ANEXO 8: BITÁCORA

BITACORA DIARIA DE OBRA N.75

214

CONTRATO N. 01045 de 2025

OBJETO: construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de Casanare.

LUGAR: Ciudadela - Bloque N°-17.

FECHA: 27 de Abril de 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIAL: 7:00 am HORA FINAL: 5:00pm

PERSONAL DE OBRA:
- RESIDENTE DE OBRA
- SUPERVISOR HSE
- MAESTRO GENERAL
- OFICIAL DE OBRA
- OFICIAL DE SOLDADURA
- AYUDANTE DE OBRA

ACTIVIDADES DE OBRA:
- vaciado de concreto 3000psi muro tipo 1 y 2.
- instalacion de formaletas para muros

MATERIALES UTILIZADOS
concreto de 3000psi

EQUIPOS EN USO
- formaleta
- mixer
- motobomba.

OBSERVACIONES
- no se presentaron novedades de obra.
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZARAMA	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2	ING. RESIDENTE 1	INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°-76

CONTRATO N°- 01045 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare - Ciudadela bloque N°-17

FECHA: 28 de abril de 2026.

CLIMA: soleado

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 17:00 PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- Supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de obra
- Oficial de soldadura
- Ayudante de obra

ACTIVIDADES DE OBRA
- Instalacion de formaletas para vigas
- Pintura para estructura metalica A500C.
- Instalacion estructura Metalica A500C
- Instalacion estructura metalica A36.

MATERIALES UTILIZADOS
- Pintura 3 en 1
- Acero A500C
- Acero A36.
- Soldadura 6013.

EQUIPOS EN USO
- Equipo de soldadura.
- formaleta en acero.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades en obra. las actividades se ejecutaron conforme.

MARLON ZARAMA	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ING-RESIDENTE 2	ING-RESIDENTE 1	INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N° 77

CONTRATO N°-01045 DE 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de Casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare - ciudadela bloque N°-17

FECHA: 29 de abril de 2026

CLIMA: lluvioso.

HORA INICIAL: 7:00 Am. HORA FINAL: 5:00 pm.

PERSONAL DE OBRA:
- Residente de obra
- Supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de obra
- Oficial de soldadura
- Ayudante de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- instalación de formaletas
- instalación Acero de refuerzo A500C
- instalación Acero de refuerzo A36.

MATERIALES UTILIZADOS
- Alambre de amarre
- soldadura 7018
- Acero A500C
- Acero A36.

EQUIPOS EN USO
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades en obra.
- Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

HAROLD ZALAMA.	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2	ING-RESIDENTE 1	INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de Casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare - ciudadela bloque N° 17

FECHA: 30 de abril de 2026

CLIMA: soleado

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- Supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de obra
- Oficial de Soldadura
- Ayudante de Obra

ACTIVIDADES DE OBRA
- Pintura epoxilado 3en1 para colocación relélica.
- vaciado de concreto para vigas

MATERIALES UTILIZADOS
- Pintura epoxilite 3en1.
- concreto 3000psi

EQUIPOS EN USO
- mixer
- Autobomba
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades de obra las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

HARLON ZALAMA	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2	ING. RESIDENTE 1	INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°-

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: Construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare - ciudadela bloque N° 17

FECHA: 01 de mayo de 2026.

CLIMA: Soleado.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM.

PERSONAL DE OBRA.
- Residente de obra
- Supervisor HSE.
- maestro general
- oficial de obra
- oficial de soldadura
- Ayudante obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- ocupante de cortaletas.
- instalacion de cortaletas.
- retiro retros.

MATERIALES UTILIZADOS
- arena
- cemento
- Agua.

EQUIPOS EN USO
Herramienta retros.

OBSERVACIONES
-No se presentaron novedades de obra.
-las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARLON ZARATA
ING. RESIDENTE 2

FABIO PEÑA
ING. RESIDENTE 1

LEIDY CUENTAS
INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de Casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare - Ciudadela bloque N° 17

FECHA: 02 de mayo de 2026.

CLIMA: Nublado.

HORA INICIAL: 7:00 a.m. HORA FINAL: 12:00 p.m.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- SUPERVISOR HSE
- Maestro general
- oficial de obra
- oficial de soldadura
- Ayudante obra

ACTIVIDADES DE OBRA
- instalación formaleta: para muros.
- resane de muros.

MATERIALES UTILIZADOS
- Mortero. 1:3.

EQUIPOS EN USO
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- No se presentaron novedades de obra.
- Se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARLON ZALAMA
ING. RESIDENTE 2

FABIO PEÑA
ING. RESIDENTE 1

LEIDY CUENCAS
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

250

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N°-019-45 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de Casanare.

LUGAR: Aguazul casanare - ciudadela bloque N°-17

FECHA: 04 de mayo de 2026.

CLIMA: soleado - lluvioso.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- supervisor HSE
- maestro general
- oficial de obra
- oficial de soldadura
- Ayudante obra

ACTIVIDADES DE OBRA.
- instalación de formaletas.
- Resane de muro.

MATERIALES UTILIZADOS
- mortero 1:3.

EQUIPOS EN USO.
herramienta menor.

OBSERVACIONES
- no se presentaron novedades de obra.
- las actividades de excavación conforme al cronograma de actividades.

OSCAR ZARAMA — RESIDENTE
FABIO PEÑA — RESIDENTE 1
LEIDY CUENCAS — PRACTICANTE.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare

LUGAR: Aguazul casanare - ciudadela bloque N° 17

FECHA: 05 de mayo de 2026.

Clima: soleado.

HORA INICIAL: 7:00 A.M. HORA FINAL: 5:00 P.M.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- SUPERVISOR HSE
- Maestro general
- Oficial de obra
- Oficial de soldadura
- Ayudante de Obra

ACTIVIDADES DE OBRA
- INSTALACION DE BARRERAS DE ACCESO.
- PINTURA MUROS TIPO 1

MATERIALES UTILIZADOS
- PINTURA BORUZA
- SOLDADURA 7018.

EQUIPOS EN USO
- BARRERAS DE ACCESO.
- ANDAMIOS TUBULARES.
- EQUIPO DE SOLDADURA.
- HERRAMIENTA MENOR.

OBSERVACIONES
- NO SE PRESENTARON NOVEDADES DE OBRA.
- LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

MALLOW ZARAMA	JACOB PEÑA	JEISON CUBILLOS
ING. RESIDENTE 2	ING. RESIDENTE 1	INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01015 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare - ciudadela bloque N° 17

FECHA: 06 de Mayo de 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- Supervisor HSE
- Maestro general
- Oficial de obra
- Oficial de soldadura
- Ayudante de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Pintura 3 muros para resane con madera.

MATERIALES UTILIZADOS
- madera tuco acetico.

EQUIPOS EN USO
- Andamios tubulares
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZALAMEA	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2	ING. RESIDENTE 1	INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N°: 01045 DE 2025

OBJETO: Construccion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare - Ciudadela bloque N° 77

FECHA: 07 de mayo de 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de Obra
- supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de Obra
- oficial de soldadura
- Ayudante de Obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Vaciado de concreto 3000psi para muros.
- Pintura tipo Koraza 3 muros
- Resane de muros

MATERIALES UTILIZADOS
- concreto 3000 psi
- Pintura tipo koraza.
- Mortero 1:3.

Equipos EN USO
- mixer
- Autobomba.
- Herramienta menor
- formaletas
- tubería andamios.

OBSERVACIONES
las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

MARLON ZALAMA	PABLO PONA	LEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2	ING. RESIDENTE 1	INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de Casanare

LUGAR: Aguazul Casanare - Ciudadela bloque N° 11

FECHA: 08 de MAYO de 2026.

CLIMA: soleado

HORA INICIAL: 7:00 AM. Hora final: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de obra
- Oficial de Soldadura
- Ayudante de Obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- instalacion de parrotelas
- pintura tres hileras 3 rotos
- resane de rotos.

MATERIALES UTILIZADOS
- Pintura tres rotaras.
- Mortero 1:3.
- soldadura 7018

EQUIPOS EN USO
- equipo de soldadura.
- parrotelas de acero.
- andamios tubulares.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZARAMA
ING. RESIDENTE 2

FABIO PEÑA
ING. RESIDENTE 1

LEIDY CUENTAS
INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul departamento de Casanare.

LUGAR: Aguazul Casanare ciudadela bloque N° 17

FECHA: 09 de Mayo de 2026.

Clima: Soleado.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 12:00PM.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de obra
- oficial de soldadura
- Ayudante de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- instalación de formaletas de acero tipo I
- pintura tipo roseza 3 manos para vigas tipo I y II

MATERIALES UTILIZADOS
- pintura tipo roseza.
- soldadura 7018

EQUIPOS EN USO
- equipo de soldadora.
- formaletas de acero
- andamios tubulares.
- herramienta menor.

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

YOVELIN ZALAMEA	FABIO PEÑA	JEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2	ING. RESIDENTE 1	INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

256

BITACORA DIARIA DE OBRA N-

CONTRATO N- 01045 DE. 2025

OBJETO: construcion de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare ciudadela bloque N- 17.

FECHA: 16 de Mayo de 2026.

Clima: soleado - lluvioso.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- supervisor HSE
- Maestro general
- oficial de obra
- oficial de soldadura
- Ayudante de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- vaciado de concreto 3000psi
- pintura tipo horaza 3 rotos. para rotos tipo 1, 4 11

MATERIALES UTILIZADOS
- concreto 3000 psi
- pintura tipo horaza

EQUIPOS EN USO
- Mixer
- cotacloraza.
- vibrador de concreto.
- formaleta de acero
- Andamios tubulares.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MILLON ZALAMA	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ING. RESIDENTE 2.	ING. RESIDENTE 1	FISCALIZADORA

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N.-

CONTRATO N.- 01045 DE 2023

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la Ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de Casanare

LUGAR: aguazul casanare ciudadela bloque N.- 17

FECHA: 12 de Mayo de 2026.

CLIMA: Soleado.

HORA INICIAL: 7:00 AM. HORA FINAL: 5:00 PM

PERSONAL OBRA:
- Residente de Obra
- Supervisor HSE
- Fidelio General
- Oficial de Obra
- Oficial Soldadura
- Ayudante Obra.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Instalación de formaletas
- Pintura tipo horaza 3 capas para cuco tipo II
- corte y traslado de bargadas.
- Instalación planchas.
- Instalación de corredores para formaleta.

MATERIALES UTILIZADOS
- Pintura tipo horaza
- soldadura 6013
- soldadura 7018
- lamina para plancha.
- varilla 1/2"

EQUIPOS EN USO
- Equipo de soldadura.
- formaletas
- herramientas topografica

OBSERVACIONES:
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de actividades.

IMPREVISTOS
Al perforar la placa para el corredor de la formaleta, dimos con un tubo de 1/2" PVC para agua, en ese momento procedimos a socabar la separación del tubo.

MARLON ZALAMA
ING. RESIDENTE 2

FABIO PEÑA
ING. RESIDENTE 1

LEIDY GODOY
INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N°

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul departamento de casanare.

LUGAR: Aguazul casanare ciudadela bloque N° 17

FECHA: 13 de Mayo de 2026

CLIMA: lluvia

HORA INICIAL: 7:00 AM. HORA FINAL: 5:00 PM.

PERSONAL OBRA.
- Residente de obra
- supervisor HSE
- Maestro General
- Oficial de obra
- oficial de soldadura
- Ayudante de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- instalación cerramiento de acero
- pintura tipo koraza y retoques caso tipo II
- instalación flaretic.

MATERIALES UTILIZADOS
- pintura tipo koraza.
- lamina para flaretic
- soldadura 7018.
- soldadura 6013.
- sika flex
- cinta asfaltica.

EQUIPOS EN USO
- Equipo de soldadura.
- cerraletes
- andamios tubulares
- Herramienta varias

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZALAMA
RES. RESIDENTE 2

FABIO PEÑA
RES. RESIDENTE 1

LEIDY CUENTAS
INTELIGENTOMA

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N° 90

CONTRATO N° 01045 DE 2025

OBJETO: Construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguachica departamento de cesar.

LUGAR: Ciudadela - Bloque N.19.

FECHA: 14 de Mayo de 2026.

CLIMA: soleado:

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00PM.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra.: 1
- Inspector HSE: 1
- Maestro general: 1
- Oficial de obra.: 3
- Ayudante de obra: 6

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Instalación de formaletas para vigas tipo 2.
- Pintura tipo novaco a vigas para viga tipo 7.

MATERIALES UTILIZADOS
- Pintura tipo novaco
- soldadura 7018

EQUIPOS EN USO.
- Equipo de soldadura
- Formaletas de acero
- Andamios tubulares
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES.
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZARAMA	FABIO REYNA	LEIDY CORTINA
Ing. residente 2	Ing. residente 1	Interventora.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA N:° 01

CONTRATO N° 0045 de 2025
OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de casanare.
LUGAR: ciudadela - Bloque N:17
FECHA: 15 de mayo de 2025
CLIMA: nublado - soleado.
HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 pm.

PERSONAL OBRA
- residente de obra 1
- supervisor HSE 1
- maestro general 1
- oficial de obra. 3
- ayudante de obra 6.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- perfilación andenes.
- vaciado de concreto para andenes

MATERIALES UTILIZADOS
- Malla electrosoldada q.5
- cemento
- arena
- grava.
- Madera para formaleta

EQUIPOS EN USO.
- Mezcladora.
- vibrador de concreto.
- soldadora.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES.
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZABALA
Ing. Residente 2.

FABIO PEÑA
Ing. residente 1.

YENNY CUENTAS
interventora

BITÁCORA DIARIA DE OBRA N: 92

CONTRATO Nº 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguatol departamento de casanare.

LUGAR: Ciudadela - Bloque N: 17

FECHA: 16 de Mayo de 2026.

CLIMA: Soleado.

HORA INICIAL: 7:00AM HORA FINAL: 12:00PM

PERSONAL OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
- residente de obra: 1	· Suministro e instalación
- supervisor HSE: 1	de cajas metálicas para
- Maestro general: 1	medidores de agua.
- oficial de obra: 3	· vaciado de concreto
- ayudante de obra: 6.	para anclajes.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPO EN USO.
- cajas metálicas	- compresor
- pintura 3 en 1	- mezcladora.
- cemento	- soldadora.
- arena	- herramienta menor.
- grava.	
- Malla electrosoldada q8	

OBSERVACIONES:

- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARION ZAPATA
Ing. residente 2

FABIO PEÑA
Ing. residente 1

LEIDY CORTES
Interventoría

Powered by CamScanner

BITÁCORA DIARIA DE OBRA N°93

CONTRATO N° 0104 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE ACUARTELAMIENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE NOGABAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LUGAR: Ciudadela - Bloque N°17

FECHA: 18 de Mayo de 2026.

CLIMA: Lluvia. - nublado.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 pm.

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra: 1
- Supervisor HSE: 1
- Maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- Ayudante de obra: 3

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Instalación cargas retálicas para reductores de agua.
- Instalación de adoquines.
- Localización y replanteo de tubería, pozos y cerramo.

MATERIALES UTILIZADOS
- cobacas
- cargo retálicas
- arena
- adoquines.
- Mortero 1:3

EQUIPOS EN USO.
- Equipo topografía.
- Bolvadora.
- Herramienta menor.

OBSERVACIONES
- Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON PARAVA
Ing. Residente 2

PABLO PEÑA
Ing. Residente 1

LEIDY CORTES
Inspectora

BITACORA DIARIA DE OBRA N:94

CONTRATO N: 01045 de 2025
OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul departamento de casanare.
LUGAR: Ciudadela - Bloque N:17
FECHA: 19 de mayo de 2026.
CLIMA: Soleado - lluvia.
HORA INICIO: 7:00 A.M. HORA FINAL 5:00 P.M.

PERSONAL OBRA
- Residente de obra 1
- supervisor HSE 1
- Maestro general 1
- oficial de obra 2
- Ayudante de obra. 4

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- vaciado de concreto para muro tipo II
- Pintura tipo koraza 3 manos para muro tipo II

MATERIALES UTILIZADOS
- concreto 3000 psi
- Pintura tipo koraza.

EQUIPOS EN USO.
- mixer
- colocadora
- vibrador de concreto.
- Herramienta menor
- formaletas
- andamio tubular.

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.
- se realizo socialización con la junta de acción comunal de la ciudadela la esperanza y la supervisión de la alcaldía, sobre la radicatoria de prorroga y adicional del presupuesto del contrato obra de 2025. Además se socializo el adición de actividad para el diseño de cubierta de aguas lluvias.

MARION ZARAMA
Ing. Residente 2

PABLO PEÑA
Ing. Residente 1

LEIDY CONTRERAS.
Interventoria.

Powered by CamScanner

264

BITACORA DIARIA DE OBRA N. 95

CONTRATO: OTROS de 2025
OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de aguazul, departamento de casanare.
LUGAR: ciudadela - bloque 17
FECHA: 20 de mayo de 2026.
CLIMA: lluvia
HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 pm

PERSONAL OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS.
-residente de obra: 1	- descarte de formaletas
-supervisor HSE: 1	- instalación de formaleta para
-maestro general: 1	muros tipo 11.
-oficial de obra: 2	- pintura tipo fuerza 3 manos
-ayudante de obra: 4	para muro tipo 2.

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPO EN USO.
-pintura tipo fuerza.	- equipo de soldadura
-discos de corte 4"	- soldadora.
-alambre negro	- herramienta menor
-soldadura 7018	

OBSERVACIONES
-las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZARAMA
ing. residente 2.

FABIO PEÑA
ing. residente 1

LEIDY CUENTAS.
interventoria.

Powered by CamScanner

INFORME DIARIA DE OBRA N°96.

CONTRATO N°: 0104S DE 2025
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
LUGAR: CIUDADELA - BLOQUE N°17
FECHA: 21 DE MAYO DE 2026.
CLIMA: NUBLADO - LLUVIA.
HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM.

PERSONAL DE OBRA
- RESIDENTE DE OBRA: 1
- SUPERVISOR HSE: 1
- MAESTRO GENERAL: 1
- OFICIAL DE OBRA: 2
- AYUDANTE DE OBRA: 4

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- INSTALACIÓN CONCRETOS DE ACERO PARA MURO TIPO II
- PINTURA PARA MURO TIPO II
- 3 TRAPOS.

MATERIALES UTILIZADOS
- PINTURA TIPO HORTAZA
- ALAMBRE DE AMARRE
- SOLDADURA 2018

EQUIPOS EN USO
- EQUIPO SOLDADURA.
- SOLDADORA.
- HERRAMIENTA MENOR

OBSERVACIONES:
- LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA.

MARLON ZARAMA
ING. RESIDENTE

FABIO PEÑA
ING. RESIDENTE

LENDY COGNIDO
INTERVENTORA

Powered by CamScanner

CONTRATO N.- 01048 dc 2025

OBJETO: construcción dc la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio dc Agua zul, departamento de cundinamarca.

LUGAR: ciudadela - Bloque N.-17

FECHA: 22 de Mayo de 2026.

CLIMA: soleado.

HORA INICIAL: 7:00 am HORA FINAL: 5:00 p.m.

PERSONAL DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- residente de obra: 1	- suministro tubería 10", 12" y 14"
- supervisor HSE : 1	- excavación mecánica.
- maestro general.: 1	- pintura para todo tipo de
- oficial de obra. : 2	- instalación de torretas.
- ayudante de obra: 4.	

MATERIALES UTILIZADOS	EQUIPOS EN USO.
- tubería alcantarillado 10"	- pavanta.
- tubería alcantarillado 12"	- soldadora
- tubería alcantarillado 14"	- equipo de soldadura.
- pintura todo horario.	- andamios tubulares
- alambre negro	- torretas.
- soldadura 7018	- herramienta menor.

OBSERVACIONES

- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON ZABALA	FABIO PEÑA	LEIDY CUENTAS
ing. residente	ing. residente	interventoria.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA Nº 18

CONTRATO N. 0045 DE 2026

OBJETO: construcción de la fase II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

LUGAR: Ciudadela - bloque N=17

FECHA: 23 de Mayo de 2026.

CLIMA: Soleado

HORA INICIAL: 7:00 am HORA FINAL: 12:00 pm

PERSONAL DE OBRA	
-Residente de obra:	1
-Supervisor HSE:	1
-Maestro general	1
-oficial de obra	2
-Ayudante de obra.	4.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Excavación mecanica.
- vaciado de concreto
- Pintura rojo a rayas.

MATERIALES UTILIZADOS
- concreto 3000 psi
- Pintura tipo tráfico

EQUIPO EN USO:
- mixer
- cotacionera
- Andamios tubulares
- formaletas de acero.
- Herramienta menor
- Polidora.
- vibrador de concreto.
- Planta

OBSERVACIÓN:
- las actividades de obra se ejecutaron conforme al cronograma de obra.

MARLON BARRERA
Ing. Residente 2

JAIRO RIAÑO
Ing. Residente 1

LEIDY CUENTAS
Interventora

Powered by CamScanner

268

BITÁCORA DIARIA DE OBRA N°99.

CONTRATO N° 0404 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LUGAR: CIUDADELA – BLOQUE N° 17

FECHA: 25 DE MAYO DE 2026.

CLIMA: LLUVIA.

HORA INICIAL: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA
- RESIDENTE DE OBRA: 1
- SUPERVISOR HSE: 1
- OFICIAL DE OBRA: 2
- FACTOTUM GENERAL: 1
- AYUDANTE DE OBRA: 4

ACTIVIDADES EJECUTADAS
- EXCAVACIÓN MECÁNICA
- INSTALACIÓN BASE GRANULAR 1-1/2"
- INSTALACIÓN TUBERÍA 4"
- DESCRAPE E IMPERMEABILIZACIÓN
- BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"
- DESCRAPE DE CONCRETOS
- FABRICACIÓN SELLOS CONCRETO.

MATERIALES UTILIZADOS
- BASE GRANULAR 1-1/2"
- TUBERÍA ALCANTARILLADO 12"
- TUBERÍA BAJANTE 4"
- ANGULO 2½"x3/16"
- VARILLA ½"
- SOLDADURA 7018

EQUIPOS EN USO
- RETROEXCAVADORA
- HERRAMIENTAS MENORES
- EQUIPO DE SOLDADURA.
- FORMALETAS DE ACERO

OBSERVACIONES.
- LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA.

IMPREVISTOS
- AL MOMENTO DE EXCAVAR CON LA RETRO, HALLAMOS UNA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, LA CUAL SE FRACTURÓ CON EL BALDE DE LA RETRO. EN ESE MOMENTO PROCEDIMOS A REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12" DE ALCANTARILLADO.

MARLON ZAMORA. ING. RESIDENTE 2.

FABIO PEÑA ING. RESIDENTE 1

LEIDY CUENTAS ING. INTERVENTORA.

Powered by CamScanner

BITACORA DIARIA DE OBRA Nº 100

CONTRATO Nº 01045 de 2025

OBJETO: construcción de la base II del reforzamiento estructural de los bloques de apartamentos de la ciudadela la esperanza del remanso de Aguazul, departamento de casanare.

LUGAR: Ciudadela - Bloque Nº17

FECHA: 26 de mayo de 2026.

CLIMA: lluvia - soleado

HORA INICIAL: 7:00 am HORA FINAL: 5:00 pm.

PERSONAL DE OBRA
- Ing Residente: 1
- Operador Retro: 1
- Maestro general: 1
- oficial de obra: 2
- Ayudante de obra: 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- Excavación manual
- Encamado de base granular para tubería
- Instalación de tubería 14"
- Relleno con material base granular para atraque de tubería
- Relleno con material de excavación.

MATERIALES UTILIZADOS
- Base granular 1-1/2"
- tubería de alcantarillado 14"
- Material de excavación

EQUIPOS EN USO.
- palustre.
- Herramienta menor

OBSERVACIONES
- las actividades se ejecutaron conforme al cronograma de obra.
- No se presentaron novedades de obra.

EDISON TARAZONA	FABIO PEÑA	LEIDY CONTRERAS
Ing Residente	Ing. Residente	Interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_017

Aguazul, 11 de mayo de 2026

12 MAY 2026

Señores
MUNICIPIO DE AGUAZUL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Radicación de pólizas para aprobación – Modificatoria Contrato No. 01045 de 2025

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 01045, suscrito entre MUNICIPIO DE AGUAZUL y CONSORCIO REFORZAMEINTO 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, nos permitimos radicar las pólizas de cumplimiento y RCE para su respectiva revisión y aprobación, conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos del proceso.

Atentamente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Aguazul, 11 de mayo del 2026.

1045_018

RECIBIDO
FIRMA: Johanna Sarmiento
FECHA: 11-05-26 HORA: 9:00 AM

Ingeniera:
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S
Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1045 DE 18 DE DICIEMBRE 2025, CON OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE**".

ASUNTO.: INFORME TECNICO PARA ACTA PARCIAL No. 02

Cordial Saludo Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito hacer entrega del INFORME TECNICO PARA ACTA PARCIAL del periodo correspondiente a 28 de marzo hasta el 11 de mayo de 2026, correspondiente al Contrato de Obra Pública N° 01045 del 18 de diciembre del 2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Anexos,

- 01 MEMORIAS DE CALCULO
- 02 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE INSUMOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO.
- 03 COPIA DE BITACORA DIARIA DE OBRA.
- 04 COMITES Y ACTAS
- 05 COPIA DE LAS AFILIACIONES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA.
- 06 PÓLIZAS.
- 07 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.
- 08 INFORMES SEMANALES
- 09 INFORME DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Agradezco la atención prestada

SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
R/L. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

1 de 2

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_019

Aguazul, 15 de mayo de 2026

RECIBIDO
FIRMA: Dayana Sarmiento
FECHA: 15/05/26 HORA: 2:00pm

Señores,
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S
INTERVENTORÍA
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
INFRAESTRUCTURA
JUNTA DE ACCION COMUNAL CIUDADELA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE AGUAZUL
PRESIDENTE NELSON OCAMPO QUINTERO.

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de reunión en sitio de obra – Socialización de modificatoria contractual

Por medio de la presente, y en calidad de contratista del contrato de obra No. 01045 de 2025, cuyo objeto corresponde a CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", me permito solicitar muy comedidamente la realización de una reunión en el sitio de ejecución de la obra, con el fin de socializar e informar a las partes interesadas sobre la modificatoria contractual que actualmente se encuentra aprobada.

La reunión tiene como propósito presentar las condiciones y alcances relacionados con la solicitud de prórroga, adicional y/o ajustes contractuales derivados de las necesidades técnicas evidenciadas durante la ejecución del proyecto, así como escuchar las observaciones y brindar claridad a la comunidad y entidades participantes.

Por lo anterior, solicitamos se programe la visita y reunión para el día 19 de mayo de 2026 a las 17:00 pm, en el sitio de la obra.

Agradecemos su atención y participación, ya que estos espacios fortalecen la comunicación y el adecuado desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

7t2

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

OFI_CR_1045_019

Aguazul, 15 de mayo de 2026

RECIBIDO
FIRMA: Dayana Sarmiento
FECHA: 15/05/26 HORA: 2:00pm

Señores,
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S
INTERVENTORÍA
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
INFRAESTRUCTURA
JUNTA DE ACCION COMUNAL CIUDADELA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE AGUAZUL
PRESIDENTE NELSON OCAMPO QUINTERO.

REFERENCIA: CONTRATO No 01045 "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de reunión en sitio de obra – Socialización de modificatoria contractual

Por medio de la presente, y en calidad de contratista del contrato de obra No. 01045 de 2025, cuyo objeto corresponde a CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", me permito solicitar muy comedidamente la realización de una reunión en el sitio de ejecución de la obra, con el fin de socializar e informar a las partes interesadas sobre la modificatoria contractual que actualmente se encuentra aprobada.

La reunión tiene como propósito presentar las condiciones y alcances relacionados con la solicitud de prórroga, adicional y/o ajustes contractuales derivados de las necesidades técnicas evidenciadas durante la ejecución del proyecto, así como escuchar las observaciones y brindar claridad a la comunidad y entidades participantes.

Por lo anterior, solicitamos se programe la visita y reunión para el día 19 de mayo de 2026 a las 17:00 pm, en el sitio de la obra.

Agradecemos su atención y participación, ya que estos espacios fortalecen la comunicación y el adecuado desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025
R.L. SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
C.C. N° 79.616.221 de Bogotá

EZ

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Aguazul, 26 de mayo del 2026.

OFI_CR_1045_020

RECIBIDO
FIRMA: Layana Sarmiento
FECHA: 26/05/26 HORA: 10:00 AM

Ingeniera:
LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S
Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1045 DE 18 DE DICIEMBRE 2025, CON OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 04

Cordial Saludo Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito hacer entrega del INFORME TECNICO DE OBRA del periodo correspondiente a 27 de abril hasta el 26 de mayo de 2026, correspondiente al Contrato de Obra Pública N° 01045 del 18 de diciembre del 2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Anexos,

- 01 – CERTIFICADOS DE CALIDAD DE INSUMOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO.
- 02 – BITACORA DIARIA DE OBRA.
- 03 – POLIZAS.
- 04 – CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.
- 05 – COPIA DE LAS AFILIACIONES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA
- 06 – PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.
- 07 – INFORMES SEMANALES.
- 08 – INFORME DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Agradezco la atención prestada

SANDRO WALTER CARRILLO TORRES
R/L. CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

HE2

ANEXO 9: INFORMES SEMANALES

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		2	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 16 — Del: 27 de abril de 2026 — Al: 02 de mayo de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 96 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	2,90%	65,75%
Avance financiero obra:	$ 33.889.011,57	$ 768.345.693,45

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	2,90%	65,75%
Avance financiero interventoría:	$ 3.553.180,08	$ 80.559.169,03

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1.068.556.990,00
Valor Actualizado:	$ 1.168.586.606,00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15 DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2026
Fecha de Términación Inicial:	10 de mayo de 2026
Fecha de Términación actulizad	10 de julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97.316.508,00
Valor Actualizado:	$ 122.523.451,00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación Inical:	15 de abril 2026
Fecha de Términación actulizado:	25 de julio2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.	Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.





CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consultoría S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		2	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL


Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Esmalte sobre lamina lineal

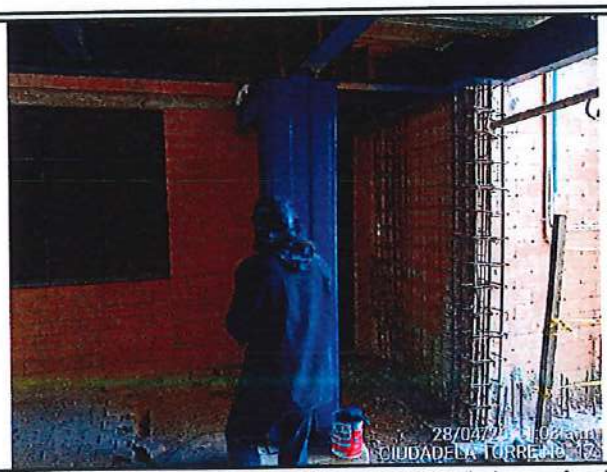

Esmalte sobre lamina lineal



Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.



Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)




CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		2	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.

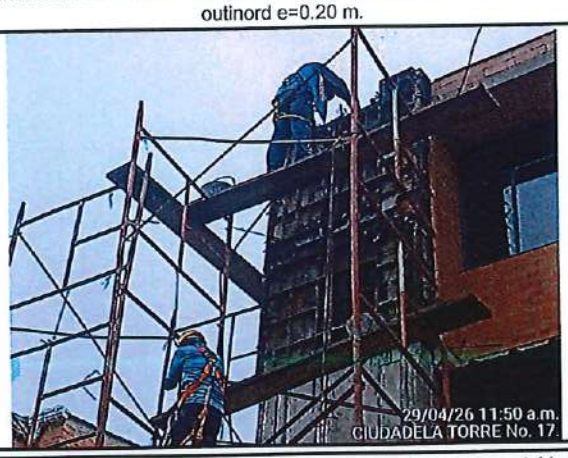

Esmalte sobre lamina lineal



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consultoría S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		2	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Esmalte sobre lamina lineal
Esmalte sobre lamina lineal
Conector de cortante de Ø 1/4" x 440 mm con epoxico (incluye perforación L=70 mm). Suministro e Instal.
Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Esmalte sobre lamina lineal
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 16 se reporta un avance del 65,75%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LIDY CUENTAS PERALTA FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		11	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 17 — Del: 04 de mayo de 2026 — Al: 11 de mayo de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 106 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	4,01%	69,76%
Avance financiero obra:	$ 46.845.996,55	$ 815.191.690,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	4,01%	69,76%
Avance financiero interventoría:	$ 4.911.688,30	$ 85.470.857,34

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1.068.556.990,00
Valor Actualizado:	$ 1.168.586.606,00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15 DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2026
Fecha de Términación Inicial:	10 de mayo de 2026
Fecha de Términación actulizadc	10 de julio de 2026


CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97.316.508,00
Valor Actualizado:	$ 122.523.451,00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación Inical:	15 de abril 2026
Fecha de Términación actulizada:	25 de julio2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos

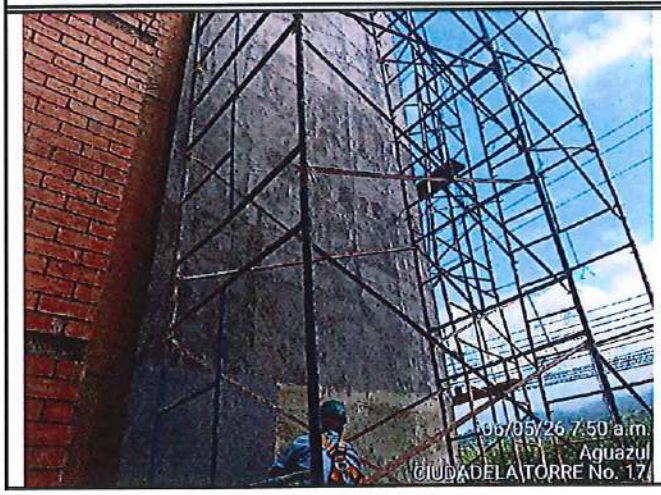

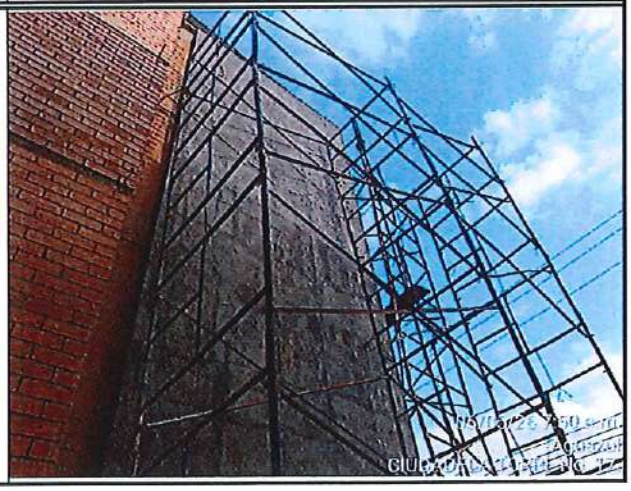

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		11	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos




Limpieza, raspado y lavado mecanico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m



Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.



Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.

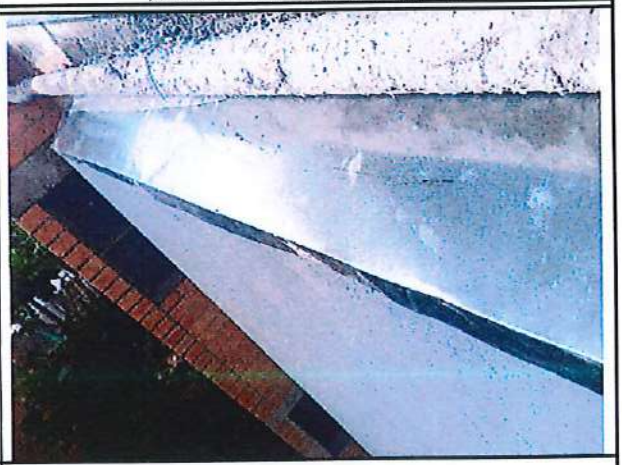

Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol



Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		11	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos




Caja de metalica para medidor de agua de



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.

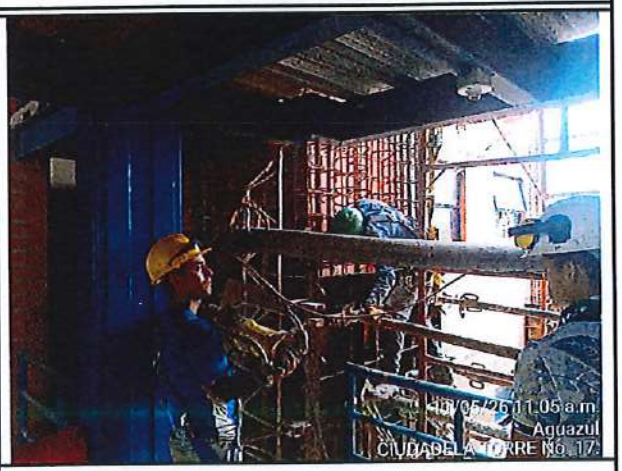

Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Pintura para baranda metalica



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		11	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Limpieza, raspado y lavado mecanico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m
Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.
Flanche lamina galvanizada cal. 18 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.
Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Caja de metalica para medidor de agua de
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Pintura para baranda metalica

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 17 se reporta un avance del 69,76%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025		Cresse Consulting S.A.S			INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		16	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 18 — Del: 12 de mayo de 2026 — Al: 16 de mayo de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 96 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	5,50%	75,26%
Avance financiero obra:	$ 64.272.263,33	$ 879.478.279,68

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoría (%) avance	5,50%	75,26%
Avance financiero interventoría:	$ 6.738.789,81	$ 92.211.149,22

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1.068.556.990,00
Valor Actualizado:	$ 1.168.586.606,00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15 DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2026
Fecha de Términación inicial:	10 de mayo de 2026
Fecha de Términación actulizadc	10 de julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97.316.508,00
Valor Actualizado:	$ 122.523.451,00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación inical:	15 de abril 2026
Fecha de Términación actulizado:	25 de julio2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura	Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura



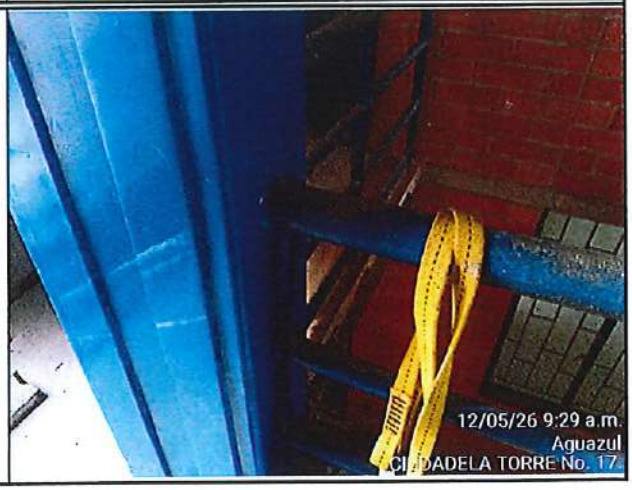

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025		Cesse Consultoría S.A.S			INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		16	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL


Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura



Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura



Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura

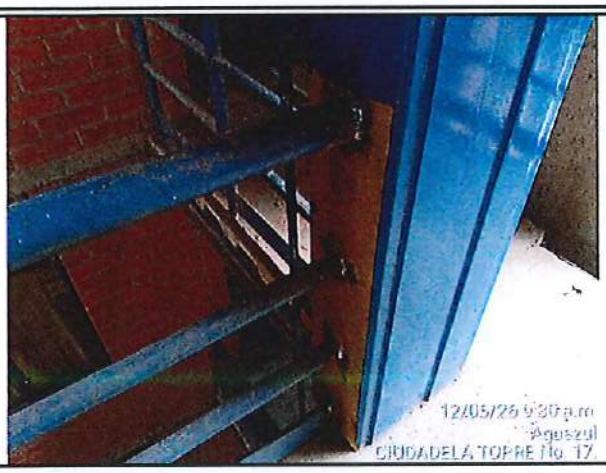

Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos



Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro




CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		16	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL


Malla Electrosoldada Q-5 o M 188

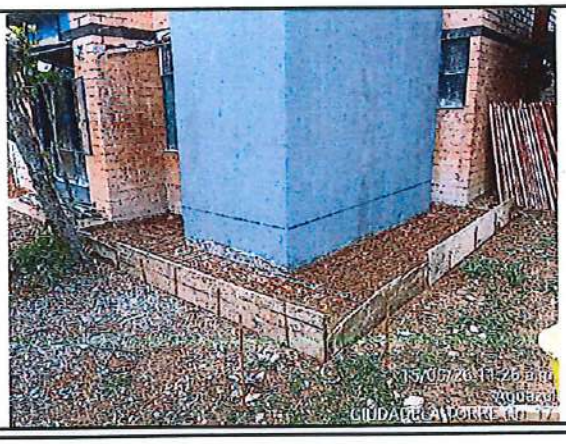

Malla Electrosoldada Q-5 o M 188



Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m.

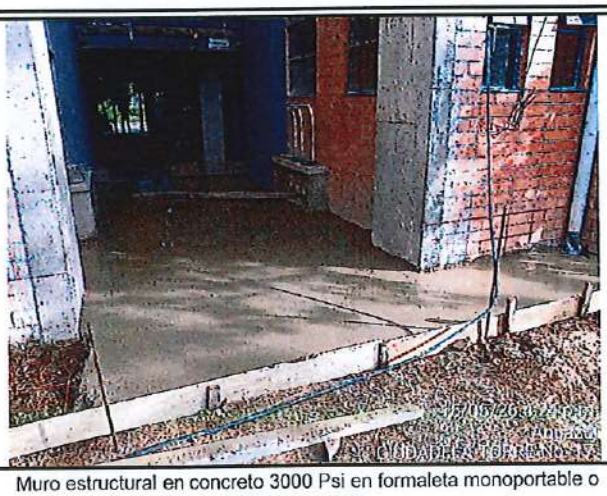

Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		16	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura
Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura
Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura
Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura
Corte y traslado de baranda metalica, No incluye pintura
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro
Malla Electrosoldada Q-5 o M 188
Malla Electrosoldada Q-5 o M 188
Placa base en concreto 3000 psi e=0.12 m.
Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 18 se reporta un avance del 75,26%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025			Cresse Consulting S.A.S		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		23	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 18 — Del: 18 de mayo de 2026 — Al: 23 de mayo de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 96 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	3,50%	78,76%
Avance financiero obra:	$ 40.900.531,21	$ 920.378.810,89

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	3,50%	78,76%
Avance financiero interventoría:	$ 4.288.320,79	$ 96.499.470,01

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1.068.556.990,00
Valor Actualizado:	$ 1.168.586.606,00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15 DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2026
Fecha de Términación Inicial:	10 de mayo de 2026
Fecha de Términación actulizad	10 de julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97.316.508,00
Valor Actualizado:	$ 122.523.451,00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación inical:	15 de abril 2026
Fecha de Términación actulizada:	25 de julio2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación	Instalación de adoquines





CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		23	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Instalación de adoquines




Replanteo y localizacion tuberias de alcantarillado



Replanteo y localizacion tuberias de alcantarillado



Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación

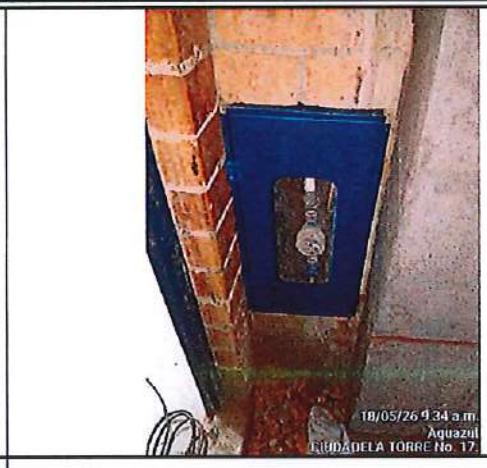

Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación



Suministro de tuberías de allcantarillado



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consultora S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		23	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos



Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos



Bajante aguas negras-grises 6"



Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.



Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)



Bajante aguas negras-grises 6"



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		23	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación
Instalación de adoquines
Instalación de adoquines
Replanteo y localizacion tuberias de alcantarillado
Replanteo y localizacion tuberias de alcantarillado
Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación
Caja de metalica para medidor de agua de 1/2" y 3/", Suministro e Instalación
Suministro de tuberías de allcantarillado
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos
Bajante aguas negras-grises 6"
Muro estructural en concreto 3000 Psi en formaleta monoportable o outinord e=0.20 m.
Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)
Bajante aguas negras-grises 6"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 19 se reporta un avance del 78,76%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025					INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 18 — Del: 25 de mayo de 2026 — Al: 26 de mayo de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 96 Dias.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra (%) avance	1,78%	80,54%
Avance financiero obra:	$ 20.800.841,59	$ 941.230.201,18

	SEMANAL	ACUMULADO
Interventoria (%) avance	1,78%	80,54%
Avance financiero interventoría:	$ 2.180.917,43	$ 98.685.687,34

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025

Contrato No.	01045 de 2025
Valor Inicial:	$ 1.068.556.990,00
Valor Actualizado:	$ 1.168.586.606,00
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15 DIAS
Fecha de Iniciación:	26 de enero de 2026
Fecha de Términación Inicial:	10 de mayo de 2026
Fecha de Términación actulizadc	10 de julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor: CRESSE CONSULTING S.A.S

Contrato No.	1024 de 2025
Valor Inicial:	$ 97.316.508,00
Valor Actualizado:	$ 122.523.451,00
Plazo Inicial:	CUATRO MESES (4)
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	17 de diciembre de 2025
Fecha de Términación Inical:	15 de abril 2026
Fecha de Términación actulizada:	25 de julio2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	Bajante aguas negras-grises 6"



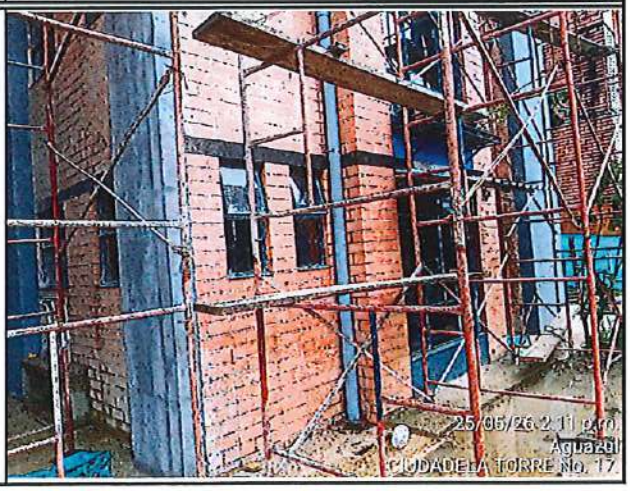

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

Desmonte De Canales Y Bajantes De Aguas Lluvias



Encamado tuberia con material base granular triturada (tamaño maximo 1 1/2")



Encamado tuberia con material base granular triturada (tamaño maximo 1 1/2")



Tubería PVC alcantarillado 14". suministro e instal.



Tubería PVC alcantarillado 14". suministro e instal.



Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2")



CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL


Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2")



Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado

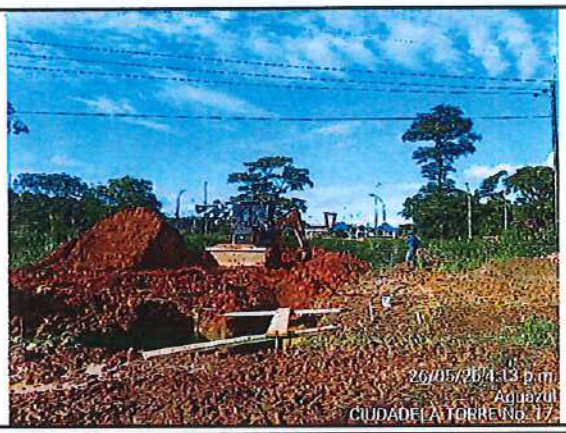

Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado

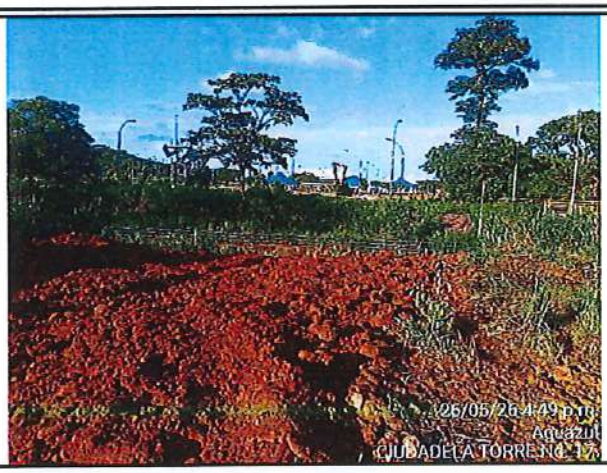


Bajante aguas negras-grises 6"



Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)



Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado

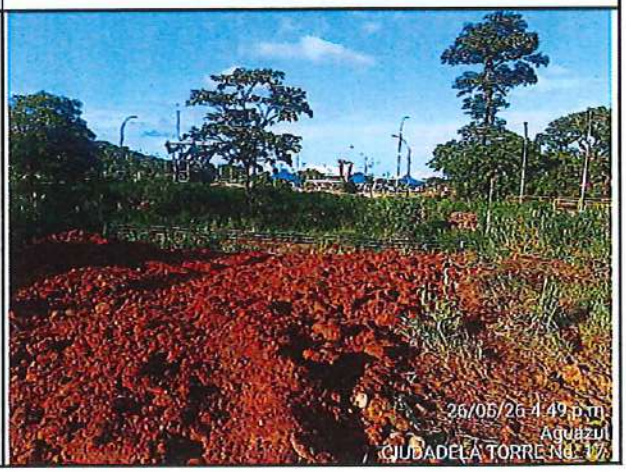

CONSORCIO REFORZAMIENTO 2025	Cesse Consulting S.A.S	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO.1045 -2025
		26	5	2026	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE AGUAZUL

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)
Bajante aguas negras-grises 6"
Desmonte De Canales Y Bajantes De Aguas Lluvias
Encamado tuberia con material base granular triturada (tamaño maximo 1 1/2")
Encamado tuberia con material base granular triturada (tamaño maximo 1 1/2")
Tubería PVC alcantarillado 14". suministro e instal.
Tubería PVC alcantarillado 14". suministro e instal.
Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2")
Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2")
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado
Bajante aguas negras-grises 6"
Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

de acuerdo con la semana 20 se reporta un avance del 80,54%

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	FABIO NELSON PEÑA AMEZQUITA FIRMA RESIDENTE OBRA	LEIDY CUENTAS PERALTA FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
