Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	16	FECHA:	5	de	NOVIEMBRE	de	2025

PERIODO: DEL	2	de	NOVIEMBRE	de	2025	AL	5	de	NOVIEMBRE	de	2025

CONVENIO No:	2941	DE	2023		

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

Institucion Educativa Las Mercedes, en el Centro Poblado Las Mercedes Del Municipio de chiscas

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
Gobernacion de Boyacá	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
Lourdes Marcela Blanco Pedroza Teléfono: Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.241.141.231,73	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.241.141.231,73**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CH-LP-04-2023	25/07/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	25/07/2023	
Estudios Previos	25/07/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	25/07/2023	
Pliego de condiciones definitivos	10/08/2023	
Acto de adjudicación	25/09/2023	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CMPTS-03-2023	30/08/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/08/2023	
Estudios Previos	30/08/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	30/08/2023	
Pliego de condiciones definitivos	13/09/2023	
Acto de adjudicación	11/10/2023	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					
ENTIDAD CONTRATANTE:				VALOR:	
Alcaldica de Chiscas				**$ 11.154.431.389,00**	
OBJETO:					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DELA COMUNIDAD DELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO ENEL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DECHISCAS					
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA			REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO ALTAMAQUINAS			**JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ**		
Teléfono: 3214801404	Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA		Teléfono: 3104801404	Dirección: DIAGONAL 67 No. 4-45 TUNJA	

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
ENTIDAD CONTRATANTE:				VALOR:	
Alcaldica de Chiscas				**$ 75.444.991,00**	
OBJETO:					
"INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL,JURÍDICAYFINANCIERAALAEJECUCIÓNDELCONTRATODEOBRAPÚBLICAQUERESULTEDELALICITACIÓNPÚBLICANo.CHLP-04-2023,CUYO OBJETOCORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOSLINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LA SNECESIDADES DELA COMUNIDAD DELAI NSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS".					
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO INTERCHISCAS			**HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA**		
Teléfono: 3214801404	Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA		Teléfono: 3214801404	Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA	


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	29	11	2023	29	11	2023
PLAZO INICIAL	4	7	2023	29	2	2024	29	2	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	29	2	2024	29	2	2024
ADICIONES EN PLAZO	2	3	2024						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	7	11	2025	7	11	2025	7	11	2025

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	96,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	96,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	60,0%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	73,7%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	96,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	54,0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	73,7%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	96,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

QUE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE DA INICIO A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO, POR LO QUE EL MUNICIPIO DE CHISCAS SOLICITA SUSPENSIÓN AL CONVENIO 2941-2023 HASTA DAR TRÁMITE A SOLICITUD DE PRORROGA PRESENTADA CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MISMO Y LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LAS OBRAS A REALIZAR. CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE SUSCRIBE ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO. DURANTE EL PERIODO SE REPORTAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, SOLADO EN CONCRETO RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO Y COMPACTADA MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO. EN ANDENES DE CONEXIÓN DE BLOQUE B ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE, CANCHA MÚLTIPLE, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO, SOLADO EN CONCRETO, CONCRETO VIGA DE AMARRE, CONCRETO PLACA CANCHA MULTIPLE, ANDENES DE CONEXION ENTRADA PRINCIPAL, CON UN AVANCE, QUE EL DÍA 4 DE MARZO DE 2024 SE DIO REINICIO DE OBRA SUPERANDO LOS PROBLEMAS QUE CONLLEVARON A LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO QUE EL DÍA 6 DE MAYO SE SOLICITA LA SUSPENSIÓN 2 DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS CON EL FIN DE ACLARAR CANTIDADES DE OBRA Y REALIZAR ACTA DE MODIFICACIONES, QUE EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE FIRMA EL REINICIO 2 DE OBRA SUPERANDO LOS PROBLEMAS QUE CONLLEVARON A LA SUSPENSIÓN, QUE EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE FIRMA EL OTROSÍ MODIFICATORIO DEL CONVENIO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES Y ADICIÓN A EL CONTRATO DE OBRA POR UN VALOR DE (11.264.851,73), QUE EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE FIRMA LA SUSPENSIÓN 3 POR PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de suspension No. 1	30	11	2023	
Acta de Reinicio	29	2	2024	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	11	2023	
Acta de suspension	21	12	2023	
Prorroga a la suspension	15	1	2024	
Reinicio	4	3	2024	
Suspension 2	6	5	2024	
reincio 2	14	10	2025	
Otrosi No. 1	17	10	2025	
Suspension 3	6	11	2025	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	11	2023	
Acta de suspension	21	12	2023	
Prorroga a la suspension	15	1	2024	
Reinicio	4	3	2024	
Suspension 2	6	5	2024	
reincio 2	14	10	2025	
Otrosi No. 1	17	10	2025	

Suspension 3	6	11	2025

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	B-100043238	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							17	10	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
cumplimineto	6	5	2024	7	5	2026	$ 116.569.624,07
buen manejo del anticipo	6	5	2024	7	5	2026	$ 346.329.416,70
prestaciones sociales	6	5	2024	7	11	2028	$ 116.569.624,07
estabilidad de obra	7	11	2025	7	11	2030	$ 233.139.248,15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa
							17	10	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
cumplimineto	14	10	2025	3	5	2027	$ 8.119.315,60
prestaciones sociales	4	6	2024	4	6	2027	$ 12.179.423,40
calidad de servicio	4	6	2024	4	6	2026	$ 8.119.315,60
calidad	4	6	2024	4	6	2026	$ 8.119.315,60

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	suspension del contrato		
2	reactiviacion del contrato		
3	modificacion del contrato		
4	modificacion del contrato		
5	modificacion del contrato		
6	reinicio del contrato		
7	modificacion del contrato	$11,264,851,73	
8	modificacion del contrato		
9	suspesnion de contrato		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	acta de inicio		tres meses
2	acta de suspension		25 dias calendario
3	prorroga en tiempo a suspension 1		dias calendario
4	reinicio 1		4 de marzo de 2024
5	acta de suspension 2		calendario
6	reinicio 2		14 de octubre de 2025
7	otrosi No. 1	$11,264,851,73	17 de noviembre de 2025
8	acta de suspension 3		6 de noviembre de 2025
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$11,264,851,73	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	acta de inicio		tres meses
2	acta de suspension		25 dias calendario
3	prorroga en tiempo a suspension 1		dias calendario
4	reinicio 1		4 de marzo de 2024
5	acta de suspension 2		calendario
6	reinicio 2		14 de octubre de 2025
7	otrosi No. 1	$11,264,851,73	17 de noviembre de 2025
8	acta de suspension 3		6 de noviembre de 2025
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$11,264,851,73	

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	151-43-00406-1	BANCO:	Banco Agrario	SUCURSAL:	Chiscas	
NOMBRE CUENTA:	Convenio Interadministrativo 2941 de 2023					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	30%	25	4	2024	$ 346.329.416,70
Desembolso No 2.	40%	6	6	2025	$ 498.204.411,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 844.533.827,70**

CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo	25	4	2024	$ 346.329.416,70
Acta Parcial No.	6	6	2025	$ 326.319.390,00

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				$ 672.648.806,70
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No.				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
A LA FECHA DE INFORME SE HAN DESARROLLADO LOS SIGUIENTES ITEMS, 1. ANDENES DE CONEXIÓN, 2. ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B, 3. ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE, 4. RAMPAS, 5. ESCALERA MACIZA, 6. CERRAMIENTO, 7. CANCHA MÚLTIPLE, 9. CARCAMO CANCHA MÚLTIPLE, 10. ITEMS COMPLEMENTARIOS - NO PREVISTOS	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO QUE VIENE DESARROLLANDO LA INTEVENTORIA SON INTERMITENTES Y SE DENOTRA EN LOS INFORMES DONDE SE OBSERVA LA BAJA EJECUCION DE COMITES DE OBRA Y CORRESPONDECIA ENVIADA	

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ DE OBRA	15	10	2025	SE REALIZO COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	4	7	2023	3	8	2023	
Informe de Supervisión No. 2	4	8	2023	15	8	2023	
Informe de Supervisión No. 3	16	8	2023	21	8	2023	
Informe de Supervisión No. 4	22	8	2023	21	9	2023	
Informe de Supervisión No. 5	22	9	2023	21	10	2023	
Informe de Supervisión No. 6	22	10	2023	21	11	2023	
Informe de Supervisión No. 7	22	11	2023	30	11	2023	
Informe de Supervisión No. 8	1	12	2023	31	12	2023	
Informe de Supervisión No. 9	1	1	2024	29	2	2024	
Informe de Supervisión No. 10	1	3	2024	31	3	2024	
Informe de Supervisión No. 11	1	4	2024	30	4	2024	
Informe de Supervisión No. 12	1	5	2024	27	5	2024	
Informe de Supervisión No. 13	28	5	2024	31	12	2024	
Informe de Supervisión No. 14	1	1	2025	1	10	2025	
Informe de Supervisión No. 15	2	10	2025	1	11	2025	

OBSERVACIONES





















Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		

Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.


Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 13/Feb/2026**

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Alcalde Municipal
NOMBRE:	REINALDO TORRES

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARIO ALEXANDER QUINTERO
FECHA 03-06-2026

INFORME MESUAL DE INTERVENTORIA No. 5 DESDE 14 DE OCTUBRE DE 2025 A 5 DE NOVIEMBRE DE 2025

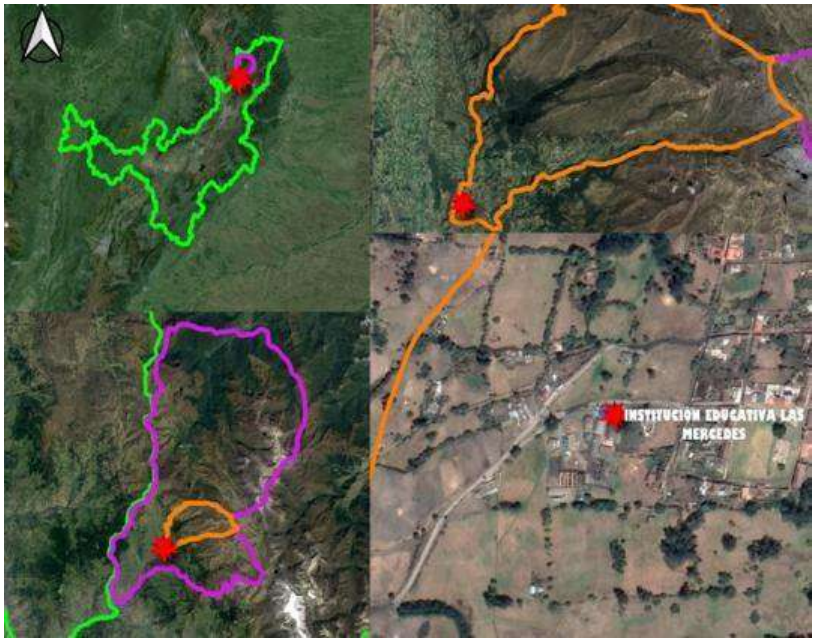

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOA LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS"

Contrato de obra No. CH-LP-OP-04-2023 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-IN-004-2023

CONSORCIO INTERCHISCAS 2023

NIT. 901749603-5

R.L. HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA 1.049.626.217

DE TUNJA (BOYACA)

NOVIEMBRE, año 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN 5
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 7
GARANTÍAS DEL CONTRATO 8
GARANTÍAS DE INTERVENTORÍA 9
DATOS GENERALES DE INTERVENTORÍA 10
GESTIÓN SOCIAL 11
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA ZONA DE IMPACTO 11
ASPECTOS FINANCIEROS DE CONTRATO DE OBRA 12
ASPECTOS FINANCIEROS DE INTERVENTORÍA 12
PLANILLAS DE PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA 13
PLANILLAS DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 13
CORRESPONDENCIA 13
ENVIADA 13
RECIBIDA 13
COMITES 13
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES 14
REGISTRO FOTOGRÁFICO 27
CONCLUCIONES 28
BITACORA 28

INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría tiene como objetivo evaluar el avance del proyecto que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS". Hasta el 5 de noviembre de 2025 se ha alcanzado un porcentaje de avance de 73,74%.

Este informe detalla el avance técnico en la construcción, incluyendo las actividades realizadas, los materiales utilizados y las metodologías implementadas. Asimismo, se abordarán las dificultades encontradas durante este primer mes de ejecución y se ofrecerán recomendaciones para optimizar el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.


A través de un seguimiento y una supervisión constante, se busca asegurar que la obra se ejecute dentro de los plazos establecidos y cumpla con los estándares de calidad requeridos. Este informe servirá como herramienta fundamental para la gestión y toma de decisiones, contribuyendo al éxito del proyecto y al bienestar de la comunidad educativa de dicha institución.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Que el municipio de Chiscas, en el Centro Poblado Las Mercedes cuenta con una Institución Educativa, en el cual desde hace seis años se vine adelantando un contrato de construcción de la infraestructura del colegio en pro de actualizar y generar espacios dignos para la educación de los niños niñas y jóvenes de la comunidad Chiscana, proceso que bien entorpecido por varios inconvenientes de carácter legal y técnico, viene en ejecución la construcción que en compañía de la administración municipal se ha venido fortaleciendo para poder culminar las obras, el inconveniente principal que se presentó en dicho contrato es que no se contemplaron alguna obras que son muy importantes para el buen funcionamiento de la Institución, estructuras que se proyectaron como complementarias al proceso constructivo que se viene realizando pero que no se lograron viabilizar entre el mismo proceso. La administración municipal en pro de llevar bienestar y cumplir con su comunidad para brindar bienestar al desarrollo de la comunidad educativa y el futuro de nuestro municipio adelanto ante la Gobernación de Boyacá, la gestión de recurso y viabilización de propuesto de las obras completarías que se deben desarrollar en la institución educativa las mercedes como lo es generar espacios más seguros mediante le construcción del cerramiento perimetral y las circulaciones para evitar accidentes, implementar los espacios deportivos teniendo en cuenta que en la institución no contaba con escenario deportivo para brindar las clases de deportes, en conjunto de la construcción de un cáncamo para la evacuación de aguas lluvias. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el municipio formulo el proyecto y presento el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL
MUNICIPIO DE CHISCAS, a el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el cual fue aprobado y como consecuencia de lo anterior entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el Municipio de Chiscas, celebraron el Convenio Interadministrativo No. 2941 de 2023, entre el Municipio de Chiscas - Boyacá y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cuyo objeto es: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

LOCALIZACIÓN

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS”. Se desarrolla en el centro poblado de Las Mercedes con coordenadas 5.5070° N y 73.1276° W, esta ubicación en la vereda Las Mercedes permite facilitar el acceso a la infraestructura educativa, beneficiando directamente a la comunidad local al mejorar la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes.

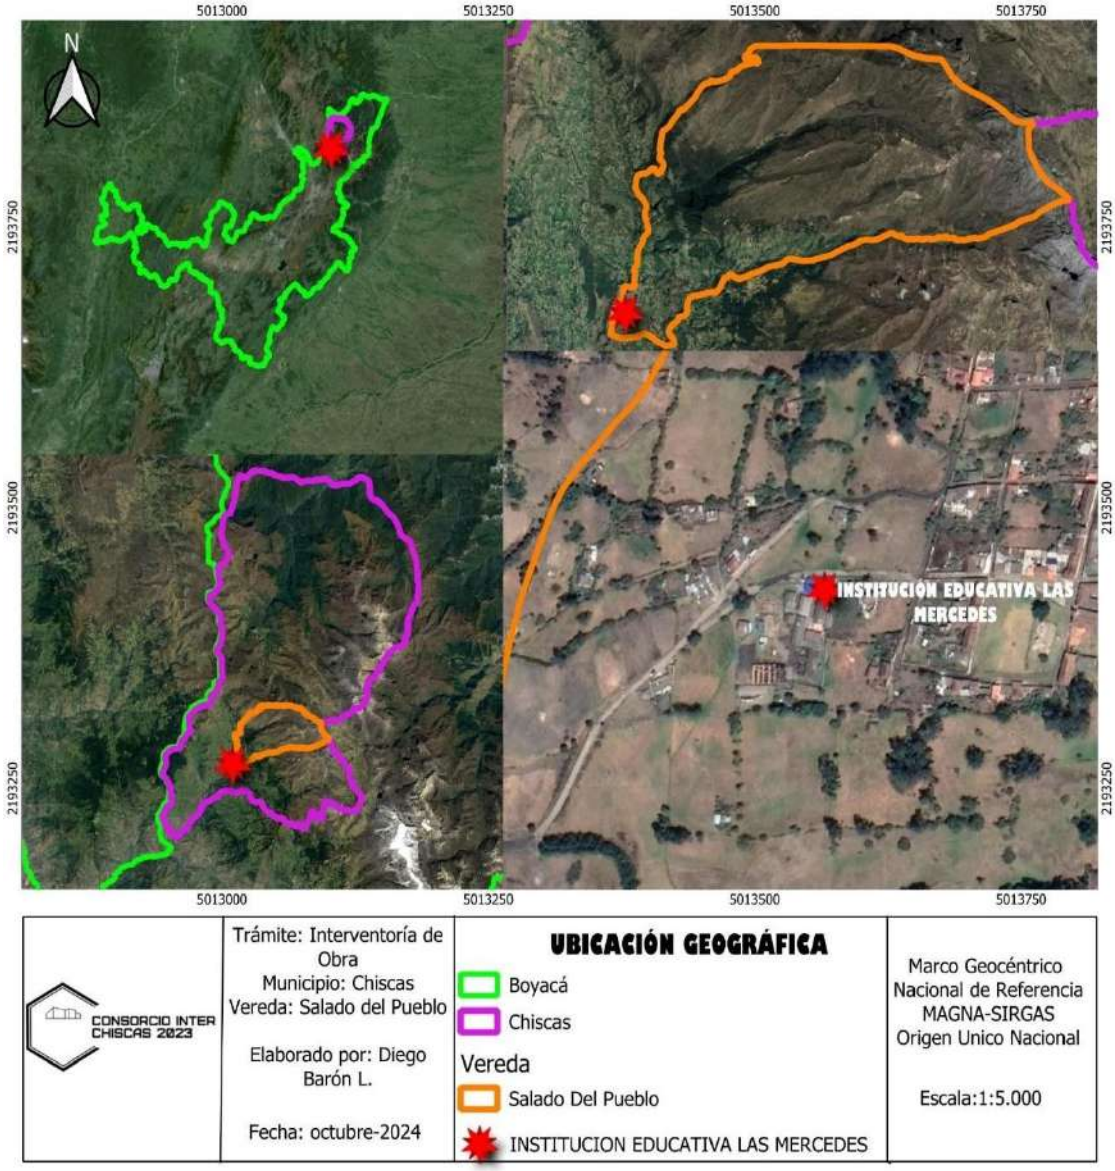

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de obras complementarias en la Institución Educativa Las Mercedes, ubicada en el municipio de Chiscas, Boyacá, Colombia. Con una inversión total de *$1.165.696.240,73*, se busca mejorar la infraestructura educativa y promover un entorno seguro y accesible para los estudiantes.

Las actividades a realizar incluyen la construcción de andenes de conexión, rampas para garantizar la accesibilidad, escaleras que faciliten la circulación interna, una cancha múltiple para actividades deportivas, un encerramiento que delimite el perímetro de la institución, y un cárcamo para el adecuado drenaje de aguas pluviales en la cancha. Estas intervenciones están alineadas con los lineamientos técnicos y legales pertinentes.

El proyecto no solo se enfocará en la mejora física del entorno escolar, sino que también busca fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo la actividad física y la inclusión. Al finalizar las obras, se espera que la comunidad educativa de Chiscas cuente con un espacio más seguro, funcional y propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal de los alumnos.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CH-LP-OP-04-2023
CDP	202200397
REGISTRO NO.	2023112906
CONTRATANTE	Municipio de Chiscas Nit: 800074859-9 R/L Reinaldo Torres
CONTRATISTA	Consorcio Chiscas 2023 NIT: 901764349-1 R/L Juan Camilo Córdoba Álvarez C.C. 1.049.641.415 de Tunja (Boyacá).
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. ($ 1.154.431.389,00)
VALOR ADICIONAL	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($11.264.851,73)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($1.165.696.240,73)
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) Meses
ADICIÓN DE TIEMPO	DIECINUEVE DÍAS (19) CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023 25 DÍAS CALENDARIO
FECHA PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	QUINCE (15) DE ENERO DE 2024 CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO. 1	CUATRO (04) DE MARZO DE 2024
FECHA SUSPENSIÓN NO. 2	06 DE MAYO DE 2024 514 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO NO. 2	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA OTROSÍ NO. 1	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 3	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN	7 DE NOVIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73,74

GARANTÍAS DEL CONTRATO

No. PÓLIZA B-100043238	PÓLIZA DE SEGUROS EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	NO. ANEXO 1	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
AMPARO	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/05/2024	07/05/2026	$ 116.569.624,07
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/05/2024	07/05/2026	$ 346.329.416,70
DEVOLUCION DEL PAGO DEL ANTICIPO	0	0	0
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/05/2024	07/05/2026	$ 116.569.624,07
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	07//11/2025	07/11/2030	$ 233.139.248,15

No. PÓLIZA B-100011306	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO. ANEXO 1	PÓLIZA RCE
AMPARO	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
BASICO – PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES (PLO)	29/11/2023	07/11/2025	$ 427.050.000,00
PATRONAL	29/11/2023	07/11/2025	$ 128.115.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	07/11/2025	$ 128.115.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/11/2023	07/11/2025	$ 128.115.000,00

GARANTÍAS DE INTERVENTORÍA

No. Póliza COQ-100001674		No. Anexo 1	Póliza de interventoría
ASEGURADORA	SEGUROS LA MUNDIAL		
AMPARO	DESDE	HASTA	V/R ASEGURA DO
Cumplimiento	04/03/2024	04/06/2024	$ 8.119.615,60
Prestaciones sociales	04/03/2024	31/12/2026	$ 12.179.423,40
Calidad de servicio	30/04/2024	31/12/2026	$ 8.119.615,60
Calidad de los elementos	30/04/2024	31/12/2026	$ 8.119.615,60

DATOS GENERALES DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHISCAS
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023 R/L: HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA
NIT	901769190-0
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOA LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS"
VALOR	NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 98.130.839,00) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) Meses
ADICIÓN DE TIEMPO	DIECINUEVE DÍAS (19) CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023 25 DÍAS CALENDARIO

GESTIÓN SOCIAL

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA ZONA DE IMPACTO

Mano de obra	
MAESTRO GENERAL	RAMIRO CUADROS
AUXILIAR	BLANCO DAVID

ASPECTOS FINANCIEROS DE CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($1.154.431.389,00).
VALOR ADICIONAL	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($11.264.851,73)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($1.165.696.240,73)
VALOR DEL ANTICIPO (33.3%)	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($346.329.416,30).

ASPECTOS FINANCIEROS DE INTERVENTORÍA

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 75.444.991,00
VALOR DEL ANTICIPO	0%
AMORTIZACIONES DEL ANTICIPO	0%
SUMATORIAS ACTAS PARCIALES EJECUTADAS	0

PLANILLAS DE PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA

Equipo profesional en obra

No.

Persona afiliada	Ingreso	Retiro	Anexo
JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ	01/01/2024	N/A	4

PLANILLAS DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

No.

Persona afiliada	Ingreso	Retiro	Anexo
HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA	01/01/2024	N/A	4

CORRESPONDENCIA

ENVIADA

No se recibió correspondencia

RECIBIDA

No se recibió correspondencia

COMITES

FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES	TEMAS TRATADOS
14/10/2025	7:00 A.M.	Colegio las mercedes	Representantes Legales Contratistas de Obra e interventoría – Secretario de Planeación Municipal	Reinicio de obras

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA PARCIAL 1		MODIFICATIRIO No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		SALDOS	
No.	ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	FID	V. UNIT	VR. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1. ANDENES DE CONEXIÓN							$ 55.436.968,00		$ 22.862.848,00		$ 42.030.716,51		$ 18.895.365,18		$ 272.503,33
1,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	144,56		$ 6.184,00	$ 893.959,00	114,30	$ 706.831,00	205,72	$ 1.272.172,48	90,22	$ 557.920,48	1,20	$ 7.421,00
1,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro)	m3	72,95		$ 51.757,00	$ 3.775.673,00	40,00	$ 2.070.280,00	75,11	$ 3.887.468,27	34,98	$ 1.810.459,86	0,13	$ 6.728,41
1,03	1.18.05	Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500Psi).	m2	123,23	23%	$ 67.996,00	$ 10.306.351,00	114,30	$ 9.559.490,00	182,89	$ 15.296.019,78	67,37	$ 5.634.495,34	1,22	$ 102.034,44
1,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi)	m2	144,56	23%	$ 34.439,00	$ 6.123.557,00	114,30	$ 4.841.745,00	205,75	$ 8.715.563,83	90,89	$ 3.850.097,67	0,56	$ 23.721,16
1,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	m3	46,90	23%	$ 90.459,00	$ 5.218.308,00	22,87	$ 2.544.621,00	37,88	$ 4.214.701,91	14,79	$ 1.645.602,99	0,22	$ 24.477,92
1,06	3.13.15	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	kg	2835,00	23%	$ 7.202,00	$ 25.113.734,00	354,45	$ 3.139.881,00	566,62	$ 5.019.380,61	208,50	$ 1.846.988,91	3,67	$ 32.510,70
1,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa.	kg	477,83	23%	$ 6.815,00	$ 4.005.386,00	0,000	$ 0,00	432,5	$ 3.625.409,63	423,480	$ 3.549.799,93	9,020	$ 75.609,70
2. ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B							$ 11.844.721,00		$ 8.407.594,00		$ 25.548.407,03		$ 16.918.591,00		$ 222.222,03
2,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	49,80		$ 6.184,00	$ 307.963,00	45,91	$ 283.907,00	125,11	$ 773.680,24	78,12	$ 483.094,08	1,08	$ 6.679,16
2,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro)	m3	29,88		$ 51.757,00	$ 1.546.499,00	16,08	$ 832.253,00	44,68	$ 2.312.502176	28,22	$ 1.460.582,54	0,38	$ 19.667,22
2,03	1.18.05	Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500 Psi).	m2	41,50	23%	$ 67.996,00	$ 3.470.856,00	38,90	$ 3.253.405,00	107,24	$ 8.969.025,98	67,26	$ 5.625.295,48	1,08	$ 90.325,50
2,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi)	m2	49,80	23%	$ 34.439,00	$ 2.109.527,00	45,91	$ 1.944.746,00	125,11	$ 5.299.655,85	78,12	$ 3.309.160,86	1,08	$ 45.748,99
2,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	m3	19,71	23%	$ 90.459,00	$ 2.193.025,00	9,18	$ 1.021.409,00	21,45	$ 2.386.625,03	12,05	$ 1.340.738,07	0,22	$ 24.477,96
2,06	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	kg	124,21	23%	$ 7.202,00	$ 1.100.309,00	121,00	$ 1.071.874,00	334,71	$ 2.965.015,15	210,47	$ 1.864.440,08	3,24	$ 28.701,07
2,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-	kg	133,20	23%	$ 6.815,00	$ 1.116.542,00	0,00	$ 0,00	339,03	$ 2.841.902,02	338,24	$ 2.835.279,89	0,790	$ 6.622,13

		420Mpa.													
3. ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE							**$ 45.316.205,00**		**$ 32.698.465,00**		**$ 58.981.237,12**		**$ 25.987.292,96**		**$ 295.479,16**
3,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	168,11		$ 6.184,00	$ 1.039.592,00	153,72	$ 950.604,00	287,35	$ 1.776.972,40	132,93	$ 822.039,12	0,70	$ 4.329,28
3,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	75,84		$ 51.757,00	$ 3.925.251,00	49,97	$ 2.586.297,00	92,62	$ 4.793.733,34	42,17	$ 2.182.592,69	0,48	$ 24.843,65
3,03	1.18.05	Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi).	*m2*	151,02	23%	$ 67.996,00	$ 12.630.570,00	142,76	$ 11.939.744,00	249,65	$ 20.879.497,72	105,53	$ 8.826.009,99	1,36	$ 113.743,73
3,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi)	*m2*	173,14	23%	$ 34.439,00	$ 7.334.205,00	142,76	$ 6.047.309,00	252,39	$ 10.691.232,83	108,27	$ 4.586.313,95	1,36	$ 57.609,88
3,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	64,92	23%	$ 90.459,00	$ 7.223.296,00	49,97	$ 5.559.891,00	78,42	$ 8.725.367,58	27,97	$ 3.112.070,02	0,48	$ 53.406,56
3,06	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	*kg*	1054,88	23%	$ 7.202,00	$ 9.344.612,00	501,11	$ 4.439.063,00	842,92	$ 7.466.973,10	337,12	$ 2.986.364,04	4,69	$ 41.546,06
3,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa.	*kg*	313,65	23%	$ 6.815,00	$ 2.629.155,00	0,00	$ 0,00	52,58	$ 440.749,22	52,58	$ 440.749,22	0,00	$ 0,00
3,08	1.01.14	Demolición anden/contrapiso concreto espesor de 7,6-12cm.	*m2*	76,65	23%	$ 12.617,00	$ 1.189.524,00	75,75	$ 1.175.557,00	271,07	$ 4.206.710,93	195,32	$ 3.031.153,93	0,00	$ 0,00
4. RAMPAS							**$ 197.019.679,00**		**$ 7.338.678,00**		**$ 46.490.878,88**		**$ 7.797.990,76**		**$ 31.354.210,12**
4,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	142,55		$ 6.184,00	$ 881.529,00	36,86	$ 227.942,00	55,04	$ 340.367,36	18,18	$ 112.425,36	0,00	$ 0,00
4,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	67,43		$ 51.757,00	$ 3.489.975,00	12,89	$ 667.148,00	69,26	$ 3.584.689,82	55,37	$ 2.865.785,09	1,00	$ 51.756,73
4,03	1.18.04	Concreto estriado rampas 17,5Mpa - (2500psi)	*m2*	95,03	23%	$ 67.996,00	$ 7.947.842,00	36,86	$ 3.082.789,00	54,88	$ 4.589.893,19	18,02	$ 1.507.104,19	0,00	$ 0,00
4,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m, 14Mpa (2000psi)	*m2*	95,03	23%	$ 34.439,00	$ 4.025.468,00	36,86	$ 1.561.388,00	54,88	$ 2.324.715,15	18,02	$ 763.327,15	0,00	$ 0,00
4,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	56,68	23%	$ 90.459,00	$ 6.306.476,00	7,37	$ 820.020,00	10,97	$ 1.220.572,33	3,60	$ 400.552,33	0,00	$ 0,00
4,06	3.10.07	Suministro e instalación de barandas en tubería metálica agua negra D=2", C=0.80 Soldado, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura.	*ml*	273,72	23%	$ 458.932,00	$ 154.511.206,00	0,00	$ 0,00	54,80	$ 30.933.852,53	0,00	$ 0,00	54,80	$ 30.933.852,53
4,07	3.08.08	Bordillo fundido en sitio 8x15cm	*m2*	135,76	23%	$ 24.488,00	$ 4.089.124,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,08	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye	*kg*	1780,00	23%	$ 7.202,00	$ 15.768.059,00	110,56	$ 979.391,00	394,74	$ 3.496.788,50	242,57	$ 2.148.796,64	41,61	$ 368.600,86

		suministro, fijación e instalación).													
5. ESCALERA MACIZA						**$ 15.938.056,00**		**$ 6.637.023,00**		**$ 8.671.688,81**		**$ 1.839.024,84**		**$ 195.640,97**	
5,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	8,31		$ 6.184,00	$ 51.389,00	**3,57**	$ 22.077,00	**14,58**	$ 90.162,72	**11,01**	$ 68.085,72	**0,00**	$ 0,00
5,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	15,25		$ 51.757,00	$ 789.294,00	**6,43**	$ 332.798,00	**12,41**	$ 642.304,37	**2,20**	$ 113.865,40	**3,78**	$ 195.640,97
5,03	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	4,98	23%	$ 90.459,00	$ 554.098,00	**1,94**	$ 215.853,00	**2,90**	$ 322.667,25	**0,96**	$ 106.814,25	**0,00**	$ 0,00
5,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m, 14Mpa (2000psi)	*m2*	8,31	23%	$ 34.439,00	$ 352.011,00	**0,00**	$ 0,00	**0,00**	$ 0,00	**0,00**	$ 0,00	**0,00**	$ 0,00
5,05	1.03.06	Escalera maciza 21Mpa-3000psi.	*m3*	5,10	23%	$ 1.518.523,00	$ 9.525.695,00	**2,17**	$ 4.053.090,00	**3,00**	$ 5.603.349,87	**0,83**	$ 1.550.259,87	**0,00**	$ 0,00
5,06	1.02.28	Concreto ciclópeo 17.5Mpa - 2500psi, relación 60C/40P	*m3*	3,78	23%	$ 495.057,00	$ 2.301.718,00	**1,68**	$ 1.022.986,00	**1,68**	$ 1.022.985,78	**0,00**	-$ 0,22	**0,00**	$ 0,00
5,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa.	*kg*	282,00	23%	$ 6.815,00	$ 2.363.851,00	**118,13**	$ 990.219,00	**118,13**	$ 990.218,82	**0,00**	-$ 0,18	**0,00**	$ 0,00
6. CERRAMIENTO						**$ 172.676.862,00**		**$ 32.596.924,00**		**$ 125.102.974,33**		**$ 74.735.558,85**		**$ 17.770.491,48**	
6,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	45,43		$ 6.184,00	$ 280.939,00	**29,05**	$ 179.645,00	**37,19**	$ 229.982,96	**8,12**	$ 50.214,08	**0,02**	$ 123,88
6,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	26,08		$ 51.757,00	$ 1.349.823,00	**11,58**	$ 599.346,00	**26,10**	$ 1.350.857,70	**14,00**	$ 724.598,00	**0,52**	$ 26.913,70
6,03	1.02.08	Concreto ciclópeo 17.5Mpa - 2500psi, relación 60C/40P	*m3*	0,95	23%	$ 495.057,00	$ 578.474,00	**0,84**	$ 511.493,00	**26,62**	$ 16.209.453,33	**25,34**	$ 15.430.035,59	**0,44**	$ 267.924,74
6,04	1.02.13	Concreto viga de amarre 21Mpa, sección rectangular.	*m3*	11,63	23%	$ 829.394,00	$ 11.864.398,00	**10,00**	$ 10.201.546,00	**12,76**	$ 13.017.172,95	**2,76**	$ 2.815.626,95	**0,00**	$ 0,00
6,05	1.03.01	Columnas en concreto de 21MPa (3000psi), Altura menor a tres metros - formaleta de madera	*m3*	1,15	23%	$ 1.197.890,00	$ 1.694.415,00	**0,99**	$ 1.458.671,00	**1,20**	$ 1.768.08 23 5,64	**0,21**	$ 309.414,64	**0,00**	$ 0,00
6,06	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420Mpa.	*kg*	1543,30	23%	$ 6.815,00	$ 12.936.635,00	**1504,04**	$ 12.607.540,00	**1748,79**	$ 14.659.144,74	**244,75**	$ 2.051.604,74	**0,00**	$ 0,00
6,07	1.04.30	Muro tolete común E=0,10m.	*m2*	99,96	23%	$ 80.361,00	$ 9.880.449,00	**71,21**	$ 7.038.683,00	**87,60**	$ 8.658.737,03	**16,39**	$ 1.620.054,03	**0,00**	$ 0,00
6,08	1.20.09	Cerramiento malla eslabonada C=10, incluye ángulo	*m2*	399,84	23%	$ 247.636,00	$ 121.788.177,00	**0,00**	$ 0,00	**166,63**	$ 50.754.211,62	**149,65**	$ 45.582.234,70	**16,98**	$ 5.171.976,92
6,09	APU	Suministro e instalación puerta de acceso peatonal.	*un*	2,00	23%	$ 5.001.444,00	$ 12.303.552,00	**0,00**	$ 0,00	**3,00**	$ 18.455.328,36	**1,00**	$ 6.151.776,12	**2,00**	$ 12.303.552,24
7. CANCHA MÚLTIPLE						**$ 351.796.416,00**		**$ 267.667.154,00**		**$ 468.153.549,15**		**$ 60.016.511,50**		**$ 140.469.883,65**	
7,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	540,00		$ 6.184,00	$ 3.339.360,00	**532,90**	$ 3.295.454,00	**629,60**	$ 3.893.446,40	**96,70**	$ 597.992,40	**0,00**	$ 0,00
7,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	222,48		$ 51.757,00	$ 11.514.897,00	**130,59**	$ 6.758.947,00	**224,47**	$ 11.617.893,79	**93,88**	$ 4.858.946,79	**0,00**	$ 0,00

7,03	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	166,86	23%	$ 90.459,00	$ 18.565.606,00	163,17	$ 18.155.040,00	206,00	$ 22.920.501,42	42,83	$ 4.765.461,42	0,00	$ 0,00
7,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI)	*m2*	556,20	23%	$ 34.439,00	$ 23.560.615,00	542,42	$ 22.976.895,00	629,60	$ 26.669.837,11	87,18	$ 3.692.942,11	0,00	$ 0,00
7,05	1.03.19	Placa maciza 21 Mpa - 3000psi, E=0,10m	*m2*	540,00	23%	$ 285.074,00	$ 189.346.151,00	531,18	$ 186.253.497,00	588,56	$ 206.373.278,73	57,38	$ 20.119.781,73	0,00	$ 0,00
7,06	1.19.07	Demarcación con pintura tipo trafico E=,08m	*ml*	376,07	23%	$ 7.273,00	$ 3.364.243,00	0,00	$ 0,00	411,23	$ 3.678.777,22	0,00	$ 0,00	411,23	$ 3.678.777,22
7,07	1.19.03	Cancha múltiple tubo agua negra 3" y 2" incluye tablero acrílico B 10mm con rodachines y cilindro para movilizar.	*JG*	1,00	23%	$ 4.845.388,00	$ 5.959.827,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.959.827,24	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.959.827,24
7,08	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	*kg*	3262,98	23%	$ 7.202,00	$ 28.904.978,00	3189,88	$ 28.257.424,00	4119,17	$ 36.489.502,68	929,29	$ 8.232.078,68	0,00	$ 0,00
7,09	1.02.13	Concreto viga de amarre 21,1 Mpa, sección rectangular.	*m3*	6,50	23%	$ 829.394,00	$ 6.631.005,00	1,23	$ 1.254.790,00	12,32	$ 12.568.304,92	11,09	$ 11.313.514,92	0,00	$ 0,00
7,10	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa.	*kg*	98,02	23%	$ 6.815,00	$ 821.648,00	85,31	$ 715.107,00	853,08	$ 7.150.900,45	767,77	$ 6.435.793,45	0,00	$ 0,00
7,11	APU	Suministro e instalación malla contra impacto H= 5,0m	*un*	40,00	23%	$ 1.215.205,00	$ 59.788.086,00	0,00	$ 0,00	87,53	$ 130.831.279,19	0,00	$ 0,00	87,53	$ 130.831.279,19
8. PRADIZACIÓN (PASTO)						**$ 14.935.316,00**		**$ 4.266.231,00**		**$ 6.592.222,91**		**$ 1.114.537,74**		**$ 1.211.454,17**	
8,01	1.18.11	Pradización - pasto.	*m2*	468,48	23%	$ 25.919,00	$ 14.935.316,00	133,82	$ 4.266.231,00	206,78	$ 6.592.222,91	34,96	$ 1.114.537,74	38,00	$ 1.211.454,17
9. CARCAMO CANCHA MÚLTIPLE						**$ 23.059.923,00**		**$ 759.245,00**		**$ 12.338.257,36**		**$ 5.366.575,90**		**$ 6.212.436,46**	
9,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	31,68		$ 6.184,00	$ 195.909,00	22,33	$ 138.089,00	29,85	$ 184.592,40	7,52	$ 46.503,40	0,00	$ 0,00
9,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	11,09		$ 51.757,00	$ 573.985,00	0,58	$ 30.019,00	15,57	$ 805.856,49	11,94	$ 617.978,58	3,05	$ 157.858,91
9,03	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI)	*m2*	31,68	23%	$ 34.439,00	$ 1.341.964,00	0,00	$ 0,00	79,85	$ 3.382.443,60	63,91	$ 2.707.225,68	15,94	$ 675.217,92
9,04	2.05.02	Base y cañuela en concreto 17,5 Mpa - (2500 PSI)	*m3*	7,92	23%	$ 758.585,00	$ 7.389.832,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,05	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa.	*kg*	808,59	23%	$ 6.815,00	$ 6.777.965,00	0,00	$ 0,00	668,16	$ 5.600.817,79	96,94	$ 812.594,70	571,22	$ 4.788.223,09
9,06	APU	Suministro e instalación de rejilla en concreto 2500 PSI prefabricada.	*un*	79,20	23%	$ 63.533,00	$ 6.189.131,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,07	1.02.05	Cajas de inspección 80x80x80cm - ladrillo.	*un*	1,00	23%	$ 480.599,00	$ 591.137,00	1,00	$ 591.137,00	4,00	$ 2.364.547,08	2,00	$ 1.182.273,54	1,00	$ 591.136,54
10. ITEMS COMPLEMENTARIOS - NO PREVISTOS						**$ -**				**$ 102.779.483,84**		**$ 65.352.227,71**		**$ 37.427.256,13**	

IC-NP-10.01	COT.1	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 13	*m3*		23%	$ 282.000,00				41,20	$ 14.290.632,00	40,20	$ 13.943.772,00	1,00	$ 346.860,00
IC-NP-10.02	COT 2	Suministro e instalación de cárcamo prefabricado c45 (45*40*100, incl. Rejillas y excavación)	*ml*		23%	$ 324.088,58				48,20	$ 19.213.915,56	48,20	$ 19.213.915,56	0,00	$ 0,00
IC-NP-10.03	5,01,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	*ml*		23%	$ 73.154,27				55,70	$ 5.011.872,19	33,70	$ 3.032.317,65	22,00	$ 1.979.554,54
IC-NP-10.04	5,01,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	*ml*		23%	$ 41.023,96				16,00	$ 807.351,53	16,00	$ 807.351,53	0,00	$ 0,00
IC-NP-10.05	REF 1	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	*m3*		0%	$ 126.395,06				10,01	$ 1.265.214,55	6,67	$ 843.055,05	3,34	$ 422.159,50
IC-NP-10.06	2,02,24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	*m3*			$ 27.765,74				15,05	$ 417.874,39	9,15	$ 254.056,52	5,90	$ 163.817,87
IC-NP-10.07	REF 2	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H: 35CM, E:20 CM	*m3*		23%	$ 946.089,01				15,85	$ 18.444.478,29	15,70	$ 18.269.924,87	0,15	$ 174.553,42
IC-NP-10.08	COT. 3	Sumidero sencillo en ladrillo (0,6m x 0.40m)	*un*		23%	$ 725.626,34				3,00	$ 2.677.561,19	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.677.561,19
IC-NP-10.09	COT. 4	Sumidero transversal (Fundido en sitio, concreto hecho en obra, Inc. Suministro, Form, Ref y Const, Inc. Reja)	*un*		23%	$ 6.741.833,93				1,00	$ 8.292.455,73	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.292.455,73
IC-NP-10.10	3,01,08	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	*km*		0%	$ 4.049.000,34				0,02	$ 80.980,01	0,02	$ 80.980,01	0,00	$ 0,00
IC-NP-10.11	3,02,07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	*m3*		0%	$ 26.955,15				22,68	$ 611.342,80	0,00	$ 0,00	22,68	$ 611.342,80
IC-NP-10.12	3,04,07	SUMINISTRO,EXTENDIDAYCOMPACTACIÓNDEMATERIALSELECCIÓNADOPARASUBBASE GRANULAR(INCLUYEACARREOLIBREHASTA5KM) (**)	*m3*		0%	$ 140.355,91				23,71	$ 3.327.838,63	6,74	$ 945.998,83	16,97	$ 2.381.839,80

IC-NP-10.13	3,05,11	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	*m3*		23%	$ 855.295,71				7,97	$ 8.384.549,37	0,00	$ 0,00	7,97	$ 8.384.549,37
IC-NP-10.14	3,03,21	SUMINISTROEINSTALACIÓNDECONCRETOCICLOPEODE21MPA(3000PSI),60%RAJONPARAPLACAHUELLASINCLUYESELLODEJUNTAS	*m3*		23%	$ 602.894,77				10,15	$ 7.526.839,76	4,08	$ 3.025.567,11	6,07	$ 4.501.272,65
IC-NP-10.15	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	*m3-km*		0%	$ 2.765,10				1033,75	$ 2.858.422,13	294,30	$ 813.768,93	739,45	$ 2.044.653,20
IC-NP-10.16	REF. 3	Bordillo Fundido En Sitio15 X 25 cm	*ml*		23%	$ 55.367,23				84,30	$ 5.740.972,71	35,50	$ 2.417.610,10	48,80	$ 3.323.362,61
IC-NP-10.17	4,01,08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	*m3*		0%	$ 139.077,47				10,38	$ 1.443.624,14	0,00	$ 0,00	10,38	$ 1.443.624,14
IC-NP-10.18	3,03,05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	*m3*		23%	$ 778.254,11				2,49	$ 2.383.558,86	1,78	$ 1.703.909,55	0,71	$ 679.649,31
COSTOS DIRECTOS OBRA CONTRACTUAL						**$ 888.024.146,00**		**$ 383.234.162,00**		**$ 896.689.415,94**		**$ 278.023.676,44**		**$ 235.431.577,50**	
		ADMINISTRACIÓN			22%	$ 195.365.312,00		$ 84.311.516,00		$ 197.271.671,51		$ 61.165.208,82		$ 51.794.946,69	
		IMPREVISTOS			3%	$ 26.640.724,00		$ 11.497.025,00		$ 26.900.682,48		$ 8.340.710,29		$ 7.062.947,19	
		UTILIDAD			5%	$ 44.401.207,00		$ 19.161.708,00		$ 44.834.470,80		$ 13.901.183,82		$ 11.771.578,98	
		TOTAL PRESUPUESTO				**$ 1.154.431.389,00**		**$ 498.204.411,00**		**$ 1.165.696.240,73**		**$ 361.430.779,37**		**$ 306.061.050,36**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. ANDENES DE CONEXIÓN
   
1.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 90,22 M2
 
1.02 Excavación manual en material común (incluye retiro) = 34.98 M3




1.03 Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500Psi). = 67.37 M2




1.04 Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi) = 90.89 M2




1.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 14.79 M3




1.06 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 208.50 KG




1.07 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa. = 423.48 KG

2. ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B




2.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 78.12 M2




2.02 Excavación manual en material común (incluye retiro) = 28.22 M3





2.03 Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500 Psi). = 67.26 M2




2.04 Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi) = 78.12 M2





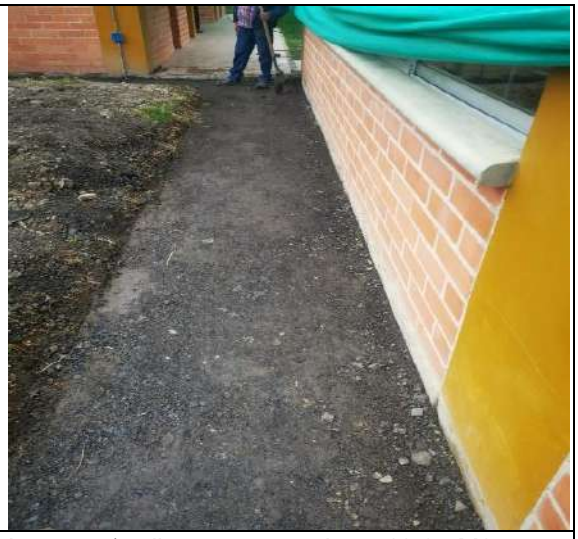

2.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 12.05 M3




2.06 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 210.47 KG







2.07 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa. = 338.24 KG

3. ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE




3.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 132.93 M2




3.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 42.17 M3




3.03 Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi). = 105.53 M2




3.04 Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi) = 108.27 M2




3.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 27.97 M3






3.06 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 337.12 KG




3.07 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa. = 52.58 KG






3.08 Demolición anden/contrapiso concreto espesor de 7,6-12cm. = 195.32 M2

4. RAMPAS




4.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 18.18 M2




4.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 55.37 M3




4.03 Concreto estriado rampas 17,5Mpa - (2500psi) = 18.02 M2




4.04 Solado en concreto E=0,05m, 14Mpa (2000psi) = 18.02 M2




4.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 3.60 M3




4.08 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 242.57 KG

5. ESCALERA MACIZA




5.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 11.01 M2




5.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 2.20 M3




5.03 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 0.96 M3




5.05 Escalera maciza 21Mpa-3000psi. = 0.83 M3

6. CERRAMIENTO






6.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 8.12 M2






6.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 14.00M3







6.03 Concreto ciclópeo 17.5Mpa - 2500psi, relación 60C/40P = 25.34 M3






6.04 Concreto viga de amarre 21Mpa, sección rectangular. = 2.76 M3






6.05 Columnas en concreto de 21MPa (3000psi), Altura menor a tres metros - formaleta de madera = 0.21 M3







6.06 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420Mpa. = 244.75 KG






6.07 Muro tolete común E=0,10m. = 16.39 M2

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.08 Cerramiento malla eslabonada C=10, incluye ángulo = 149.65 M2</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.09 Suministro e instalación puerta de acceso peatonal. = 1 UND</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. CANCHA MÚLTIPLE</td></tr>
</table>




7.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 96.70 M2




7.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 93.88 M3




7.03 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 42.83 M3




7.04 Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI) = 87.18 M2






7.05 Placa maciza 21 Mpa - 3000psi, E=0,10m = 57.38 M2





7.08 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 929.29 KG







7.09 Concreto viga de amarre 21,1 Mpa, sección rectangular. = 11.09 M3

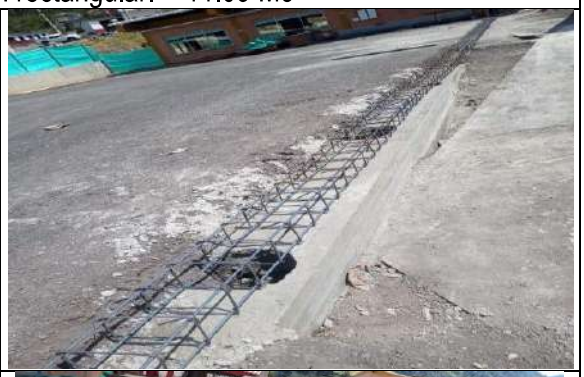

7.10 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa. = 767.77 KG

8. PRADIZACIÓN (PASTO)




8.01 Pradización - pasto. = 34.96 M2

9. CARCAMO CANCHA MÚLTIPLE




9.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 7.52 M2




9.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 11.94 M3




9,03 Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI) = 63.91 M2




9,05 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa. 96.94 KG
 
 
9.07 Cajas de inspección 80x80x80cm - ladrillo. = 2 UND
10. ITEMS COMPLEMENTARIOS - NO PREVISTOS
 




IC-NP-10.01 CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 13 = 40.20 M3






IC-NP-10.02 Suministro e instalación de cárcamo prefabricado c45 (45*40*100, incl. Rejillas y excavación) = 48.20 ML




IC-NP-10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6 = 33.70 ML




IC-NP-10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" = 16 ML




IC-NP-10.05 RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. = 6.67 M3




IC-NP-10.06 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) = 9.15 M3






IC-NP-10.07 CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H: 35CM, E:20 CM = 15.70 M3




IC-NP-10.10 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL = 0.02 KM




IC-NP-10.12 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASEGRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) = 6.74 M3




IC-NP-10.14 SUMINISTROEINSTALACIÓNDECONCRETOCICLOPEODE21MPA(3000PSI),60% RAJONPARAPLACAHUELLASINCLUYESELLODEJUNTAS = 4.08 M3




IC-NP-10.15 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.= 294.30 M3-KM

	
IC-NP-10.16 Bordillo Fundido En Sitio15 X 25 cm = 35.50 ML	
	
IC-NP-10.18 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) = 1.78 M3	

CONCLUSIONES

- Durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 2025 y el 05 de noviembre de 2025, y una vez realizado el reinicio de las actividades contractuales, se evidenció la reactivación efectiva del proyecto y la ejecución de diversas actividades constructivas contempladas dentro del alcance del contrato de obra.
- De acuerdo con la información registrada en la tabla donde se registran las actividades relacionadas durante el período, así como con el registro fotográfico presentado en el presente informe, se verificó el avance en la construcción de varios de los componentes del proyecto, destacándose principalmente la ejecución de obras relacionadas con andenes de conexión, rampas de accesibilidad, cerramiento perimetral, obras asociadas a la cancha múltiple, actividades de drenaje, así mismo como ítems no previstos como el andén perimetral.
- En relación con los andenes de conexión, andenes de conexión bloque B, y andenes de conexión colegio existente, se evidenció la ejecución de actividades de localización y replanteo, excavaciones manuales, construcción de solados en concreto, rellenos con material de afirmado y la instalación de malla electrosoldada y acero de refuerzo. Estas actividades permiten avanzar en la consolidación de las circulaciones peatonales dentro de la institución educativa, contribuyendo a mejorar la conectividad entre los diferentes bloques.

- En cuanto a las rampas de acceso, se adelantaron actividades de replanteo, excavación, construcción de solados en concreto, rellenos compactados e instalación de malla electrosoldada, las cuales forman parte fundamental de las obras de accesibilidad contempladas en el proyecto.
- De igual manera, se observan avances en la estructura del cerramiento perimetral, con la ejecución de excavaciones, fundición de elementos en concreto, instalación de acero de refuerzo y construcción de muros en mampostería, los cuales permitirán mejoran las condiciones de seguridad de la institución educativa, de igual manera la instalación del cerramiento en malla electrosoldada en la totalidad del perímetro del colegio incluida dentro del contrato de obra de la referencia.
- En lo referente a la cancha múltiple, se evidencia la ejecución de actividades preliminares y estructurales como excavaciones, rellenos, solados y fundición de placas en concreto, así como la instalación de malla electrosoldada y refuerzos estructurales, elementos necesarios para la conformación del escenario deportivo proyectado.
- Asimismo, dentro de las obras hidráulicas se registran avances en las actividades relacionadas con el cárcamo de drenaje y estructuras complementarias, las cuales buscan garantizar el adecuado manejo de aguas lluvias en el área de la cancha múltiple.
- Con base en la información técnica y financiera registrada, el proyecto presenta un avance acumulado del 73,74%, evidenciando que una parte significativa de las actividades contractuales ha sido ejecutada.
- Finalmente, se concluye que las actividades ejecutadas durante el período reportado se encuentran acordes con las cantidades verificadas en el Acta Parcial No. 2 y soportadas mediante el registro fotográfico, permitiendo evidenciar el progreso de las obras complementarias destinadas a mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Las Mercedes.

HANDER SLEYDER MURILLO VEGA

R/L CONSORCIO INTERCHISCAS 2023 CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

No CONTRATO

CH-LP-OP-04-2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS"

CONTRATISTA:
CONSORCIO ALTA MAQUINAS

INTERVENTORIA:
CONSORCIO INTERCHISCAS 2023.

FECHA INICIO

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

→Dia: 14 octubre 2025.

Hora inicio: 7:00AM
Hora final 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes

Personal administrativo: Residente de obra. Residente de interventoria.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvias intermitentes en la jornada

Actividades ejecutadas: Se realizan actividades de localización y replanteo de andenes de conexión áreas aledañas a bodega, sala de profesores y aula de reuniones.

Firma interventor

Firma contratista.

→Dia: 15-octubre-2025

Hora inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes

Personal administrativo: Residente de obra. Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso toda la jornada

Actividades ejecutadas: Se continúa con labores de localización y replanteo en andenes de conexión.

Firma interventor

Firma contratista

⇒ Día: 16-octubre-2025.

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes

Personal administrativo: Residente de obra- Residente de interventoría.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso durante toda la jornada.

Actividades ejecutadas: Se realizan excavaciones para construcción de andenes de conexión en todos los bloques. Se localiza y replantea para iniciar la construcción andenes colegio existente y Bloque D.

Firma interventor

Firma contratista.

→ Dia: 17 octubre 2025

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso durante toda la jornada

Actividades ejecutadas: Se realiza fundicion de solado de concreto en un espesor de 5 cm en los andenes de conexión del Bloque B.

Firma interventor

Firma contratista

→ Dia: 18-octubre-2025.

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 12:00 M

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso durante la jornada.

Actividades ejecutadas: Se realiza fundición de solado de concreto, en espesor de 5cm en los andenes de conexión y colegio existente.

Firma interventor ← Firma contratista.

→Dia: 20-Octubre-2025

Hora inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00 PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoría.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso durante toda la jornada.

Actividades ejecutadas: Se realiza corte, figurado y amarre de acero, instalación y amarre de parrilla de concreto para construcción de andenes de conexión en su totalidad.

Firma interventor

Firma contratista.

→ Día 21 octubre 2025

Hora inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes.

Personal administrativo: Residente de obra, residente de interventoría.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso durante toda la jornada.

Actividades ejecutadas: Se continúa con la instalación de acero y parrilla de malla electrosoldada en los andenes de conexión

Firma interventor

Firma contratista.

→ Día: 22-octubre-2025

Hora inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoría.

Equipo: Herramienta menor

Estado del clima: Lluvias durante toda la jornada

Actividades ejecutadas: Se funde concreto, construcción de andenes de conexión, andenes de conexión Bloque B, colegio existente.

Firma interventor

Firma contratista.

-> Dia: 23-Octubre-2025.

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 PM.

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvias durante toda la jornada.

Actividades ejecutadas: Se continua la construccion de andenes de conexión, andenes de conexión Bloque B, colegio existente.

Firma interventor

Firma contratista.

⇒Dia: 24-octubre-2025

Hora inicio: 7:00AM
Hora final = 5:00 PM.

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Llovras durante toda la jornada.

Actividades ejecutadas: Se continúa con la fundición de anderes de conexión, Bloque B y colegio existente.

Firma interventor

Firma contratista

→Dia: 25-octubre-2025.

Hora inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00PM.

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria

Estado del clima: Lluvias intermitentes durante la jornada.

Actividades ejecutadas: Se inician con las actividades de localización y replanteo de las rampas.

Firma interventor

Firma contratista

→ Dia: 27-octubre-2025

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra Residente de interventoria.

Equipo: Herramienta menor

Estado del clima: Lluvias durante toda la jornada.

Actividades ejecutadas: Se realizan excavaciones manuales en el area de rampas para la posterior instalación del solado.

Firma interventor

Firma contratista.

→Dia: 28-octubre-2025

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso durante la jornada

Actividades ejecutadas: Se realizan actividades de fundación en rampas, en concreto reforzado

Firma interventor

Firma contratista.

→Dia: 29-octubre-2025.

Hora inicio: 7:00AM :
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra Residente de interventoria.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvosa durante la jornada.

Actividades ejecutadas: Se realiza construcción de escalera maciza en área de colegio existente.

Firma interventor

Firma contratista

→ Día: 30-octobre-2025

Hora inicio: 7:00 AM

Hora final: 5:00 PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoría

Equipo: Herramienta menor

Estado del clima: Lluvias intermitentes

Actividades ejecutadas: Se inician actividades de excavación y fundición del concreto ciclopeo para cerramiento con gamare de acero.

Firma interventor

Firma contratista

→ Día: 31-Octubre-2025

Hora inicio: 7:00AM.

Hora final: 5:00PM.

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria.

Equipo: Herramienta menor

Estado del clima: Lluvioso.

Actividades ejecutadas: se inicia fundicion viga de amare, construcción de columas en area de cerramiento. se inician trabajos cancha múltiple. se instala malla en ella

Firma interventor

Firma contratista

→ Dia: 01-Noviembre-2025

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 12:00M.

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes de obra.

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor

Estado del clima: Soleado

Actividades ejecutadas: Se comienza la construcción de muro de cerramiento y se instala malla eslabonada en todo el perimetro. Se instala porton ingresa

Firma interventor Firma contratista

→ Dia: 03-Noviembre-2025

Hora inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial, ayudantes

Personal administrativo: Residente de obra, Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor

Estado del clima: Lluvioso.

Actividades ejecutadas: se funden placas de concreto placa maza concha, se funde viga de amarre maza concha. se construyen gaviones.

Firma interventor Firma contratista

→ Dia: 04-Noviembre-2025

Hora inicio: 7:00AM

Hora final: 5:00 PM.

Personal en obra: Maestro de obra, oficial ayudantes.

Personal administrativa: Residen de obra Residente interventoria

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso.

Actividades ejecutadas: Se instala tubería de alcantarillado relleno, etc. Se localiza área de parqueo y anden perimetral. Se empieza a fundir.

Firma interventor

Firma contratista

→Día: 05-Noviembre-2025

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 PM

Personal en obra: Maestro de obra, oficial ayudantes.

Personal administrativo: Residente de obra Residente de interventoria

Equipo: Herramienta menor.

Estado del clima: Lluvioso

Actividades ejecutadas: Se termina la fundicion del andén perimetral y se funden cunetas en concreto, incluido el bordillo.

Firma interventor

Firma contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7176106		RICARDO ALFREDO MOJICA MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	calle 19 n10 90	TUNJA-BOYACA	7420620	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	7176106 MOJICA RICARDO							X		X									25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	19947478541	9496208874	I	2025/11/07	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7176106		RICARDO ALFREDO MOJICA MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	calle 19 n10 90	TUNJA-BOYACA	7420620	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	7176106	MOJICA RICARDO		X					X		X								25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1994733052	9496207723	I	2025/10/07	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

CONSORCIO ALTAMAQUINAS	ACTA COMITÉ DE OBRA			CÓDIGO SG-SST-005
NIT.901.764.349-1	PROCESO: Construcción	VERSION No: 001	FECHA DE ELABORACIÓN NOVIEMBRE/2023	Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN	
ENTIDAD:	CONSORCIO ALTAMAQUINAS
PROYECTO No:	CH.LP-OP-04-2023
RL CONTRATISTA	JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
MUNICIPIO:	CHISCAS
DELEGADO DEL CLIENTE	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ORDEN DEL DIA Y/O PUNTOS A TRATAR
Saludo
Revisión solicitud de reinicio contratista de obra
Definición fecha reinicio de obra

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
Con el fin de dar reinicio a las actividades constructivas se realiza un comité de obra contando únicamente con la participación de los representantes legales tanto de obra como de interventoría así como con el secretario de planeación e infraestructura con el fin de dar reinicio a las actividades constructivas en el marco del contrato de la referencia, con el fin de llevar a feliz termino las actividades incluidas dentro del mismo, toda vez que las motivaciones que dieron inicio a la mencionada suspensión ya fueron superadas y se toma la decisión de firmar acta de reinicio desde la fecha del mencionado comité.

LUGAR Y FECHA:
Las Mercedes, Chiscas Boyacá, 14 de octubre de 2025.

PERSONAL QUE INTERVINO EN EL COMITÉ	FIRMA
Juan Camilo Córdoba Álvarez	
Hander Sleyder Murillo Vega	
Edicson Guillermo Duarte Rincón	

CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
NIT. 901769190-0

Chiscas, 06 de abril de 2025

Arquitecto
EDICSON GUILLERMO DUARTE RINCÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Chiscas

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CH-LP-OP-04-2023 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS".

Asunto: Revisión de pólizas y solicitud de acto administrativo de aprobación.

Respetado Arquitecto.

En calidad de interventoría del contrato de obra de la referencia, nos permitimos informar que fueron recibidas por parte del contratista las pólizas correspondientes a la modificación derivada de la aplicación del Acta de Suspensión No. 2 de fecha 06 de mayo de 2024, Acta de Reinicio No. 2 de fecha 14 de octubre de 2025 y Otrosí No. 1 de fecha 17 de octubre de 2025, procediendo esta interventoría a efectuar la respectiva revisión técnica y contractual de las mismas.

Una vez verificada la documentación presentada, se evidenció la expedición de las siguientes garantías:

1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. B-100011306
Fecha de expedición: 31 de marzo de 2026

Mediante la mencionada póliza se deja constancia de la aplicación de:

- Acta de Suspensión No. 2 – 06 de mayo de 2024
- Acta de Reinicio No. 2 – 14 de octubre de 2025
- Otrosí No. 1 – 17 de octubre de 2025

Amparos otorgados:

- Amparo básico – predios, labores y operaciones

  Límite por evento: $213.525.000,00
  Límite por vigencia: $427.050.000,00
  Suma asegurada: $427.050.000,00

- Patronal
  Límite por evento: $128.115.000,00
  Límite por vigencia: $128.115.000,00
  Suma asegurada: $128.115.000,00
- Contratistas y subcontratistas
  Límite por evento: $128.115.000,00
  Límite por vigencia: $128.115.000,00
  Suma asegurada: $128.115.000,00

- Vehículos propios y no propios
  Límite por evento: $128.115.000,00
  Límite por vigencia: $128.115.000,00

Suma asegurada: $128.115.000,00

2. Póliza de Cumplimiento ante Entidades Estatales No. B-100043238
Fecha de expedición: 31 de marzo de 2026
Vigencia general: desde el 29 de noviembre de 2023 hasta el 07 de noviembre de 2030

Mediante la mencionada póliza se deja constancia de la aplicación de:

- Acta de Suspensión No. 2 – 06 de mayo de 2024
- Acta de Reinicio No. 2 – 14 de octubre de 2025
- Otrosí No. 1 – 17 de octubre de 2025

Amparos otorgados:

- Cumplimiento
  Vigencia: 06 de mayo de 2024 al 07 de mayo de 2026
  Valor asegurado: $116.569.624,07

- Buen manejo del anticipo
  Vigencia: 06 de mayo de 2024 al 07 de mayo de 2026
  Valor asegurado: $346.329.416,70


- Prestaciones sociales
  Vigencia: 06 de mayo de 2024 al 07 de noviembre de 2028
  Valor asegurado: $116.569.624,07
- Estabilidad de la obra
  Vigencia: 06 de mayo de 2024 al 07 de noviembre de 2030
  Valor asegurado: $233.139.248,15

De acuerdo con la revisión efectuada, esta interventoría considera que las pólizas presentadas se encuentran acordes con las exigencias contractuales y cubren los riesgos derivados de la ejecución del contrato, incluyendo las modificaciones introducidas mediante los documentos anteriormente mencionados.

En virtud de lo anterior, de manera atenta se solicita al Municipio de Chiscas proceder con la expedición del acto administrativo de aprobación de las pólizas presentadas, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la continuidad de la ejecución contractual.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente.



REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCHISCAS 2023

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.19 17:15:34 -05:00

Código de Seguridad: +tGFpgnFQ6VosEEDbaB4RA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001674	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680012282	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	04/06/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023	**No. DOC. IDENTIDAD**	901769190-0
DIRECCIÓN	DG 63 8 66	**TELÉFONO**	3214801404
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800074859-9
DIRECCIÓN	CENTRO CHISCAS	**TELÉFONO**	3142705413
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800074859-9
DIRECCIÓN	CENTRO CHISCAS	**TELÉFONO**	3142705413

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGÚN OTRO SI N1 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2025, MODIFICATORIO N°1 Y PRORROGA N°2. LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMPTS-004-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/10/2025	24:00 Horas Del 03/05/2027	8.119.615,60	31.477,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 04/06/2027	12.179.423,40	20.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/06/2024	24:00 Horas Del 04/06/2026	8.119.615,60	0,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 04/06/2024	24:00 Horas Del 04/06/2026	8.119.615,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 36.538.270,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	51.477,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	51.477,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.781,00
TOTAL A PAGAR	$	61.258,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001674	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680012282	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	04/06/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100001674** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERCHISCAS 2023** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA / ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA** , expedida por la Compañía en **19/11/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **19** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	680012282

Fecha de Facturación	19/11/2025	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	COQ-100001674	
Periodo Facturado	29/11/2023	04/06/2027

Fecha Límite de Pago	19/12/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	51.477,00
IVA	9.781,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	61.258,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
DG 63 8 66	901769190
Intermediario	ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	680012282

Fecha de Facturación	19/11/2025	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	COQ-100001674	
Periodo Facturado	29/11/2023	04/06/2027

Fecha Límite de Pago	19/12/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	51.477,00
IVA	9.781,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	61.258,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
DG 63 8 66	901769190
Intermediario	ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000006800122 82(3900)000000061258(96)20251219

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990680012282(3900)000000061258(96)20251219

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.19 17:17:31 -05:00

Código de Seguridad: L+K6x+Pf3Px/q0nDq1FkgQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001674	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	680012318	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	19/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	04/06/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023	**No. DOC. IDENTIDAD**	901769190-0
DIRECCIÓN	DG 63 8 66	**TELÉFONO**	3214801404
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800074859-9
DIRECCIÓN	CENTRO CHISCAS	**TELÉFONO**	3142705413
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800074859-9
DIRECCIÓN	CENTRO CHISCAS	**TELÉFONO**	3142705413

OBJETO DE CONTRATO

CANCELACION AJUSTES INTEGRANTES DEL CONSORCIO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMPTS-004-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/10/2025	24:00 Horas Del 03/05/2027	-8.119.615,60	-44.936,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 04/06/2027	-12.179.423,40	-136.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/06/2024	24:00 Horas Del 04/06/2026	-8.119.615,60	-40.654,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 04/06/2024	24:00 Horas Del 04/06/2026	-8.119.615,60	-40.654,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -36.538.270,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-262.678,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-262.678,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-50.858,82
TOTAL A PAGAR	$	-318.536,82

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001674	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	680012318	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	04/06/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100001674** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERCHISCAS 2023** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA / ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA** , expedida por la Compañía en **19/11/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **19** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.19 17:19:24 -05:00

Código de Seguridad: QhQxn4t8tyfRWIjQDwBmnQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001674	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	680012338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	04/06/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023	**No. DOC. IDENTIDAD**	901769190-0
DIRECCIÓN	DG 63 8 66	**TELÉFONO**	3214801404
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800074859-9
DIRECCIÓN	CENTRO CHISCAS	**TELÉFONO**	3142705413
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800074859-9
DIRECCIÓN	CENTRO CHISCAS	**TELÉFONO**	3142705413

OBJETO DE CONTRATO

SE REHABILITA POLIZA MODIFICANDO EL TOMADOR INCLUYENDO LOS PARTICIPANTES DEL MISMO INTEGRADO POR:
QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S. NIT 9 0 1 0 7 2 4 5 3 - 1 95 %
FURA INGENIERIA S.A.S NIT 9 0 1 6 2 8 2 7 1 5%
ESLEYDER HANDER MURILLO VEGA 1 0 4 9 6 2 6 2 1 7 rep leg
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMPTS-004-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. CH-LP-04-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/10/2025	24:00 Horas Del 03/05/2027	8.119.615,60	44.936,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 04/06/2027	12.179.423,40	136.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/06/2024	24:00 Horas Del 04/06/2026	8.119.615,60	40.654,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 04/06/2024	24:00 Horas Del 04/06/2026	8.119.615,60	40.654,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 36.538.270,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	262.678,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	262.678,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	50.858,82
TOTAL A PAGAR	$	318.536,82

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001674	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	680012338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	04/06/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100001674** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERCHISCAS 2023** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA / ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA** , expedida por la Compañía en **20/11/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **19** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	680012338

Fecha de Facturación	20/11/2025	
REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	COQ-100001674	
Periodo Facturado	29/11/2023	04/06/2027

Fecha Límite de Pago	20/12/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	267.678,00
IVA	50.858,82
VALOR TOTAL A PAGAR $	318.536,82

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
DG 63 8 66	901769190
Intermediario	ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	680012338

Fecha de Facturación	20/11/2025	
REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	COQ-100001674	
Periodo Facturado	29/11/2023	04/06/2027

Fecha Límite de Pago	20/12/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	267.678,00
IVA	50.858,82
VALOR TOTAL A PAGAR $	318.536,82

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
DG 63 8 66	901769190
Intermediario	ASESORIAS Y SOLUCIONES M&M

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000006800123 38(3900)000000318536(96)20251220

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990680012338(3900)000000318536(96)20251220

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
PERIODO: 14 DE OCTUBRE DE 2025 A 5 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No CH-LP-OP-04-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALTAMAQUINAS
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO CÓRDOBA A.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS"


INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERCHISCAS 2023

MUNICIOP DE CHISCAS
ENERO DE 2026

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS"
No. CONTRATO	CH-LP-OP-04-2023
VALOR CONTRATO	$ 1.154.431.389,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ALTAMAQUINAS
NIT	901764349-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCHISCAS
TIEMPO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES

1. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Y ZONA DEL PROYECTO:

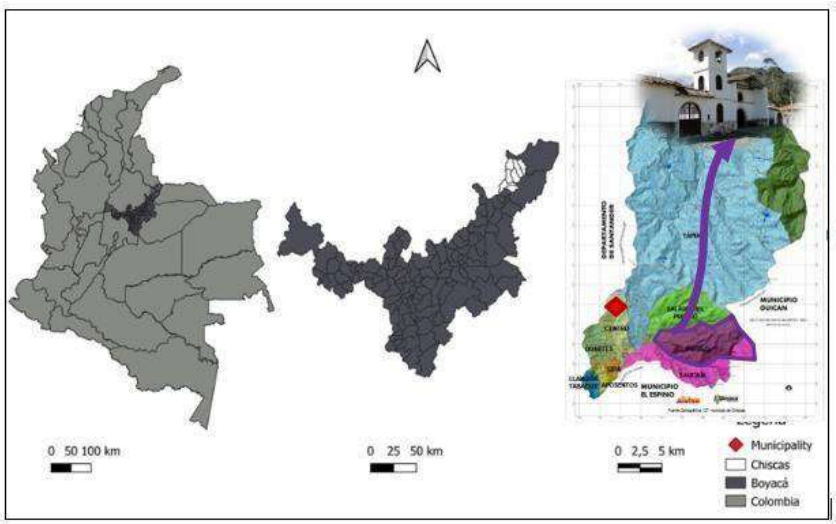

El presente proyecto se está ejecutando en el Municipio de Chiscas, el cual se encuentra ubicado en la Provincia de Gutiérrez, en el departamento de Boyacá. Se encuentra a 252 km de Tunja, capital del departamento.

A su vez el Municipio de Chiscas se encuentra dividido en nueve veredas cada una con sus respectivos sectores:

- Taucasí (Casiano, Llantenal, La Meseta Grande y Chiquita y La Ramada.)
- Vereda de El Pueblo (La Úcriga, Golondrinas)
- Salado del Pueblo (Rechíniga, Tarazona, Salado Grande)
- Tapias (Tapias, Betaveba, La Perla, Las Cañas, Manua, Rinconcitos, Los Valles)
- Centro (Las Higueras, Soyagra, Peña Blanca, El Rodeo y Cardonal)
- Duartes (Duartes Arriba, Duartes Abajo)
- La Upa (La Upa propiamente dicho y Puente Chiquito)
- Aposentos (Aposentos y La Fragua)
- Llano de Tabaco (Porqueras, Llano de Tabaco central, El Limón y Tachirín).

El proyecto se desarrolla específicamente en el corregimiento denominado el Pueblo de las Mercedes, el cual hace parte de la Vereda de El Pueblo.





El pueblo de Las Mercedes es conocido por su tranquilidad y su entorno natural, rodeado de montañas y paisajes típicos de la región boyacense. Es una comunidad que se caracteriza por su cercanía con la naturaleza y por su actividad agrícola, especialmente en la producción de productos como café, maíz y otros cultivos propios de la zona.

Las Mercedes está situada en las estribaciones de la cordillera Oriental, en el municipio de Chiscas, se encuentra a una distancia aproximada de 5,5Km desde el casco urbano.

El proyecto se desarrolla específicamente en la sede central de la Institución Educativa Las Mercedes, como principal comunidad beneficiada del proyecto. Es una institución de carácter público, con alrededor de 150 estudiantes desde los cursos transición hasta grado undécimo.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Chiscas, en el Centro Poblado Las Mercedes cuenta con una Institución Educativa, en el cual desde hace seis años se viene adelantando un contrato de construcción de la infraestructura del colegio en pro de actualizar y generar espacios dignos para la educación de los niños niñas y jóvenes de la comunidad Chiscana, proceso que se ha visto entorpecido por varios inconvenientes de carácter legal y técnico, viene en ejecución la construcción que en compañía de la administración municipal se ha venido fortaleciendo para poder culminar las obras, el inconveniente principal que se presentó en dicho contrato es que no se contemplaron alguna obras que son muy importantes para el buen funcionamiento de la Institución, estructuras que se proyectaron como complementarias al proceso constructivo que se viene realizando pero que no se lograron viabilizar entre el mismo proceso.

La administración municipal en pro de llevar bienestar y cumplir con su comunidad para brindar bienestar al desarrollo de la comunidad educativa y el futuro del municipio adelantó ante la Gobernación de Boyacá, la gestión de recurso y viabilización de propuesto de las obras completarías que se deben desarrollar en la Institución Educativa Las Mercedes como lo es generar espacios más seguros mediante le construcción del cerramiento perimetral y las circulaciones para evitar accidentes, implementar los espacios deportivos teniendo en cuenta que en la institución no contaba con escenario deportivo para brindar las clases de deportes, en conjunto de la construcción de un cárcamo para la evacuación de aguas lluvias.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el municipio formuló el proyecto y presento el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, a el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el cual fue aprobado y como consecuencia de lo anterior entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el Municipio de Chiscas, celebraron el Convenio Interadministrativo No. 2941 de 2023, entre el Municipio de Chiscas - Boyacá y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, cuyo objeto es: *" AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".*

3. ALCANCE

El alcance del presente documento es presentar un informe detallado sobre el progreso de las diversas actividades realizadas entre el 14 de octubre al 5 de noviembre de 2026, en el marco del contrato de obra No CH-LP-OP-04-2023, cuyo objeto es la *"CONSTRUCCI ÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS "*.
Este informe cumple con lo estipulado en el literal b de la cláusula 10 del contrato, que establece *"Entre gar mensualmente informe del constructor con el registro fotográfico donde conste la ejecución de los trabajos ".*

4. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo detallar los avances alcanzados hasta la fecha en el marco del contrato de obra pública titulado *"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS".* Este proyecto tiene como finalidad la realización de obras complementarias indispensables para la culminación integral de la Institución Educativa Las Mercedes, mejorando así las condiciones de infraestructura y asegurando un ambiente adecuado para la comunidad educativa. Las actividades desarrolladas incluyen la ejecución de obras esenciales que contribuirán al bienestar de los estudiantes y docentes, permitiendo la finalización completa del establecimiento. A la fecha del 5 de noviembre del 2025, se ha alcanzado un progreso del 73,74% en la ejecución total acumulada del proyecto.

En el presente informe de avance se deja en evidencia del avance que se ha tenido en cada uno de los capítulos que hacen parte del presupuesto de obra.

5. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	CH-LP-OP-04-2023
CDP	202200397
REGISTRO NO.	2023112906
CONTRATANTE	Municipio de Chiscas Nit: 800074859-9 R/L Reinaldo Torres
CONTRATISTA	Consorcio Chiscas 2023 NIT: 901764349-1 R/L Juan Camilo Córdoba Álvarez C.C. 1.049.641.415 de Tunja (Boyacá).
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. ($ 1.154.431.389,00)
VALOR ADICIONAL	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($11.264.851,73)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($1.165.696.240,73)
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) Meses
ADICIÓN DE TIEMPO	DIECINUEVE DÍAS (19) CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023 25 DÍAS CALENDARIO
FECHA PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	QUINCE (15) DE ENERO DE 2024 CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO NO. 1	CUATRO (04) DE MARZO DE 2024

FECHA SUSPENSIÓN NO. 2	06 DE MAYO DE 2024 514 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO NO. 2	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA OTROSÍ NO. 1	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 3	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN	7 DE NOVIEMBRE DE 2025

6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Se incluye la relación de las garantías generadas durante el contrato, las cuales se incluyen como anexo del presente informe. Ambos ámparos de la aseguradora Mundial de Seguros S.A.

No. PÓLIZA B-100043238	**PÓLIZA DE SEGUROS EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**NO. ANEXO 1**	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**
AMPARO	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/05/2024	07/05/2026	$ 116.569.624,07
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/05/2024	07/05/2026	$ 346.329.416,70
DEVOLUCION DEL PAGO DEL ANTICIPO	0	0	0
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/05/2024	07/05/2026	$ 116.569.624,07
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	07//11/2025	07/11/2030	$ 233.139.248,15

No. PÓLIZA B-100011306	**PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NO. ANEXO 1**	**PÓLIZA RCE**
AMPARO	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
BASICO – PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES (PLO)	29/11/2023	07/11/2025	$ 427.050.000,00
PATRONAL	29/11/2023	07/11/2025	$ 128.115.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	07/11/2025	$ 128.115.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/11/2023	07/11/2025	$ 128.115.000,00

7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.154.431.389,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$11.264.851,73

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.165.696.240,73
% EJECUTADO EN EL PERIODO	30.58,58%
% EJECUTADO ACUMULADO	73.74%
% POR EJECUTAR	26,26%

AVANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.154.431.389,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$11.264.851,73
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.165.696.240,73
EJECUTADO EN EL PERIODO ANTERIOR	$ 498.204.411,00
EJECUTADO EN EL PERIODO REPORTADO	$ 361.430.779,37
EJECUTADO ACUMULADO	$ 859.635.190,37
POR EJECUTAR	$ 306.061.050,36

8. ACTA PARCIAL No. 2

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA PARCIAL 1		MODIFICATIRIO No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		SALDOS	
No.	ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	FID	V. UNIT	VR. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1. ANDENES DE CONEXIÓN						**$ 55.436.968,00**		**$ 22.862.848,00**		**$ 42.030.716,51**		**$ 18.895.365,18**		**$ 272.503,33**	
1,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	144,56		$ 6.184,00	$ 893.959,00	114,30	$ 706.831,00	205,72	$ 1.272.172,48	90,22	$ 557.920,48	1,20	$ 7.421,00
1,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro)	m3	72,95		$ 51.757,00	$ 3.775.673,00	40,00	$ 2.070.280,00	75,11	$ 3.887.468,27	34,98	$ 1.810.459,86	0,13	$ 6.728,41
1,03	1.18.05	Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500Psi).	m2	123,23	23%	$ 67.996,00	$ 10.306.351,00	114,30	$ 9.559.490,00	182,89	$ 15.296.019,78	67,37	$ 5.634.495,34	1,22	$ 102.034,44
1,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi)	m2	144,56	23%	$ 34.439,00	$ 6.123.557,00	114,30	$ 4.841.745,00	205,75	$ 8.715.563,83	90,89	$ 3.850.097,67	0,56	$ 23.721,16
1,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	m3	46,90	23%	$ 90.459,00	$ 5.218.308,00	22,87	$ 2.544.621,00	37,88	$ 4.214.701,91	14,79	$ 1.645.602,99	0,22	$ 24.477,92
1,06	3.13.15	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	kg	2835,00	23%	$ 7.202,00	$ 25.113.734,00	354,45	$ 3.139.881,00	566,62	$ 5.019.380,61	208,50	$ 1.846.988,91	3,67	$ 32.510,70
1,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa.	kg	477,83	23%	$ 6.815,00	$ 4.005.386,00	0,000	$ 0,00	432,5	$ 3.625.409,63	423,480	$ 3.549.799,93	9,020	$ 75.609,70
2. ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B						**$ 11.844.721,00**		**$ 8.407.594,00**		**$ 25.548.407,03**		**$ 16.918.591,00**		**$ 222.222,03**	
2,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	49,80		$ 6.184,00	$ 307.963,00	45,91	$ 283.907,00	125,11	$ 773.680,24	78,12	$ 483.094,08	1,08	$ 6.679,16
2,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro)	m3	29,88		$ 51.757,00	$ 1.546.499,00	16,08	$ 832.253,00	44,68	$ 2.312.502,76	28,22	$ 1.460.582,54	0,38	$ 19.667,22
2,03	1.18.05	Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500 Psi).	m2	41,50	23%	$ 67.996,00	$ 3.470.856,00	38,90	$ 3.253.405,00	107,24	$ 8.969.025,98	67,26	$ 5.625.295,48	1,08	$ 90.325,50

2,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi)	*m2*	49,80	23%	$ 34.439,00	$ 2.109.527,00	45,91	$ 1.944.746,00	125,11	$ 5.299.655,85	78,12	$ 3.309.160,86	1,08	$ 45.748,99
2,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	19,71	23%	$ 90.459,00	$ 2.193.025,00	9,18	$ 1.021.409,00	21,45	$ 2.386.625,03	12,05	$ 1.340.738,07	0,22	$ 24.477,96
2,06	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	*kg*	124,21	23%	$ 7.202,00	$ 1.100.309,00	121,00	$ 1.071.874,00	334,71	$ 2.965.015,15	210,47	$ 1.864.440,08	3,24	$ 28.701,07
2,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa.	*kg*	133,20	23%	$ 6.815,00	$ 1.116.542,00	0,00	$ 0,00	339,03	$ 2.841.902,02	338,24	$ 2.835.279,89	0,790	$ 6.622,13
3. ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE						**$ 45.316.205,00**		**$ 32.698.465,00**		**$ 58.981.237,12**		**$ 25.987.292,96**		**$ 295.479,16**	
3,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	168,11		$ 6.184,00	$ 1.039.592,00	153,72	$ 950.604,00	287,35	$ 1.776.972,40	132,93	$ 822.039,12	0,70	$ 4.329,28
3,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	75,84		$ 51.757,00	$ 3.925.251,00	49,97	$ 2.586.297,00	92,62	$ 4.793.733,34	42,17	$ 2.182.592,69	0,48	$ 24.843,65
3,03	1.18.05	Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi).	*m2*	151,02	23%	$ 67.996,00	$ 12.630.570,00	142,76	$ 11.939.744,00	249,65	$ 20.879.497,72	105,53	$ 8.826.009,99	1,36	$ 113.743,73
3,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi)	*m2*	173,14	23%	$ 34.439,00	$ 7.334.205,00	142,76	$ 6.047.309,00	252,39	$ 10.691.232,83	108,27	$ 4.586.313,95	1,36	$ 57.609,88
3,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	64,92	23%	$ 90.459,00	$ 7.223.296,00	49,97	$ 5.559.891,00	78,42	$ 8.725.367,58	27,97	$ 3.112.070,02	0,48	$ 53.406,56
3,06	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	*kg*	1054,88	23%	$ 7.202,00	$ 9.344.612,00	501,11	$ 4.439.063,00	842,92	$ 7.466.973,10	337,12	$ 2.986.364,04	4,69	$ 41.546,06
3,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa.	*kg*	313,65	23%	$ 6.815,00	$ 2.629.155,00	0,00	$ 0,00	52,58	$ 440.749,22	52,58	$ 440.749,22	0,00	$ 0,00
3,08	1.01.14	Demolición anden/contrapiso concreto espesor de 7,6-12cm.	*m2*	76,65	23%	$ 12.617,00	$ 1.189.524,00	75,75	$ 1.175.557,00	271,07	$ 4.206.710,93	195,32	$ 3.031.153,93	0,00	$ 0,00
4. RAMPAS						**$ 197.019.679,00**		**$ 7.338.678,00**		**$ 46.490.878,88**		**$ 7.797.990,76**		**$ 31.354.210,12**	
4,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	*m2*	142,55		$ 6.184,00	$ 881.529,00	36,86	$ 227.942,00	55,04	$ 340.367,36	18,18	$ 112.425,36	0,00	$ 0,00
4,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	*m3*	67,43		$ 51.757,00	$ 3.489.975,00	12,89	$ 667.148,00	69,26	$ 3.584.689,82	55,37	$ 2.865.785,09	1,00	$ 51.756,73
4,03	1.18.04	Concreto estriado rampas 17,5Mpa - (2500psi)	*m2*	95,03	23%	$ 67.996,00	$ 7.947.842,00	36,86	$ 3.082.789,00	54,88	$ 4.589.893,19	18,02	$ 1.507.104,19	0,00	$ 0,00
4,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m, 14Mpa (2000psi)	*m2*	95,03	23%	$ 34.439,00	$ 4.025.468,00	36,86	$ 1.561.388,00	54,88	$ 2.324.715,15	18,02	$ 763.327,15	0,00	$ 0,00
4,05	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	*m3*	56,68	23%	$ 90.459,00	$ 6.306.476,00	7,37	$ 820.020,00	10,97	$ 1.220.572,33	3,60	$ 400.552,33	0,00	$ 0,00

4,06	3.10.07	Suministro e instalación de barandas en tubería metálica agua negra D=2", C=0.80 Soldado, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura.	ml	273,72	23%	$ 458.932,00	$ 154.511.206,00	0,00	$ 0,00	54,80	$ 30.933.852,53	0,00	$ 0,00	54,80	$ 30.933.852,53
4,07	3.08.08	Bordillo fundido en sitio 8x15cm	m2	135,76	23%	$ 24.488,00	$ 4.089.124,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,08	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	kg	1780,00	23%	$ 7.202,00	$ 15.768.059,00	110,56	$ 979.391,00	394,74	$ 3.496.788,50	242,57	$ 2.148.796,64	41,61	$ 368.600,86
5. ESCALERA MACIZA						**$ 15.938.056,00**		**$ 6.637.023,00**		**$ 8.671.688,81**		**$ 1.839.024,84**		**$ 195.640,97**	
5,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	8,31		$ 6.184,00	$ 51.389,00	3,57	$ 22.077,00	14,58	$ 90.162,72	11,01	$ 68.085,72	0,00	$ 0,00
5,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	m3	15,25		$ 51.757,00	$ 789.294,00	6,43	$ 332.798,00	12,41	$ 642.304,37	2,20	$ 113.865,40	3,78	$ 195.640,97
5,03	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	m3	4,98	23%	$ 90.459,00	$ 554.098,00	1,94	$ 215.853,00	2,90	$ 322.667,25	0,96	$ 106.814,25	0,00	$ 0,00
5,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m, 14Mpa (2000psi)	m2	8,31	23%	$ 34.439,00	$ 352.011,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,05	1.03.06	Escalera maciza 21Mpa-3000psi.	m3	5,10	23%	$ 1.518.523,00	$ 9.525.695,00	2,17	$ 4.053.090,00	3,00	$ 5.603.349,87	0,83	$ 1.550.259,87	0,00	$ 0,00
5,06	1.02.28	Concreto ciclópeo 17.5Mpa - 2500psi, relación 60C/40P	m3	3,78	23%	$ 495.057,00	$ 2.301.718,00	1,68	$ 1.022.986,00	1,68	$ 1.022.985,78	0,00	-$ 0,22	0,00	$ 0,00
5,07	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa.	kg	282,00	23%	$ 6.815,00	$ 2.363.851,00	118,13	$ 990.219,00	118,13	$ 990.218,82	0,00	-$ 0,18	0,00	$ 0,00
6. CERRAMIENTO						**$ 172.676.862,00**		**$ 32.596.924,00**		**$ 125.102.974,33**		**$ 74.735.558,85**		**$ 17.770.491,48**	
6,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	45,43		$ 6.184,00	$ 280.939,00	29,05	$ 179.645,00	37,19	$ 229.982,96	8,12	$ 50.214,08	0,02	$ 123,88
6,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	m3	26,08		$ 51.757,00	$ 1.349.823,00	11,58	$ 599.346,00	26,10	$ 1.350.857,70	14,00	$ 724.598,00	0,52	$ 26.913,70
6,03	1.02.08	Concreto ciclópeo 17.5Mpa - 2500psi, relación 60C/40P	m3	0,95	23%	$ 495.057,00	$ 578.474,00	0,84	$ 511.493,00	26,62	$ 16.209.453,33	25,34	$ 15.430.035,59	0,44	$ 267.924,74
6,04	1.02.13	Concreto viga de amarre 21Mpa, sección rectangular.	m3	11,63	23%	$ 829.394,00	$ 11.864.398,00	10,00	$ 10.201.546,00	12,76	$ 13.017.172,95	2,76	$ 2.815.626,95	0,00	$ 0,00
6,05	1.03.01	Columnas en concreto de 21MPa (3000psi), Altura menor a tres metros - formaleta de madera	m3	1,15	23%	$ 1.197.890,00	$ 1.694.415,00	0,99	$ 1.458.671,00	1,20	$ 1.768.085,64	0,21	$ 309.414,64	0,00	$ 0,00
6,06	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420Mpa.	kg	1543,30	23%	$ 6.815,00	$ 12.936.635,00	1504,04	$ 12.607.540,00	1748,79	$ 14.659.144,74	244,75	$ 2.051.604,74	0,00	$ 0,00
6,07	1.04.30	Muro tolete común E=0,10m.	m2	99,96	23%	$ 80.361,00	$ 9.880.449,00	71,21	$ 7.038.683,00	87,60	$ 8.658.737,03	16,39	$ 1.620.054,03	0,00	$ 0,00

6,08	1.20.09	Cerramiento malla eslabonada C=10, incluye ángulo	m2	399,84	23%	$ 247.636,00	$ 121.788.177,00	0,00	$ 0,00	166,63	$ 50.754.211,62	149,65	$ 45.582.234,70	16,98	$ 5.171.976,92
6,09	APU	Suministro e instalación puerta de acceso peatonal.	un	2,00	23%	$ 5.001.444,00	$ 12.303.552,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 18.455.328,36	1,00	$ 6.151.776,12	2,00	$ 12.303.552,24
7. CANCHA MÚLTIPLE						**$ 351.796.416,00**		**$ 267.667.154,00**		**$ 468.153.549,15**		**$ 60.016.511,50**		**$ 140.469.883,65**	
7,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	540,00		$ 6.184,00	$ 3.339.360,00	532,90	$ 3.295.454,00	629,60	$ 3.893.446,40	96,70	$ 597.992,40	0,00	$ 0,00
7,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	m3	222,48		$ 51.757,00	$ 11.514.897,00	130,59	$ 6.758.947,00	224,47	$ 11.617.893,79	93,88	$ 4.858.946,79	0,00	$ 0,00
7,03	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	m3	166,86	23%	$ 90.459,00	$ 18.565.606,00	163,17	$ 18.155.040,00	206,00	$ 22.920.501,42	42,83	$ 4.765.461,42	0,00	$ 0,00
7,04	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI)	m2	556,20	23%	$ 34.439,00	$ 23.560.615,00	542,42	$ 22.976.895,00	629,60	$ 26.669.837,11	87,18	$ 3.692.942,11	0,00	$ 0,00
7,05	1.03.19	Placa maciza 21 Mpa - 3000psi, E=0,10m	m2	540,00	23%	$ 285.074,00	$ 189.346.151,00	531,18	$ 186.253.497,00	588,56	$ 206.373.278,73	57,38	$ 20.119.781,73	0,00	$ 0,00
7,06	1.19.07	Demarcación con pintura tipo trafico E=,08m	ml	376,07	23%	$ 7.273,00	$ 3.364.243,00	0,00	$ 0,00	411,23	$ 3.678.777,22	0,00	$ 0,00	411,23	$ 3.678.777,22
7,07	1.19.03	Cancha múltiple tubo agua negra 3" y 2" incluye tablero acrílico B 10mm con rodachines y cilindro para movilizar.	JG	1,00	23%	$ 4.845.388,00	$ 5.959.827,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.959.827,24	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.959.827,24
7,08	3.13.26	Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación).	kg	3262,98	23%	$ 7.202,00	$ 28.904.978,00	3189,88	$ 28.257.424,00	4119,17	$ 36.489.502,68	929,29	$ 8.232.078,68	0,00	$ 0,00
7,09	1.02.13	Concreto viga de amarre 21,1 Mpa, sección rectangular.	m3	6,50	23%	$ 829.394,00	$ 6.631.005,00	1,23	$ 1.254.790,00	12,32	$ 12.568.304,92	11,09	$ 11.313.514,92	0,00	$ 0,00
7,10	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa.	kg	98,02	23%	$ 6.815,00	$ 821.648,00	85,31	$ 715.107,00	853,08	$ 7.150.900,45	767,77	$ 6.435.793,45	0,00	$ 0,00
7,11	APU	Suministro e instalación malla contra impacto H= 5,0m	un	40,00	23%	$ 1.215.205,00	$ 59.788.086,00	0,00	$ 0,00	87,53	$ 130.831.279,19	0,00	$ 0,00	87,53	$ 130.831.279,19
8. PRADIZACIÓN (PASTO)						**$ 14.935.316,00**		**$ 4.266.231,00**		**$ 6.592.222,91**		**$ 1.114.537,74**		**$ 1.211.454,17**	
8,01	1.18.11	Pradización - pasto.	m2	468,48	23%	$ 25.919,00	$ 14.935.316,00	133,82	$ 4.266.231,00	206,78	$ 6.592.222,91	34,96	$ 1.114.537,74	38,00	$ 1.211.454,17
9. CARCAMO CANCHA MÚLTIPLE						**$ 23.059.923,00**		**$ 759.245,00**		**$ 12.338.257,36**		**$ 5.366.575,90**		**$ 6.212.436,46**	
9,01	1.01.68	Localización y replanteo obra arquitectónica	m2	31,68		$ 6.184,00	$ 195.909,00	22,33	$ 138.089,00	29,85	$ 184.592,40	7,52	$ 46.503,40	0,00	$ 0,00
9,02	1.02.17	Excavación manual en material común (incluye retiro).	m3	11,09		$ 51.757,00	$ 573.985,00	0,58	$ 30.019,00	15,57	$ 805.856,49	11,94	$ 617.978,58	3,05	$ 157.858,91
9,03	1.02.28	Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI)	m2	31,68	23%	$ 34.439,00	$ 1.341.964,00	0,00	$ 0,00	79,85	$ 3.382.443,60	63,91	$ 2.707.225,68	15,94	$ 675.217,92
9,04	2.05.02	Base y cañuela en concreto 17,5 Mpa - (2500 PSI)	m3	7,92	23%	$ 758.585,00	$ 7.389.832,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

9,05	3.10.12	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa.	*kg*	808,59	23%	$ 6.815,00	$ 6.777.965,00	0,00	$ 0,00	668,16	$ 5.600.817,79	96,94	$ 812.594,70	571,22	$ 4.788.223,09
9,06	APU	Suministro e instalación de rejilla en concreto 2500 PSI prefabricada.	*un*	79,20	23%	$ 63.533,00	$ 6.189.131,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,07	1.02.05	Cajas de inspección 80x80x80cm - ladrillo.	*un*	1,00	23%	$ 480.599,00	$ 591.137,00	1,00	$ 591.137,00	4,00	$ 2.364.547,08	2,00	$ 1.182.273,54	1,00	$ 591.136,54
10. ITEMS COMPLEMENTARIOS - NO PREVISTOS						**$ -**				**$ 102.779.483,84**		**$ 65.352.227,71**		**$ 37.427.256,13**	
IC-NP-10.01	COT.1	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 13	*m3*		23%	$ 282.000,00				41,20	$ 14.290.632,00	40,20	$ 13.943.772,00	1,00	$ 346.860,00
IC-NP-10.02	COT 2	Suministro e instalación de cárcamo prefabricado c45 (45*40*100, incl. Rejillas y excavación)	*ml*		23%	$ 324.088,58				48,20	$ 19.213.915,56	48,20	$ 19.213.915,56	0,00	$ 0,00
IC-NP-10.03	5,01,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	*ml*		23%	$ 73.154,27				55,70	$ 5.011.872,19	33,70	$ 3.032.317,65	22,00	$ 1.979.554,54
IC-NP-10.04	5,01,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	*ml*		23%	$ 41.023,96				16,00	$ 807.351,53	16,00	$ 807.351,53	0,00	$ 0,00
IC-NP-10.05	REF 1	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	*m3*		0%	$ 126.395,06				10,01	$ 1.265.214,55	6,67	$ 843.055,05	3,34	$ 422.159,50
IC-NP-10.06	2,02,24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	*m3*			$ 27.765,74				15,05	$ 417.874,39	9,15	$ 254.056,52	5,90	$ 163.817,87
IC-NP-10.07	REF 2	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H: 35CM, E:20 CM	*m3*		23%	$ 946.089,01				15,85	$ 18.444.478,29	15,70	$ 18.269.924,87	0,15	$ 174.553,42
IC-NP-10.08	COT. 3	Sumidero sencillo en ladrillo (0,6m x 0.40m)	*un*		23%	$ 725.626,34				3,00	$ 2.677.561,19	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.677.561,19
IC-NP-10.09	COT. 4	Sumidero transversal (Fundido en sitio, concreto hecho en obra, Inc. Suministro, Form, Ref y Const, Inc. Reja)	*un*		23%	$ 6.741.833,93				1,00	$ 8.292.455,73	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.292.455,73
IC-NP-10.10	3,01,08	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	*km*		0%	$ 4.049.000,34				0,02	$ 80.980,01	0,02	$ 80.980,01	0,00	$ 0,00

IC-NP-10.11	3,02,07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	*m3*		0%	$ 26.955,15				22,68	$ 611.342,80	0,00	$ 0,00	22,68	$ 611.342,80
IC-NP-10.12	3,04,07	SUMINISTRO,EXTENDIDAYCOMPACTACIÓNDEMATERIALSELECCIÓNADOPARASUBBASEGRANULAR(INCLUYEACARREOLIBREHASTA5KM) (**)	*m3*		0%	$ 140.355,91				23,71	$ 3.327.838,63	6,74	$ 945.998,83	16,97	$ 2.381.839,80
IC-NP-10.13	3,05,11	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	*m3*		23%	$ 855.295,71				7,97	$ 8.384.549,37	0,00	$ 0,00	7,97	$ 8.384.549,37
IC-NP-10.14	3,03,21	SUMINISTROEINSTALACIÓNDECONCRETOCICLOPEODE21MPA(3000PSI),60%RAJONPARAPLACAHUELLASINCLUYESELLODEJUNTAS	*m3*		23%	$ 602.894,77				10,15	$ 7.526.839,76	4,08	$ 3.025.567,11	6,07	$ 4.501.272,65
IC-NP-10.15	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	*m3-km*		0%	$ 2.765,10				1033,75	$ 2.858.422,13	294,30	$ 813.768,93	739,45	$ 2.044.653,20
IC-NP-10.16	REF. 3	Bordillo Fundido En Sitio15 X 25 cm	*ml*		23%	$ 55.367,23				84,30	$ 5.740.972,71	35,50	$ 2.417.610,10	48,80	$ 3.323.362,61
IC-NP-10.17	4,01,08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	*m3*		0%	$ 139.077,47				10,38	$ 1.443.624,14	0,00	$ 0,00	10,38	$ 1.443.624,14
IC-NP-10.18	3,03,05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	*m3*		23%	$ 778.254,11				2,49	$ 2.383.558,86	1,78	$ 1.703.909,55	0,71	$ 679.649,31
COSTOS DIRECTOS OBRA CONTRACTUAL						**$ 888.024.146,00**		**$ 383.234.162,00**		**$ 896.689.415,94**		**$ 278.023.676,44**		**$ 235.431.577,50**	
		ADMINISTRACIÓN		22%		$ 195.365.312,00		$ 84.311.516,00		$ 197.271.671,51		$ 61.165.208,82		$ 51.794.946,69	
		IMPREVISTOS		3%		$ 26.640.724,00		$ 11.497.025,00		$ 26.900.682,48		$ 8.340.710,29		$ 7.062.947,19	
		UTILIDAD		5%		$ 44.401.207,00		$ 19.161.708,00		$ 44.834.470,80		$ 13.901.183,82		$ 11.771.578,98	
		TOTAL PRESUPUESTO				**$ 1.154.431.389,00**		**$ 498.204.411,00**		**$ 1.165.696.240,73**		**$ 361.430.779,37**		**$ 306.061.050,36**	

9. DESCRIPCIÓN DETALLADA

A continuación, se dará una descripción detallada por capítulos en los cuales se ejecutaron actividades para el período reportado.

1. ANDENES DE CONEXIÓN








1.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 90,22 M2






1.02 Excavación manual en material común (incluye retiro) = 34.98 M3

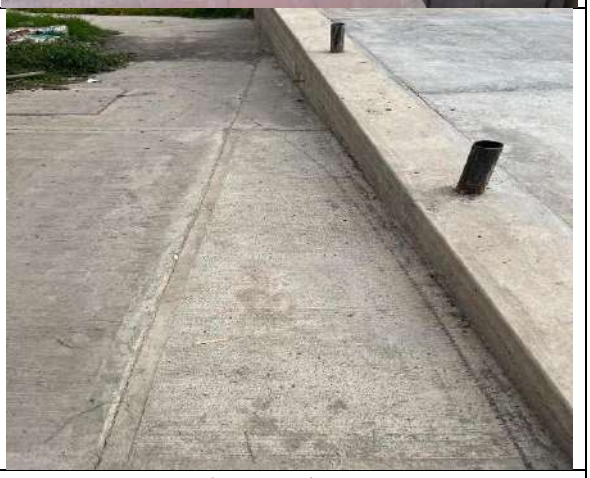

1.03 Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500Psi). = 67.37 M2




1.04 Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi) = 90.89 M2







1.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 14.79 M3




1.06 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 208.50 KG






1.07 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa. = 423.48 KG

2. ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B






2.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 78.12 M2







2.02 Excavación manual en material común (incluye retiro) = 28.22 M3







2.03 Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5Mpa - (2500 Psi). = 67.26 M2

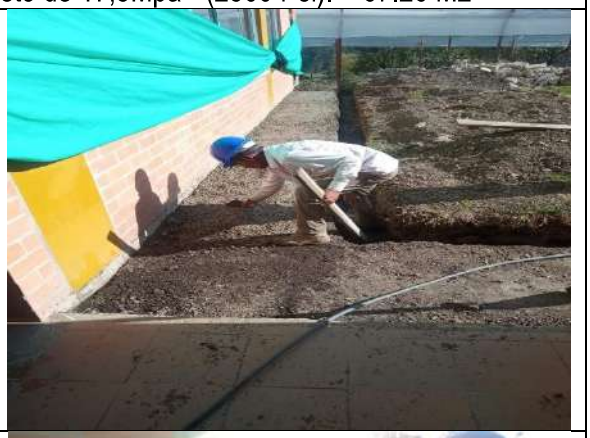

2.04 Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi) = 78.12 M2



2.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 12.05 M3

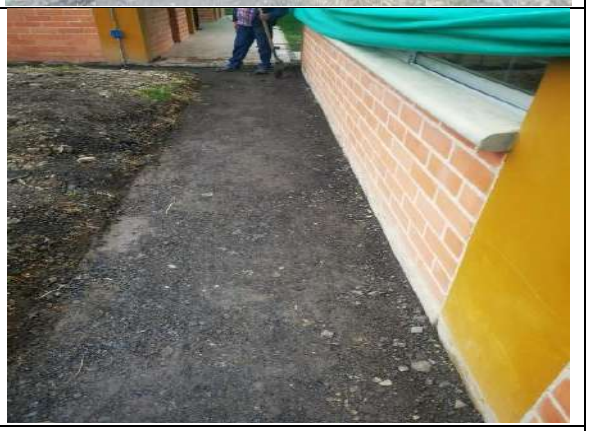




2.06 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 210.47 KG






2.07 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa. = 338.24 KG

3. ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE






3.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 132.93 M2






3.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 42.17 M3






3.03 Construcción de andenes E=0,10m en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi). = 105.53 M2






3.04 Solado en concreto E=0,05m 14Mpa (2000psi) = 108.27 M2






3.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 27.97 M3






3.06 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 337.12 KG




3.07 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi-420Mpa. = 52.58 KG







3.08 Demolición anden/contrapiso concreto espesor de 7,6-12cm. = 195.32 M2

4. RAMPAS




4.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 18.18 M2






4.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 55.37 M3




4.03 Concreto estriado rampas 17,5Mpa - (2500psi) = 18.02 M2




4.04 Solado en concreto E=0,05m, 14Mpa (2000psi) = 18.02 M2




4.05 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 3.60 M3




4.08 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 242.57 KG

5. ESCALERA MACIZA





5.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 11.01 M2





5.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 2.20 M3





5.03 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 0.96 M3





5.05 Escalera maciza 21Mpa-3000psi. = 0.83 M3

6. CERRAMIENTO






6.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 8.12 M2






6.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 14.00M3






6.03 Concreto ciclópeo 17.5Mpa - 2500psi, relación 60C/40P = 25.34 M3






6.04 Concreto viga de amarre 21Mpa, sección rectangular. = 2.76 M3







6.05 Columnas en concreto de 21MPa (3000psi), Altura menor a tres metros - formaleta de madera = 0.21 M3






6.06 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420Mpa. = 244.75 KG

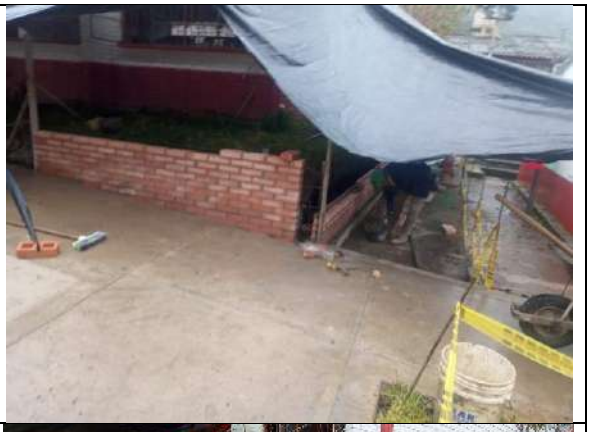

6.07 Muro tolete común E=0,10m. = 16.39 M2







6.08 Cerramiento malla eslabonada C=10, incluye ángulo = 149.65 M2




6.09 Suministro e instalación puerta de acceso peatonal. = 1 UND

7. CANCHA MÚLTIPLE




7.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 96.70 M2






7.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 93.88 M3




7.03 Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador = 42.83 M3




7.04 Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI) = 87.18 M2






7.05 Placa maciza 21 Mpa - 3000psi, E=0,10m = 57.38 M2





7.08 Malla electrosoldada 0,15x0,15m D=6mm (incluye suministro, fijación e instalación). = 929.29 KG






7.09 Concreto viga de amarre 21,1 Mpa, sección rectangular. = 11.09 M3

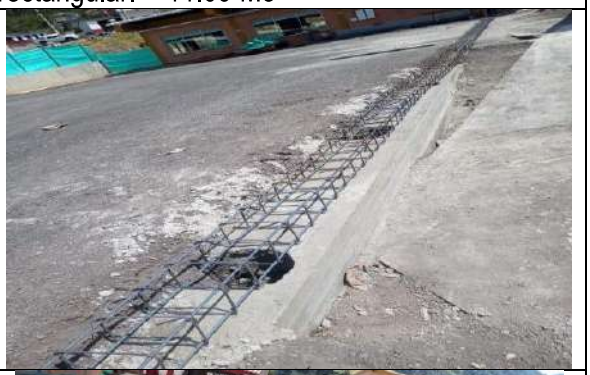

7.10 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa. = 767.77 KG

8. PRADIZACIÓN (PASTO)





8.01 Pradización - pasto. = 34.96 M2

9. CARCAMO CANCHA MÚLTIPLE





9.01 Localización y replanteo obra arquitectónica = 7.52 M2













9.02 Excavación manual en material común (incluye retiro). = 11.94 M3



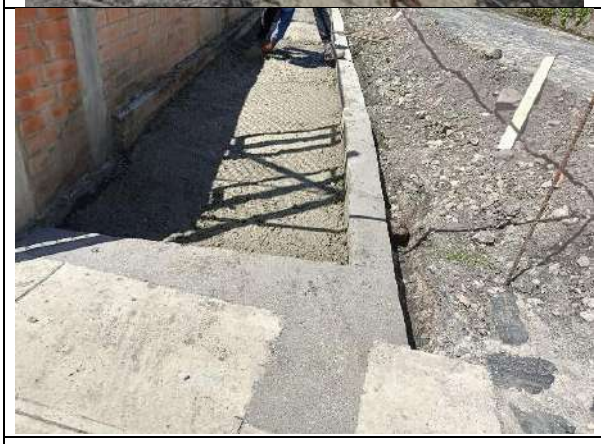


9,03 Solado en concreto E=0,05m 14 Mpa (2000 PSI) = 63.91 M2




9,05 Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000psi - 420 Mpa. 96.94 KG






9.07 Cajas de inspección 80x80x80cm - ladrillo. = 2 UND

10. ITEMS COMPLEMENTARIOS - NO PREVISTOS






IC-NP-10.01 CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 13 = 40.20 M3






IC-NP-10.02 Suministro e instalación de cárcamo prefabricado c45 (45*40*100, incl. Rejillas y excavación) = 48.20 ML




IC-NP-10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6 = 33.70 ML




IC-NP-10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" = 16 ML




IC-NP-10.05 RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. = 6.67 M3




IC-NP-10.06 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) = 9.15 M3






IC-NP-10.07 CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H: 35CM, E:20 CM = 15.70 M3




IC-NP-10.10 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL = 0.02 KM




IC-NP-10.12 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASEGRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) = 6.74 M3




IC-NP-10.14 SUMINISTROEINSTALACIÓNDECONCRETOCICLOPEODE21MPA(3000PSI),60% RAJONPARAPLACAHUELLASINCLUYESELLODEJUNTAS = 4.08 M3




IC-NP-10.15 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.= 294.30 M3-KM




IC-NP-10.16 Bordillo Fundido En Sitio15 X 25 cm = 35.50 ML




IC-NP-10.18 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) = 1.78 M3

10. RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

En este apartado se relaciona el personal profesional y personal de mano de obra que laboró en el proyecto en el período relacionado, los certificados de aportes a seguridad social se incluyen como documento anexo del presente informe.

PERSONAL ADMINISTRATIVO	
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Camilo Córdoba Álvarez

PERSONAL MANO DE OBRA	
MAESTRO GENERAL	Ramiro Cuadros
MAESTRO OFICIAL	Alexander Florez
AUXILIAR 1	Stivert Estupiñan
AUXILIAR 2	Alexander Herrera
AUXILIAR 3	Héctor Martínez

11. CORRESPONDENCIA


En este capítulo se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el período, la cual se encontrará como anexo del presente informe.

FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	RESPUESTA


12. CONCLUSIONES:

- Luego del análisis técnico, presupuestal y constructivo, se concluye que el modificatorio aprobado fue necesario y pertinente para garantizar la correcta funcionalidad, estabilidad, finalización y durabilidad del proyecto.
- La ejecución de las actividades de construcción de andenes y bordillos se realizó conforme a los diseños aprobados, garantizando adecuados niveles, pendientes y acabados, lo que mejora la movilidad peatonal, la accesibilidad y la seguridad de los niños.
- Las obras correspondientes a la cancha fueron ejecutadas cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, logrando una superficie funcional, segura y con condiciones apropiadas de drenaje para su correcto uso.
- La ejecución de los cerramientos permite la correcta delimitación de las áreas, fortaleciendo la seguridad de la infraestructura y facilitando el control y protección de los espacios construidos.
- Los cárcamos construidos cumplen la función de recolección y conducción de aguas, permitiendo un manejo eficiente de escorrentías y evitando acumulaciones que puedan afectar las estructuras o las áreas de uso.
- Los muros de contención ejecutados garantizan la estabilidad de los taludes y terrenos intervenidos, mitigando riesgos geotécnicos y protegiendo las obras principales frente a empujes de tierra y erosión.

- Las obras de drenaje complementarias fueron ejecutadas de manera integral, asegurando la adecuada evacuación de aguas lluvias y contribuyendo a la durabilidad y correcto funcionamiento del proyecto en su conjunto
- Finalmente, se concluye que el modificatorio aprobado contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto, optimizando su desempeño y garantizando una infraestructura segura, funcional y acorde a las condiciones reales del sitio.



JUAN CAMILO CÓRDOBA ÁLVAREZ
Representante Legal Consorcio Altamaquinas – Contratista de obra

Visto bueno 

HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA
Representante Legal Consorcio Interchiscas 2023 - Interventoría

.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.31 15:53:08 -05:00

Código de Seguridad: CxVDjAg2ON3CJOVZeJOo6Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100043238	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22310700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	07/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ALTAMAQUINAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.764.349-1
DIRECCIÓN	CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE OFICINA 316	**TELÉFONO**	3107926809
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.074.859-9
DIRECCIÓN	CALLE 4 # 4 41	**TELÉFONO**	3142705413
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.074.859-9
DIRECCIÓN	CALLE 4 # 4 41	**TELÉFONO**	3142705413

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO Y APLICACION DE:

- ACTA DE SUSPENSION NO.2 DE FECHA 06/05/2024
- ACTA DE REINICIO NO.2 DE FECHA 14/10/2025
- OTROSÍ No. 01 DE FECHA 07/10/2025

SE ACLARA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE EL L 29/11/2023 SEGUN ACTA DE INICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/05/2024	24:00 Horas Del 07/05/2026	116.569.624,07	16.007,32
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 06/05/2024	24:00 Horas Del 07/05/2026	346.329.416,70	1.461.225,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/05/2024	24:00 Horas Del 07/11/2028	116.569.624,07	425.448,72
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 07/11/2025	24:00 Horas Del 07/11/2030	233.139.248,15	28.177,56
		TOTAL ASEGURADO	$ 812.607.912,99	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.930.859,09
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.930.859,09
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	366.863,23
TOTAL A PAGAR	$	2.297.722,32

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100043238	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22310700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	07/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CH-LP-OP-04-2023 , CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S NIT: 901401590 (PART. 90,0 %)
INTEGRANTE 2 - MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC NIT: 901636135 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ALTAMAQUINAS)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100043238** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ALTAMAQUINAS** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA / ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA** , expedida por la Compañía en **31/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **31** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22310700

Fecha de Facturación	31/03/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	B-100043238	
Periodo Facturado	29/11/2023	07/11/2030

Fecha Límite de Pago	30/04/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.930.859,09
IVA	366.863,23
VALOR TOTAL A PAGAR $	2.297.722,32

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ALTAMAQUINAS
CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE	901.764.349
Intermediario	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22310700

Fecha de Facturación	31/03/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	B-100043238	
Periodo Facturado	29/11/2023	07/11/2030

Fecha Límite de Pago	30/04/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.930.859,09
IVA	366.863,23
VALOR TOTAL A PAGAR $	2.297.722,32

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ALTAMAQUINAS
CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE	901.764.349
Intermediario	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000022310700(3900)000002297722(96)20260430

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900223107 00(3900)000002297722(96)20260430

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.31 16:03:13 -05:00

Código de Seguridad: H6jfOzP71rubLkCgylqjAg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100011306	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22310701	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	07/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ALTAMAQUINAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.764.349-1
DIRECCIÓN	CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE OFICINA 316	**TELÉFONO**	3107926809
ASEGURADO	CONSORCIO ALTAMAQUINAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.764.349-1
DIRECCIÓN	CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE OFICINA 316	**TELÉFONO**	3107926809
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	1

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO Y APLICACION DE:

- ACTA DE SUSPENSION NO.2 DE FECHA 06/05/2024
- ACTA DE REINICIO NO.2 DE FECHA 14/10/2025
- OTROSÍ No. 01 DE FECHA 07/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CH-LP-OP-04-2023 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	213.525.000,00	427.050.000,00	427.050.000,00	1.531.284,25
PATRONAL	128.115.000,00	128.115.000,00	128.115.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	128.115.000,00	128.115.000,00	128.115.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	128.115.000,00	128.115.000,00	128.115.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 427.050.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.531.284,25
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.531.284,25
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	290.944,01
TOTAL A PAGAR	$	1.822.228,26

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100011306	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22310701	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/11/2023	24:00 Horas Del	07/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S NIT: 901401590 (PART. 90,0 %)
INTEGRANTE 2 - MAQUINAS OBRAS Y PROYECTO S.A.S NIT: 901636135 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ALTAMAQUINAS) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ALTAMAQUINAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS - BOYACA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22310701

Fecha de Facturación	31/03/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza No.	B-100011306	
Periodo Facturado	29/11/2023	07/11/2025

Fecha Límite de Pago	30/04/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.531.284,25
IVA	290.944,01
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.822.228,26

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ALTAMAQUINAS
CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE	901.764.349
Intermediario	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22310701

Fecha de Facturación	31/03/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza No.	B-100011306	
Periodo Facturado	29/11/2023	07/11/2025

Fecha Límite de Pago	30/04/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.531.284,25
IVA	290.944,01
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.822.228,26

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO ALTAMAQUINAS
CRA 1 F 40 - 195 EDIF ENTREPRISE	901.764.349
Intermediario	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000022310701(3900)000001822228(96)20260430

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900223107O1(3900)000001822228(96)20260430

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial

NIT: 860.037.013-6

RECIBO ELECTRONICO No. 100000136

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 31/03/2026 5:13:12 p.m.

VALOR TOTAL: $4.119.951,00

RECIBO DE: CONSORCIO ALTAMAQUINAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901764349

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
TC-7974	20260100159798	601306	MASTERCARD	4.119.950,58

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100043238 Certificado(s): 22310700; Ramo: RESP. CIVIL Póliza(s): 100011306 Certificado(s): 22310701

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019
