

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**PROYECTO SENA**	**231 días**
2		Inicio	0 días
3		**CENTRO DE FORMACIÓN TURISTICO GENTE DE MAR Y SERVICIOS**	**231 días**
4		**ADECUACIONES BLOQUE PRINCIPAL**	**176 días**
5		Desmonte y retiro de teja asfaltica y manto existente	46 días
6		Sum. E int. De teja asfáltica verde 100mm x 330mm x 2.8mm para impermeabilización de cubierta	47 días
7		Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico instalado en caliente, utilizando adhesivo sellador de poliuretano y acabado con cemento marino denso	47 días
8		Construcción de estructura de soporte en madera inmunizada, utilizando listones de 4"x2" en cercha tipo Pratt, fijación con clavos calibre 23 x 30mm y soportes metálicos para madera de 4"x2	47 días
9		Desmonte de columnas interiores tipo sándwich en madera en estado de deterioro	47 días
10		Suministro e instalación de columnas interiores tipo sándwich en madera de teca 3x8 pulgadas, con recubrimiento de pintura en esmalte, fijación con clavos calibre 23 x 30mm, refuerzo con varilla roscada de acero 1/2", y sellado con adhesivo de poliuretano	35 días
11		Desmonte de revestimiento Vinyl Siding existente	32 días
12		Suministro e instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm (0.26x3.66 mts), con fijación con tornillos autoperforantes de 2" y perfiles esquineros exteriores de Vinyl Siding	40 días
13		Pintura en vinilo tipo 1 super lavable para muro interiores, cielo raso 3 manos, incluye resane con sika panel, malla y estuco plástico	20 días
14		Pintura en esmalte sobre madera, incluye raspado y resane de madera con masilla	83 días
15		Pintura de demarcación en esmalte sobre madera, incluye raspado y resane de madera con masilla	78 días
16		**BLOQUE COORDINACIÓN ACADÉMICA - BLOQUE 4-GAAM-BLOQUE SERVICI**	**183,38 días**
17		Desmonte de aires acondicionados para reparación de fachada	20 días
18		Desmonte de revestimiento Vinyl Siding existente	40 días
19		Muro en superboard e=0,10m por una sola cara para soporte de revestimiento Vinsyl Siding Prova de PVC, incluye refuerzo de estructura de soporte en perfilería galvanizada	90 días
20		Suministro e instalación de revestimiento Vinyl Siding Prova de PVC 1 mm (0.26x3.66 mts), con fijación con tornillos autoperforantes de 2 y perfiles esquineros exteriores de Vinyl Siding	40 días
21		Instalación de aire acondicionado	10 días
22		Desmonte y retiro de teja asfaltica y manto existente	37 días
23		Sum. E int. De teja asfáltica verde 100mm x 330mm x 2.8mm para impermeabilización de cubierta	35 días
24		Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico instalado en caliente, utilizando adhesivo sellador de poliuretano y acabado con cemento marino denso	35 días
25		Desmonte de piso en baldosa de barro en nivel 1 y 2 (incluye retiro)	15 días
26		Nivelación de piso con mortero 1:4 e=0.025m	15 días
27		Sum. e inst. Piso Cerámico tipo tráfico 5 formato 60x60	17 días
28		**VARIOS**	**50 días**
29		Pintura epoxica para piso en concreto endurecido	25 días
30		Demarcación de áreas con pintura epoxica para pisos	25 días
31		**ASEO Y DESALOJO - MANEJO AMBIENTAL**	**133,38 días**
32		Aseo y limpieza general de la obra	121 días
33		Retiro y disposición de escombros	102 días
34		Implementación de Plan de manejo ambiental	100 días
35		**ITEM NO PREVISTOS**	**96,13 días**
36		Desmonte de sistema de canalización pluvial existente	20 días
37		Suministro e instalación de canaleta para evacuación de aguas lluvias	15 días
38		Desmonte y retiro de espejo existente	20 días
39		Suministro e instalación de espejos de madera de canales	20 días
40		Pintura de demarcación lineal en esmalte para espejos, incluye raspado y resane de madera con masilla	20 días
41		Suministro e instalación de impermeabilización de viga canal con manto asfáltico instalado en caliente.	4 días
42		Instalación de aire acondicionado	20 días

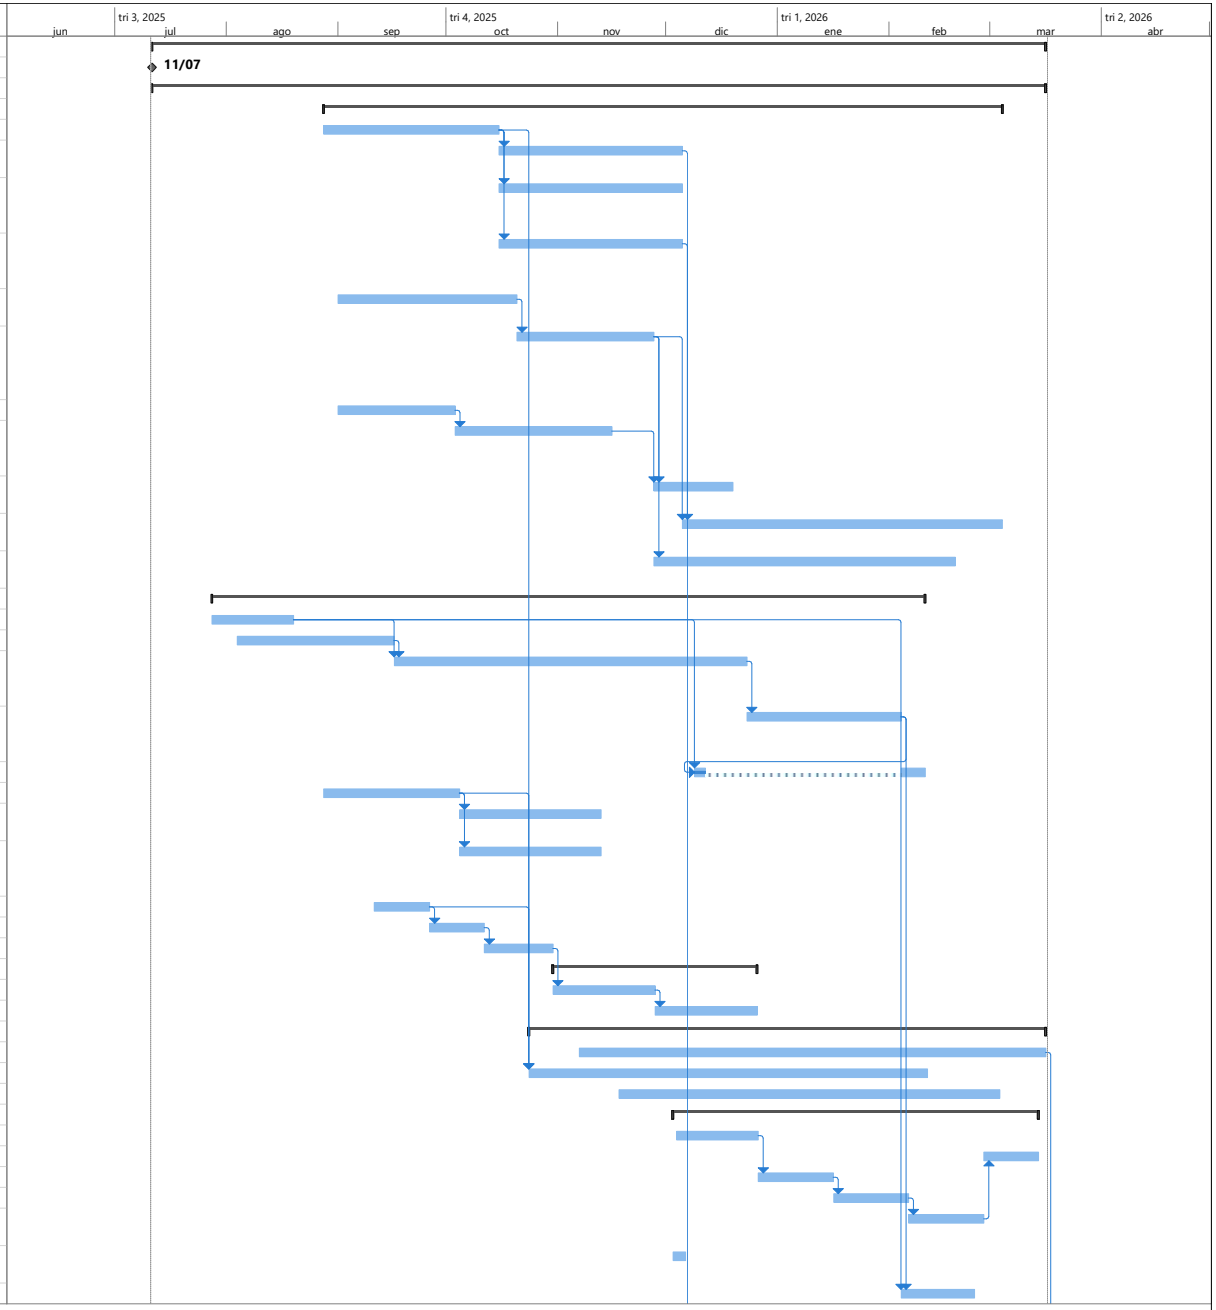

Proyecto: PROYECTO SAN AND
Fecha: mié 6/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
43		Suministro e instalación de espejos de madera y esquineros de cubierta	20 días
44		Suministro e instalación de Piso Cerámico antideslizante formato 60x60	20 días
45		Nivelación de piso con concreto de 3.000 psi	30 días
46		**INDIRECTOS**	**231 días**
47		A (29%)	231 días
48		U (1%)	231 días
49		Fin	0 días



Proyecto: PROYECTO SAN AND
Fecha: mié 6/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
