CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — MARCA: SANY

CARGO: Profesional OST — SERIE Nº: BHL95

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 30 Mar - al - 5 abril — MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y baja) se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓									
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	✓		✓		✓									
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓									
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	✓		✓		✓									
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	✓		✓		✓									
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	✓		✓		✓									
	Los indicadores de horómetro, combustible, aceite y motor están en buenas condiciones.	✓		✓		✓									
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	✓		✓		✓									
	La cámara de retroceso funciona correctamente.	✓		✓		✓									
	El pito no presenta alguna falla.	✓		✓		✓									
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓									
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	✓		✓		✓									
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	✓		✓		✓									
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓									
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	✓		✓		✓									
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	✓		✓		✓									
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	✓		✓		✓									
	Los pedales se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓				✓					
LLANTAS	Las llantas no presentan protuberancias, abultamientos o cortaduras.	✓		✓		✓									
	La huella está en buen estado.	✓		✓		✓									
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓									
	Los pasadores (Basculador / Desgarrador) están en buenas condiciones.	✓		✓		✓									
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	✓		✓		✓									
	El mecanismo de giro (brazo / Enrutador) está en buenas condiciones.	✓		✓		✓									
	La tubería hidráulica está funcionando adecuadamente.	✓		✓		✓									
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	✓		✓											
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓									
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	✓		✓		✓									
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	✓		✓		✓									
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓									
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓									
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		✓		✓		✓								
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		✓		✓		✓								
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		✓		✓		✓								
Firma diaria del operador															
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:
A partir del jueves se suspendieron labores debido al receso de Semana Santa. Conforme a la programación establecida.

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Alirio Ramirez	Supervisor:	Julian Mendoza
Periodo de Inspección:	30 Marzo - 5 abril	Firma del Conductor:	
Placas:	SPO 697	Marca/Modelo:	
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reversa.		✓		✓		✓								
2			✓		✓		✓								
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	✓		✓		✓									
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	✓		✓		✓									
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	✓		✓		✓									
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	✓		✓		✓									
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	✓		✓		✓									
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	✓		✓		✓									
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	✓		✓		✓									
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	✓		✓		✓									
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	✓		✓		✓									
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	✓		✓		✓									
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre		✓		✓		✓								
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	✓		✓		✓									
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, palo, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	✓		✓		✓									
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	✓		✓		✓									
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, cuello (porosidad o rajaduras)	✓		✓		✓									
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ojetes de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	✓		✓		✓									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	✓		✓		✓									
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	✓		✓		✓									
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	✓		✓		✓									
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:
Las actividades se desarrollaron con normalidad de lunes a miercoles. A partir del jueves se suspendieron labores debido al receso de Semana Santa, conforme a la programacion establecida.

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 8

Fecha: 10/22/2024

Conductor:	Alirio Ramirez	Supervisor:	Julian Mendoza
Periodo de Inspección:	6 al 11 Abril 2026	Firma del Conductor:	
Placa:	SPO 691	Marca/Modelo:	
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con [x] la casilla correspondiente, siempre al estar diligenciar el presente formato, registre las novedades en la observación.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.		✓		✓		✓		✓		✓				
2			✓		✓		✓		✓		✓				
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	✓		✓		✓		✓		✓					
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	✓		✓		✓		✓		✓					
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Ajustes de las frenos, Limpiar de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Bomba de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades.	✓		✓		✓		✓		✓					
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin levantamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Ruz de rajaduras	✓		✓		✓		✓		✓					
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, Limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	✓		✓		✓		✓		✓					
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	✓		✓		✓		✓		✓					
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre		✓		✓		✓		✓		✓				
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	✓		✓		✓		✓		✓					
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpion de pies. Lamp de repuesto. Avisos de cobros de prevención	✓		✓		✓		✓		✓					
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pico, pala, saco de cisco para señalización, almohadillas para absorber crudo, bolsa de residuos. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	✓		✓		✓		✓		✓					
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, cuerpo (perforado o rajaduras)	✓		✓		✓		✓		✓					
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cilios de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de sellante de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	✓		✓		✓		✓		✓					
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, pedales con espacio de ingreso para accionar luces. Cerrado el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos o olores anormales	✓		✓		✓		✓		✓					
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	✓		✓		✓		✓		✓					
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. SERIE No.: Hx 80 pro

CARGO: Profesional SST N MODELO: 2024.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 6 al 12-Abril-2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓					
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓					
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓					
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓					
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓					
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓					
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓					
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓					
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓					
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓					
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓					
Firma diaria del operador			Cumb Ben		Cumb Ben		Cumb Ben		Cumb Ben		Cumb Ben					
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:	Julian Mendoza	SERIE No.:	Hyundai
CARGO:	Profesional	MODELO:	2024
FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:	6 al 12-Abril-2026	MARCA:	Hx 60.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓					
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓					
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓					
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral Izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓					
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓					
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓					
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓					
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓					
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓					
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓					
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓					
Firma diaria del operador			Correcto		Correcto		Correcto		Correcto		Correcto					
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — MARCA: SANY

CARGO: Profesional SST — SERIE Nº: BHL75

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 6 al 12 Abril - 2026 — MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los indicadores de horómetro, combustible, aceite y motor están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El pito no presenta alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los lubricadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La huella está en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los pasadores (Estabilizador / Cargerador) están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El conjunto de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El estado general del cargerador / balde es el adecuado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Firma diaria del operador															
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA 12/02/2024

SEMANA DEL 6 AL 12 DE Abril DEL 2026 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA UPP MODELO 2003 PLACA WFT065 UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Fabian Vargas C.C. 100 646 9993

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflactor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silletería y tapicería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	refrigerante, horómetro, aire)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paradores, suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadano del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Soporte del tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible(Abrazaderas, Soporte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Instalación de puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	Documentos del vehículo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR															
	KILOMETRAJE INICIAL														
	KILOMETRAJE FINAL														
	FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL	Fabian	Fabian	Fabian	Fabian	Fabian	Fabian								
	V°. B° SUPERVISOR.														
	V° B° COORDINADOR SST														

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:


NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°. B° COORDINADOR SSTA

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SVB 380 MODELO 1994 MARCA Dodge
INSPECCIONADO POR Julian Mendoza
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 6 AL 17 MES Abril DE 2026



ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas/bajas	2		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓		✓				
De stop y cabal trasera	2		✓		✓		✓		✓		✓				
Cabina		✓		✓		✓		✓		✓					
Espejo central cerrado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de servicio	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección/suspensión (terminales)	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal(en buen estado)	1		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia brisas	1		✓		✓		✓		✓		✓				
Retrovisor	1		✓		✓		✓		✓		✓				
Asiento en buena condición	2		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidraulico, voltimetro)	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Motor(-refrigerantes-lubricantes-aire)			✓		✓		✓		✓		✓				
Escalones y pasamanos (cabina)	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria y cables	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Carroceria			✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de la carga, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Chasis	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Luces direccionales, pasada, reversa, laterales, parqueo	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Conexiones eléctricas	completo		✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema retractivo (Res 3246 de 2018)		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de componentes de carroceria	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado mecánico		✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas hidráulicas	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
pasadores, amperaje	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas de aire	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras neumáticas y acoples	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
Grapas y anclaje de chasis	completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — MARCA: SANY

CARGO: Profesional SST — SERIE Nº: BHL75

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 al 19 abril — MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓					
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El pito no presenta alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	✓		✓		✓		✓		✓					
	La huella está en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓					
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓					
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓					
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		✓		✓		✓		✓		✓				
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		✓		✓		✓		✓		✓				
Firma diaria del operador															
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Ramirez	Supervisor:	Jhon Mendoza.
Periodo de Inspección:	13 al 19 Abril	Firma del Conductor:	
Placa:	SPO 697	Marca/Modelo:	
N° Licencia de Tránsito:		Kilometraje Final:	

Verifique cada ítem de acuerdo a la condición encontrada, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en el espacio Observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.		✓		✓		✓		✓		✓				
2			✓		✓		✓		✓		✓				
3	INDICADORES: Velocímetro, odómetro, amperímetro, batería, combustible, RPM.	✓		✓		✓		✓		✓					
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y aluvión, vidrio lateral y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	✓		✓		✓		✓		✓					
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓					
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Resorte del pedal, Acoples de los frenes, Ineques de almacenamiento de aire. Cauchos de pódales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y articuladores, caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓					
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos el cordeles o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Sin alineaciones	✓		✓		✓		✓		✓					
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	✓		✓		✓		✓		✓					
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir cortocircuitos conectados con partes metálicas.	✓		✓		✓		✓		✓					
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre		✓		✓		✓		✓		✓				
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	✓		✓		✓		✓		✓					
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Juntas de señales de prevención	✓		✓		✓		✓		✓					
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, tacos sólidos para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	✓		✓		✓		✓		✓					
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (posición o salpicaduras)	✓		✓		✓		✓		✓					
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ojales de izamiento. Anclajes de la compuerta. Anclajes. Ganchos de puerta de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta	✓		✓		✓		✓		✓					
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo presión estén operativos, dirección que no tenga fuga, presión del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños	✓		✓		✓		✓		✓					
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados	✓		✓		✓		✓		✓					
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, rombo de turismo, Lista de chequeo de Emergencia, Formato preoperacional.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [ ]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:	Julian Mendoza	SERIE No.:	Hx 60
CARGO:	Profesional SST	MODELO:	2024
FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:	13 al 19 Abril.	MARCA:	Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓					
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓					
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓					
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral Izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓					
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓					
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓					
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓					
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓					
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓					
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓					
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓					
Firma diaria del operador			Conforme		Conforme		Conforme		Conforme		Conforme					
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx 80

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 al 19 Abril. — MARCA: Hyundai


C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓					
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓					
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓					
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓					
Relojes Indicadores			✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓					
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓					
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓					
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓					
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓					
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓					
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓					
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓					
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓					
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓					
Firma diaria del operador			Cumple Pos		Cumple Pos		Cumple Pos		Cumple Pos		Cumple Pos					
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 13/03/2026
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SVQ280 MODELO 1979 MARCA DODGE
INSPECCIONADO POR Fabian Mendoza
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 13 AL 19 MES Abril DE 2026



ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2		✓		✓		✓		✓						
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓						
Direccionales de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓						
Stop y exploradoras	2		✓		✓		✓		✓						
cabina		✓		✓		✓		✓							
Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓							
Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓							
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓							
Pito	1	✓		✓		✓		✓							
Freno de servicio	completo		✓		✓		✓		✓						
Freno de emergencia	completo		✓		✓		✓		✓						
Dirección/suspensión (terminales)	completo	✓		✓		✓		✓							
Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓							
Vidrio frontal (en buen estado)	1		✓		✓		✓		✓						
Limpia brisas	1		✓		✓		✓		✓						
Espejo	1		✓		✓		✓		✓						
Asiento en buena condición	2		✓		✓		✓		✓						
Indicadores (hidráulico_voltímetro)	completo		✓		✓		✓		✓						
Pitos(reversa/reversa-hombre-otro)			✓		✓		✓		✓						
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo		✓		✓		✓		✓						
Estufa y cabina	completo		✓		✓		✓		✓						
Cerraduras			✓		✓		✓		✓						
Estado de la carpa, que no este roca, alambres y hubillas en buen estado	completas	✓		✓		✓		✓							
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo		✓		✓		✓		✓						
Chasis	completo		✓		✓		✓		✓						
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo		✓		✓		✓		✓						
Conexiones eléctricas	completo		✓		✓		✓		✓						
Señales reflectivas (Res 32/18 de 2008)		✓		✓		✓		✓							
Estado de compuertas de carrocería	completo	✓		✓		✓		✓							
Llantas		✓		✓		✓		✓							
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas		✓		✓		✓		✓						
Estado mecánico		✓		✓		✓		✓							
Control de fugas hidráulicas	completo	✓		✓		✓		✓							
pasadores, suspensión	completo	✓		✓		✓		✓							
Control de fugas de aire	completo	✓		✓		✓		✓							
Mangueras neumáticas y acoples	completo	✓		✓		✓		✓							
Grapas y anclaje de chasis	completo	✓		✓		✓		✓							
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx 80

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 Abril — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia parebrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma operador			Yeison Sanchez		Yeison Sanchez		Yeison Sanchez		Yeison Sanchez		Yeison Sanchez		Yeison Sanchez			
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx 80

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 Abril — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma operador			Camilo Ro		Camilo Ro		Camilo Ro		Camilo Ro		Camilo Ro		Camilo Ro			
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 9

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº SXB386 MODELO 1979 MARCA DODGE
INSPECCIONADO POR Julian Mendoza
LOCALIZACIÓN Profesional
SEMANA DEL 20 AL 26 MES Abril DE 2026



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
Delanteras altas / bajas	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Direccionales de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
De stop y señal trasera	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo control convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de emergencia	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Dirección/suspensión (terminales)	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Asiento en buena condición	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicaciones (hidraulico_volumen)	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Motor(-refrigerantes-barómetro-aire)			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y cables	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Garrucería			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de la capa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Chasis	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Conexiones eléctricas	completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de compuertas de carroceria	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado mecánico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
pasadores, suspensión	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aire	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras neumáticas y acoples	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje inicial															
Kilometraje final															
Firma diaria del conductor															
VºBº del supervisor															

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

VºBº COORDINADOR H.S.E _____

AK

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — MARCA: SANY

CARGO: Profesional SST — SERIE N°: BHL75

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 Abril — MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El pito no presenta alguna falla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La huella está en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.														
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.														
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Firma diaria del operador															
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA 12/02/2024

SEMANA DEL 20 AL 26 DE Abril DEL 2026 Km. Inicial _____ Km. Final _____
MARCA Hyundai MODELO _____ PLACA _____ UBICACIÓN campamento
OPERADOR Fabian Vargas C.C. 100 644 9993

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silletería y tapicería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	refrigerante, horómetro, aire)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	llanto de repuesto inflada, en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardán	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Soporte del tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Instalación de puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	Documentos del vehículo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL	Fabi	Fabi	Fabi	Fabi	Fabi	Fabi	
V°. B° SUPERVISOR.							
V° B° COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°. B° COORDINADOR SSTA

2/3

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	02/09/2024

Conductor:	Jhon Rodriguez	Supervisor:	Julian Mendoza
Periodo de Inspección:	20 al 26 Abril	Firma del Conductor:	Jhon William Rodriguez
Placa:	AJD927	Manifiesto No:	7956
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está bueno o M si el ítem falla, registre las novedades en observaciones.

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ILUMINADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2															
3	INDICADORES: Velocímetro, Medidor, odómetro, batería, combustible, RPM.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	✓		✓		✓		✓			✓		✓		
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Reconido del pedal, Acoples de las líneas, tanques de almacenamiento de aire. Cuchas de pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y seguros completos. Sin rajaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, aceite de la batería, aceite del motor y dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado y así prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de salidas de prevención		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, absorbentes para absorber crudo, tapa de cuneta (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ojales de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cierre de la capa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o alarmas extraños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegúrelos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases. revisión definitiva, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/03/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° _____ MODELO 1999 MARCA Dodge

INSPECCIONADO POR Julian Hernandez

LOCALIZACIÓN Campamento

SEMANA DEL 22 AL 3 MES Abril DE 2026



ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2		✓		✓		✓		✓						
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓						
Direccionales de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓		✓						
De stop y señal trasera	2		✓		✓		✓		✓						
cabina		✓		✓		✓		✓							
Espejo cantel conveso	1	✓		✓		✓		✓							
Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓							
Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓							
Pito	1	✓		✓		✓		✓							
Freno de servicio	completo		✓		✓		✓		✓						
Freno de emergencia	completo		✓		✓		✓		✓						
Dirección/suspensión (terminales)	completo	✓		✓		✓		✓							
Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓							
Vidrio frontal (en buen estado)	1		✓		✓		✓		✓						
Limpia brisas	1		✓		✓		✓		✓						
Retrovisor	1		✓		✓		✓		✓						
Asiento en buena condición	2		✓		✓		✓		✓						
Indicadores (hidraulico, voltimetro)	completo		✓		✓		✓		✓						
Motor(-refrigerantes-hor#motor-aire)			✓		✓		✓		✓						
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo		✓		✓		✓		✓						
Bocina y cables	completo		✓		✓		✓		✓						
Carrocería			✓		✓		✓		✓						
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	✓		✓		✓		✓							
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo		✓		✓		✓		✓						
Chasis	completo		✓		✓		✓		✓						
Luces direccionales, pereto, reverso, laterales, parqueo	completo		✓		✓		✓		✓						
Conexiones eléctricas	completo		✓		✓		✓		✓						
Sobres estructura (Res 8246 de 2015)		✓		✓		✓		✓							
Estado de compuertas de carroceria	completo	✓		✓		✓		✓							
Llantas		✓		✓		✓		✓							
sin cocaduras profundas y sin abultamientos	completas		✓		✓		✓		✓						
Estado mecanico		✓		✓		✓		✓							
Control de fugas hidráulicas	completo	✓		✓		✓		✓							
pasadores, suspensión	completo	✓		✓		✓		✓							
Control de fugas de aire	completo	✓		✓		✓		✓							
Mangueras neumáticas y acoples	completo	✓		✓		✓		✓							
Grapas y seguro de chasis	completo	✓		✓		✓		✓							
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma dipio del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: El día viernes no se realizaron actividades por ser el día del trabajador. 01-05-2026

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza MARCA: SANY

CARGO: Profesional SST SERIE N°: BHL75

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 29-abril-al 03 mayo MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓							
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	✓		✓		✓		✓							
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓							
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	✓		✓		✓		✓							
	Los indicadores de horómetro, combustible, aceite y motor están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓							
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓							
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓							
	El pito no presenta alguna falla.	✓		✓		✓		✓							
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	✓		✓		✓		✓							
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	✓		✓		✓		✓							
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	✓		✓		✓		✓							
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓							
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	✓		✓		✓		✓							
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	✓		✓		✓		✓							
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	✓		✓		✓		✓							
	La huella está en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓							
	Los pasadores (Bastidor / Descargador) están en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓							
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	✓		✓		✓		✓							
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓							
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	✓		✓		✓		✓							
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓							
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	✓		✓		✓		✓							
	El estado general del descargador / balde es el adecuado.	✓		✓		✓		✓							
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	✓		✓		✓		✓							
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	✓		✓		✓		✓							
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		✓		✓		✓		✓						
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		✓		✓		✓		✓						
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		✓		✓		✓		✓						
Firma diaria del operador															
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: No se realizaron actividades por ser el día del trabajador viernes 01-05-2024.

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Jillian Mendoza — SERIE No.: ____

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 27 de abril al 3 mayo 2026 — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓							
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓							
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓							
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓							
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓							
Bocina			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓							
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓							
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓							
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓							
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓							
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓							
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓							
Panel de control			✓		✓		✓		✓							
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓							
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓							
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓							
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓							
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓							
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓							
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓							
Orugas			✓		✓		✓		✓							
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓							
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓							
Exosto			✓		✓		✓		✓							
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓							
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓							
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓							
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓							
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓							
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓							
Firma operador			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]							
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES: El día viernes no se realizaron actividades por ser el día del trabajador 01-05-2026

BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. SERIE No.:

CARGO: Profesional SST. MODELO: 2024.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 27 abril al 3 Mayo 2026 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ITEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Lucos de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓							
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓							
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓							
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓							
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓							
Bocina			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓							
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓							
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓							
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓							
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓							
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓							
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓							
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓							
Panel de control			✓		✓		✓		✓							
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓							
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓							
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓							
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓							
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓							
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓							
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓							
Orugas			✓		✓		✓		✓							
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓							
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓							
Exosto			✓		✓		✓		✓							
Rodamientos de oruga fijas			✓		✓		✓		✓							
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓							
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓							
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓							
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓							
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓							
Firma operador			Yulian Sanchez		Yulian Sanchez		Yulian Sanchez		Yulian Sanchez							
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES: El día viernes no se realizaron actividades por ser el día del trabajador 01-05-2026

ANEXO 4

PLANILLA CHARLAS Y/O CAPACITACIONES



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	01 / 04 / 26	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Inducción SSTA

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	06/04/26	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:
TEMA:	Identificación de redes existentes.				

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz. Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 08/11/2022

FECHA	05	04	26	HORA DE INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:	
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Acta cerrada y salud del trabajador

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 08/11/2022

FECHA	10	04	26	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Conformidad con el acta anterior

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
CONSORCIO BENDICIÓN 23	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	13 / 04 / 26	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Riesgos de atrapamiento y caidas en excavaciones

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	Luisa Montero
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	Luis Octavio
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	15 04 20	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: levantamiento de cargas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	Luisa Montero
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	16/04/26	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	09:10
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Reunión de lineamientos ambientales a cargo de

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	20	04	26	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Salud mental, Fisica y Emocional

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	22 04 26	HORA DE INICIO:	6:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Señalización preventiva e informativa

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.116.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz. Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	23 / 04 / 26	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Seguridad Vial dentro y fuera de la empresa

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	Kevin Acosta
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	Javier B
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	Hanz Cardona
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
6	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON MEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.823	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	30 / 04 / 26	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	09:10
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Protocolo de rescate y reubicación de fauna

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	1.118.573.622	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	1.019.082.927	MAESTRO DE OBRA	
5	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
6	GARCIA MELOIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
7	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
9	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
10	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
11	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
12	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
13	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
14	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
15	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
16	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
17	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	1.118.563.927	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
18	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
19	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
20	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	7.224.623	INGENIERO RESIDENTE No. 2	
21	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

ANEXO 5

INFORME DE LABORATORIO AGUA SUMINISTRADA PARA HIDRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

INFORME DE RESULTADOS DE ALIMENTOS
422-26

Datos del Solicitante	
Cliente	Agua Pura Super Kristal
NIT/C.C.	47427841-2
Dirección	Carrera 8 N° 22-110
Municipio	Yopal
Teléfono	6356355
Datos de la Muestra	
Municipio de Recolección	Yopal
Dirección de Toma de Muestra	Carrera 8 No. 22 - 110
Lugar de Toma de Muestra	Área de Producción
Tipo de Alimento	Agua Envasada
Cantidad y/o Presentación	18,9L
Marca del Producto	Agua Pura Super Kristal
Registro Sanitario	RSA-0032557-2024
Lote	11-02-2026
Fecha de producción	2026-02-11
Fecha de Vencimiento	2026-03-11
Recolectada por	Aqualim; Luis Fernando Cataño Padilla
Plan y Procedimiento de Muestreo	35-26; PGL-MST-13
Fecha y Hora de Recolección	2026-02-11 07:50
Fecha y Hora de Recepción	2026-02-11 8:45
Fecha y hora de Emisión del Resultado	2026-02-17 14:50

Análisis de Laboratorio

Fecha de Análisis	Parámetro	Resultado	Unidades	Método	Técnica	Norma Agua Envasada Res. 1407:2022
2026-02-13	Mesofilos	0	UFC/mL	SM 9215	Recuento en Placa	-
2026-02-12	Pseudomonas Aeruginosa	<1	NMP/100mL	SM 9213 F MODIFICADO	Sustrato Enzimático Multiceldа	<1
2026-02-12	Escherichia Coli	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1
2026-02-12	Coliformes Totales	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1

Parámetro no Acreditado, ' Parámetros Acreditados por el IDEAM; • Parámetros Subcontratados; •' Parámetros Subcontratados Acreditados ; (ISC): Corresponden a información suministrada por el cliente; SM: Standard Methods for the Examination of Water And Wastewater.

LCM: Límite de cuantificación del método; NMP: Número Más Probable; UFC: Unidades Formadoras de Colonias

OBSERVACIONES:

Cotización 60-26V1; Item 10

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita por AQUALIM. Los resultados son válidos únicamente para las muestras analizadas en el laboratorio AQUALIM. El laboratorio no es responsable del origen o la fuente de donde han sido extraídas las muestras y de la información que sea suministrada por el cliente (ISC) que pueda afectar la validez de los resultados.

AQUALIM se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 1598 de 30 de Julio de 2025 para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.

El laboratorio se abstiene de emitir declaraciones de conformidad.

437

MARCOS MONTOYA GOMEZ
DIRECTOR DEL LABORATORIO
Revisó y Aprobó

Fin del Resultado

LABORATORIO AMBIENTAL
LABORATORIO AMBIENTAL

Carrera 23 No. 19 - 15 Yopal - Casanare
Cel.: 310 349 0629 - 320 301 7075
gerencia@aqualim.com - cotizaciones@aqualim.com
www. aqualim.com

7 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL


Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan de gestión social se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

7.1 ANEXOS

7.1.1 INFORME PARCIAL No. 25 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ANEXOS 7.1

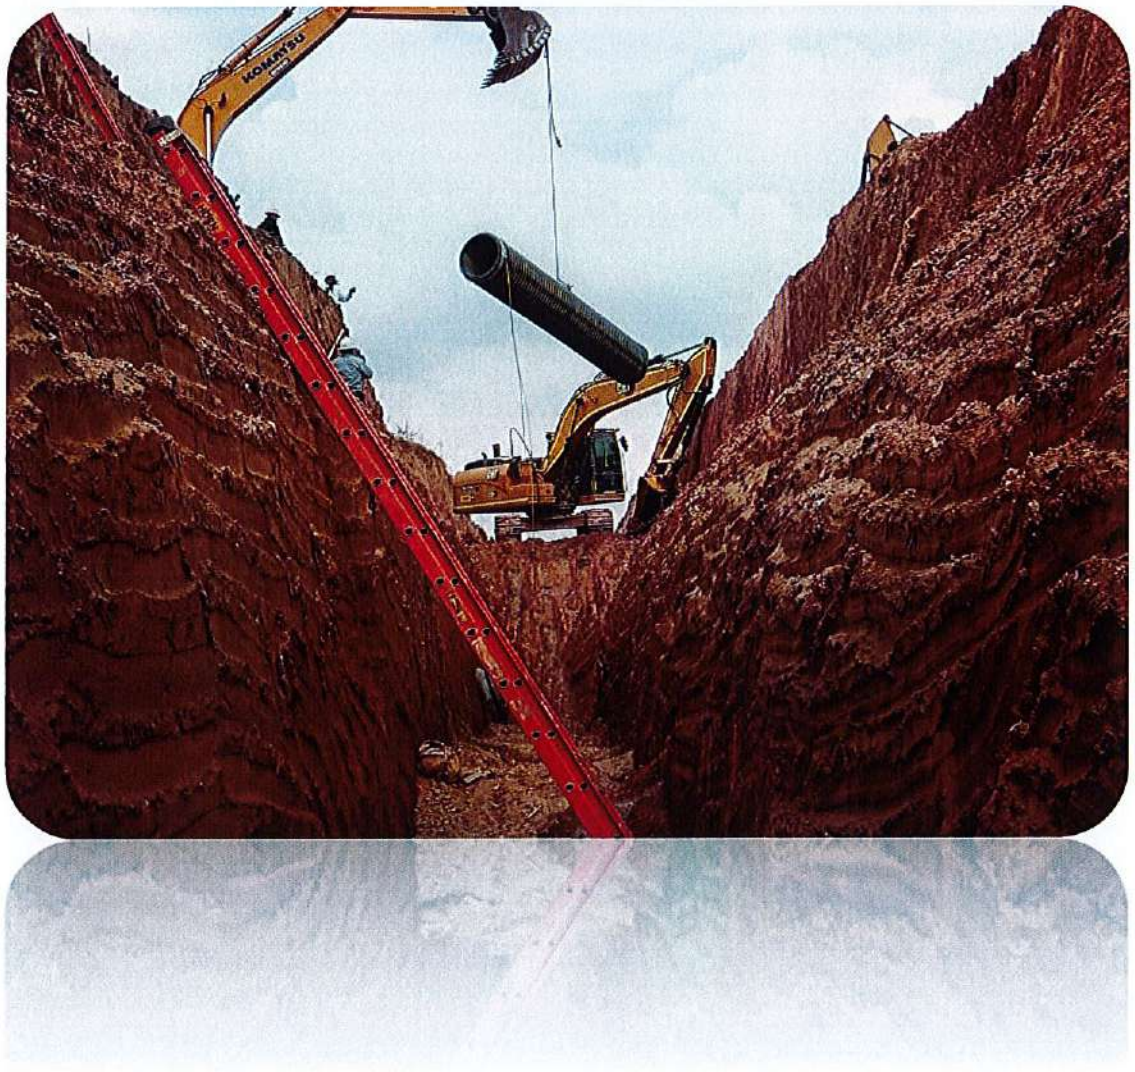

CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 25 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 25 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
1 PRELIMINARES DE OBRA 6
1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 6
1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL 9
1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS 9
2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN 10
2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 10
2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL 14
2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 15
2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 16
2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 17
2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD 18
2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE 18
2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD 18
2.7 VISITA GOBERNACIÓN DE CASANARE 20
2.8 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 22

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto 6
Ilustración 2 Socialización del proyecto 13
Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión 19
Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad 19
Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales 20
Ilustración 6. Visita gobernación y ACUATODOS 21
Ilustración 7. Acta de reunión con propietarios de Alameda 22
Ilustración 8. Reunión veeduría y lideres ALAMEDA con representantes de OBRA, INTER Y SUPERVISIÓN en ACUTODOS SA ESP 24

Ilustración 9. Mesa de trabajo alameda Martha Mojica 25
Ilustración 10. Reunión con comunidad de ciudadela la Bendición para tratar el estado de las vías. 26
Ilustración 11. Reunión con comunidad para atender inquietudes en las instalaciones de ACUATODOS SA 27

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Inventario de establecimientos 7
Tabla 2. Relación de actas de reunión con comunidad en general 27

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas del plan de gestión social durante la etapa constructiva, el cual contiene el acompañamiento y seguimiento a las actividades de comunicación y participación a la comunidad durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, cambios abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector, así como también atender a los intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, el plan de gestión social busca impactar positivamente en la comunidad permitiendo vincularla mediante su participación ciudadana en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma.

El presente documento, será un compendio de las actividades del plan de gestión social realizadas por el contratista a través de todo el desarrollo de la obra, por lo cual, contiene cada una de las actividades ejecutadas e implementadas relacionadas con el plan desde el inicio de la obra.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer procedimientos y estrategias que permitan prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna los impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos que se generen derivados de las obras civiles relacionadas con la **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, así como garantizar la participación activa de la comunidad y promover el reconocimiento, apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- ✓ Dar a conocer el proyecto a ejecutar a la comunidad de La Ciudadela La Bendición y Alameda Martha Mojica, así como las actividades que se desarrollaran antes, durante y después de la obra.
- ✓ Socializar a la comunidad sobre el inicio de la ejecución del proyecto, así como informar todos los aspectos técnicos y generalidades del mismo junto con los actores y entidades públicas involucradas.
- ✓ Dar respuesta de manera oportuna a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto.
- ✓ Dar claridad frente a la vinculación de mano de obra local y los aspectos a tener en cuenta sobre la misma para así evitar la creación de las falsas expectativas por la demanda laboral con ocasión a la ejecución del proyecto.
- ✓ Ser responsable con las actividades a ejecutar sobre el espacio público, socializando las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de éste y respetando su uso.
- ✓ Disminuir al máximo el impacto generado en el tráfico y en los distintos actores viales por las labores constructivas que se desarrollan en el sector.
- ✓ Establecer estrategias que permitan minimizar la afectación de viviendas por el tránsito de maquinaria pesada.
- ✓ Mantener informadas a las comunidades y demás actores que intervengan en el desarrollo del proyecto en cuanto a las medidas de manejo ambiental.
- ✓ Evitar especulaciones y desinformación de la comunidad frente al proyecto y sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.

1 PRELIMINARES DE OBRA

1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

El área de estudio corresponde al asentamiento humano denominado Ciudadela La Bendición y la zona suroccidental, la cual se encuentra ubicada al sur del casco urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a 3.8 km de distancia, partiendo de la Diagonal 47, sobre la vía que conduce al Centro Poblado de Santa Fe de Morichal, limita al Norte con la Comuna VI y Oriente con el Caño Usivar, tiene una extensión de 745.794,30 m².

Ilustración 1 Localización del proyecto

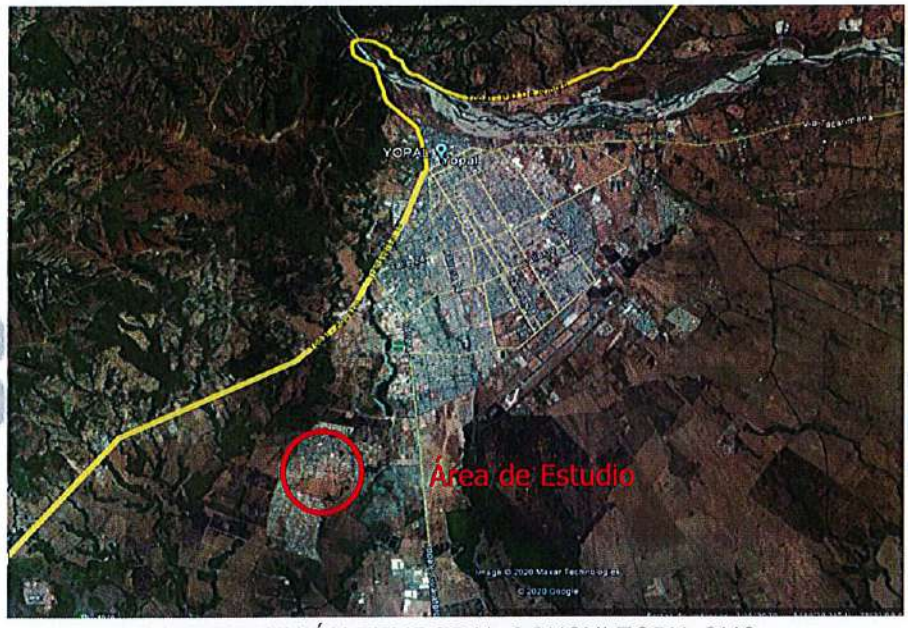

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Para la realización del diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se inició con una inspección ocular en el sector de ciudadela la bendición en donde se identificó que no existen industrias o fábricas de ninguna clase, en consecuencia, no hay generación de aguas residuales industriales.

Se observó y cuantificó que el sector comercial de la Ciudadela La Bendición lo conforman establecimientos de comercio tales como: supermercados, tiendas, expendio de carnes, restaurantes, peluquerías, bares, talleres y panaderías; donde el establecimiento que más prevalece su economía son las tiendas, ya que ocupa el 32.53% de la totalidad de la zona comercial.

En total se cuantificaron ochenta y tres (83) establecimientos comerciales, A continuación, se ilustra en la Tabla *1.* Inventario de establecimientos, el conteo de establecimientos comerciales realizados en la Ciudadela La Bendición.

Tabla 1. Inventario de establecimientos

ESTABLECIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Tiendas	27	32,53%
Supermercados	15	18,07%
Talleres	11	13,25%
Expendio de carnes	10	12,05%
Restaurantes	6	7,23%
Bares	6	7,23%
Panaderías	5	6,02%
Peluquerías	3	3,61%
TOTAL	**83**	**100,00%**

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Además, en el diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se identificaron áreas públicas existentes tales como parques, vías, andenes, antejardines senderos peatonales, mobiliario urbano (bancas, señalización luminarias) y se determinó el estado actual zonas recreativas o zonas verdes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de senderos en la zona directa del proyecto

REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de andenes en la zona directa del proyecto




Identificación de mobiliario urbano en la zona directa del proyecto



Identificación de establecimientos comerciales en la zona directa del proyecto



Identificación de antejardines en la zona directa del proyecto

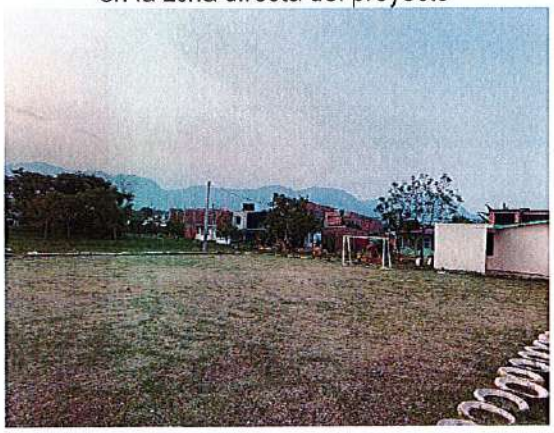

Identificación de zonas verdes y parques recreativos en la zona directa del proyecto

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Cabe resaltar que los trabajos de obra contemplan la intervención de calzadas, igualmente se pueden presentar alteraciones en la prestación de los servicios públicos, el acceso a las viviendas, garajes, además se pueden presentar riesgos de accidentes, razón por la que se hace necesario formular acciones que permitan mitigar los impactos de carácter negativo, a fin de evitar en la etapa constructiva del proyecto genere molestias en la comunidad.

1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL

1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS

Veeduría ciudadana: Mediante correo electrónico emitido el lunes 15 de enero de 2024 la veeduría ciudadana La Bendición envió carta de presentación al consorcio, realizando la presentación de su objeto el cual corresponde a "CONTROL SOCIAL A LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y ADMINISTRACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, LA GOBERNACION DE CASANARE, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) Y LOS DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES EN LO RELACIONADO CON LA ESCRITURACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIUDADELA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a la Resolución No. 067 de 2020 emitida por la personería de Yopal. Manifestaron en la carta de presentación el deber que los asiste a realizar control social a la ejecución e inversión de los recursos públicos en beneficio de la comunidad de la Ciudadela La Bendición.

2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN

2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

FECHA DE LA SOCIALIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR: CIUDADELA LA BENDICIÓN

HORA: 6:30 PM A 9:00 PM

ASISTENTES MESA PROTOCOLARIA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Julio Cesar Cuevas Jiménez	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S. P
Leonardo Cárdenas Niño	Director del proyecto	Obra- Consorcio Bendición 23
Fabian Leonardo Carreño	Profesional de apoyo	Obra- Consorcio Bendición 23
Gabriel Andrés Durán Moreno	Coordinador de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
Boris Andrés Roa Pineda	Director de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S. P
Ociel Ortiz Zuluaga	Concejal-representante de la comunidad	Concejo Municipal de Yopal
Pedro Felipe Becerra Vargas	Concejal	Concejo Municipal de Yopal
Elmer Dumar Montaña Torres	Concejal	Concejo Municipal de Yopal
Wilder Andrés Ávila	Diputado	Asamblea Departamental de Casanare

OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACIÓN: Realizar la socialización del proyecto que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación de los asistentes de la mesa protocolaria.
2. Himnos de Colombia, Casanare y Yopal.
3. Palabras de bienvenida, descripción general del proyecto por parte del subgerente Técnico y Operativo de ACUATODOS S.A. E.S.P, Julio Cesar Cuevas Jiménez
4. Presentación del proyecto, fases, alcance total del mismo y aspectos a tener en cuenta para la vinculación de la mano de obra local por parte del Contratista, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño.
5. Intervención por parte del coordinador de interventoría, el ingeniero Gabriel Andrés Durán Moreno.
6. Intervención por parte del concejal y representante de la comunidad de la Bendición Ociel Ortiz Zuluaga.
7. Intervención por parte del concejal Pedro Felipe Becerra Vargas, Elmer Dumar Montaña Torres y el diputado Wilder Andrés Ávila.
8. Intervención por parte de veeduría, ediles, presidentes de juntas de acción comunal, lideres sociales y representantes de la comunidad de La ciudadela La Bendición, Alameda Martha Mojica y San Rafael de Morichal.
9. Despedida.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

Se da inicio a la socialización siendo las 6:30 pm con la presentación de todos los asistentes en la mesa protocolaria mismos que se relacionan en el cuadro de asistentes.

El ingeniero Julio Cesar Cuevas Jiménez subgerente técnico y operativo de la empresa contratante ACUATODOS S.A. E.S.P manifiesta a la comunidad y los asistentes a la socialización el valor total de los recursos invertidos que corresponden al contrato de obra pública, al contrato de consultoría para la interventoría y al contrato de apoyo a la supervisión, manifiesta que ACUATODOS S.A E.S.P empresa contratante será exigente para que así se garantice que las obras se cumplan en su totalidad y se cumplan la normatividad y los aspectos técnicos propuestos.

Realiza su intervención el contratista de obra, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño en calidad de director del proyecto, inicia describiendo la información general del proyecto correspondiente al objeto del contrato, valor total del proyecto y de sus contratos derivados, plazos de ejecución y fuente de financiación, realizó la descripción de los capítulos principales y el alcance de la obra, constituidas en la construcción de la EBAR, construcción de pozos y cámaras de inspección, instalación de tubería sanitaria y la instalación de la tubería de impulsión, indicó los aspectos a tener en cuenta en las situaciones asociadas a la ejecución del contrato como la vinculación de la mano de

obra local, dio a conocer los canales oficiales para la atención al público en general y finalmente dio a conocer el diseño de la valla informativa del proyecto, además de realizar una explicación de las fases de intervención del proyecto que se tienen proyectadas.

A continuación, se relacionan algunos de los aspectos más relevantes de la presentación del contratista:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO BPIN	2023005850036
NOMBRE:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
APROBACION:	DECRETO DEPARTAMENTAL 0358 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR:	$ 88.842.008.646.00
FUENTES DE FINANCIACION:	$ 88.842.008.646.00 (100%) – REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION
ENTIDAD EJECUTORA:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
PLAZO DE EJECUCION	26 MESES

CONTRATOS DEL PROYECTO

OBRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
VALOR:	$ 83.611.009.207,00
PLAZO DE EJECUCION:	24 MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATOS DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 042 DE 2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO PR-HK
VALOR:	$ 5.097.882.690,00
PLAZO DE EJECUCION:	25 MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATOS DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 040 DE 2023
OBJETO:	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
CONTRATISTA:	ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA
VALOR:	$ 130.690.560,00
PLAZO DE EJECUCION:	25 MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE MARZO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

DESCRIPCIÓN DE CAPITULOS PRINCIPALES

ITEM	DESCRIPCION
CAP-1	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS
CAP-2	EMISARIOS ENTREGA EBAR
CAP-3	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Ejemplos de trabajos a realizar:



Atención a la comunidad

CONTRATISTA DE OBRA

Consorcio BENDICIÓN 23
Director de proyecto: Leonardo Ariel Cárdenas Niño
Contacto: 3248217830
Atención al público: Vía San Rafael de Morichal con calle 79
Correo: consorciobendicion23@theos.com.co

INTERVENTORÍA

Consorcio PR-HK
Coordinador de interventoría: Gabriel Andrés Duran Moreno
Contacto: 3219726100
Atención al público: Carrera 7 Oeste con Calle 67 Ciudadela la Bendición
Correo: consorcioprhk@proycon.com.co

ENTIDAD CONTRATANTE

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P.
Profesional apoyo a la supervisión: Roberto Andrés Ríos
Correo: contactenos@espacuatodos.gov.co

El coordinador de interventoría realiza su intervención, socializa a los asistentes los canales de comunicación y manifiesta que estará en disposición de atender cualquier asunto relacionado con el control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra.

El concejal Ociel Ortiz realiza su intervención, manifiesta a la comunidad la importancia y magnitud del proyecto, manifiesta servir a la comunidad como veedor del cumplimiento del contrato estipulado, así como de velar por el cumplimiento de la vinculación de la mano de obra local, del mismo modo los demás concejales y el honorable Diputado manifestaron el compromiso de velar por el desarrollo oportuno y legal de este proyecto.

La comunidad representada por los respectivos ediles, presidentes de juntas, veeduría entre otros manifestaron la importancia de la vinculación de la mano de obra local e indicaron que estarán atentos al cumplimiento general del contrato en todas sus fases.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ilustración 2 Socialización del proyecto









2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL

El día 20 de febrero de 2024 luego de la socialización inicial del proyecto se programó una reunión con la comunidad de ciudadela La Bendición y beneficiarios del proyecto Alameda Martha Mojica en donde se les informó el proceso de vinculación de mano de obra local calificada y no calificada, se les menciono que para mayor organización en el proceso de recepción de hojas de vida se debe hacer la entrega en el punto de atención a la comunidad, ubicado en el campamento de obra, además se le menciono a la comunidad de AMM que si es posible eligieran a una persona como vocero(a) de los beneficiaros de este sector para mantener información constante con la persona designada y fuera está la encargada de transmitir la información a los demás en aras de brindar organización y claridad en el proceso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN CON LA COMUNIDAD SOBRE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL



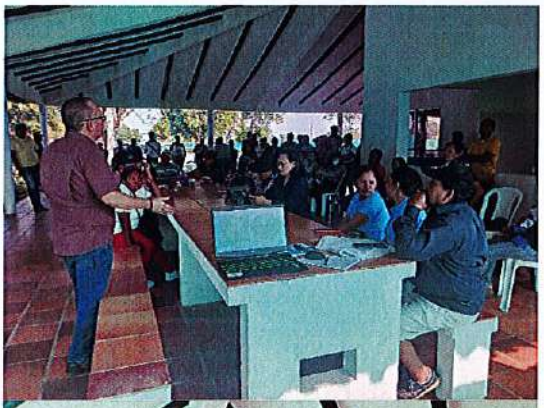




2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA


El día 28 de febrero de 2024 se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto en la vía que conduce a San Rafael de Morichal entrada principal de Alameda Martha Mojica con las especificaciones técnicas y diseño suministrado por ACUATODOS S.A E.S.P.



FUENTE: AUTOR, 2024

2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La oficina destinada para la atención a la comunidad se encuentra ubicada en la vía San Rafael de Morichal con calle 79 en la cual el profesional del área social atenderá, recibirá y tramitará todos los PQRS que sean radicados con ocasión de la ejecución del proyecto.

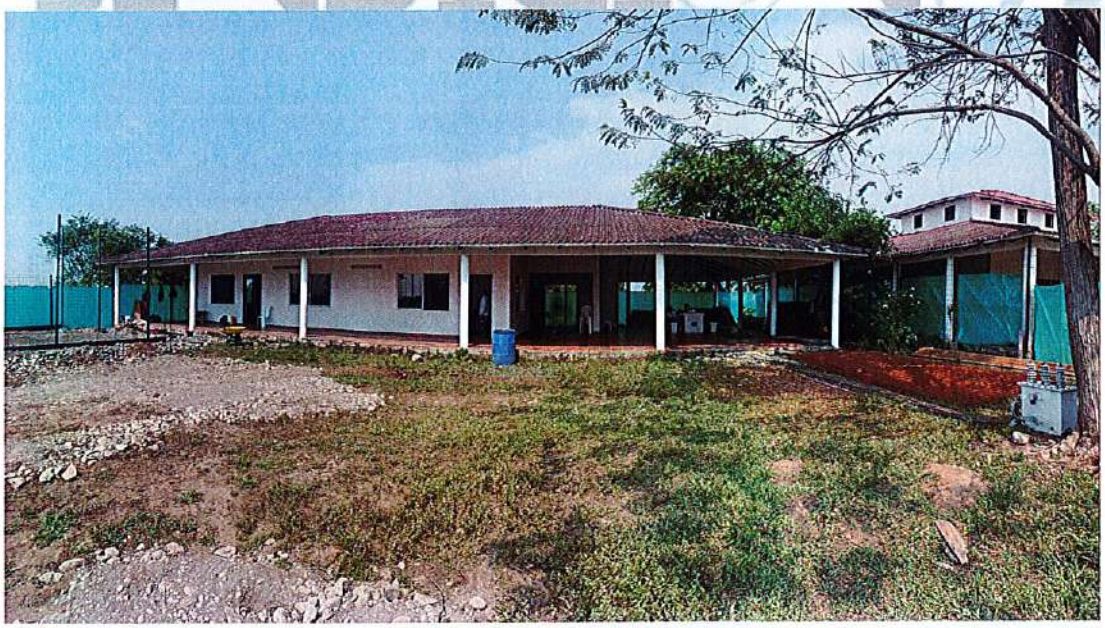


FUENTE: AUTOR, 2024

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de información, quejas y reclamos presentados por la comunidad o las autoridades competentes relacionadas con la actividad del proyecto, se realiza la instalación de un buzón de sugerencias el cual está dotado de un formato de sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes que podrá diligenciar cualquier persona natural o jurídica con el fin de exponer sus opiniones, inquietudes o solicitudes con respecto al desarrollo de la obra.

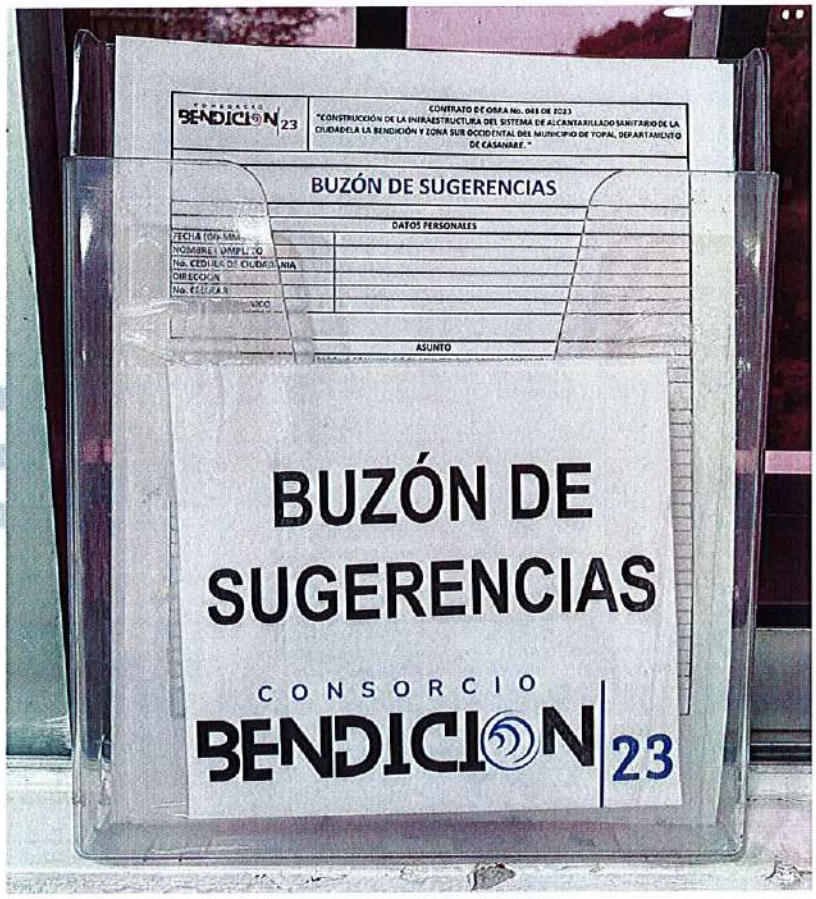

FUENTE: AUTOR, 2024

2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD

QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	-	-	-	
ENVIADAS	-	-	-	
SEGUIMIENTO	-	-	-	

2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE

FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVÍA	ASUNTO	SE LE DIO TRAMITE (SI, NO)	¿CUAL?
-	-	-	-	-

2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD

El proyecto estaba progresando sin inconvenientes hasta el miércoles 13 de marzo de 2024, cuando, lamentablemente, se presentó un incidente. Un grupo de personas ingresó sin autorización al área designada para las excavaciones de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) aproximadamente a las 8:00 a.m. Este evento inesperado provocó una interrupción en el flujo normal de las operaciones y las actividades de construcción se vieron afectadas temporalmente.

La oposición de este grupo de personas al proyecto llevó al CONSORCIO BENDICION 23 a tomar medidas preventivas para salvaguardar sus recursos. En respuesta a la invasión del sitio de construcción, el consorcio actuó con prontitud y retiró la maquinaria que estaba en uso para evitar daños o complicaciones adicionales. Esta acción refleja un compromiso con la seguridad y la gestión de riesgos, así como con la resolución de conflictos de manera pacífica y eficiente. Pasados los días, con diálogos entre la comunidad y las entidades gubernamentales se llegó a un común acuerdo que permitió la reanudación de las actividades el día 20 de marzo de 2024.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión





- **SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTAS DE VECINDAD**

El día 26 de marzo de 2024 se realizó una socialización con la comunidad para informar el inicio del llenado de los formatos de actas de vecindad con el fin de verificar el estado actual de las viviendas antes de iniciar actividades de obra, con esto, se pretende establecer posibles responsabilidades por afectaciones a las viviendas después de la intervención de cada tramo.

Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad





- **REUNIÓN CON LA COMUNIDAD PARA TRATAR TEMA DE LA EBAR**

El 18 de abril del año en curso se realizó una reunión pactada con la comunidad donde se contó con la presencia del Gobernador de Casanare, Cesar Augusto Ortiz Zorro en el que se escuchó a la comunidad y se llegó a un común acuerdo.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales



2.7 VISITA GOBERNACIÓN DE CASANARE

El sábado 06 de Julio del año en curso se realizó una visita por parte de la gobernación de Casanare y de ACUATODOS S.A ESP, donde se contó con la presencia del señor gobernador Cesar Ortiz Zorro y el gerente de la empresa departamental de servicios públicos ACUATODOS SA ESP el ingeniero Julio Cesar Cuevas, representantes de la dirección técnica de obra e interventoría. Se visitaron todos los frentes de obra con el fin de verificar el avance del proyecto 041 de 2023.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 6. Visita gobernación y ACUATODOS













2.8 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

El 24 de septiembre de 2024 se llevó a cabo una reunión en la comunidad de Alameda Martha Mojica, con el propósito de informar a los propietarios de los lotes en la zona nororiental de Alameda acerca de la necesidad de reubicar las cercas que demarcan los linderos de cada predio, especialmente los que se encuentran por la carrera 7 Oeste. Esto es necesario debido a que algunos lotes están invadiendo la vía pública. Durante la reunión, la comunidad mostró su comprensión y apoyo a la solicitud, comprometiéndose no solo a reubicar las cercas, sino también a marcar cada lote con su respectivo número y manzana para una mejor organización y delimitación de los terrenos.

Ilustración 7. Acta de reunión con propietarios de Alameda

CONSORCIO BENDICIÓN 23 — ACTA DE REUNIÓN — VERSIÓN 1

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE INICIO:
24 - 09 - 2024	4:00 AM ☐ PM ☑	: AM ☐ PM ☐

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Carrera 7 Oeste Alameda Martha Mojica

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Traslado de Cercas y notificación a líderes y Comunidad en general

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Victor Ramirez Vago	Residente Obra	Consorcio Bendición
2	Angela Montañez	Insp interventoria	Consorcio PP-IH
3	[illegible]	Asesor Ete 2	A M M.
4	[illegible]	ADM ET. 3	AMM
5	[illegible]	ADM ET 1	A.M.M.
6	VEEDURIA.	REPRESENTANTE	VEEDOR.
7	Rosa Yolanda Abril M.	ADH Suplente 2	AM M.
8	Doris Castrillo Gonzalez	Beneficiaria M2	A M M
9	Maibel Maldonado T.	Beneficiaria	A M M
10	Doris Maria Pinzon	Beneficiaria	AMA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Notificar el traslado de las Cercas de la Carrera 7 Oeste sobre calzada Martha Mojica 1-2 y 3

ORDEN DEL DÍA:

Primero = Presentacion del Personal Responsable de obra y Comunidad

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23 — ACTA DE REUNIÓN — VERSIÓN 1

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Segundo: Explicación del tema
Tercero: Socialización y Sugerencias de la Comunidad

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hizo la explicación del porque se debe mover las Cercas de algunos predios sobre la carrera 7 oeste. Son el fin de salvaguardar el estado de las Cercas existentes.
El Contratista de obra notifica que realizara el traslado de Cerramiento existente
La Comunidad sugiere y recomienda Marcar los Postes por numero de lote y manzanas.
La Comunidad da la posibilidad de que los propietarios que deseen retirar ellos y salvaguardar el cerramiento. Sea posible.
La Comunidad recomienda referenciar los mojones de cada Cerramiento.

El 26 de febrero de 2025 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS SA ESP. Este encuentro contó con la presencia de varias figuras claves, tales como el gerente de ACUATODOS SA ESP, el ingeniero Julio Cesar Cuevas; el supervisor del contrato 041 de 2023, el ingeniero Robert Asís Hernández Cachay; el apoyo a la supervisión, el ingeniero Roberto Andrés Ríos Figueroa; el gerente del contrato 041 de 2023, el arquitecto Leonardo Cárdenas; el representante legal de la Veeduría denominada "ALAMEDA MARTHA MOJICA", el señor Carlos Wilson Salazar, representantes de la interventoría y los líderes de las diferentes etapas de Alameda Martha Mojica.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

El objetivo principal de esta reunión fue esclarecer y definir los canales de comunicación que deben mantenerse entre la comunidad general de ALAMEDA y los propietarios de los lotes de la zona. Además de este propósito central, también se abordaron otros temas técnicos relevantes para el proyecto, tales como los avances actuales de la obra, especificaciones técnicas, y otros aspectos clave que necesitan atención para asegurar el progreso exitoso del proyecto. De esta manera, todos los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, plantear sugerencias y recibir información detallada sobre el estado y proyecciones de la obra.

Esta reunión fue crucial para garantizar una comunicación eficaz y fluida entre todas las partes involucradas, asegurando así que todos los interesados estén informados y puedan colaborar de manera coordinada para el éxito del proyecto en Alameda Martha Mojica

Ilustración 8. Reunión veeduría y lideres ALAMEDA con representantes de OBRA, INTER Y SUPERVISIÓN en ACUTODOS SA ESP



El día domingo 9 de marzo de 2025 tuvo lugar una mesa de trabajo organizada con la comunidad de Alameda Martha Mojica. Este encuentro se llevó a cabo con el propósito principal de atender las inquietudes que los miembros de la comunidad habían expresado en relación al proyecto en cuestión. Durante la reunión, se generó un espacio de diálogo y participación, buscando brindar claridad y resolver todas las dudas planteadas por los asistentes. Este tipo de iniciativas refuerzan la importancia de la comunicación abierta y la colaboración entre la comunidad y las partes involucradas en el desarrollo del proyecto.

En este encuentro, se brindó un espacio abierto para escuchar las opiniones, preocupaciones e inquietudes de la comunidad en general. Se fomentó un ambiente de participación activa donde cada miembro tuvo la oportunidad de expresar sus puntos de vista y plantear sus dudas sobre el proyecto. Todas las inquietudes generadas fueron atendidas con el compromiso de ofrecer respuestas claras y satisfactorias, fortaleciendo así la comunicación y el entendimiento mutuo entre los asistentes y las partes responsables del proyecto.

Ilustración 9. Mesa de trabajo alameda Martha Mojica



El 22 de abril de 2025 se llevó a cabo una importante reunión en la Ciudadela La Bendición, en la que participaron diversos actores clave para abordar la problemática del estado de las vías en la comunidad. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la comunidad, contratistas de obra, el equipo de interventoría y personal del banco de maquinaria de la Gobernación de Casanare.

El propósito de la reunión fue generar un espacio de diálogo y concertación para buscar soluciones viables y efectivas que permitan mejorar el estado actual de las vías en la Ciudadela La Bendición. A lo largo de la jornada, los asistentes expusieron sus preocupaciones y necesidades, resaltando la importancia de contar con vías en óptimas condiciones para garantizar la movilidad de los habitantes y el acceso a servicios esenciales.

Este acercamiento fue clave para fortalecer el compromiso de las autoridades y las entidades responsables con la comunidad. Se discutieron posibles estrategias y planes de acción que permitirían ejecutar intervenciones necesarias en el menor tiempo posible. Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener un canal de comunicación abierto y constante entre los involucrados para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la eficacia de las soluciones planteadas.

En conclusión, la reunión representó un paso fundamental para atender las necesidades de la Ciudadela La Bendición en materia de infraestructura vial, consolidando el trabajo conjunto entre la comunidad y las entidades responsables para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 10. Reunión con comunidad de ciudadela la Bendición para tratar el estado de las vías



El 24 de abril de 2025 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS S.A. E.S.P., con la participación de diversos actores clave en el desarrollo y supervisión de obras de infraestructura. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la supervisión, contratistas de obra, el equipo de interventoría y miembros de la veeduría Alameda Martha Mojica liderada por el señor Carlos Salazar en calidad de representante legal.

El propósito de la reunión fue atender y resolver inquietudes técnicas planteadas por los veedores en relación con algunas estructuras de pozos que presentaban signos de socavación. Durante la jornada, el contratista de obra respondió a cada una de las dudas expuestas, proporcionando explicaciones detalladas sobre las condiciones de las estructuras y las medidas correctivas que se implementarían para garantizar su estabilidad y seguridad.

Este espacio de diálogo permitió fortalecer la relación entre la comunidad y los responsables de la obra, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada para asegurar la calidad y

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

durabilidad de las intervenciones. Como resultado del encuentro, se establecieron compromisos concretos orientados a mejorar la estabilidad de las estructuras y garantizar que, al momento de la entrega de la obra, se cumplan los estándares de calidad exigidos.

La reunión representó un paso significativo en el proceso de supervisión y control ciudadano, asegurando que las inquietudes de la comunidad sean atendidas de manera efectiva y que las obras se desarrollen con transparencia y responsabilidad.

Ilustración 11. Reunión con comunidad para atender inquietudes en las instalaciones de ACUATODOS SA



Con el objetivo principal de responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades manifestadas por la comunidad, se han establecido espacios permanentes de escucha activa, en los cuales se reciben, analizan y atienden cada una de las inquietudes y problemáticas que afectan directamente a los habitantes. Esta estrategia busca facilitar un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas, fortaleciendo así la comunicación y promoviendo una convivencia sana y armoniosa durante el desarrollo de las actividades contempladas en el presente contrato:

Tabla 2. Relación de actas de reunión con comunidad en general

ACTA No.	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
1	09/07/2025	Socialización de trabajos de instalación de colectores	Se informa a la comunidad la ruta a seguir para el mes de Julio 2025	N/A
2	09/07/2025	Atención a la comunidad y verificación técnica de materiales	Supervisión e interventoría aprueban el uso del ladrillo	Fortalecer atención a la comunidad y gestión social
3	09/07/2025	Visita a campo con comunidad	Se realiza visita por los frentes de obra y se identifican algunos daños a revisar por parte del contratista de obra	La comunidad se compromete a realizar un listado de pendientes al contratista de obra

Ver anexo 5.14.15, Actas de reunión del informa parcial de obra No. 16

Ilustración 12 Reunión con comunidad en general





De igual forma, con el propósito de transmitir la información a la comunidad de manera clara, directa y oportuna, se realizan visitas puerta a puerta en los sectores específicos que serán intervenidos en los próximos días. Durante estas jornadas, se comunica a los residentes sobre la presencia de maquinaria pesada, obreros y demás personal técnico necesario para ejecutar actividades tales como la construcción de acometidas domiciliarias y pozos de inspección. Esta estrategia busca preparar adecuadamente a los habitantes del sector para minimizar inconvenientes, resolver inquietudes previas y garantizar que las labores se desarrollen en un ambiente de entendimiento y cooperación mutua.



Ilustración 13 Visitas de socialización de actividades del contrato de obra





Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare



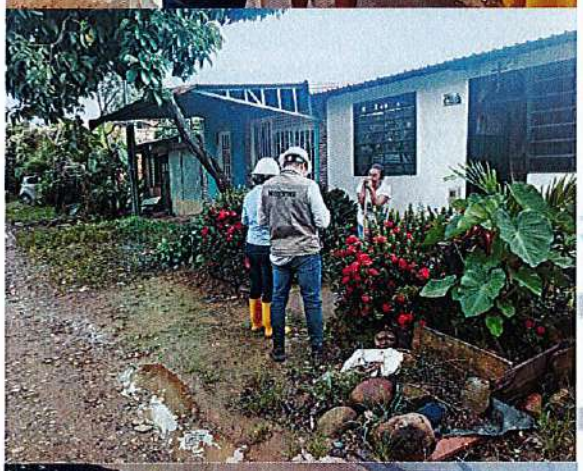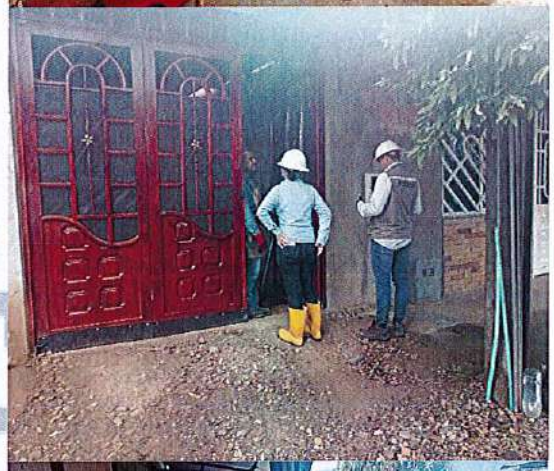





El día 18 de diciembre del año 2025 se llevó a cabo una visita de la comunidad del sector Ciudadela La Bendición a los diferentes frentes de obra vinculados a la ejecución del contrato No. 048 de 2023. Esta actividad fue coordinada entre el contratista, la interventoría y los representantes de la comunidad, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre las partes interesadas en el proyecto y fomentar un ejercicio de veeduría y transparencia frente al desarrollo de las obras.

Durante el recorrido, se presentó a los asistentes el estado actual de avance del proyecto, explicando de manera detallada las actividades que se han venido ejecutando en cada frente de trabajo, los componentes intervenidos y los resultados obtenidos hasta la fecha. De igual forma, se socializaron las principales dificultades que han incidido en el cronograma, particularmente aquellas asociadas al retraso en la ejecución de algunas actividades, derivadas de factores operativos, climáticos y logísticos, con el fin de que la comunidad comprendiera el contexto real en el que se ha desarrollado la obra.

Finalmente, se informó a la comunidad que, en atención a la temporada de fin de año, las actividades de campo se suspenderían temporalmente a partir del día 24 de diciembre, retomándose nuevamente el día 5 de enero de 2026. Esta programación fue debidamente explicada, aclarando que la pausa corresponde a una interrupción operativa prevista, y que una vez reiniciadas las labores se continuará trabajando en el cumplimiento de las metas físicas y contractuales establecidas.

Ilustración 14 Visita de la comunidad del sector Ciudadela La Bendición

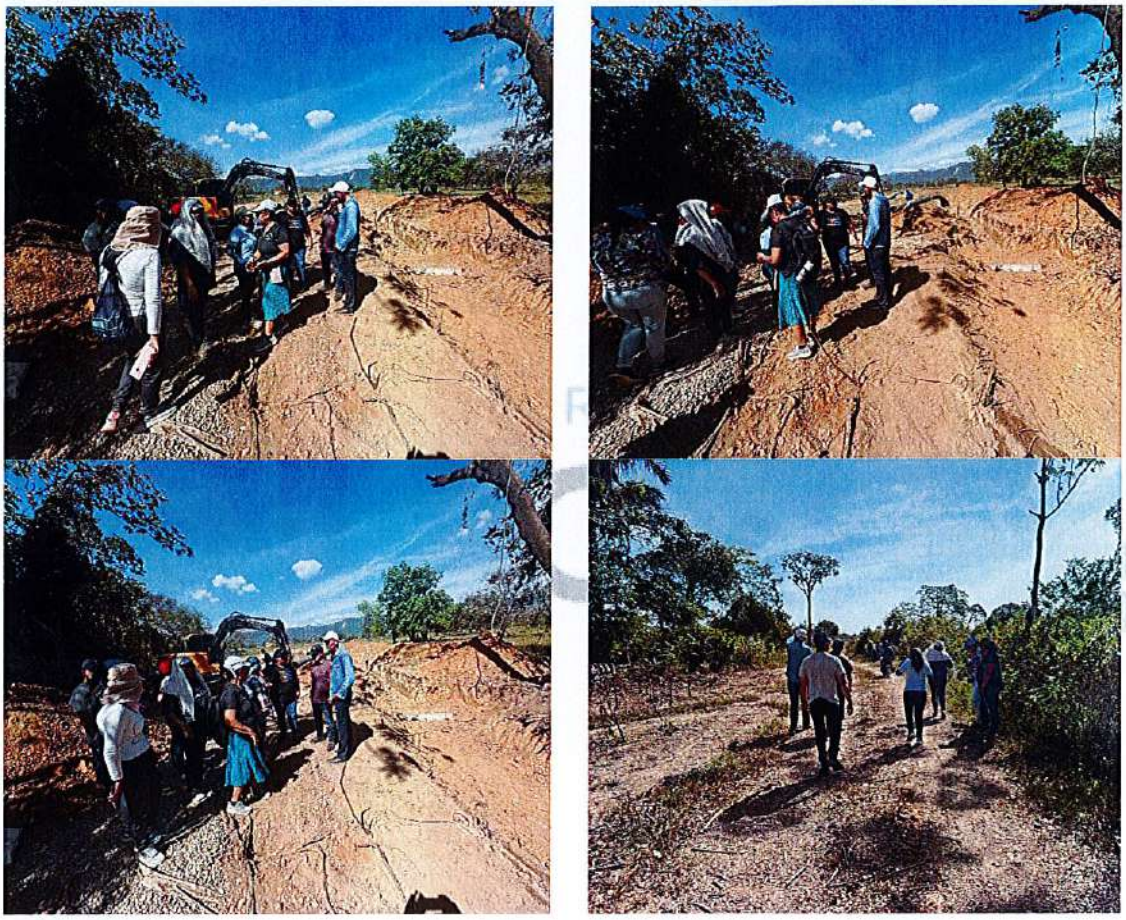

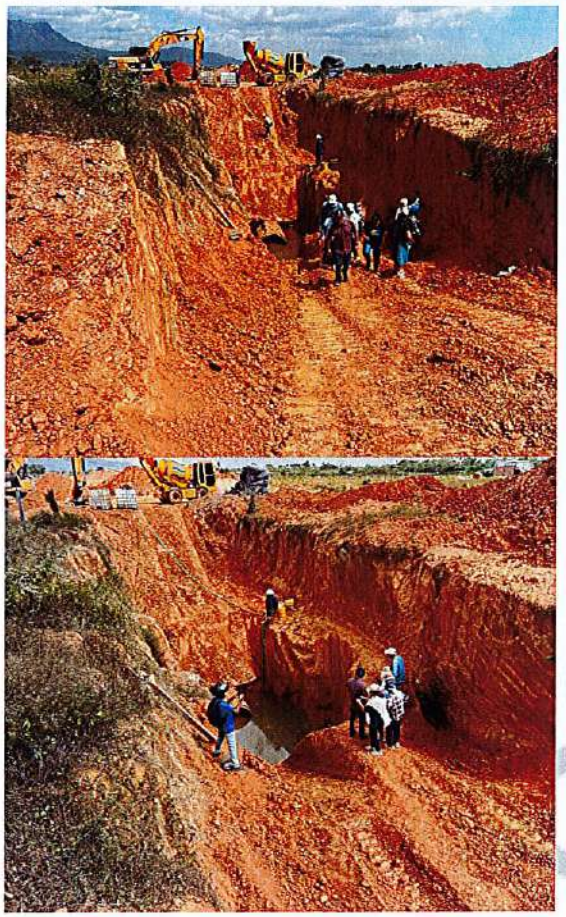





El 12 de febrero de 2026 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS S.A. E.S.P., con el propósito de atender las inquietudes presentadas por la comunidad de Ciudadela La Bendición y del sector Alameda Martha Mojica, relacionadas con la ejecución del Contrato de Obra No. 041 de 2023. En la reunión participaron representantes de ACUATODOS, el contratista de obra, la interventoría y delegados de la comunidad.

Durante el desarrollo de la reunión se socializó el estado actual del proyecto y su avance, indicando que las actividades se ejecutan conforme a la programación establecida. También se informó a la comunidad sobre la prórroga contractual por seis meses, explicando que esta responde a condiciones técnicas presentadas durante la ejecución de la obra, como el alto nivel freático en las zonas de intervención, que ha requerido mayores tiempos operativos para excavaciones, control y bombeo de agua.

Adicionalmente, se expusieron otras situaciones que incidieron en la ampliación del plazo, como demoras en la fabricación y entrega de equipos electromecánicos para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR). Durante la reunión se presentaron evidencias fotográficas de las

condiciones encontradas en campo y se explicó el manejo técnico que se viene implementando para garantizar la continuidad de las obras.

Ilustración 15 Reunión con la comunidad de Ciudadela La Bendición y del sector Alameda Martha Mojica





El día 26 de marzo del año 2026 se sostuvo una reunión con la comunidad de Alameda Martha Mojica frente a las instalaciones de la EBAR.

Durante la mesa de trabajo con la comunidad del sector Alameda Martha Mojica, se abordó como punto crítico la seguridad ciudadana ante la falta de tapas en pozos de inspección y cajas de registro, situación que el contratista atribuyó al hurto recurrente por vandalismo pese a haber instalado algunas unidades y aplicado medidas de fijación, decidiendo postergar la instalación definitiva para la etapa final de la obra mientras se refuerza la señalización preventiva y las inspecciones semanales. Paralelamente, se expuso una problemática técnica de alta complejidad debido a la falta de planos récord y la existencia de diseños desfasados de las redes de acueducto y gas, lo cual ha generado interferencias en las excavaciones y riesgos de daño a la infraestructura, por lo que se solicitó el acompañamiento técnico formal de las empresas prestadoras y de la entidad ASISURPO para mejorar la articulación en campo. Finalmente, el contratista reafirmó su compromiso de iniciar mejoramientos viales y paisajismo una vez concluyan las obras civiles, informando además el cierre de la ruta crítica en Ciudadela La Bendición para priorizar los frentes de trabajo en Alameda Martha Mojica antes del inicio de la temporada de lluvias, quedando pendiente la evaluación operativa para apoyar a la comunidad con maquinaria en actividades de mejoramiento vial gestionadas ante la Gobernación.



Firma:

Yolima Hurtado P.

PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
YOLIMA HURTADO PINEDA
C.C. 46.364.728 DE SOGAMOSO

8 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto se aprobó según resolución No. 01504 DEL 26 DE ENERO DE 2024, se actualiza por segunda vez su vigencia mediante resolución No. 05224 DEL 30 DE MAYO DE 2024, se actualiza por tercera vez mediante resolución No. 08247 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 y se actualiza por cuarta ver mediante resolución 05570 del 02 de Julio de 2025 y se actualiza por quinta vez mediante resolución 01164 de 04 de febrero de 2026 "Por la cual se concede permiso para cierres totales y parciales de vías urbanas del municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCODENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

8.1 ANEXOS

8.1.1 INFORME PARCIAL No. 25 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ANEXOS 8.1



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 25 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 25 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT

PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
MAYO 2026
ORIGINAL

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
1.1 FICHA TECNICA 5
2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6
2.1 TRAMOS A INTERVENIR 7
2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA 9
2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS 9
2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO 9
3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 10
3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA 10
3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 11
4 AVANCE PRESUPUESTO PMT 13
5 CONCLUSIONES 15

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto 5
Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM 7

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular 10
Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación 11
Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de parcial 25 15

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 del 15 de noviembre de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 para la implementación del Plan de Manejo de Transito durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca garantizar y brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, implementando las estrategias y alternativas establecidas en el Plan de Manejo de Transito- PMT para la regulación del tránsito y necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías causado por la ejecución de la obra.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mitigar el impacto generado por las obras durante la construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Generar el menor impacto en la movilidad en los tramos viales intervenidos para la ejecución de la obra
- ✓ Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- ✓ Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- ✓ Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
- ✓ Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito.
- ✓ Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de la obra en ejecución.

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TECNICA

Tabla 1. Información general del proyecto

CONTRATO DE OBRA No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
DIRECTOR DE OBRA:	ING. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
RESIDENTE DE OBRA:	ING. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 83.611.009.207,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%):	$ 41.805.504.603,50
PLAZO INICIAL:	VEINTICUATRO (24) MESES
PLAZO PRÓRROGA No. 1:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PR-HK R/L OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
DATOS DEL CONSORCIO	
DIRECCIÓN	CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4
TELÉFONO	6334412
CORREO ELECTRÓNICO	consorciobendicion23@theos.com.co

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Las actividades a desarrollar para efectos del cumplimiento del objeto del presente proyecto son las siguientes:

- Construcción de redes de alcantarillado sanitario
- Construcción pozos de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción cámaras de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado
- Construcción de estación de bombeo de aguas residuales (EBAR)
- Instalación de tubería a presión para línea de impulsión
- Construcción de caseta eléctrica para EBAR
- Instalación de red de media tensión para caseta eléctrica de EBAR
- Construcción de una subestación eléctrica
- Construcción de alumbrado público para zona de EBAR
- Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- Implementación Plan de Manejo de Transito
- Certificado RETIE
- Certificado RETILAP

CONSORCIO BENDICIÓN 23

2.1 TRAMOS A INTERVENIR

✓ PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA (PPAMM)

Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM

No	Calle / Carrera	Desde	Hasta
1	Calle 90	Carrera 7 Oeste	Carrera 1
2	Calle 90A	Carrera 2A Oeste	Carrera 1
3	Calle 90B	Carrera 2A Oeste	Carrera 1C Oeste
4	Calle 90C	Carrera 2A Oeste	Carrera 1C Oeste
5	Calle 91	Transversal 1	Carrera 1C Oeste
6	Calle 90A	Carrera 1B Oeste	Carrera 1
7	Calle 90B	Carrera 1B Oeste	Carrera 1
8	Transversal 1	Carrera 4 Oeste	Carrera 1
9	Calle 90C	Carrera 7B Oeste	Carrera 7 Oeste
10	Calle 92	Carrera 7B Oeste	Carrera 4 Oeste
11	Calle 92B	Carrera 7B Oeste	Carrera 4 Oeste
12	Calle 92B BIS	Carrera 8 Oeste	Carrera 3 Oeste
13	Calle 92C	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
14	Calle 93	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
15	Calle 93A	Carrera 7A Oeste	Carrera 7 Oeste
16	Calle 93B	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
17	Calle 94	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
18	Calle 94A	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
19	Calle 94B	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
20	Calle 95	Carrera 8 Oeste	Carrera 1
21	Calle 95A	Carrera 7 BIS Oeste	Carrera 4 Oeste
22	Calle 95B	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
23	Calle 95C	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
24	Calle 95D	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
25	Calle 96	Carrera 7 BIS Oeste	Carrera 4 Oeste
26	Calle 96A	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
27	Calle 97	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
28	Calle 97A	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
29	Calle 97B	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
30	Transversal 3 Oeste	Calle 92	Calle 92B BIS
31	Transversal 3A Oeste	Carrera 4 Oeste	Calle 92B BIS

No	Calle / Carrera	Desde	Hasta
32	Carrera 8	Calle 90	Calle 95
33	Carrera 7B Oeste	Calle 90C	Calle 92B
34	Carrera 7A Oeste	Calle 90C	Calle 95
35	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 90C	Calle 92B
36	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 93A	Calle 95
37	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 95A	Calle 96
38	Carrera 7 Oeste	Calle 90	Calle 97B
39	Carrera 6 Oeste	Calle 92	Calle 92B
40	Carrera 5 Oeste	Calle 92	Calle 92B
41	Carrera 4 Oeste	Calle 92	Calle 93
42	Carrera 4 Oeste	Calle 92B BIS	Calle 95
43	Carrera 6 Oeste	Calle 93	Calle 93B
44	Carrera 5 Oeste	Calle 93	Calle 93B
45	Carrera 4 Oeste	Calle 93	Calle 97B
46	Carrera 3B Oeste	Calle 93	Calle 93B
47	Carrera 3A Oeste	Calle 93	Calle 93B
48	Carrera 4 Oeste	Calle 90	Transversal 1
49	Carrera 3 Oeste	Calle 90	Transversal 1
50	Carrera 2A Oeste	Calle 90	Transversal 1
51	Carrera 2 Oeste	Calle 90	Calle 90C
52	Carrera 1C Oeste	Calle 90	Transversal 1
53	Carrera 1B BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
54	Carrera 1B Oeste	Calle 90	Transversal 1
55	Carrera 1B Oeste	Calle 90	Transversal 1
56	Carrera 1A BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
57	Carrera 1A Oeste	Calle 90A	Transversal 1
58	Carrera 1 BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
59	Carrera 1	Calle 90	Calle 95
57	Carrera 1A Oeste	Calle 90A	Transversal 1
58	Carrera 1 BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
59	Carrera 1	Calle 90	Calle 95

- ✓ **CIUDADELA LA BENDICIÓN**

En la ciudadela la bendición, se proyecta intervenir el 100% de las vías de esta zona. No se tiene listado de vías a intervenir debido a que a la fecha no se tienen nomenclaturas oficiales para este sector, por tanto, la ubicación de referencia utilizada esta plasmada en los planos de la etapa de formulación.

2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA

Las actividades de obra se realizarán durante 24 meses a partir del acta de inicio de obra. En el transcurso de las obras se dará ingreso y salida de volquetas y vehículos con materiales de construcción.

Los trabajos se ejecutarán durante las 07:00 y las 17:00 horas con cierre de la vía residencial, con el control y vigilancia del auxiliar de tránsito. Se laborará de lunes a sábado, en el horario diurno, siempre y cuando no se presenten imprevistos que generen atrasos en el cronograma de la obra y haga necesario realizar trabajos en horario nocturno, se dejara al final de cada día las zonas donde se estarán realizando trabajos con su respectiva señalización.

Los domingos no se trabajará, sin embargo, por razones de retrasos o situaciones particulares podrían llevarse a cabo algunas actividades constructivas, que se informarían con anterioridad.

2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS

El 100% de los tramos a intervenir se encuentran despavimentos, algunos tramos cuentan con mejoramientos, en condición general el nivel de servicio de los tramos es malo.

2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta la condición de las vías a intervenir, se tiene un volumen bajo de transitabilidad.

3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

Se instala de manera obligatoria la señalización en todos los accesos y áreas intervenidas de la obra, con el fin de no ocasionar accidentes o incidentes y/o interrumpir la movilidad vial de la zona de influencia del proyecto, adicionalmente se implementaron las señales verticales a lo largo de los tramos para informar a la comunidad de la ejecución de las actividades, los desvíos y las rutas para los peatones y ciclistas.

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular



3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante el presente periodo se realizaron labores para la construcción del alcantarillado sanitario, las cuales comprenden la construcción de colectores en tubería polietileno de alta densidad de diámetros variados, se adelantó la construcción de cajas de inspección y demás actividades para la construcción de acometidas domiciliarias, además, se adelantan labores de construcción de pozos y cámaras de inspección. Paralelamente, se construyen acometidas domiciliarias. Cada actividad comprende las labores necesarias de replanteo y localización de tubería, excavación mecánica, excavación manual, encamado de la tubería con arena sucia de rio debidamente apisonada y relleno en material seleccionado de la excavación y/o material subbase triturada. Con el fin de prevenir accidentes laborales durante la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente se realiza la demarcación y señalización de áreas de trabajo.

Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación





















4 AVANCE PRESUPUESTO PMT

BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO											
PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDAD PARCIAL 25		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A)										
	DISPOSITIVOS DE CONTROL										
1,1	Barricada metálica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingenieria, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvió de 60 cm.	und	4,00	$ 707.407,00	$ 2.829.628,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.829.628,00	-	$ -
1,2	Paleta PARE - SIGA 45 cm	und	4,00	$ 72.282,00	$ 289.128,00	0,00	$ -	4,00	$ 289.128,00	-	$ -
1,3	Colombina o baliza de señalización H=1.30 m	und	20,00	$ 52.486,00	$ 1.049.720,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.049.720,00	-	$ -
1,4	Barrera o maletín plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x 0.50 m	und	4,00	$ 540.809,00	$ 2.163.236,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.163.236,00	-	$ -
1,5	Cono de señalización vial, doble reflectivo H=70 cm	und	20,00	$ 61.638,00	$ 1.232.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.232.760,00	-	$ -
1,6	Cinta de Señalización - peligro no pase -	m	2800,00	$ 68,00	$ 190.400,00	0,00	$ -	2.800,00	$ 190.400,00	-	$ -
	SEÑALIZACION										
1,7	Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8".	und	32,00	$ 278.941,00	$ 8.926.112,00	0,00	$ -	32,00	$ 8.926.112,00	-	$ -
	EQUIPOS VARIOS										
1,8	Chaleco reflectivo	und	8,00	$ 23.343,00	$ 186.744,00	0,00	$ -	8,00	$ 186.744,00	-	$ -
1,9	Pitos para auxiliares de transito	und	8,00	$ 5.900,00	$ 47.200,00	0,00	$ -	8,00	$ 47.200,00	-	$ -
1,10	Ploteo planos PMT específicos	und	10,00	$ 5.000,00	$ 50.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 50.000,00	-	$ -

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME PARCIAL No.25 IMPLEMENTACIÓN DEL PMT
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDAD PARCIAL 25		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1,11	Papeleria, impresión de informes			mes	12,00	$ 230.000,00	$ 2.760.000,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.760.000,00	-	$ -
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)							**$ 19.724.928,00**		**$ -**		**$ 19.724.928,00**		**$ -**
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CIERRES SIMULTANEOS	VR. UNITARIO	MESES								
	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)												
1.12	Paleteros (2)	0,00	2,00	$ 5.072.160,00	24	1,00	$ 243.463.680,00	0,00	$ -	22,00	$ 223.175.040,00	2,00	$ 20.288.640,00
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)							$ 243.463.680,00	0,00	$ -	-	$ 81.154.560,00		$ 20.288.640,00
VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)							$ 263.188.608,00		$ -	-	$ 242.899.968,00		$ 20.288.640,00
VALOR TOTAL PMT (AJUSTADO AL PESO)							$ 263.188.608,00		**$ -**		**$ 242.899.968,00**		**$ 20.288.640,00**

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5 CONCLUSIONES

- ✓ A la fecha de la presente parcial se ha ejecutado un 92.29% del valor total del presupuesto del PTM, tal como se relaciona en la siguiente gráfica:

Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de parcial 25



- ✓ A la fecha, no se han presentado inconvenientes ni accidentes en la ejecución del presente plan de manejo de tránsito.

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el informe parcial No.25 se llevaron a cabo acciones relacionadas con la ejecución de la obra. Estas acciones incluyeron:

  - **Instalación de tubería:** Se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas con la instalación de tuberías sanitarias de 48 pulgadas con el fin de conectar las viviendas de Ciudadela la Bendición con los colectores secundarios con el fin de transportar las aguas residuales hasta la estación de bombeo (EBAR)

  - **Pozos de inspección:** Se han construido pozos de inspección con diámetro de 1.50 y alturas que varían entre 1.0 y 7.0 metros. Estos pozos son esenciales para el mantenimiento y la supervisión de las redes de tuberías sanitarias, permitiendo un acceso seguro y eficiente para las inspecciones y reparaciones necesarias. La construcción de estos pozos incluye la excavación, el refuerzo de las paredes, la instalación de tapas de manhole.

- A la fecha del informe parcial No.25, se ha logrado un avance del 92,57%. Es importante señalar que, según el cuadro de avance de obra, han transcurrido 778 días, lo que corresponde al 88,60% del tiempo desde la fecha de inicio del contrato.

- En cuanto al plan de manejo integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, a la fecha se cuenta con personal de mano de obra calificada, a este personal contratado se le han realizado las respectivas afiliaciones a ARL y EPS, se les realizó su respectivo pago de seguridad social, se les realizo entrega de dotación y EPP's y se realizaron charlas preoperacionales periódicas.

- En cuanto al avance al plan de plan de gestión social para el presente periodo, se ha anexado un informe donde se detalla el manejo social que se le ha dado al proyecto.

- Se realizó prórroga No. 1 al contrato 041 de 2023 dejando como nueva fecha de terminación el día 12 de agosto del año 2026.

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA
