MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN	07 DE MARZO DE 2026	VÉRSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	19	DEL	15/03/2026	AL	14/03/2026
FECHA INICIO :	8/03/2026	FECHA TERMINO :	14/03/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325	901987572-5	CONTRATO N°	238
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA		PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	100,00%	76,00%			RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN
						RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN
						RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	NO SE HA FUNDIDO TODA LA CIMENTACIÓN
C-2	C-2 CIMIENTOS	100,00%	54,00%			FUNDIDA DE ZAPATAS	NO SE CONTABA CON TODO EL ACERO DE LAS ESTRUCTURAS
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	72,93%	7,00%			BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	0,00%			FUNDIDA DE PISOS EN CONCRETO	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	93,32%	25,00%			FUNDIDA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	NO SE CONTABA CON TODO EL ACERO DE LAS ESTRUCTURAS
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	82,27%	11,00%			LEVANTE DE MUROS	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,00%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	32,26%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	60,00%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	100,00%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	100,00%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
CR-11	CR-11 CIELORASOS	100,00%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	27,87%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	59,73%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	26,36%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	24,42%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	60,11%	0,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	79,94%	51,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	55,09%	0,00%				
TOTALES		58,73%	13,93%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 792.143.870,96	$ 4.894.459.653,51		13,93%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	ELECTRICISTA	0
INGENIEROS	1	OFICIALES	5
SISO	1	MAESTRO	1
AMBIENTAL	0	AYUDANTES	6
TOPÓGRAFO	0	ALMACENISTA	0
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

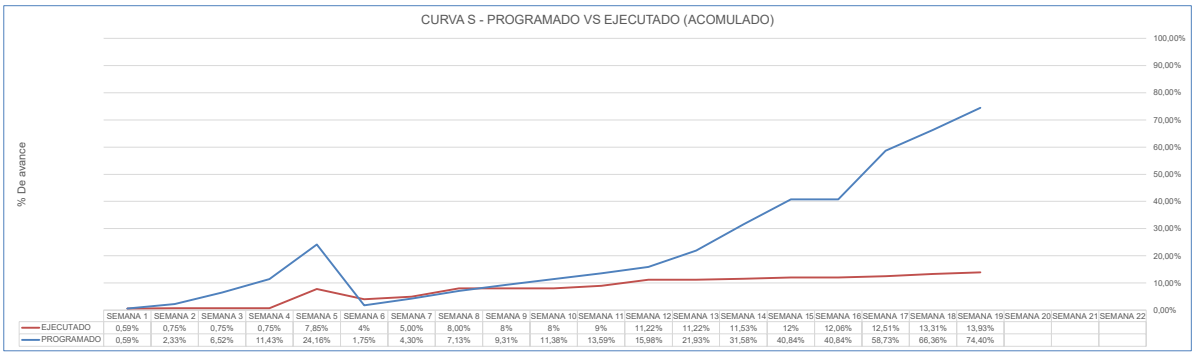

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%	8%	9%	11,22%	11,22%	11,53%	12%	12,06%	12,51%	13,31%	13,93%			
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%	11,38%	13,59%	15,98%	21,93%	31,58%	40,84%	40,84%	58,73%	66,36%	74,40%			

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

LOS ATRASOS PRESENTADOS EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES OBEDECEN A LO MANIFESTADO EN LAS COMUNICACIONES REMITIDAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. DICHOS RETRASOS SE ORIGINAN PRINCIPALMENTE EN LA DEMORA EN LA ENTREGA DE MATERIALES, OCASIONADA POR FACTORES EXTERNOS ASOCIADOS A LAS DIFICULTADES EN LAS RUTAS DE ACCESO DEBIDO A LA OLA INVERNAL.
ESTA SITUACIÓN TAMBIÉN HA IMPACTADO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES, COMO LAS EXCAVACIONES, GENERANDO AFECTACIONES EN LA PROGRAMACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, DEMORAS EN LAS ACTIVIDADES SUBSIGUIENTES DEL PROYECTO.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

LEONARDO IVAN ONATE LOPEZ
Residente de obra:
Mat. Profesional 20202-367956 CES

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista


21 mar 2026 9:17:41
Vía al Aeropuerto
Santa Rosa Del Sur
Bolívar
Edwin Lugo inspector SST




19 mar 2026 13:30:58
Vía al Aeropuerto
Santa Rosa Del Sur
Bolívar
Edwin Lugo inspector SST
