Valledupar, 2 de febrero de 2026

DEPOARM-2025-048

Señores,
CONSORCIO ARMERÍA 325
Atn. Ingeniero Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

Asunto: Remisión de informes semanales 1 – 1 2 – Proyecto BASRO 48


Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir los informes semanales correspondientes a los periodos 1 al 12, elaborados hasta la fecha, para su conocimiento, revisión y fines pertinentes, en el marco del **Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**, cuyo objeto corresponde a la *Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia en el BASRO 48*

Los documentos adjuntos contienen el detalle de las actividades realizadas, avances alcanzados y demás información relevante de cada semana reportada.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,



Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante legal
Consorcio Depoarm 2025

Dirección: Carrera 9 #19-18 Brr. Centro
Teléfono: 310 538 62 51
Correo electrónico: consorciodepoarm2025@gmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	1	DEL	06/11/2025	AL	08/11/2025
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA		PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el area objeto de construccion	100,00%	100,00%		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO	100,00%	100,00%		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	100,00%	100,00%		
	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.)				
C-2	C-2 CIMIENTOS	75,00%	75,00%		
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS				
CR-11	CR-11 CIELORASOS				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO				
CE-18	CE-18 CERRADURAS				
PI-19	PI-19 PINTURA				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO				
	TOTALES	0,59%	0,59%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 33.550.960,79	$ 5.653.052.563,67		0,59%	0,59%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR
INGENIEROS	1	OBREROS
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		

V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

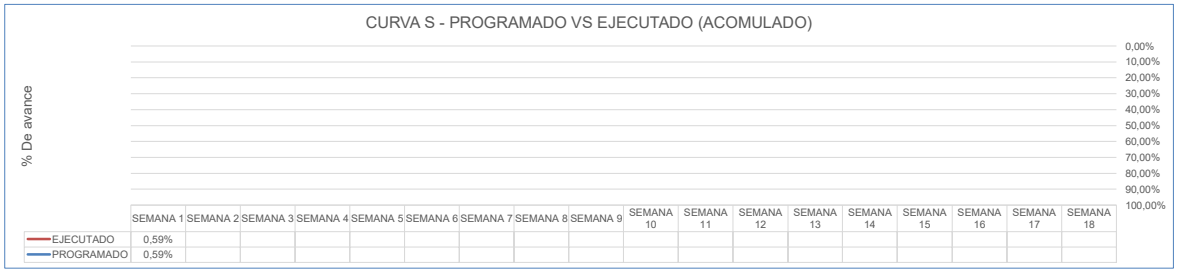

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTARON ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES NECESARIAS; COMO LA VERIFICACION TOPOGRAFICA, EN MEDIO DIGITAL Y EN CAMPO, DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO.
2.- LA VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DEL PYTO ARQUITECNICO; DEFINIO EL AREA REAL DE LOS DEPOSITOS Y LA FEHA DE INCIO DEL DESCAPOTE.
3.- LA OBTENCION DEL SITIO PARA BOTADERO, CERCANO AL BASRO 48; FUE DEFINITIVO.
4.- LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EDIFICIOS, DEL CERRAMIENTO Y REDES; SE REALIZARRAN UNA VEZ TENGAMOS LA PLATAFORMA Y/O RELLENO DE APOYO DE LOS DEPOSITOS.
5.- **SE FIRMA ACTA DE INICIO CON FECHA 06/11/2025**

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO; EN COMPAÑÍA DE MILITARES



SITIO DE BOTADERO DE MATERIAL GENERADO POR DESCAPOTE



UBICACION DE BM; CERCANO A TANQUES DE AGUA TRATADA



VERIFICACION EN SITIO DE PROYECTO; FRENTE A VIVERO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA Nº	2	DEL	09/11/2025		AL	15/11/2025
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N° 221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES						
	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.)	25,00%	25,00%				
	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 5.0 M. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)	75,00%	0,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS						
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS						
	SUB BASE GRANULAR MATERIAL SBG-2. Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invias y estudios de suelos.	15,00%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA						
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS						
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES						
CB-10	CB-10 CUBIERTAS						
CR-11	CR-11 CIELORASOS						
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS						
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS						
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO						
CE-18	CE-18 CERRADURAS						
PI-19	PI-19 PINTURA						
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES						
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES						
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL						
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS						
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO						
	TOTALES	2,33%	0,75%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I-U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA
	$ 5.686.603.524,46	$ 42.649.526,43	$ 5.643.953.998,03	0,75%	
				ANTERIORES	
				SEMANA 1	


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR
INGENIEROS	1	OBREROS
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)			FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
			11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

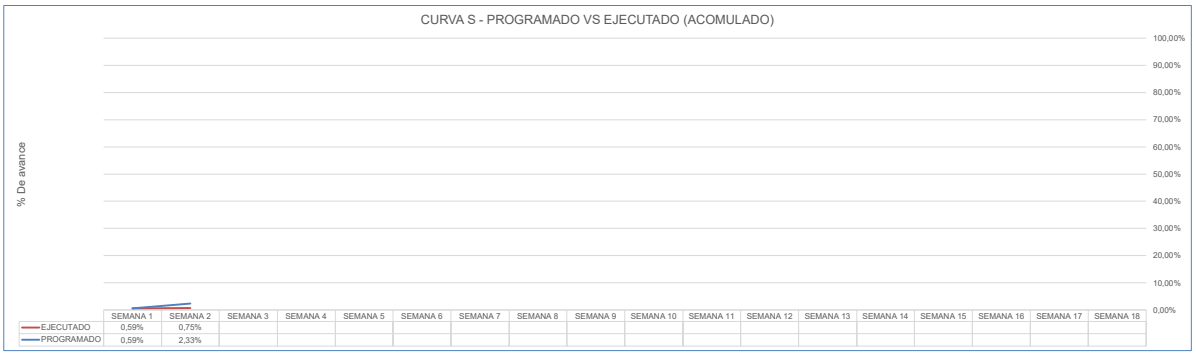

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTARON ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES NECESARIAS; COMO LA VERIFICACION TOPOGRAFICA, EN MEDIO DIGITAL Y EN CAMPO, DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO.
2.- LA VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DEL PYTO ARQUITECNICO; DEFINIO EL AREA REAL DE LOS DEPOSITOS Y LA FEHA DE INCIO DEL DESCAPOTE.
3.- LA OBTENCION DEL SITIO PARA BOTADERO, CERCANO AL BASRO 48; FUE DEFINITIVO.
4.- LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EDIFICIOS, DEL CERRAMIENTO Y REDES; SE REALIZARRAN UNA VEZ TENGAMOS LA PLATAFORMA Y/O RELLENO DE APOYO DE LOS DEPOSITOS.
5.- **SE FIRMA ACTA DE INICIO CON FECHA 06/11/2025**

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista




RECONOCIMIENTO DEL TERRENO;



DESCAPOTE; CON EQUIPO PESADO.



DESCAPOTE

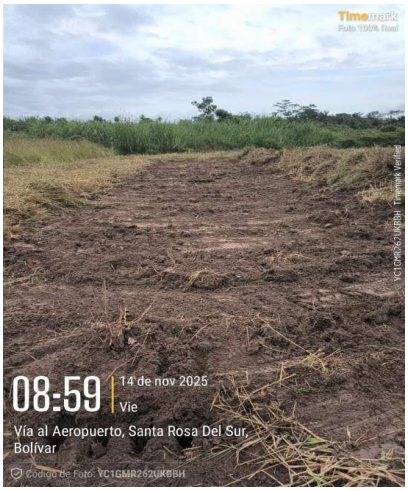

DESCAPOTE



TOPOGRAFIA INICIAL, LUEGO DEL DESCAPOTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	3	DEL	16/11/2025	AL	22/11/2025
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES						
	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)	100,00%	25,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS						
	BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	100,00%	0,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS						
	SUB BASE GRANULAR MATERIAL SBG-2. Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invias y estudios de suelos.	38,05%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	38,05%	0,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA						
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS						
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES						
CB-10	CB-10 CUBIERTAS						
CR-11	CR-11 CIELORASOS						
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS						
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS						
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO						
CE-18	CE-18 CERRADURAS						
PI-19	PI-19 PINTURA						
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES						
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES						
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL						
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS						
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO						
	TOTALES	6,52%	0,75%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I-U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	$ 5.686.603.524,46	$ 42.649.526,43	$ 5.643.953.998,03

AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	0,75%	0,75%
ANTERIORES		
SEMANA 1		0,59%
SEMANA 2		0,75%
SEMANA 3		0,75%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR
INGENIEROS	1	OBREROS
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)			FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
			11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)




VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTARON ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES NECESARIAS; COMO LA VERIFICACION TOPOGRAFICA, EN MEDIO DIGITAL Y EN CAMPO, DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO.
2.- LA VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DEL PYTO ARQUITECNICO; DEFINIO EL AREA REAL DE LOS DEPOSITOS Y LA FEHA DE INCIO DEL DESCAPOTE.
3.- LA OBTENCION DEL SITIO PARA BOTADERO, CERCANO AL BASRO 48; FUE DEFINITIVO.
4.- LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EDIFICIOS, DEL CERRAMIENTO Y REDES; SE REALIZARRAN UNA VEZ TENGAMOS LA PLATAFORMA Y/O RELLENO DE APOYO DE LOS DEPOSITOS.
5.- **SE FIRMA ACTA DE INICIO CON FECHA 06/11/2025**

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO; EN COMPAÑÍA DE MILITARES

DESCAPOTE; CON EQUIPO PESADO.



SITIO DE BOTADERO DE MATERIAL GENERADO POR DESCAPOTE
DESCAPOTE; CON EQUIPO PESADO.



DESCARGUE DEL DESCAPOTE ; EN BOTADERO PRIVADO



VERIFICACION EN SITIO DE PROYECTO; FRENTE A VIVERO
TOPOGRAFIA INICIAL, LUEGO DEL DESCAPOTE



TOPOGRAFIA INICIAL, LUEGO DEL DESCAPOTE



CERRAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO EN POLISOBRA, COLOR VERDE





SE REGISTRA LLUVIAS EL 17/11/2025

LLEGADA DE MATERIAL A OBRA



CAMPAMENTO DE OBRA



CAMPAMENTO DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VÉRSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	4	DEL	23/11/2025		AL	29/11/2025
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES						
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA ancho hasta 80 cm y h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue, trasiego y retiro de material excavado).	100,00%	0,00%				
	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, trasiego y retiro de sobrantes a botadero.)	100,00%	0,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS						
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo)	100,00%	0,00%				
	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	100,00%	0,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS						
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	38,05%	0,00%				
	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	100,00%	0,00%				
	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 Φ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	100,00%	0,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA						
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS						
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES						
CB-10	CB-10 CUBIERTAS						
CR-11	CR-11 CIELORASOS						
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS						
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS						
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS						
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO						
CE-18	CE-18 CERRADURAS						
PI-19	PI-19 PINTURA						
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES						
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES						
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL						
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS						
	SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.	59,64%					
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO						
	TOTALES	**11,43%**	**0,75%**				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 42.649.526,43	$ 5.643.953.998,03		0,75%	0,75%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0,00
INGENIEROS	1	OBREROS	0,00
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES	1,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

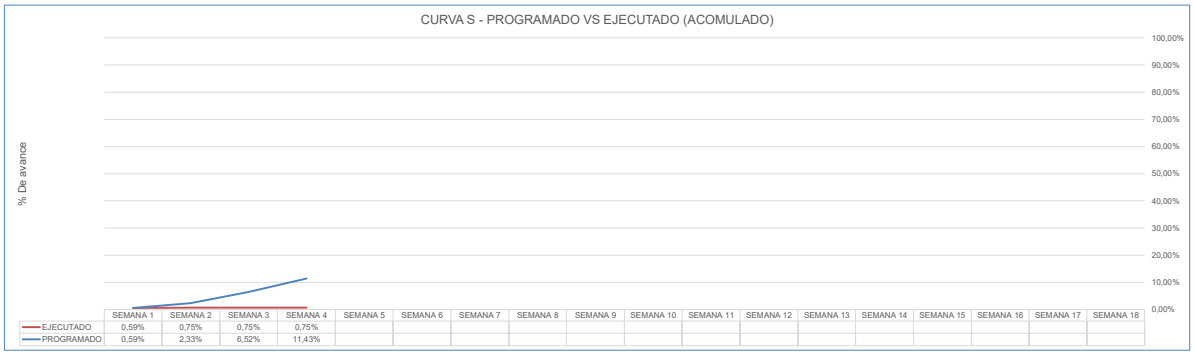

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%														
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%														

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACIÓN DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019. PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



SE TERMINA TODO EL DESCAPOTE Y SE HACE EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE



SE TERMINAN LAS LABORES DE CAMPAMENTO Y ZONA DE OFICINAS PROVISIONALES



TERRENO LISTO PARA INICIO DE RELLENOS VERIFICADOS CON TOPOGAFIA



INICIA LLEGADA DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE RELLENOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	5	DEL	30/11/2025	AL	06/12/2025
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACION

	EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)		ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES					
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el area objeto de construccion	100,00%	100,00%		C	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO	100,00%	100,00%		C	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA	100,00%	100,00%		C	
	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.)	100,00%	100,00%		C	
	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)	0,00%	0,00%		PE	
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%		PE	
	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 5.0 M. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)	5,00%	5,00%			
	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, trasiego y retiro de sobrantes a botadero.)	0,00%	0,00%			
C-2	C-2 CIMIENTOS					
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS					
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS					
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA					
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS					
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS					
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS					
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES					
CB-10	CB-10 CUBIERTAS					
CR-11	CR-11 CIELORASOS					
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS					
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS					
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS					
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS					
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO					
CE-18	CE-18 CERRADURAS					
PI-19	PI-19 PINTURA					
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES					
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES					
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL					
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS					
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO					
	TOTALES	24,16%	0,00%			

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ -	$ 5.686.603.524,46		0,00%	7,85%

IV.PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0,00
INGENIEROS	1	OBREROS	0,00
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES	1,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACIÓN DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019. PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



RES



MATERIAL DE RELLENO - EXTENDIDA



DO



SE CONTINUA CON MATERIAL DE RELLENO Y EXTENDIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VÉRSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	6	DEL	07/12/2025	AL	13/12/2025
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	18,92%	21,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS	0,63%	9,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0,00%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,00%	0,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	9,03%	30,00%				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	**1,75%**	**4,00%**				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 307.808.076,00	$ 5.378.795.448,46		1,75%	4,00%
				ANTERIORES		


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0,00
INGENIEROS	1	OBREROS	0,00
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES	1,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

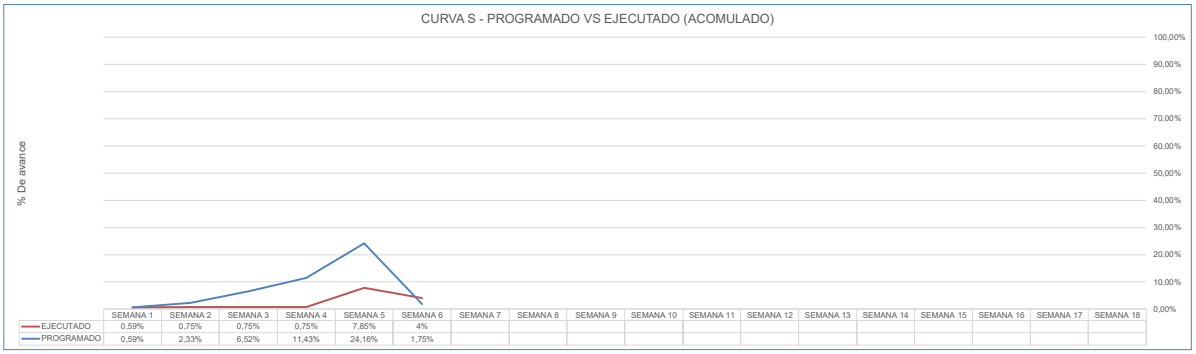

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%												
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%												

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACION DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019. PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



RES



MATERIAL DE RELLENO - EXTENDIDA



DO



SE CONTINUA CON MATERIAL DE RELLENO Y EXTENDIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA			
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**						
FECHA DE EMISIÓN		**VERSIÓN**				**HOJA**	1	**DE** 2

SEMANA N°	7	**DEL**	14/12/2025		**AL**	20/12/2025	
FECHA INICIO :		**FECHA TERMINO :**					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48**			
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**			**CONTRATO N°**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**		**901977673-8**	**CONTRATO N°** **221**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)**	**PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)**		**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P -1	P -1 PRELIMINARES	31,54%	32,00%			
C-2	C-2 CIMIENTOS	20,00%	14,00%			
S-3	S-3 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%			
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0,00%	31,14%			
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2,62%	0,00%			
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%			
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%			
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%			
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%			
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%			
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%			
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%			
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%			
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%			
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%			
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%			
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%			
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%			
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%			
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%			
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%			
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%			
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	14,16%	30,00%			
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL. CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%			
	TOTALES	**4,30%**	**5,00%**			

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**VR.TOTAL CONTRATO**	**VR.TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 5.686.603.524,46	$ 329.224.042,00	$ 5.357.379.482,46		1,00%	5,00%
				ANTERIORES		


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	**0**	**INSPECTOR**	**0,00**
INGENIEROS	**1**	**OBREROS**	**0,00**
TOPÓGRAFO	**1**	**AYUDANTES**	**1,00**
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

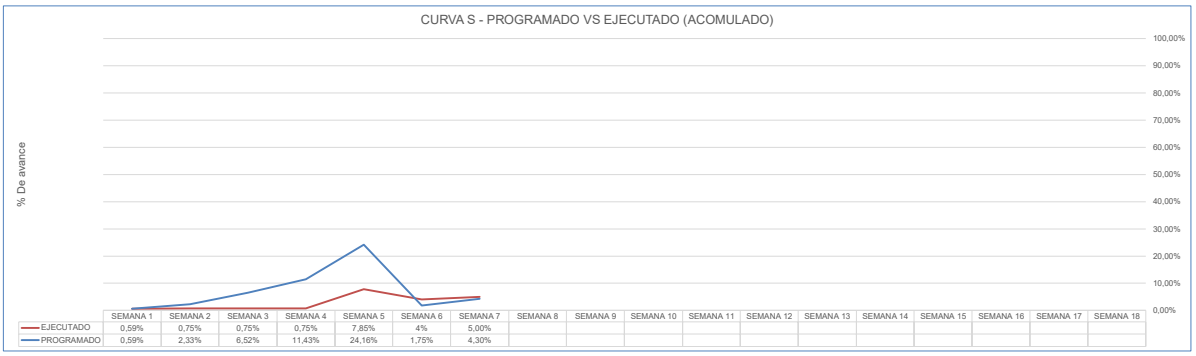

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%											
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%											

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACION DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019. PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista





SE HACE REVISIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA





VERIFICACION POR PARTE DE LOS PROFESIONALES EN OBRA





REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON PERSONAL SEGURIDAD



VISTA GENERAL DE COMO VA HASTA LA FECHA MATERIAL DE RELLENO





SE REALIZA TRAZADO PARA INICIO DE EXCAVACIONES





SE INICIAN EXCAVACIONES PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VÉRSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	8	DEL	08/01/1900	AL	14/01/1900
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	45,95%	32,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS	40,00%	14,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0,00%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	6,66%	0,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	6,00%	2,00%				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	19,28%	51,00%				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VIAS	0,00%	0,00%				
	CONCRETO PARA PAVIMENTO Módulo de rotura: 43 kg/cm2. Extendido, perfilado y vibrado según norma INVIAS.	0,00%	0,00%				
	SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.	0,00%	0,00%				
	CORTE DE PAVIMENTO	0,00%	0,00%				
	SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.	25,70%	66,00%				
	PASADORES DE CARGA O DOVELAS: Suministro e instalacion de varilla lisa de 1 pulgada, incluye la canastilla separación desde el centro de las barras de 30 cm, soldadura en un costado de la varilla y engrase de pasador.	0,00%	0,00%				
	CORDÓN DE RESPALDO PARA EL SELLO DE JUNTAS de dilatación Sika Rod 5/8" o similar (incluye suministro e instalación).	0,00%	0,00%				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	**8,00%**	**7,13%**				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 515.955.347,00	$ 5.170.648.177,46		0,00%	8,00%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0,00
INGENIEROS	1	OBREROS	0,00
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES	1,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

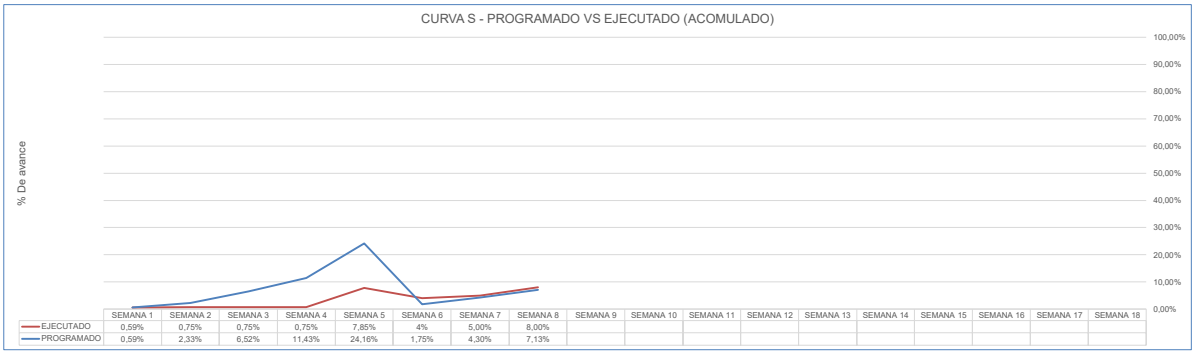

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%										
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%										

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACION DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019, PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Control Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista





COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO EN TALUDES







SE INICIA LA BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI Y ACERO 60000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	9	DEL	28/12/2025	AL	03/01/2026
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N° 221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	58,57%	32,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS	60,00%	14,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	66,87%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	9,50%	2,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	24,41%	51,00%				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	9,31%	8,00%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 515.955.347,00	$ 5.170.648.177,46		0,00%	8,00%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0,00
INGENIEROS	1	OBREROS	0,00
TOPÓGRAFO	1	AYUDANTES	1,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

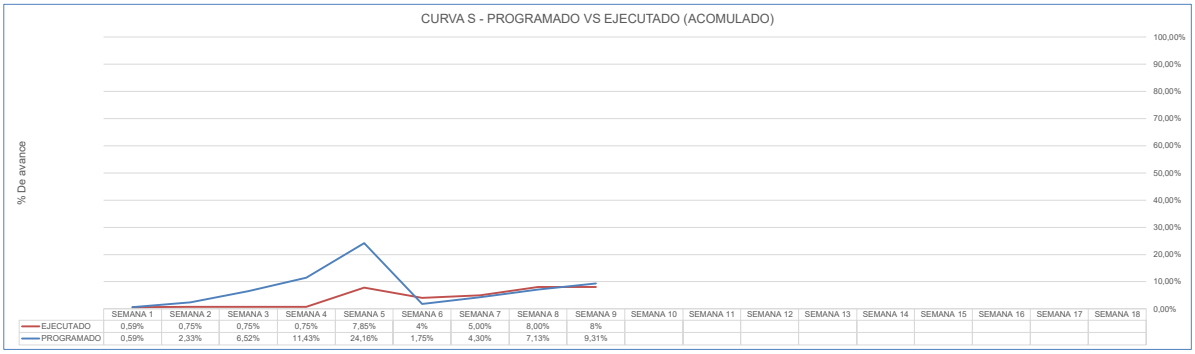

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%									
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%									

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACION DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019, PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Control Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VÉRSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	10	DEL	04/01/2026	AL	10/01/2026
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N° 221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA		PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	58,57%	32,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS	60,00%	14,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	72,20%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	9,50%	2,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	24,41%	51,00%				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	**11,38%**	**8,00%**				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 515.955.347,00	$ 5.170.648.177,46		0,00%	8,00%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0
INGENIEROS	1	OBRREROS	0
SISO	1	MAESTRO	1
AMBIENTAL	0	AYUDANTES	4
TOPÓGRAFO	0	ALMACENISTA	1
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

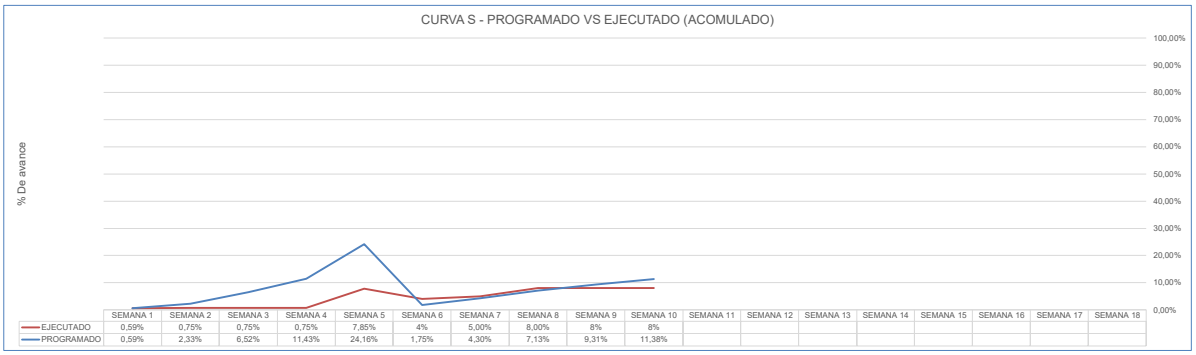

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%	8%								
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%	11,38%								

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACION DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019. PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	11	DEL	11/01/2026	AL	17/01/2026
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	0,00%	0,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS	0,00%	0,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0,00%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,00%	0,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0,00%	0,00%				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	13,59%	9,00%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46				9,00%	9,00%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	INSPECTOR	0
INGENIEROS	1	OBREROS	0
SISO	1	MAESTRO	1
AMBIENTAL	0	AYUDANTES	9
TOPÓGRAFO	1	ALMACENISTA	1
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

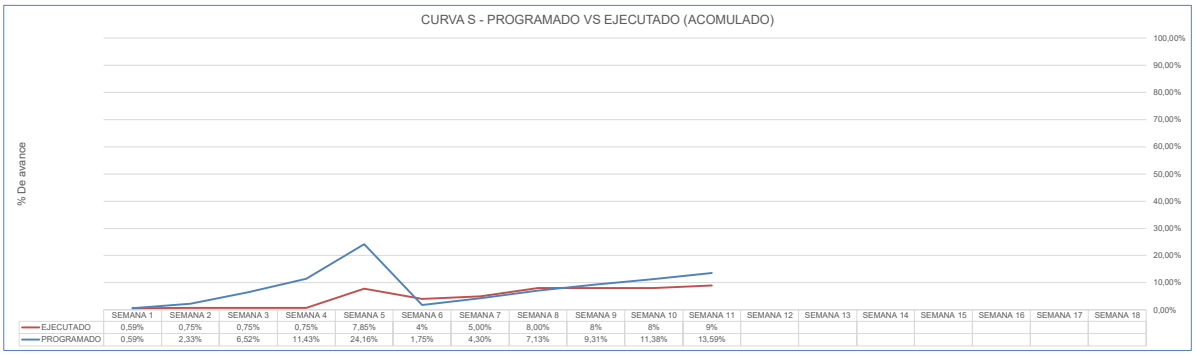

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%	8%	9%							
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%	11,38%	13,59%							

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFIA AL 100% PARA INCIO DE RELLENOS
4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ITEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
6- SE INICIA FIGURACION DE ACEROS
7- SE ENVIO OFICIO DEPOARM-2025-019. PROPUESTA RELLENO - PARA QUE SE PUEDA VALIDAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista






KUNTER
2000 Lts

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN		VÉRSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	12	DEL	25/01/2026	AL	31/01/2026
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325			CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N° 221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	100,00%	46,00%				
C-2	C-2 CIMIENTOS	100,00%	53,00%				
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%				
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	66,67%	0,00%				
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	23,12%	13,00%				
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%				
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	0,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	39,79%	51,00%				
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	15,98%	11,22%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 637.818.086,54	$ 5.048.785.437,92		11,22%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	ELECTRICISTA	1
INGENIEROS	1	OFICIALES	2
SISO	1	MAESTRO	1
AMBIENTAL	0	AYUDANTES	6
TOPÓGRAFO	1	ALMACENISTA	1
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2025	X		SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

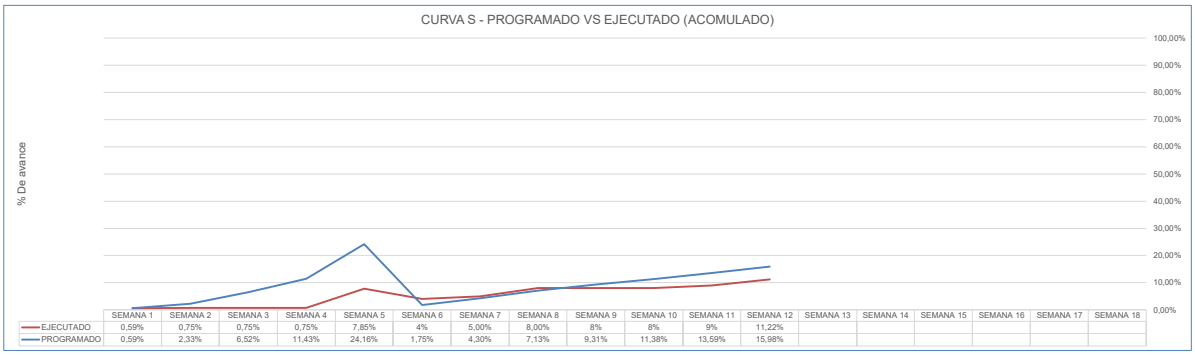

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%	8%	9%	11,22%						
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%	11,38%	13,59%	15,98%						

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista










Jue, 29 de ene 2026 15:43

