INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 17

CONSORCIO BETA REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. USPEC-CTO-271-2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES)

CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTOS GMC

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

PERIODO:

1 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 3
2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO *3*
3. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 1
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2
4.1 CONTRATO DE OBRA: *2*
4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA: *3*
5. AVANCE PROGRAMACION DE OBRA. 3
6. ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCION 10
7. CORRESPONDENCIA 125
8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: 125
9. CONTROL DE MANEJO DE ANTICIPO 125
13. CONTROL DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES. 130
14. ACTAS DE COMITÉ *130*
15. INFORMES QUINCENALES *130*
16. BITACORA DE OBRA *130*
17. ESTADO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 130
18. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES 133
19. ANEXOS 134

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No.17 de Interventoría, realizado por CONSORCIO BETA REGIONALES, en el cual se describen las actividades realizadas del 1 al 30 de abril del 2026, en el Proyecto: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC" CONTRATO NO. USPEC-256-2024"** y así mismo los avances, situación a la fecha, descripción y reporte de actividades en la ejecución de este. En consecuencia, que compete al Estado, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC, es definir en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran, para la atención de los internos de los centros de reclusión del orden Nacional a cargo del INPEC, de conformidad con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos en el presente proceso; de tal manera que es necesario por parte de la USPEC, atender mediante la contratación de obras civiles, bienes y servicios la ampliación de infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, identificados con mayores índices de hacinamiento y deterioro funcional.

2. GENERALIDADES

A través del presente documento se presenta informe técnico, administrativo y financiero, con el fin de comunicar a la entidad contratante Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC, el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo del contrato.

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de la ejecución del contrato será en ciento veinte seis (126) establecimientos a nivel nacional, que corresponden a la totalidad de los ERONES a cargo del INPEC a nivel nacional, repartidos en las 6 regionales, distribuidos así:

N°	REGIONAL	DPTO	COD.	ESTABLECIMIENTO	DIRECCION ESTABLECIMIENTO
1	CENTRAL	AMAZONAS	101	EPMSC LETICIA	DIRECCIÓN: CALLE 13 No. 10-120 Barrio Victoria Regia.
2	CENTRAL	BOYACA	103	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Vereda El Olivo Kilometro 2 vía Santa Rosa de Viterbo - Cerinza
3	CENTRAL	BOYACA	104	CPMSCHI CHIQUINQUIRÁ	DIRECCIÓN: Kilometro 2 vía Bogotá. Chiquinquirá-Boyacá
4	CENTRAL	BOYACA	105	EPMSC DUITAMA	DIRECCIÓN: Calle 7 No 15 -08 Duitama
5	CENTRAL	BOYACA	107	EPMSC GUATEQUE	DIRECCIÓN: CALLE 9 Nº 6 – 35
6	CENTRAL	BOYACA	109	EPMSC MONIQUIRÁ	Km 01 Vía Moniquirá - Barbosa
7	CENTRAL	BOYACA	110	EPMS RAMIRIQUÍ	DIRECCIÓN: Calle 8 No. 4-08
8	CENTRAL	BOYACA	112	EPMSC RM JP SOGAMOSO	DIRECCIÓN: Carrera 9ª 1ª -16 sur
9	CENTRAL	BOGOTA, D.C	113	COMEB BOGOTÁ (PICOTA)	DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía usme
10	CENTRAL	BOGOTA, D.C	114	CPMS BOGOTÁ (MODELO)	DIRECCIÓN: Carrera 56 No 18ª47
11	CENTRAL	CUNDINAMARCA	116	EPC CÁQUEZA	DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 4-32 palacio Municipal
12	CENTRAL	CUNDINAMARCA	117	EPMSC CHOCONTÁ	DIRECCIÓN: Carrera 5 N· 5-31
13	CENTRAL	CUNDINAMARCA	118	CPMMSFFA FACATATIVÀ	Dirección: Calle 8 No 2 - 29 Barrio CENTRAL Facatativá
14	CENTRAL	CUNDINAMARCA	119	EPMSC CMS FUSAGASUGÁ	DIRECCIÓN: CARRERA 8 No. 7-51
15	CENTRAL	CUNDINAMARCA	120	EPMSC GACHETÁ	DIRECCIÓN: Calle 5 No. 4 - 19
16	CENTRAL	CUNDINAMARCA	124	EPMSC LA MESA	DIRECCIÓN: Carrera 21 N°8-46
17	CENTRAL	CUNDINAMARCA	126	EPMSC UBATÉ	DIRECCIÓN: CRA 7 N°6-41
18	CENTRAL	CUNDINAMARCA	127	EPMSC VILLETA	DIRECCIÓN: Cra 6 N. 3-160 Villeta
19	CENTRAL	BOGOTA, D.C	129	RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR)	DIRECCION: Cra 58 No. 80 - 95
20	CENTRAL	META	130	CAMIS ERE ACACÍAS	DIRECCIÓN: Km 3 vía Acacias-Villavicencio
21	CENTRAL	META	131	EPMSC RM VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN: TV 26c No. 14ª - 22
22	CENTRAL	META	133	EPMSC GRANADA	DIRECCIÓN: Cra 14 Nº 14-31
23	CENTRAL	TOLIMA	136	EPMSC MELGAR	CARRERA 26 N° 5 – 71 Barrio el CENTRAL Melgar - Tolima
24	CENTRAL	CUNDINAMARCA	138	EPMSC GIRARDOT	DIRECCIÓN: CALLE 38 # 3 – 28 BARRIO DIAMANTE
25	CENTRAL	HUILA	139	EPMSC RM NEIVA	DIRECCIÓN: Vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera.
26	CENTRAL	HUILA	140	EPMSC GARZÓN	CALLE 3 SUR No. 18 A 19 BRÍO AGUAZUL
27	CENTRAL	HUILA	141	EPMSC LA PLATA	DIRECCIÓN: Kilometro 1 vía Neiva
28	CENTRAL	HUILA	142	EPMSC PITALITO	DIRECCIÓN: Calle 19 Sur Nro. 6-180
29	CENTRAL	CAQUETA	143	EPMSC FLORENCIA (CUNDUY)	DIRECCIÓN: KILÓMETRO 3 VÍA NEIVA - BARRIO EL CUNDUY
30	CENTRAL	TOLIMA	144	EPMSC CHAPARRAL	Dirección: carrera 6ªE N° 8ª- 44 barrio Carmenza Rocha

31	CENTRAL	TOLIMA	145	EPMSC JP ESPINAL	DIRECCIÓN: Calle 6 Carrera 12 Esquina # 12-56
32	CENTRAL	META	148	EPMSC ACACÍAS	DIRECCIÓN: KM 5 Vía antigua Villavicencio
33	CENTRAL	BOYACA	149	EPMSC TUNJA	DIRECCIÓN: Calle 31 No. 2 -15 Este. Barrio. El Dorado, en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá
34	CENTRAL	BOYACA	150	EPAMS CAS CÓMBITA	DIRECCIÓN: Kilometro 17 Via Tunja Paipa
35	CENTRAL	CASANARE	152	EPMSC PAZ DE ARIPORO	DIRECCIÓN: Calle 10 No. 6-69 Barrio Camilo Torres Paz de Ariporo
36	CENTRAL	CASANARE	153	EPC YOPAL	DIRECCIÓN: Kilómetro 12 Vía Yopal Aguazul
37	CENTRAL	CUNDINAMARCA	156	EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS	DIRECCIÓN: Km 3.5 Vía a Cambao, Vereda la Unión, Finca la Esperanza
38	CENTRAL	CAQUETA	157	EP FLORENCIA (HELICONIAS)	DIRECCIÓN: Km 1.5 De La Variante San Martin Vereda San Isidro
39	CENTRAL	TOLIMA	158	EPC GUAMO	DIRECCIÓN: Calle 11 N. 8-04
40	OCCIDENTAL	CAUCA	202	EPMSC BOLÍVAR (CAUCA)	DIRECCION: calle 3 No. 3-32 Barrio Sur
41	OCCIDENTAL	CAUCA	204	EPMSC EL BORDO	DIRECCION: carrera 2 W 7-65
42	OCCIDENTAL	CAUCA	206	EPMSC PUERTO TEJADA	DIRECCION: Calle 17 N° 19-37 Barrio el CENTRAL Puerto Tejada Cauca
43	OCCIDENTAL	CAUCA	207	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	DIRECCION: CALLE 4 No. 27-34 B/ MORALES DUQUE
44	OCCIDENTAL	CAUCA	208	EPMSC SILVIA	DIRECCION: Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia
45	OCCIDENTAL	CAUCA	209	RM POPAYÁN	DIRECCIÓN: Calle 3 N. 16-11 Barrio Alfonso López
46	OCCIDENTAL	NARIÑO	215	EPMSC RM PASTO	DIRECCION: Calle 24 No. 31-23 Barrio La Esperanza.
47	OCCIDENTAL	NARIÑO	217	EPMSC IPIALES	DIRECCION: Cra. 8 No. 1 – 49 Sector Las Animas.
48	OCCIDENTAL	NARIÑO	219	EPMSC LA UNIÓN	DIRECCION: Carrera 3 No. 13 – 48, Barrio Chapinero
49	OCCIDENTAL	NARIÑO	221	EPMSC TÚQUERRES	DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 26-210 Barrio las Mercedes - Tuquerres Nariño
50	OCCIDENTAL	NARIÑO	222	EPMSC TUMACO	DIRECCION: km 19, vía Tumaco – Pasto, vereda Buchely
51	OCCIDENTAL	VALLE	225	EPAMS CAS JP PALMIRA	DIRECCION: Calle 23 vía CORPOICA
52	OCCIDENTAL	VALLE	226	EPMSC ERE CALI	DIRECCION: Transversal 25 No 31-116
53	OCCIDENTAL	VALLE	227	EPMSC BUGA	DIRECCIÓN: CARRERA 16 N°32-97 BARRIO EL JARDÍN
54	OCCIDENTAL	VALLE	228	EPMSC BUENAVENTURA	DIRECCIÓN: Calle 6 No. 51b-61 Barrio Transformación, avenida Simón Bolívar.
55	OCCIDENTAL	VALLE	233	EPMSC TULUÁ	DIRECCIÓN: CARRERA 29 14-02 BARRIO: EL POPULAR
56	OCCIDENTAL	CAUCA	235	EPAMS CAS ERE POPAYÁN	DIRECCIÓN: Kilómetro 3 Vía Vereda las Guacas
57	OCCIDENTAL	VALLE	238	EPMSC CARTAGO	DIRECCIÓN: Calle 10 Nº 13 - 72
58	OCCIDENTAL	VALLE	239	EPMSC CAICEDONIA	DIRECCION: Calle 18 No. 19-203 Barrio Lleras
59	OCCIDENTAL	VALLE	240	EPMSC ROLDANILLO	Dirección: calle 7 N° 6 -51 / Barrio CENTRAL
60	OCCIDENTAL	VALLE	241	EPMSC SEVILLA	DIRECCION: CRA 50 CON CALLE 62ª ESQUINA
61	OCCIDENTAL	VALLE	242	COJAM JAMUNDÍ	DIRECCION: Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca
62	NORTE	ATLÁNTICO	301	EC JP BARRANQUILLA (MODELO)	DIRECCION: Vía 40 # 54-332

63	NORTE	BOLIVAR	303	EPMSC CARTAGENA	DIRECCIÓN: Diagonal 31 # 85-180 Barrio Ternera
64	NORTE	BOLIVAR	305	EPMSC MAGANGUÉ	DIRECCIÓN: Cárcel Nacional Barrio Camilo Torres
65	NORTE	CESAR	307	EPMSC ERE VALLEDUPAR	Carrera 19 A N° 18-60 barrio dangond
66	NORTE	CORDOBA	308	EPMSC JP MONTERÍA	DIRECCIÓN: Calle 35 Carrera 23
67	NORTE	GUAJIRA	313	EPMSC RIOHACHA	DIRECCIÓN: Calle 9ª N° 17 – 13 Barrio José Antonio Galán
68	NORTE	MAGDALENA	314	EPMSC SANTA MARTA	DIRECCIÓN: CALLE 24 No. 17A-36
69	NORTE	MAGDALENA	316	EPMSC EL BANCO	DIRECCIÓN: KILOMETRO 2 VIA GUAMAL BARRIO LAS MARIAS
70	NORTE	SAN ANDRES	318	EPMSC SAN ANDRÉS	DIRECCIÓN: Av Circunvalar Schooner bight.
71	NORTE	SUCRE	319	EPMSC SINCELEJO	DIRECCIÓN: CARRERA 17 No 3 - 21
72	NORTE	ATLÁNTICO	322	EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	DIRECCIÓN: Calle 76 No. 8 - 100
73	NORTE	CESAR	323	EPAMS CAS VALLEDUPAR	DIRECCIÓN: Km 3.5 vía la mesa
74	NORTE	CORDOBA	324	EPC TIERRALTA	DIRECCIÓN: KILOMETRO 23 VIA URRA – VEREDA SANTA ANA
75	ORIENTE	ARAUCA	401	EPMSC ARAUCA	DIRECCIÓN: Calle 17 No. 25A-26 B. La Esperanza
76	ORIENTE	CESAR	405	EPMSC AGUACHICA	DIRECCIÓN: CALLE 10 # 8-90 BARRIO SAN ROQUE – AGUACHICA (CESAR)
77	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	407	EPMSC PAMPLONA	DIRECCIÓN: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
78	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	408	EPMSC OCAÑA	DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 4-34 Barrio Tibet
79	ORIENTE	SANTANDER	410	EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)	DIRECCIÓN: Calle 45 No. 6-75 B. Alfonso López, Bucaramanga, Santander
80	ORIENTE	SANTANDER	411	EPMSC BARRANCABERMEJA	DIRECCIÓN: Carrera 5 No. 8-07 B. Sector Comercial
81	ORIENTE	SANTANDER	413	EPMSC MÁLAGA	DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 11 – 40 Málaga.
82	ORIENTE	SANTANDER	415	EPMSC SAN GIL	DIRECCIÓN: Carrera 12 No. 20A-67
83	ORIENTE	SANTANDER	416	EPMSC SOCORRO	DIRECCIÓN: Vereda Naranjal. Km 7 Via San Gil.
84	ORIENTE	SANTANDER	417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17b - 26 Barrio Buenos Aires.
85	ORIENTE	SANTANDER	418	EPMSC VÉLEZ	DIRECCIÓN: CARRERA 3 SALIDA A CHIPATÁ VÉLEZ SANTANDER
86	ORIENTE	SANTANDER	420	RM BUCARAMANGA	DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALLE 45 VIA CHIMITA
87	ORIENTE	SANTANDER	421	EPAMS CAS GIRÓN	DIRECCIÓN: KM 14 Vereda Palogordo, (Girón,
88	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	422	COCUC CÚCUTA	DIRECCIÓN: KM 3 Carretera Panamericana Vía al Salado
89	NOROESTE	ANTIOQUIA	501	EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	CARRERA 70 N 23-10 BARRIO SAN FRANCISCO DE ITAGUI
90	NOROESTE	ANTIOQUIA	502	EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA)	IRECCIÓN: Diagonal 44 No. 39–145 B. Las Vegas, Bello (Ant)
91	NOROESTE	ANTIOQUIA	505	EPMSC ANDES	DIRECCIÓN: calle 49 Nro. 55 – 154, Barrio San Pedro Andes Ant.

92	NOROESTE	ANTIOQUIA	507	EPMSC BOLIVAR	DIRECCION: calle 3 No. 3-32 Barrio Sur
93	NOROESTE	ANTIOQUIA	508	EPMSC CAUCASIA	DIRECCIÓN: Cra. 17 No 8 – 65 Barrio Pueblo Nuevo, Caucasia – Antioquia
94	NOROESTE	ANTIOQUIA	513	EPMSC JERICÓ	DIRECCIÓN: Carrera 6 #04-29 Barrio Las Quebraditas Jericó-Antioquia
95	NOROESTE	ANTIOQUIA	514	EPMSC LA CEJA	DIRECCIÓN: Carrera 18 N° 20-54
96	NOROESTE	ANTIOQUIA	515	EPMSC PUERTO BERRÍO	DIRECCIÓN: CALLE 50 Nro. 10 – 03 Esquina Barrio el Carmelo Puerto Berrio Antioquia
97	NOROESTE	ANTIOQUIA	517	EPMSC SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN: CALLE SUCRE BARRIO LA AZULITA #51-26, SANTA BARBARA ANTIOQUIA
98	NOROESTE	ANTIOQUIA	518	EPMSC SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 14-10 - Calle Uribe Restrepo
99	NOROESTE	ANTIOQUIA	519	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	DIRECCIÓN: Calle 27 Nº 35 a 03 barrio Camellón González
100	NOROESTE	ANTIOQUIA	521	EPMSC SONSÓN	DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 12-17
101	NOROESTE	ANTIOQUIA	523	EPMSC TÁMESIS	DIRECCIÓN: Carrera 10 No.09-40
102	NOROESTE	ANTIOQUIA	527	EPMSC YARUMAL	DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 20-07
103	NOROESTE	CHOCO	530	EPMSC QUIBDÓ	DIRECCIÓN: Calle 26 N° 8 -35 Barrio Alameda Reyes
104	NOROESTE	ANTIOQUIA	531	EPMSC APARTADÓ	DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía Apartado-Carepa
105	NOROESTE	CHOCO	533	EPMSC ITSMINA	DIRECCIÓN: Carrera 7° N° 12 – 36 Barrio San Francisco
106	NOROESTE	ANTIOQUIA	535	EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE	DIRECCION: Vía Medellín - Bogotá Km 115 (Hacienda Nápoles)
107	NOROESTE	ANTIOQUIA	537	COPED PEDREGAL	DIRECCIÓN: kilometro 6 vía al mar, Finca la TERESITA Corregimiento San Cristóbal Medellín
108	VIEJO CALDAS	CALDAS	601	EPMSC MANIZALES	DIRECCIÓN: Vía Panamericana Barrio Estambul – Manizales Caldas
109	VIEJO CALDAS	CALDAS	602	EPMSC ANSERMA	DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3 – 42 Barrio Pablo VI.
110	VIEJO CALDAS	CALDAS	607	EPMSC PÁCORA	DIRECCIÓN:KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS
111	VIEJO CALDAS	CALDAS	608	EPMSC PENSILVANIA	DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía a Manzanares
112	VIEJO CALDAS	CALDAS	609	EPMSC RIOSUCIO	DIRECCIÓN: Calle 6 N° 8- 14 Avenida el Ciprés, Barrio Guayaquil
113	VIEJO CALDAS	CALDAS	610	EPMSC SALAMINA	DIRECCIÓN: Kilómetro 1 vía Salamina - San Félix
114	VIEJO CALDAS	CALDAS	611	RM MANIZALES	DIRECCIÓN: Avenida Panamericana Granjas de Estambul
115	VIEJO CALDAS	QUINDIO	612	EPMSC CALARCÁ	DIRECCIÓN: Kilometro 1 Vía al Valle
116	VIEJO	QUINDIO	613	EPMSC ARMENIA	DIRECCIÓN: Calle 50 N° 21-97 Barrio Farallones

117	VIEJO CALDAS	QUINDIO	615	RM ARMENIA	DIRECCIÓN: Calle 50 N°23-29 B/ Farallones
118	VIEJO CALDAS	RISARALDA	616	EPMSC ERE PEREIRA	DIRECCIÓN: Carrera 8 # 41-97
119	VIEJO CALDAS	RISARALDA	617	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 14-27
120	VIEJO CALDAS	RISARALDA	620	RM PEREIRA	DIRECCIÓN: VIA LA BADEA TURIN LA POPA
121	VIEJO CALDAS	TOLIMA	626	EPMSC FRESNO	DIRECCIÓN: Calle 3 No. 4-50 Barrio CENTRAL
122	VIEJO CALDAS	TOLIMA	628	EPMSC HONDA	DIRECCIÓN: Kilometro 3 Vía La Dorada, Barrio Caracolí, Honda-Tolima
123	VIEJO CALDAS	TOLIMA	629	EPMSC LÍBANO	DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 5 – 75 BARRIO CENTRAL
124	VIEJO CALDAS	BOYACA	633	EPMSC PUERTO BOYACÁ	DIRECCIÓN: Carrera 5 No, 6B-124
125	VIEJO CALDAS	CALDAS	637	EPAMS PC ERE LA DORADA	DIRECCIÓN: Km 3 antigua vía al Palmar, Barrio Las Ferias
126	VIEJO CALDAS	TOLIMA	639	COIBA IBAGUÉ	DIRECCIÓN: Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué

Tabla 1 Ubicación de los ERON objeto del contrato.

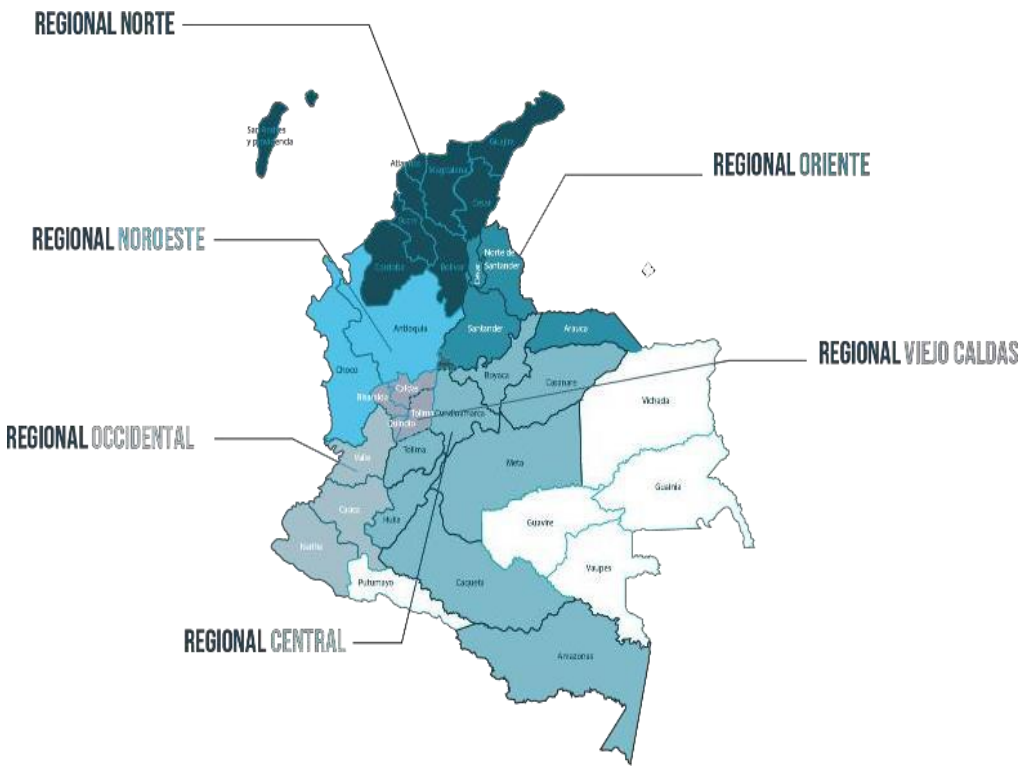


Ilustración 1 Mapa de Colombia tomado de Google.

3. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

El alcance del contrato objeto de interventoría podrá extenderse a actividades de mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación. Para dichas actividades se sustentará de forma objetiva y se fundamentará en la necesidad de cumplir objetivos de orden misional, todo lo anterior se elevará a modificatorio del contrato en aras de ejecutar actividades conexas y/o complementarias para lograr el adecuado funcionamiento del respectivo ERON.

La interventoría de acuerdo con la naturaleza propia de las obligaciones a su cargo deberá exigir la calidad de los bienes, obras y servicios adquiridos en el marco del contrato celebrado verificando que se cumplan dentro del plazo estipulado el objeto contratado y todas las condiciones técnicas, económicas y legales pactadas.

La interventoría debe garantizar que las intervenciones se adelanten dentro de los plazos previstos y con la debida calidad y oportunidad, con la colaboración y apoyo permanente que se requiera para el buen desarrollo del objeto del contrato en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales, de cada establecimiento de reclusión. Se requiere que la interventoría realice la inspección, verificación, seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de la licitación pública para las actividades de mantenimiento recurrente de los establecimientos de reclusión de orden nacional.

En todo momento durante la ejecución del contrato objeto de la presente interventoría, será responsabilidad de la interventoría, realizar el seguimiento y control de la inversión de los recursos asignados al contrato, de tal manera que no se permita superar el valor total del contrato y que se cuente con los respaldos presupuestales.

El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimientos y control al contrato de construcción y el desarrollo de actividades de interventoría, la interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se describes en los pliegos de condiciones del contrato de construcción.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

4.1 CONTRATO DE OBRA:

No. DE CONTRATO:	USPEC-CTO-256-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC)
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMENTO GMC
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BETA REGIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($53.503.188.931,00) MCTE
VALOR TOTAL OBRA	CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($52.344.098.022,00)
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.159.090.909,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($53.503.188.931,00) MCTE
ADICION	MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE $1.602.660.000
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($15.703.229.406,60) MCTE
PLAZO INICIAL DE CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	3 MESES
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	2 MESES
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	6.5 MESES
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
TIEMPO ADICIONADO:	5 MESES

Tabla 2 Información general contrato de Obra

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA:

No. DE CONTRATO:	USPEC-CTO-271-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES).
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BETA REGIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($5.488.260.537) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL FINAL DE CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI 1	MODIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
OTRO SI 2 PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	2 MESES
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	6.5 MESES
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
TIEMPO ADICIONADO:	5 MESES

Tabla 3 información General contrato de interventoría

5. AVANCE PROGRAMACION DE OBRA.

AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL 1 al 30 de abril de 2026

De acuerdo con lo establecido en el ANEXO TECNICO del contrato de interventoría Capitulo 4. ALCANCE DEL CONTRATO, Subcapítulo 4.1.6 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS. Segundo párrafo. Insumos, viñeta 2 Controles mensuales y quincenales de avance de actividades físicamente ejecutadas.

Una vez concluida la etapa “Visitas de diagnóstico” se inició la etapa II de ejecución de obra, la cual comprende a la ejecución física, administrativa, financiera, contable, legal, etc., del objeto contractual.

En el presente informe se presentan los avances al desarrollo de correspondientes a la Etapa II a corte del 26 de abril de 2026.

En atención a la Programación presentada por el contratista, interventoría procedió a realizar la pertinente estructuración del CONTROL DE PROGRAMACIÓN, la cual se presenta en los anexos (CARPETA 5 – AVANCE GENERAL).

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Con el fin de realizar un control detallado del avance de la programación, de acuerdo con el balance de FASE 2, el cual incluye los plazos de ejecución de la prórroga aprobada en otro si No 5 con fecha de terminación hasta el 15 de mayo de 2026.

Se realiza seguimiento semanal de las cantidades de obra ejecutadas por cada ítem que compone el presupuesto de cada ERON, que a su vez componen cada regional del contrato efectuando el seguimiento en detalle.


METODOLOGIA CONTROL DE ENTREGA DE INFORMES DIAGNOSTICOS.

El control de programación se realiza determinando las siguientes divisiones principales, por cada alcance determinado de cada ERON y cada Regional. Según anexo técnico (Tabla No 1 Ubicación de los ERON objeto del contrato).

- PRESUPUESTO
- CONTROL PROGRAMA DE OBRA
- CONSOLIDADO PROGRAMA DE OBRA
- CONTROL AVANCE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA
- CONSOLIDADO REGIONAL
- CONTROL AVANCE REGIONAL
- CONSOLIDADO REGIONALES
- CONTROL AVANCE REGIONALES

PRESUPUESTO

De acuerdo con el balance presupuestado y como se indicó antes, se puede observar en el cuadro de seguimiento presupuesto, la desagregación de las cantidades de obra expresadas en porcentajes de cada ítem por cada frente, multiplicada por el valor del ítem, del balance aprobado.
El seguimiento se realiza semanalmente, consignado en la columna de la semana correspondiente, las cantidades de obra ejecutadas de cada ítem, multiplicada por el valor del ítem y afectándolo por la división del valor del ítem ejecutado por el valor total de obra, lo cual nos arroja el porcentaje ejecutado del ítem con respecto al valor total del contrato de la fase II EJECUCIÓN DE OBRA.

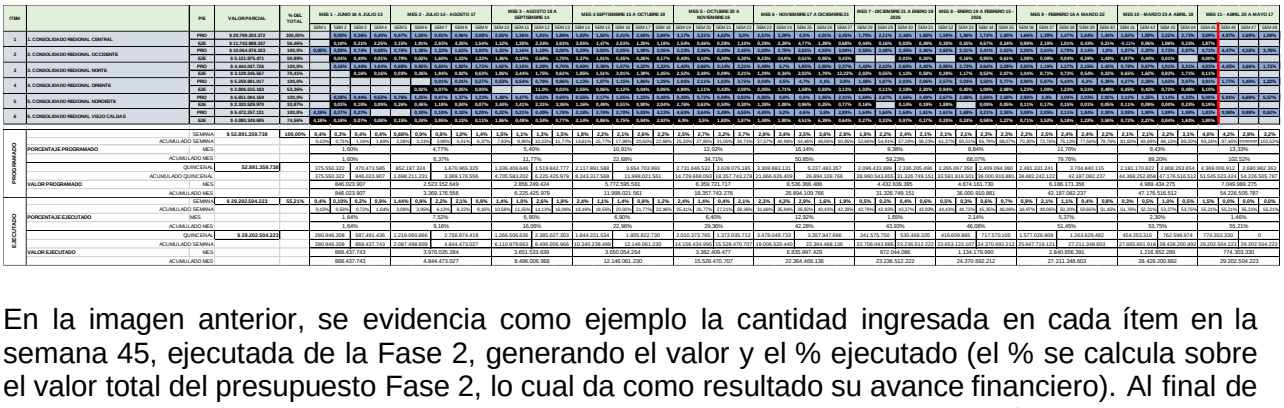

En la imagen anterior, se evidencia como ejemplo la cantidad ingresada en cada ítem en la semana 45, ejecutada de la Fase 2, generando el valor y el % ejecutado (el % se calcula sobre el valor total del presupuesto Fase 2, lo cual da como resultado su avance financiero). Al final de cada columna semanal se registra el valor en pesos y el porcentaje de ejecución de la semana.

AVANCE SEMANA			AVANCE ACUMULADO		
SEMANA 45	ABRIL 20 A 26 DE 2026		SEMANA 1 A 45	JUNIO 16 2025 A 26 ABRIL DE 2026	
PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
3,69%	1,87%	-1,82%	92,11%	56,46%	-35,64%
4,71%	0,00%	-4,70%	100,13%	50,89%	-49,24%
4,03%	0,11%	-3,92%	90,16%	70,41%	-19,74%
3,91%	5,10%	1,19%	97,62%	53,36%	-44,26%
6,00%	0,19%	-5,81%	81,83%	33,87%	-47,96%
1,83%	1,80%	-0,04%	97,41%	74,56%	-22,85%
4,04%	**1,46%**	**-2,58%**	**93,24%**	**55,21%**	**-38,02%**
TOTAL INVERSION					
$ 2.137.263.266	**$ 774.303.330**	**-$ 1.362.959.936**	**$ 49.313.779.778**	**$ 29.202.504.223**	**-$ 20.111.275.555**


En la imagen anterior, se evidencia como ejemplo el valor total ejecutado en el proyecto en la semana 45, con el 55,21% ejecutado. De igual forma en este cuadro de control presupuestal se puede observar en el costado derecho la sumatoria, valores y porcentaje acumulado de las semanas incluyendo al final de la columna el valor total y porcentaje ejecutado el cual coincide con los resultados en el cuadro de consolidado total.

Las anteriores figuras son ilustrativas, el control de presupuesto se presenta en el (ANEXOS - CARPETA 5 – AVANCE GENERAL).

CONTROL PROGRAMACION FISICO COMPLETADO

El control de programación se realiza por cada ítem, consignando los porcentajes programados por cada semana correspondientes a porcentajes y valor de cada ítem

programado según programación presentada por el contratista. De igual forma se consignan los porcentajes de ejecución provenientes del control presupuestal de cada ítem en cada semana, sumatoria de porcentajes y valor de cada ítem ejecutado, de forma que se pueda realizar lectura fácil de programado con lo ejecutado en porcentaje y valor de cada ítem. (Se presentan imágenes ilustrativas).

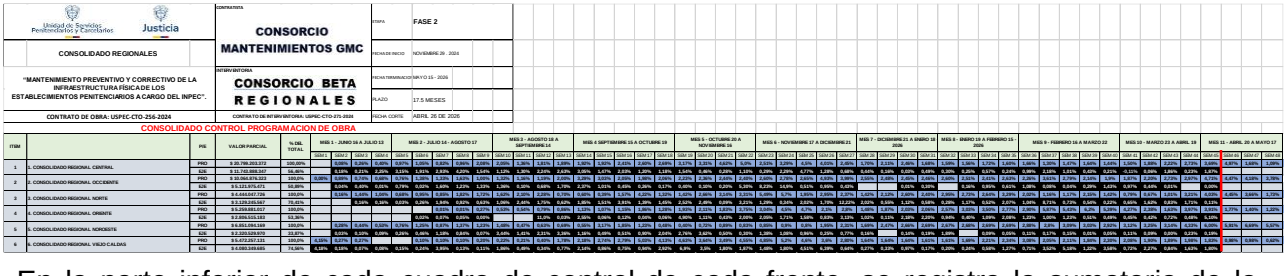
CONSOLIDADO CONTROL PROGRAMACION DE OBRA

CONSOLIDADO REGIONALES

CONSORCIO MANTENIMIENTOS GMC

CONSORCIO BETA REGIONALES

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC".

CONTRATO DE OBRA: USPEC-CTO-256-2024

FASE 2

NOVIEMBRE 29 - 2024

MAYO 15 - 2026

17.5 MESES

ABRIL 26 DE 2026

ITEM		PAI	VALOR PARCIAL	% DEL TOTAL	MES 1 - JUNIO 16 A JULIO 13	MES 2 - JULIO 14 - AGOSTO 17	MES 3 - AGOSTO 18 A SEPTIEMBRE 14	MES 4 SEPTIEMBRE 15 A OCTUBRE 19	MES 5 - OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 16	MES 6 - NOVIEMBRE 17 A DICIEMBRE 21	MES 7 - DICIEMBRE 21 A ENERO 18	MES 8 - ENERO 19 A FEBRERO 15 - 2026	MES 9 - FEBRERO 16 A MARZO 22	MES 10 - MARZO 23 A ABRIL 19	MES 11 - ABRIL 20 A MAYO 17
1	1. CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	PRO	$ 30.799.203.372	100,00%											
		EJE	$ 31.710.888.167	56,46%											
2	2. CONSOLIDADO REGIONAL OCCIDENTE	PRO	$ 10.064.876.323	100,0%											
		EJE	$ 5.111.870.471	50,80%											
3	3. CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	PRO	$ 4.443.647.726	100,0%											
		EJE	$ 1.125.015.567	25,32%											
4	4. CONSOLIDADO REGIONAL ORIENTE	PRO	$ 6.259.881.017	100,0%											
		EJE	$ 2.886.310.192	51,36%											
5	5. CONSOLIDADO REGIONAL NOROESTE	PRO	$ 6.011.094.169	100,0%											
		EJE	$ 2.120.129.873	35,27%											
6	6. CONSOLIDADO REGIONAL VIEJO CALDAS	PRO	$ 5.472.257.131	100,0%											
		EJE	$ 4.080.349.665	74,56%											

En la parte inferior de cada cuadro de control de cada frente, se registra la sumatoria de lo


programado tanto en porcentaje como en valor de cada semana por regional y del acumulado de las semanas e igualmente se registra lo ejecutado en porcentaje de ejecución y valor por cada semana y acumulado, esto nos permite hacer una correlación entre porcentaje de ejecución y valor ejecutado.

De igual forma en el costado derecho del control de programación se incluyó la sumatoria del cuadro de avance físico de obra en la semana y avance acumulado del mes, por cada ítem programado y ejecutado, estableciendo el cumplimiento de ejecución en avance o atraso.

PROGRAMADO	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	SEMANA	**$ 52.891.359.738**
		ACUMULADO SEMANA	
		MES	
		ACUMULADO MES	
	VALOR PROGRAMADO	QUINCENAL	**52.891.359.738**
		ACUMULADO QUINCENAL	
		MES	
		ACUMULADO MES	
EJECUTADO	**PORCENTAJE EJECUTADO**	SEMANA	**$ 29.202.504.223**
		ACUMULADO SEMANA	
		MES	
		ACUMULADO MES	
	VALOR EJECUTADO	QUINCENAL	**$ 29.202.504.223**
		ACUMULADO SEMANA	
		MES	
		ACUMULADO MES	

CONTROL PROGRAMACION CONSOLIDADO

En base a la programación general, los datos se registran en hoja de cálculo denominada Consolidado Control de Programación, en el cual se registran los valores de los Capítulos que componen el balance y la programación, siguiendo la misma matemática descrita anteriormente. El consolidado control de programación se realiza por cada capítulo, se consignan los porcentajes de ejecución provenientes del control de programación de cada capítulo en cada semana, sumatoria de porcentajes y valor de cada capítulo ejecutado, de forma que se pueda realizar lectura fácil de programado con lo ejecutado en porcentaje y valor de cada capítulo. (Se presentan imágenes ilustrativas).

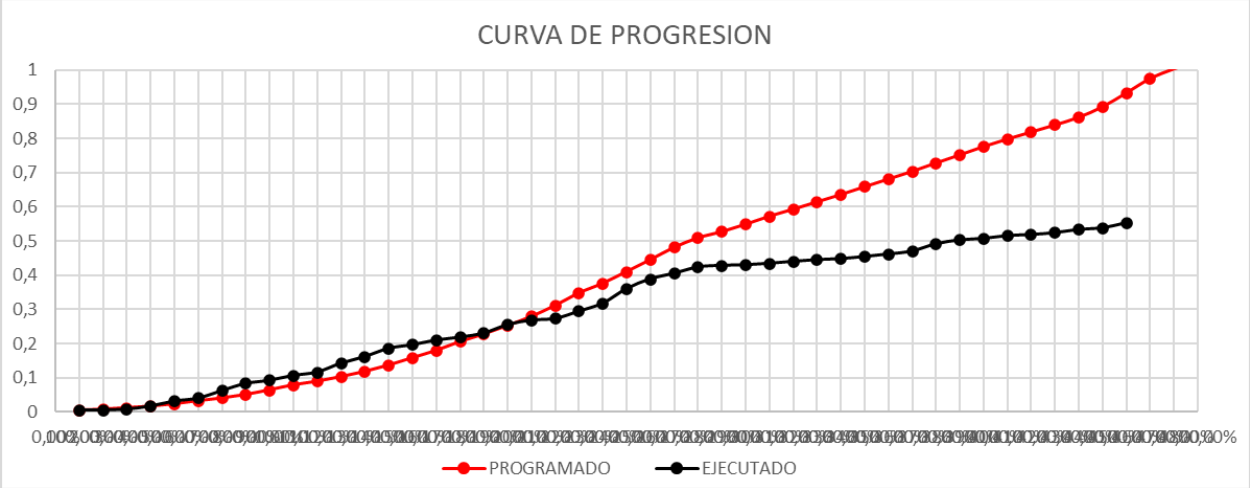

En el costado derecho del control consolidado se incluyó la sumatoria del cuadro de avance físico de obra en la semana y avance acumulado del mes, por cada ítem programado y ejecutado, estableciendo el cumplimiento de ejecución en avance o atraso. (Se pueden observar alertas en color naranja por cada ítem y sumatoria total de atraso).

Finalmente se presenta esquema de curva de progresión de las actividades del mes programadas y ejecutadas.

Las anteriores figuras son ilustrativas, el control de presupuesto se presenta en el anexo 5

DESVIACIONES

Es importante anotar que se estableció un cuadro en el costado derecho del control de programación por cada regional.

El cual indica la desviación en lo programado, ejecutado y cumplimiento, en color naranja.

N°	Capitulos	POR CANTIDADES DE OBRA FISICO EJECUTADO						
		Porcentaje (%) del presupuesto	Programado semana	Ejecutado semana	Desv.	Programado acumulado	Ejecutado acumulado	Desv.
1	1. CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	39,32%	1,45%	0,74%	-0,71%	36,22%	22,20%	-14,02%
2	2. CONSOLIDADO REGIONAL OCCIDENTE	19,03%	0,90%	0,00%	-0,90%	19,05%	9,68%	-9,37%
3	3. CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	8,40%	0,34%	0,01%	-0,33%	7,58%	5,92%	-1,66%
4	4. CONSOLIDADO REGIONAL ORIENTE	9,94%	0,39%	0,51%	0,12%	9,71%	5,31%	-4,40%
5	5. CONSOLIDADO REGIONAL NOROESTE	12,95%	0,78%	0,02%	-0,75%	10,60%	4,39%	-6,21%
6	6. CONSOLIDADO REGIONAL VIEJO CALDAS	10,35%	0,19%	0,19%	0,00%	10,08%	7,71%	-2,36%
		100,00%	**4,04%**	**1,46%**	**-2,58%**	**93,24%**	**55,21%**	**-38,02%**

AVANCE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

Avance según programa de obra, mostrándonos el avance por cada frente en la semana de ejecución y el acumulado total, ilustrándonos sobre el comportamiento de la ejecución del contrato de obra.

A continuación, se presentan los avances de programa de obra, del mes 10 de la semana 38 a la 41 correspondientes al presente informe.

MES 11 DE EJECUCION DE FASE 2. Para el mes 11 de ejecución de la Fase 2, se reportan actividades del 1 al 30 de abril de 2026, en consolidado de las regionales. Para observar en detalle los avances, por favor consultar los anexos reportados por cada regional.

MES 11 DE EJECUCION DE ETAPA II. Para el mes 11 de ejecución de la segunda etapa, se reportan actividades programadas del 1 al 30 de abril de 2026, ofreciendo un programado al 26 de abril de 2026 del 93,24% programado vs 55,21% ejecutado, con una desviación negativa del -38,02%, en consecuencia, a que se han tenido dificultades en los algunos ERONES para su inicio de actividades en algunos casos, evaluación, aprobación de propuestas de diseños, cambios de algunos alcances por parte de la dirección de algunos establecimientos y en otras el contratista no cumple con los inicios y/o entregas oportunas establecidas en los cronogramas avalados, bajo personal de mano de obra en los erones, entre otras .

ANEXOS DOCUMENTALES AL PRESENTE INFORME

Los soportes de la anterior información se presentan en el anexo 5, con corte al 29 de marzo de 2026, los cuales enunciamos a continuación: (Cada alcance de cada frente contiene: presupuesto, programación, consolidado y control avance.

6. ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCION

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL CENTRAL

COMEB BOGOTÁ (PICOTA)

Fecha de inicio: 26 de junio del 2025

Fecha de terminación: 15 de mayo del 2026

Presupuesto: $ 3.963.947.142

Alcances aprobados:

ALCANCE N°1: Hallazgo 1 2023-1 Obras complementarias en reparaciones generales de membranas y tanques subterráneos, y mantenimientos preventivos y correctivos de motobombas en las tres estructuras.

ALCANCE N° 2: - Complementación, modificación red de asbesto cemento por red 6" PVC de acometida principal (800 m) para Estruct. 1 y 2.

ALCANCE N°3 Adecuaciones generales de las redes verticales Hidrosanitarias a fachada en la estructura tres.

ALCANCE N°4 Iluminación perimetral y Guayana interna nueva malla de seguridad, junto con dos garitas (NyS) sobre troncales caracas.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N°1: Obras complementarias, membranas, tanques y motobombas.

Estado del Alcance: En proceso de subsanación y mesas técnicas.

Durante el periodo informado, la gestión se concentró en la definición técnica de las estaciones de bombeo y la revisión de acabados en la impermeabilización. Tras la mesa de trabajo del 14 de abril, se otorgó viabilidad para intervenir los tanques 1 al 6, 8, 9 y 11; no obstante, persiste un hallazgo crítico en el Tanque 10, donde la inspección visual de la Dirección de Interventoría detectó fisuras severas, agrietamientos y desprendimientos de mortero en el afinado, lo que obligó a solicitar una subsanación integral antes de proceder con el recibo. Asimismo, se reportan deficiencias de acabado en la aplicación de poliurea en las tapas de los tanques, presentando espesores irregulares que no cumplen con la ficha técnica. Administrativamente, el contratista mantiene pendiente la entrega de certificados de estanqueidad y el acuerdo de precios para los presostatos, elementos esenciales para garantizar la operatividad de los sistemas de bombeo.

ALCANCE N°2: Sustitución de red de acueducto (Asbesto Cemento a PVC 6").

Estado del Alcance: Ejecución de obra civil.

- Actividades del periodo:
    - 15 al 16 de abril: Instalación de tubería de 6" sobre cama de arena de 10 cm y relleno seleccionado.
    - 20 al 24 de abril: Excavaciones en sectores "Granja" y "CRI". Se realizó el selle de zanjas tras el montaje de la red matriz.
- HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES:
    - Incumplimiento de Programación: A la fecha de cierre de este informe, el contratista no ha entregado la programación de obra actualizada, impidiendo un seguimiento preciso del cronograma.
    - Desacato de Órdenes: El 17 de abril se ordenó el cese de actividades por falta de documentos de SST; sin embargo, el contratista laboró el día 18 sin autorización. Se generó un llamado de atención formal el 20 de abril.
    - Deficiencias en Maquinaria: Se detectó el uso de equipo de compactación ("canguro") sin la debida legalización de hojas de vida y documentos técnicos.

ALCANCE N°3: Redes verticales y Sello de Vanos (Estructura 3).

Este frente representa el punto de mayor criticidad técnica en el presente informe. Basados en las verificaciones de campo y el registro fotográfico de la Dirección, se ratificó el hallazgo de 71 celdas con deficiencias constructivas en el sello de vanos, evidenciando zonas huecas y el uso de materiales no aptos que comprometen la seguridad. Ante la presunción de baja calidad del concreto, se ordenó de manera perentoria la extracción de núcleos para validar la resistencia de 4000 PSI exigida. Paralelamente, se reportan fallas en el componente eléctrico de las Torres C, D y E, donde varias celdas permanecen sin fluido tras la intervención. La Interventoría ha determinado que no se autorizarán recibos parciales ni actas de terminación en este alcance hasta que el contratista demuela los sectores afectados y garantice la funcionalidad eléctrica total.

ALCANCE N°4: Iluminación perimetral, guayana y garitas.

En cumplimiento de las directrices de seguridad emitidas en las mesas de trabajo de este periodo, las actividades de este alcance se mantienen en segundo orden de prioridad, concentrando el recurso humano y técnico en la estabilización y aseguramiento de los vanos de la Estructura 3.

Registro Fotográfico.





Llegada de material a sitio tubería de 6” y material de relleno recebo b 200





Excavación sector CRI



Relleno con material seleccionado b200 y cama de arena 10 cm





Emergencia por sector socavado a causa colector de empresa acueducto adyacente aparentemente deteriorado





















Compactación de tubería instalada sector CRI



Excavaciones sector cri granja

CPMS BOGOTÁ MODELO

Fecha de inicio: 14 de julio del 2025

Fecha de terminación: 15 de mayo del 2026

Presupuesto: $ 2.437.410.887,00

Alcances aprobados:

ALCANCE No. 1 Hallazgo 29 de 2023-1 impermeabilización cubiertas, humedad, filtración, perdida de baldosas entre otros.

ALCANCE No. 2 Modernización área de puerta de información, implementación zona de riesgo y control para el personal externo y puesto de servicio de guardia.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N°1: Impermeabilización de cubiertas Sanidad y Garita #1.

Durante el periodo informado, las actividades se centraron en el mantenimiento de ventanas y rejas (Ítem NP-116), reportándose la finalización del acabado en la cara exterior el día 23 de abril. No obstante, la Interventoría deja constancia de un retraso crítico, ya que según la programación esta fase debió concluir el 20 de abril. Existe una preocupación mayor debido a que el contratista, tras instalar la ventanera por la cara exterior como se le autorizo de acuerdo a su solicitud, deberá ingresar al área interna para retirar la ventanería vieja y realizar el mantenimiento de rejas por la cara interior, actividades que, junto con la fijación de tuberías pendientes , la instalación de la canaleta plástica de sistemas, se encuentran seriamente ajustadas frente a la fecha de terminación del 15 de mayo. Por otro lado, en la cubierta contra la Garita #1, se reporta un hallazgo de incumplimiento total: el contratista no ha iniciado labores en este sector sin justificación técnica alguna, omitiendo los requerimientos realizados en bitácora y el oficio USPEC-BETAREGIONALES 1723. Finalmente, persiste el conflicto por el daño de dos equipos de cómputo de audiencias virtuales debido a filtraciones durante la obra; el establecimiento exige una conciliación técnica y el arreglo de estos antes de firmar cualquier acta de recibo final.

ALCANCE N°2: Modernización Puerta de Información y Zona de Control.

Este alcance se encuentra en fase de definición presupuestal y técnica. En la mesa de trabajo virtual del 24 de abril con la USPEC, se concluyó que se requiere una adición de 850 millones de pesos para ejecutar el 100% de la obra proyectada, debido principalmente a la mala calidad del suelo que exige excavaciones profundas (zapatas a 2.05 m y vigas a 1.55 m) con necesidad de entibados y excavaciones tipo talud. Asimismo, el alto nivel de seguridad requerido (Nivel 5) sobre la fachada principal y (Nivel 3) sobre la fachada interior en la carpintería metálica impacta severamente los costos. Como medida de optimización, la Interventoría y la supervisión propusieron ajustar las especificaciones del portón interno para bajar costos, tema que será validado en una próxima reunión con el cuerpo de custodia (Teniente Pedro Cardona). Se recomendó que el movimiento de tierras producto de dejar una base de recebo de 50 cm de acuerdo a la recomendación del estructural se realice de forma mecánica para optimizar los tiempos, dado que el capítulo de cimentación es uno de los más sensibles al presupuesto y no permite reducciones técnicas sin comprometer la estabilidad.

Aspectos administrativos, ambientales y de riesgo:

En el ámbito administrativo, se gestionaron oficios clave como las observaciones al APU para el movimiento de postes y la solicitud de mesas de trabajo para socialización de balances. En el aspecto financiero, se avanzó en la conciliación de cantidades ejecutadas que se reflejan en el control semanal. Respecto al componente ambiental, se reporta un hallazgo preventivo por el acopio de escombros de más de tres meses; aunque el contratista ya realizó la señalización y empezó la clasificación de materiales (asbesto, vidrio y plástico) con apoyo de personal PPL, la Interventoría exige el retiro urgente de estos residuos antes de la visita de las autoridades ambientales para evitar sanciones al establecimiento. Se acordó que el pago de la disposición de materiales no convencionales se manejará bajo el ítem 1.4.1, previa certificación de peso y volumen, descartando la creación de nuevos APUs para esta labor.

Registro Fotográfico.






Aplicación de anticorrosivo y esmalte actividad NP-116 fase terminada cara externa el 23 de abril de 2026





SI bien a la fecha no han sido retirados los escombros, Contratista acato la recomendación de la Interventoría de señalizar y proteger estos escombros, y con ayuda de personal PPL clasifico parte de los materiales.

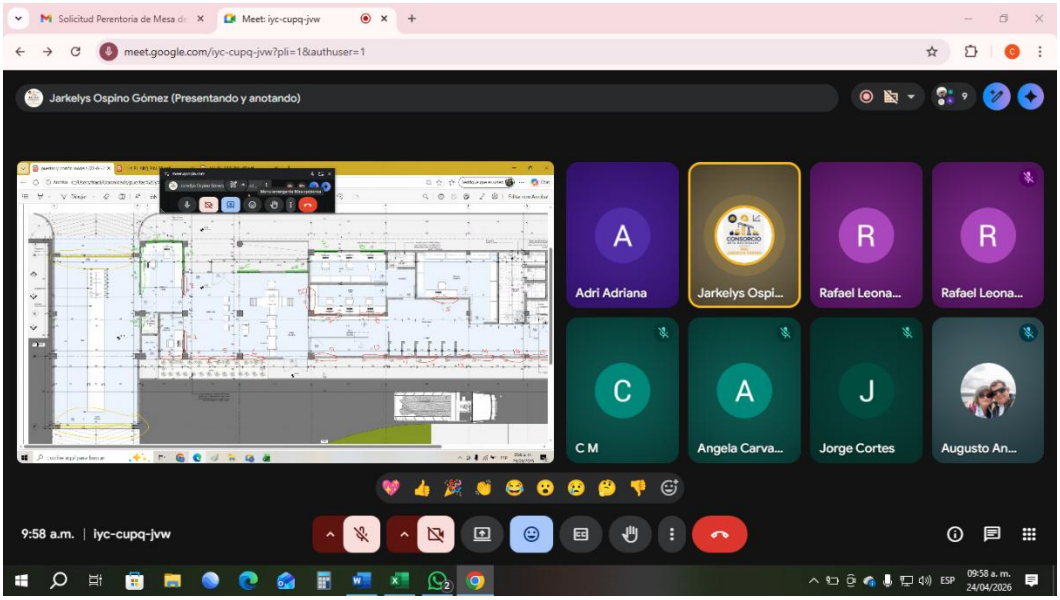

Comité virtual realizado el día 24 de abril de 2026 entre Profesional de Apoyo de la Supervisión del Contrato, Contratista e Interventoría en donde se explicó el valor del alcance # 2 Modernización área de puerta de información, implementación zona de riesgo y control para el personal externo y puesto de servicio de guardia.

RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR)

Fecha de inicio: 27 de abril del 2026

Fecha de terminación: 15 de mayo del 2026.

Presupuesto: $1.068.549.121

Alcance aprobado:

ALCANCE 5 Mantenimiento Rancho

Durante el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de abril de 2026, la gestión de la Interventoría se enfocó en la consolidación del balance presupuestal para la intervención del Rancho. A través de mesas técnicas integradas por el Contratista y la Supervisión de la Entidad, se determinó que el presupuesto asignado de $1.068.549.121 resulta insuficiente para cubrir el 100% de las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial. El hallazgo principal radica en un desbalance económico provocado por la alta complejidad de las redes hidrosanitarias y los estándares de acabados especializados para áreas de preparación de alimentos, y la solicitud de parte del Contratista de impermeabilizar la cubierta, lo que obligó a realizar una priorización técnica de actividades.

Como resultado, se concertó un alcance ajustado que garantiza la funcionalidad operativa del Rancho bajo el techo presupuestal existente, priorizando la renovación de superficies críticas y la optimización de los sistemas de drenaje. No obstante, la Interventoría deja constancia de que las actividades de mantenimiento preventivo complementarias (impermeabilización de cubierta) quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos remanentes o futuras adiciones. En este sentido, se exigió al contratista la actualización inmediata de los Análisis de Precios Unitarios (APU) para los ítems No Previstos (NP), requisito indispensable para formalizar el presupuesto definitivo y asegurar la ejecución intensiva antes del cierre contractual.

Finalmente, se reporta el inicio formal de actividades en sitio el día 27 de abril de 2026. En el marco de este arranque, el contratista ha radicado una solicitud de prórroga argumentando la complejidad técnica de la obra y los inconvenientes logísticos presentados durante el proceso de entrega de áreas por parte del ERON. Esta solicitud se encuentra bajo evaluación técnica por parte de la Interventoría para determinar su impacto en el cronograma y garantizar que los tiempos de ejecución sean coherentes con la calidad exigida.

EPMSC GUATEQUE

Fecha de inicio: 13 de enero del 2026

Fecha de terminación: 14 de abril del 2026 (vencida y sin reprogramación)

Presupuesto: $110.342.163

Alcances aprobados:

Alcance #1: Mantenimiento de la red eléctrica en la parte interna, celdas, talleres.

Alcance #2: Mantenimiento baterías sanitarias en la parte interna áreas comunes.

Alcance #3: Instalación campana extractora en el rancho.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N°1: Mantenimiento red eléctrica interna.

Durante el periodo reportado, la gestión de la red eléctrica ha presentado una dinámica irregular. Inicialmente, se registró el traslado e ingreso de materiales e insumos para las nuevas actividades concertadas en el balance presupuestal (donde se suprimió el ítem de la campana extractora), logrando el inicio de labores en el área de talleres. No obstante, al cierre de la quincena, se evidencia un cese en la continuidad de los trabajos; el contratista informó que el personal eléctrico no se encuentra disponible en sitio por haber sido desplazado a otros establecimientos del mismo contrato. Esta situación es crítica, dado que existen observaciones técnicas pendientes de corrección en celdas y talleres que no han sido atendidas. El contratista justifica esta demora en presuntas faltas de pago por parte de la USPEC, argumento que la Interventoría registra pero que no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales de permanencia del personal.

ALCANCE N°2: Mantenimiento de baterías sanitarias (Áreas Comunes).

En lo referente a las baterías sanitarias de áreas comunes, las actividades se concentraron en el patio de descanso de los PPL, donde se avanzó en la instalación de enchapes y sanitarios, siguiendo la instrucción de liberar esta área antes de intervenir otros frentes. Actualmente, el frente de trabajo cuenta con solo dos (2) operarios verificados en seguridad social, lo cual resulta insuficiente para el volumen de obra pendiente. Respecto a la carpintería metálica, se informa que la fabricación de las puertas para los baños se está realizando en la ciudad de Bogotá, debido a la imposibilidad de llegar a acuerdos técnicos y económicos con proveedores locales que garantizaran la calidad del material exigido. A la fecha, se espera el traslado e instalación de estos elementos para proceder con el cierre de este alcance.

ALCANCE N°3: Instalación campana extractora (Rancho).No se priorizó.

La Interventoría manifiesta una profunda preocupación por el estado de ejecución en Guateque. Conforme a la programación aprobada, el contratista tenía como fecha de entrega el 14 de abril de

2026, compromiso que ha sido incumplido. Al cierre de este informe, se evidencia un avance físico real de apenas el 34.03%, cifra que dista significativamente de lo proyectado y pone en alto riesgo la culminación del objeto contractual. Esta situación ha sido formalmente notificada al contratista, exigiéndole un plan de choque inmediato para mitigar el rezago.

Registro fotográfico





AMAZONAS LETICIA

Alcances a ejecutar:

ALCANCE N°1: Mantenimiento y reparación del área de rancho

Programación: Inicio 12 de septiembre de 2025 Final: 30 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 134,646,686.00

Se culminaron satisfactoriamente las actividades de obra priorizadas en el informe diagnóstico, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales, y que, una vez verificadas, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y uso

Estado: Terminado

EPMSC MONIQUIRÁ

Alcances a ejecutar:
ALCANCE No.1: Mantenimiento y remodelación área de caniles, área de descanso de los semovientes caninos y adecuación de la caja de desagüe a la PTAR. (por requerimiento de la secretaría de salud departamental).

ALCANCE No.: 2 Mantenimiento y adecuación de los alojamientos del cuerpo de custodia y auxiliares.

Programación: Inicio 04 de julio de 2025 Final: 20/03/26
Recurso asignado: $ 155,292,942
Estado: En ejecución.

Durante el mes de abril de 2026, en el establecimiento penitenciario se ejecutaron actividades correspondientes a dos alcances contractuales:

1. Mantenimiento y remodelación del área de caniles, incluyendo zona de descanso de semovientes caninos y adecuación de la caja de desagüe hacia la PTAR, conforme a requerimientos de la Secretaría de Salud Departamental.

2. Mantenimiento y adecuación de los alojamientos del cuerpo de custodia y auxiliares.

En el marco del seguimiento ejercido por la interventoría, se evidenció que el contratista Consorcio mantenimiento GMC avanzó en la instalación de la estructura soporte de cubierta; sin embargo, no ha reiniciado las actividades de acabados en los alojamientos, argumentando retiro del personal por condiciones de inactividad atribuibles al establecimiento.

Si bien la interventoría reconoce la situación expuesta, se reitera que, conforme a las condiciones contractuales y al plazo de ejecución vigente, la falta de personal no constituye una justificación válida para la suspensión de actividades. En consecuencia, se realiza llamado de atención al contratista, solicitando la presentación inmediata de un plan de contingencia que garantice la continuidad y culminación de las obras dentro del plazo establecido.

Adicionalmente, persisten observaciones técnicas previamente reportadas en la placa del área de caniles, las cuales no han sido subsanadas y continúan pendientes de atención por parte del contratista.

Registro Fotográfico.



Instalación de estructura metálica

EPMS RAMIRIQUÍ

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1 Tutela 2021 -05 fallo juzgado penal del circuito de Ramiriquí de fecha 25 de febrero de 2021 refuerzo de muro perimetral, dotación planta eléctrica y cuarto eléctrico, campana extractora área de rancho.

ALCANCE No.2 Revisión y mantenimiento de red eléctrica, cambio de bombillos y reflectores perimetrales e internos 20 reflectores de 100 w luz led.

ALCANCE 3: Mantenimiento de pintura en área de sanidad por humedad. Se realiza acta de reconocimiento y recibo de espacios para la intervención del objeto contractual en compañía del director del Establecimiento, constructor e Interventoría

Programación: Inicio 07 de julio de 2025 Final: 5/02/26

Recurso asignado: $ 137.324.642.00

Actividades ejecutadas en el periodo del informe:

Durante el periodo las actividades de obras de los alcances contractuales fueron ejecutados a satisfacción.

Registro Fotográfico.



Instalación de reflectores exteriores.

EPMSC RM JP SOGAMOSO

Alcances a ejecutar:

Alcance 1: estructura losa de entrepiso cafetería
Alcance 2: Pabellón de maternas y CDI ER

Programación: Inicio 22 de septiembre de 2025 Final: 15/05/26

Recurso asignado: $ 379,696,386.00

Novedades en el periodo del informe:

En el periodo reportado, se adelantó de manera conjunta entre la interventoría y el contratista de obra el levantamiento de cantidades de obra y la priorización de actividades, en atención a las directrices impartidas por la Subdirección del establecimiento, debidamente delegada por la Dirección del mismo.

Como resultado de este ejercicio técnico, se definió el siguiente orden de priorización de las intervenciones:

Mantenimiento general de la batería sanitaria ubicada en la cafetería.
Mantenimiento integral del área de guardia, incluyendo intervención en pisos, muros, mesones, carpintería metálica y ventanería.

Mantenimiento del acceso principal y zona de control de ingreso, contemplando el reemplazo de carpintería metálica e instalación de puertas en vidrio con control de seguridad.

Intervención en el segundo piso, correspondiente a la reposición de pisos en sala y corredores de acceso a alojamientos y baterías sanitarias.
Intervención en el primer piso y escalera de conexión, mediante la reposición de pisos en corredores, oficinas y zonas sanitarias.
Aplicación de pañetes y acabados en muros de áreas exteriores y corredores de circulación en primer y segundo nivel.
Mantenimiento de baterías sanitarias en los alojamientos del segundo piso.

En concordancia con lo anterior, se estableció como compromiso a cargo del contratista la elaboración y presentación del balance de costos, con el propósito de definir el alcance real de ejecución de las actividades priorizadas, conforme a los recursos asignados al establecimiento CPMS Sogamoso, así como la estructuración de la programación de obra ajustada.

No obstante, a la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido la información requerida por parte del contratista, lo cual evidencia un incumplimiento de los compromisos adquiridos y genera afectaciones en la adecuada planeación, control y ejecución del contrato.

En consecuencia, la interventoría reiteró el requerimiento formal al contratista, solicitando:

La definición y comunicación inmediata de la fecha de entrega del balance de obra y la programación ajustada.
La remisión de la información técnica completa, conforme a los requerimientos previamente establecidos.
La definición de la fecha de inicio de las actividades correspondientes al Alcance No. 1, relacionado con la intervención estructural por falla identificada en el segundo piso.

Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta ejecución contractual, mitigar riesgos asociados a retrasos en la programación y propender por el cumplimiento de los cronogramas establecidos, así como permitir la adopción oportuna de las medidas contractuales a que haya lugar.

ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS CÓMBITA

Programación: Inicio 06 de agosto de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Alcance no. 1: hallazgo 36 de 2021-1 continuación construcción alojamiento de rancheros estructura 2.

Alcance 2: tutela 2020-00162. iniciación de la construcción de centros de acopio (shut de basuras) de residuos sólidos del rancho y pabellones rancheros estructura 2.

Alcance 3: mantenimiento de las áreas de sanidad de las dos estructuras para atender observaciones de los entes de control.

Alcance no. 5: homogenización eléctrica de pabellones (taponamiento de las lámparas en celdas por cuestión de seguridad).

Presupuesto: $ 2,489,215,150.00

Actividades ejecutadas en el periodo.

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las cerchas y las correas.

Registro fotográfico.



Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente

EPMSC PAZ DE ARIPORO

Alcances a ejecutar:

Alcance n°2 el cambio de los pisos de los pasillos de circulación
Alcance n°4 cambio del piso de la cancha

Programación: Inicio 15 de septiembre de 2025 Final: 15 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $ 137,321,439.00

Novedades en el periodo del informe:

Se iniciaron actividades de obras el día 04 de noviembre de 2025.

Actividades ejecutadas en el periodo .

Estado: terminado

El contratista culminó las actividades de obra civil programadas en el establecimiento de Paz de Ariporo, ejecutando las labores conforme al alcance contractual y especificaciones técnicas establecidas.

Registro Fotográfico



Instalación de cerámica de piso área de pasillo

EPC CÁQUEZA

Alcances a ejecutar:

Alcance no.1: tanques de almacenamiento de agua potable
Alcance no.2: adecuación de celdas de patios 1 y 2

Programación: Inicio 17 de septiembre de 2025 Final: 30 de enero de 2026

Recurso asignado: $ 71,491,358.00

la interventoría efectuó la devolución de la propuesta técnica y económica presentada para la elaboración de los diseños hidráulicos y el estudio de suelos del EPC Cáqueza, incluyendo las respectivas observaciones técnicas y requerimientos de información complementaria, se procede a realizar seguimiento al estado de la misma.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista sigue incumpliendo con la entrega de documentación técnica de la propuesta de intervención y el presupuesto aterrizado ni la remisión de la documentación ajustada, lo cual limita la continuidad del proceso de revisión, validación técnica y eventual aprobación de la propuesta presentada.

Cabe precisar que los requerimientos efectuados mediante el oficio USPEC-BETAREGIONALES-2129 corresponden a soportes técnicos, económicos y metodológicos mínimos, necesarios para verificar la razonabilidad de los valores propuestos, así como para garantizar la adecuada definición del alcance de las actividades a ejecutar, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En este sentido, se encuentra pendiente por parte del contratista la entrega de información asociada, como mínimo, a los siguientes aspectos:

Estudios de mercado, cotizaciones o soportes comparativos de precios.
Análisis de Precios Unitarios (APU).
Desglose detallado de la propuesta económica (actividades, recursos, equipos, insumos y tiempos).

En consecuencia, la interventoría ha reiterado la solicitud de entrega de la información completa, ajustada y debidamente soportada, con el fin de mitigar retrasos y garantizar la continuidad de las actividades contractuales.

EPMSC VILLETA

Alcances a ejecutar:

Alcance no.1: Cambio de unidades sanitarias para el personal de PPL zonas comunes y en celdas.

Alcance no.2: acondicionar la guardia interna para separar los funcionarios de los PPL, y adecuación de un baño

Programación: Inicio 10 de octubre de 2025 Final: 20 de enero de 2026

Recurso asignado: $ 45,618,824.00

Se realizaron actividades de desmonte manual de elementos metálicos existentes, incluyendo rejas y módulos con malla, garantizando el retiro controlado, limpieza de puntos de fijación y disposición de los materiales reutilizables en sitio autorizado.

Se ejecutaron trabajos de demolición manual de acabados de piso, pañetes y elementos de concreto, incluyendo retiro, cargue y disposición final de escombros conforme a normativa ambiental.

Se adelantaron actividades de construcción estructural y de mampostería, tales como vigas de confinamiento, columnetas y muros en ladrillo macizo, con sus respectivos procesos de formaleteo, vaciado y curado.

Se instalaron redes hidrosanitarias en PVC, incluyendo puntos de agua y desagüe, regatas, accesorios y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Se ejecutaron actividades de adecuación arquitectónica como instalación de cielo raso en PVC, pañetes impermeabilizados, alistados de piso y acabados.

Se desarrollaron instalaciones eléctricas, incluyendo redes, salidas para tomacorrientes y montaje de luminarias LED.
Se realizó suministro e instalación de elementos de carpintería metálica y aluminio, tales como puertas, ventanas y accesorios.

Se ejecutaron acabados finales, incluyendo pintura epóxica, enchapes en pisos y muros, e instalación de aparatos sanitarios y griferías.

Registro Fotográfico



Intervención de baño y las instalaciones hidráulicas, cielo raso en pvc y adecuación de área de guardia.

EPMSC GRANADA

Alcances a ejecutar:

Alcance n° 2. concertinas para reforzar la seguridad perimetral e interna.

Alcance no.3. El cambio de tomas, interruptores, e iluminación del establecimiento.

Programación: Inicio 15 de septiembre de 2025 Final: 05 de febrero de 2026
Recurso asignado: $ 137,358,766.00

Se continúan actividades de desmonte de la concertina existe en el establecimiento.

10.2.2.5 Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o fase amarilla) + 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en oficina.

Se ejecuta esta actividad en e patio 1, esta parcial va por la coraza de ¾” instalada y la cual deriva a las celdas.

10.2.1.32 Suministro e instalación de coraza PVC flexible de ¾.

Registro fotográfico.





Trabajos de instalación de coraza ¾ a celdas patio 1

EPC GUAMO

Alcances a ejecutar:

Alcance 2: Reposición e instalación de reflectores, reposición e instalación de luminarias, reposición y/o mantenimiento ventiladores de techo dependencias.

Programación: Inicio 01 de septiembre de 2025 Final: 15 de diciembre de 2025.
Recurso asignado: $ 95,930,416.19

Novedades en el periodo del informe:

Estado: terminado

Se culminaron satisfactoriamente las actividades de obra priorizadas en el informe diagnóstico, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales, y que, una vez verificadas, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y uso

Registro Fotográfico.



Instalación de luminarias herméticas led 2*18w

EPC YOPAL.

alcances contractuales:

Alcance°1 tutela 2022-00137. solicita garantizar el servicio sanitario de manera adecuada
Alcance n°2 mantenimiento correctivo de la tubería hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento. ya que se encuentra cristalizada por exposición uv por la intemperie.
Alcance n°3mantenimiento a cajas de desagüe de aguas sanitarias y aguas lluvias
Alcance n°4instalación de concertinas en mallas perimetrales del establecimiento

Alcances aprobados:
Alcance n°1 tutela 2022-00137. solicita garantizar el servicio sanitario de manera adecuada
Alcance n°2 mantenimiento correctivo de la tubería hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento. ya que se encuentra cristalizada por exposición UV por la intemperie.

Fecha de inicio: 09 de febrero del 2026
Fecha de terminación en el eron: 20 de marzo del 2025
Recurso asignado al eron o inversión en el eron: $ 424.535.284

Actividades ejecutadas en el periodo:

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable
Se ejecutó la instalación de orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 calibre 18, con una longitud de 2,00 m, fijado mediante pernos pasantes, equivalente o superior en calidad al tipo especificado.

La actividad incluyó el suministro del elemento, perforaciones para fijación, anclajes y su respectivo montaje.

Se precisa que este ítem no contempla el suministro ni la instalación de grifería (válvula o sistema tipo push), ni la ejecución de puntos hidrosanitarios.
La cantidad ejecutada corresponde a unidades instaladas en el Pabellón 3.

Grifería válvula antivandálica de alta descarga (fluxómetro) para ducha
Se realizó la instalación de grifería antivandálica de alta descarga tipo fluxómetro para ducha, con sistema de accionamiento mediante botón tipo push empotrado en muro, para suministro de agua fría.

El sistema instalado corresponde a elementos metálicos cromados, incluyendo válvula en bronce, botón de accionamiento, escudo, regadera y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

La actividad incluyó la ejecución de regatas, resanes, instalación de accesorios hidráulicos desde la acometida hasta la conexión final con la regadera, así como las pruebas de funcionamiento correspondientes.

Las cantidades ejecutadas corresponden a instalaciones realizadas en el Pabellón 7 – segundo piso.

Grifería antivandálica para orinal

Este ítem corresponde al suministro e instalación de elementos de grifería antivandálica en los puntos definidos en planos, no incluidos dentro del suministro de los aparatos sanitarios. Incluye, según aplique, llaves terminales, grifería para lavamanos, duchas y demás accesorios hidráulicos requeridos.

Registro fotográfico.




Cerramiento requerido por establecimiento., Botones descarga orinal y lavamanos.




Pared estucada y pintada con pintura epóxica, sanitario antivandálico.

EPMSC CHOCONTÁ.

Alcances contractuales:

Presupuesto: $75.537.121

Alcance no.1: Se requiere arreglo y mantenimiento de la tubería de los tanques de abastecimiento de agua para cada una de las celdas de los PPL ya que actualmente tan solo están en funcionamiento 02 tanques de 4 que se encuentran instalados en la terraza de la estructura.
Alcance no.2: Cambio e instalación de 02 tanques de agua para la zona de alojamientos del personal del ccv.

Alcance no.3: Intervención total del área del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones, trampa de grasa, acueducto, alcantarillado, y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparación de alimentos ya que esta zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atención por parte de secretaria de salud por los diferentes hallazgos en los puntos ya mencionados.

Alcances aprobados:

Alcance no.3: Intervención total del área del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones, trampa de grasa, acueducto, alcantarillado y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparación de alimentos ya que esta zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atención por parte de secretaria de Salud por los diferentes hallazgos en los puntos ya mencionados.

Estado: terminado.
Fecha de inicio: 04 de julio
Fecha de terminación en el eron: 25 de agosto del 2025

CPMS FACATATIVA.

Alcances contractuales:
Alcance no.1: mantenimiento de la cubierta de la estructura en la zona del auditorio y Adecuación de shut de residuos sólidos.

Alcances aprobados:
Alcance: intervención pared armadillo y respaldo pared de batería baños y ajuste de humedades

Fecha de inicio: 09 de febrero de 2025
Fecha de terminación en el eron: 25 de marzo del 2026
Recurso asignado al eron o inversión en el eron: $ 24.931.785.

Actividades ejecutadas presente periodo:

Se realizaron visita a campo para verificación de cantidades para cierre de balance.
Falta programar entrega de actividades parciales al establecimiento.

Estado: terminado.

Registro fotográfico.





EPMSC CMS FUSAGASGA:

Alcances contractuales:
Alcance no.1: reubicación alojamiento guardia y área administrativos (incluyendo oficina Atención al ciudadano)
Alcance no.2: instalación red eléctrica general eron.

Alcances aprobados: batería de baños, alojamiento, mejoramiento del muro, pintura de fachada.

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2025

Fecha de terminación en el eron: 12 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $ 105.119.613
Actividades ejecutadas presente periodo:
Actividades terminadas al 100% y entregadas parcialmente el 14 de enero del 2026 al establecimiento.

EMPSC GACHETA:

Alcances contractuales:
Alcance no.1: mantén. y adecu. archivo de gestión documental.
Alcance no.2: adecuación del área de sanidad, para la atención de los ppl, para que cumpla con el mínimo de requisitos.
Alcance no.3: adecuación área administrativa
Alcance no.4: mejoramiento de la bodega de almacenamiento de materia prima del rancho.

Alcances aprobados:
Alcance modificado: intervención área de caniles y cocineta y lavadero

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2025
Fecha de terminación en el eron: 12 de diciembre de 2025
Recursos: $ 32.683.681 + $ 6.794.352,60.

Actividades terminadas y entregadas al establecimiento.

EPMSC UBATE:

Alcances contractuales:
Alcance no. 1: techos lavables área de sanidad
Alcance no. 2: paredes media caña área de sanidad
Alcance no. 3: adecuación y reestructuración de zona administrativa, áreas comunes, oficinas
Alcance no. 4: adecuación zona de almacenamiento talleres

Alcances aprobados:
Alcance no. 3: adecuación y reestructuración de zona administrativa, áreas comunes, oficinas

Las actividades ya están ejecutadas a un 100%, se hizo entrega parcial y se está a la espera de entregar al establecimiento de manera formal con el USPEC.

Fecha de inicio: 07 de julio de 2025
Fecha de terminación en el eron: 14 de agosto de 2025
Recursos: $69.663.991

EPMSC GIRARDOT:

alcances contractuales
alcance no.1: impermeabilización de placas de todas las estructuras del establecimiento, zona administrativa, alojamientos, zona plantas eléctricas, zona motobombas, pabellones, educativas, zona alimentación, talleres.
patios y celdas: reemplazo y/o instalación de baterías sanitarias
alcance no.2: mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo a la ley 594 de 2000 art. 16, y el plan de mejoramiento archivístico

alcances aprobados: alcance no.1: impermeabilización de placas de todas las estructuras del establecimiento, zona administrativa, alojamientos, plantas eléctricas, zona motobombas, pabellones, educativas, zona alimentación, talleres

Fecha de inicio: 26 de agosto del 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $408.998.714

Actividades ejecutadas:
Las actividades fueron finalizadas a un 100% y entregadas parcialmente al establecimiento desde el 3 de octubre del 2025. esperando se programe la estrega formal con el uspec

EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 43 de 2022-1 suministro de agua potable. pendiente visita con el ente de control.
Alcance no.2: reposición y/o mantenimiento correctivo de redes eléctricas (incluye cableado, tuberías embebidas y expuestas) iluminación de perimetral (guayanas internas y externas).
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria (baños, lavamos) áreas de sanidad.

Alcance no.4: adecuación de garita por puntos ciegos entre las garitas 3 y 4, en reemplazo del retén 3 y 4

Alcances aprobados:
Alcance no 2: reposición y/o mantenimiento correctivo de redes eléctricas (incluye cableado, tuberías embebidas y expuestas) iluminación de perimetral (guayanas internas y externas).

Fecha de inicio: 01 de julio de 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recursos asignados: $1.392.260.179.
Estado: terminado.
Actividades ejecutadas en el periodo: se terminaron las actividades de obra.

Registro fotográfico





EPMSC RM NEIVA

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnicas para visitas conyugales.
Alcance no.2: tutela 202300051. se intervendrán baterías sanitarias y lavaderos
Alcance no 3: mantenimiento de plancha de alojamientos de los pabellones 1a,1b, 2a, 2b, 3, 4 y rm.

Alcances aprobados:
Alcance 3: mantenimiento de plancha de alojamientos de los pabellones 1a,1b, 2a, 2b, 3, 4 y rm,

Fecha de inicio: 02 de julio del 2025

Fecha de terminación en el eron: 14 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 743.280.495

Actividades ejecutadas en el periodo:
Actividades al 100%, se realizó la entrega final al establecimiento en compañía del supervisor de apoyo del INPEC ingeniero leonardo cabrales el día 09 de octubre del 2025.

Estado: terminado.

EPMSC GARZON.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-condiciones técnicas para visitas conyugales
Alcance no.2: mantenimiento a la red eléctrica perimetral.

Alcances aprobados:
Alcance no .2: mantenimiento a la red eléctrica perimetral

Fecha de inicio: 15 de agosto de 2025
Fecha de terminación en el eron: 31 de octubre de 2025

Recurso asignado: $201.787.386

las actividades terminadas al 100%, se realizó la entrega final al establecimiento en compañía del supervisor de apoyo del INPEC ingeniero leonardo cabrales el día 08 de octubre del 2025.

LA PLATA.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnica (construcción) para visitas conyugales
Alcance no.2: cambio de pisos área del rancho eliminación de aposamiento de agua, mejoramiento sistema hidráulico.

Alcances aprobados:
Alcance no.2: cambio de pisos área del rancho eliminación de pasamiento de agua, mejoramiento sistema hidráulico

Fecha de inicio en el eron: pendiente por reprogramar

Fecha de terminación en el eron: pendiente por reprogramar

Recurso asignado: $303.000.820

Actividades ejecutadas.

Se retoman actividades por parte del contratista, el día lunes 13 de abril.
se continúa con boquilla de piso tipo granito de 30x30
se continúan actividades de pintura epóxica en área de rancho.
se realiza aseo y bote de escombros
se continúa con estuco, retocando detalles.

Registro fotográfico.



Pulida de piso área de rancho, aplicación de pintura muros en área de ranchos .

EPMSC PITALITO:

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnicas para visitas conyugales
Alcance no. 2: tutela 2020-00020. implementación de acciones para reducir el hacinamiento
Alcance no. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12
Alcance no. 5: adecuación placa de cubierta patio 6

Alcances aprobados:
Alcance no.5: adecuación placa de cubierta patio 6
Alcance no. 2: tutela 2020 00020. implementación de acciones para reducir el hacinamiento.
Alcance no. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12

fecha de inicio en el eron: 07 de julio del 2025

Fecha de terminación en el eron: 09 de diciembre de 2025
Recurso asignado : $538.930.092

Actividades terminadas al 100% está pendiente entregar al establecimiento la entrega de las ultimas iluminarias por parte del contratista e interventoría.

EPMSC COLONIA PENAL DE ORIENTE – CAMIS

Alcances contractuales
Alcance: patio n°3, mantenimiento y mejoramiento patio 3 cola de pato
Valor: $ 448.767.840,00
Actividades ejecutadas: durante la semana el contratista realizo las siguientes actividades:

Actividades realizadas en los alojamientos de mujeres

Placa de contrapiso en concreto e.>17,6<=20,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante




Construcción de placa.

EPMSC RM VILLAVICENCIO:

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 22 2022-1 impermeabilización UTE
Alcance no.2: tutela 202100155. implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación alojamientos ccv

Alcances aprobados:
Alcance no1: hallazgo 22 2022-1 impermeabilización UTE
Alcance no.2: tutela 202100155. implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación alojamientos ccv

programación: inicio 02 de septiembre de 2025 final: 09 de diciembre de 2025

Fecha de inicio en el eron: 02 de septiembre de 2025

Fecha de terminación en el eron: 09 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $604.115.802

Actividades ejecutadas:

1.3.4.8 desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas no sean de carga). incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

se realiza el desmonte de las cubiertas existentes en la habitación 3 y 4, dentro de esta actividad se incluye el desmonte de las correas y/o cerchas existentes, ya que la proyección de ejecución que se quiere es que está cubierta se instale totalmente sobre una estructura nueva.

4.4.3.4 estructura metálica de cubierta y pasillo técnico (inc. anticorrosivo y pintura tipo esmalte) – esta actividad se refiere a la instalación de la estructura metálica tipo c, según diseño entregado, vale la pena aclarar que una vez revisado este plano y revisadas las actividades en sitio, se evidencia que estas estructuras instaladas no coinciden con los diseños, por este motivo no se cuantifica.

10.2.1.7 suministro e instalación de tubería pvc de 3/4". incluye conectores, terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
esta actividad se realiza para la construcción de la red eléctrica de tomas e interruptores de las 4 habitaciones, esta actividad consiste en cortar el murto e instalar esta tubería y las cajas para tomas e interruptores.

1.3.9.1 desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo c o z, doble c / cajón, peinazos, cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas gramíneas como la guadua o el bambú). incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. el pago por m2 será medido en el área cubierta proyectada en planta.
se retira las estructuras de soporte




Instalación de estructura de cubiertas y

EPMSC ACACIAS

Alcances contractuales:

Alcance no.1: pabellones 4 y 5, celdas de la segunda planta. $450.478.376
alcance no.2: tutela 2021-00377. se solicita el arreglo de la celda 78 del pabellón 6. $ 13.857.844

Alcance no.3: tutela 2021-00164. mantenimiento de barandas, rejas, cubículos, escaleras. $ 350.942.198
Alcance no.4: tutela 2021-00237. mantenimiento canales de desagüe. $ 233.430.466
Alcance no.5tutela 2022-00260. destapar los sifones de las duchas del segundo piso y del orinal del primer piso $4.265.512

Alcances aprobados

Alcance no.1: pabellones 4 y 5, celdas de la segunda planta
Alcance no.2: tutela 2021-00377. se solicita el arreglo de la celda 78 del pabellón 6.
alcance no.3: tutela 2021-00164. mantenimiento de barandas, rejas, cubículos, escaleras
alcance no.4: tutela 2021-00237. mantenimiento canales de desagüe
alcance no.5tutela 2022-00260. destapar los sifones de las duchas del segundo piso y del orinal del primer piso

Recurso asignado al eron o inversión: $1.052.974.364

Actividades ejecutadas:

pinturas y recubrimientos

21.5.3 pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 2,1/2" - 4".



Aplicación de anticorrosivo barandas.

EPMSC MELGAR

Alcances contractuales:
alcance no.1: realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e implementar un lavamanos al interior del rancho

Alcances aprobados:
Alcance no.1: realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e implementar un lavamanos al interior del rancho.

Fecha de inicio en el eron: 22 de septiembre del 2025

Observaciones novedades y/o generalidades del frente de obra: este establecimiento ya fue terminadas las actividades al 100%, se realizó la entrega al establecimiento, pendiente entrega de las ultimas actividades.

EPMSC CHAPARRAL

Alcances contractuales:
Alcance no.1: cambio de techos de asbesto por techos en material adecuado en todo el establecimiento.
Alcance no.2: instalación de concertina de los patios.

Alcances aprobados:
Alcance no.1: cambio de techos de asbesto por techos en material adecuado en todo el establecimiento.
Alcance no.2: instalación de concertina de los patios.

Fecha de inicio en el eron: 07 de julio del 2025
Fecha de terminación en el eron: 09 de octubre de 2025
Recursos asignado al eron o inversión: $ 147.128.771.

Observaciones novedades y/o generalidades del frente de obra
estas actividades fueron terminadas en un 100%, quedando recursos del presupuesto contractual.

EPMSC JP ESPINAL

alcances contractuales:
alcance no.1: adecuación de cuarto plomado para dar uso al equipo de rx
alcance no.2: remodelación baño del área de sanidad se encuentra dañado, techo en drywall deteriorado por humedad
alcance no.3: mantenimiento cerraduras especiales
alcance no.4: mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado patios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, utey educativas.
alcance no.5: mantenimiento y mejora de la red eléctrica patios 1, 2, 3 ,4,5,6,7,8,9,10, ute y área de talleres sector 1 y 2, educativas
alcance no. 6 adecuación área de caniles

alcances aprobados:
alcance no.4: “mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado”.
alcance no. 5: “mantenimiento y mejora de la red eléctrica”

fecha de inicio en el eron: 11 de agosto de 2025
fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
recursos asigando al eron o inversión en el eron: $892.785.935

EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN (INCLUYE CABLEADO, TUBERÍAS EMBEBIDAS Y EXPUESTAS) DE TODO EL ESTABLECIMIENTO.

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de julio de 2025

Final: 17 de agosto de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 17 de agosto de 2025

Recurso asignado: $334.750.742:00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante.
- A la fecha no han sido remitido la subsanación de las observaciones de los documentos de cierre, requerimiento que ha sido reiterativo.



Ubicación general de la red eléctrica perimetral entre garitas

CPMSCHI CHIQUINQUIRA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Arreglo general de aula de talleres por filtraciones de agua en techo y paredes área restringida por riesgo, al igual que la capilla-espacio para actividades espirituales católica (se excluye es espacio capilla-espacio para actividades espirituales católica por valor asignado).

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de julio de 2025

Final: 17 de agosto de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 17 de agosto de 2025

Recurso asignado: $ 200´121.507.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento
- Se realizará entrega formal por parte del profesional de apoyo de la USPEC para hacer la entrega oficial el día 16 de abril de 2026.



Cambio de cubierta zona de talleres

EPMSC DUITAMA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Mantenimiento e impermeabilización de cubiertas

Fechas según ultima programación

Inicio: 14 de julio de 2025

Final: 14 de diciembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 14 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $ 244´988.628.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, no se realiza acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento debido a un pendiente de una canal.
- No se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento debido a que no se ha suministrado de forma debida la totalidad de la documentación.



Cambio de cubierta, canales y bajantes del establecimiento

EPMSC TUNJA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Adecuación y mantenimiento. de las instalaciones eléctricas y sistema de iluminación de las áreas internas y semi externas, incluyendo áreas administrativas. del establecimiento, así mismo carece de iluminación las celdas, pasillos y demás áreas de la parte interna del establecimiento

Alcance N°2: Adecuación. de un casino con el fin de contar con un espacio para la toma de los alimentos, pausas activas y descanso del personal de funcionarios, en sus horas laborales. teniendo en cuenta que no se cuenta con un lugar en el establecimiento. de ahí la importancia de crear entornos saludables que faciliten a los empleados tener comodidad y ambiente relajado

Fechas según ultima programación

Inicio: 01 de diciembre de 2025

Final: 31 de marzo de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de febrero de 2026

Recurso asignado: $110´411.211.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, no se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento ya que la Dirección requiere la presencia del profesional de apoyo de la USPEC.
- Se encuentra pendiente el acta parcial y acta final de recibo y entrega de obras.
- Se realizará entrega formal por parte del profesional de apoyo de la USPEC para hacer la entrega oficial el día 16 de abril de 2026.



Adecuación zona de casino, instalaciones eléctricas

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL OCCIDENTE

EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

Fecha de inicio: 28 de agosto del 2025

Fecha de terminación: 16 de enero del 2026. (vencida y sin reprogramación)

Presupuesto $ 44.957.403,00

Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: "Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico".

Actividades desarrolladas:

Durante la mayor parte del periodo informado, la Interventoría ratificó la persistencia de una inactividad operativa absoluta en el establecimiento, a pesar de que las áreas de intervención (archivo, bodega y pasillo) cuentan con total disponibilidad de vanos y condiciones de limpieza óptimas desde el mes de febrero. El proyecto mantiene un avance físico del 94,34%, restando un 5,66% correspondiente exclusivamente a la fabricación e instalación de carpintería metálica (dos puertas y dos ventanas). Es preciso señalar que el Contratista incumplió el compromiso formal

adquirido en la mesa de trabajo del 09 de abril, donde se estipuló la entrega e instalación de estos elementos para los días 16 y 17 de abril de 2026.

Al cierre de la quincena, la situación del proyecto se ha visto alterada por factores externos de fuerza mayor. Mediante el oficio CE-CGMC-256-2067 con fecha del 27 de abril de 2026, el Consorcio Mantenimientos GMC notificó la suspensión inmediata de actividades en la Regional Occidental, incluyendo el frente de Bolívar (Cauca), debido a la ola de atentados terroristas, alteraciones del orden público y cierres viales que afectan el suroccidente del país. El contratista argumenta una imposibilidad material de ejecución y riesgos para la integridad del personal operativo, situación que la Interventoría se encuentra validando frente a la realidad del territorio.

La Interventoría deja constancia de que, si bien el contratista aduce ahora motivos de fuerza mayor para la suspensión, el incumplimiento en la entrega del alcance final es previo a estos eventos de orden público, considerando que la fecha de terminación contractual venció el 16 de enero de 2026 y el proyecto carece de una reprogramación vigente. Administrativamente, se informa a la Entidad que el proceso de cierre y recibo final queda supeditado al restablecimiento de las condiciones de seguridad en la zona y a la efectiva voluntad técnica del contratista para finalizar el suministro de carpintería una vez se normalice la movilidad en el departamento del Cauca.

Registro fotográfico

No se ejecutaron actividades durante el periodo.

EPMSC EL BORDO

Fecha de inicio: 4 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 15 de enero del 2026. (vencida y sin reprogramación)

Presupuesto $ 46.134.443

Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: " Cambio de cubierta total del establecimiento, incluye estructura metálica”.

Actividades desarrolladas:

Durante la presente quincena, se reportó una reactivación en la gestión administrativa del frente de obra de El Bordo. Mediante el oficio CE-CGMC-256-2049 del 22 de abril, el contratista manifestó su intención de iniciar actividades físicas en el área del Comedor de Guardia. No obstante, tras la revisión técnica de la Interventoría, se determinó que la programación presentada contenía discrepancias con el balance de obra y los tiempos contractuales. Se le recordó al contratista que

la fecha de inicio original (04 de septiembre de 2025) es inamovible, por lo cual el cronograma debe ajustarse estrictamente a los periodos de suspensión y reinicio vigentes.

En el componente técnico, la Interventoría emitió recomendaciones de optimización estructural para el reemplazo de la cubierta, sugiriendo el uso de perfiles de mayor eficiencia (120x120x3mm para columnas y 200x100x3mm para vigas) y especificaciones detalladas para las platinas de conexión y refuerzos en cumbrera. Bajo estas condiciones, se autorizó exclusivamente el inicio de actividades preliminares y de desmonte, supeditando la fase de fabricación y montaje al aval definitivo del diseño estructural por parte del calculista del contratista.

A pesar de la intención de inicio manifestada el 22 de abril, el cierre del periodo informado se vio afectado por condiciones de fuerza mayor. Mediante el comunicado CE-CGMC-256-2067 del 27 de abril, el Consorcio Mantenimientos GMC notificó la suspensión inmediata de actividades en este establecimiento debido a la grave alteración del orden público, atentados terroristas y restricciones de movilidad en el departamento del Cauca. El contratista argumenta una imposibilidad material de ejecución y riesgos inminentes para la integridad del personal operativo en la zona de influencia de El Bordo.

Registro fotográfico

No se logró acceder al taller donde tienen la estructura.

EPMSC PUERTO TEJADA

Fecha de inicio: 20 de enero del 2026

Fecha de terminación: 24 de marzo del 2026 (vencida y sin reprogramación)

Presupuesto $45.633.398

Alcances aprobados:

- Alcance contractual No.1: Mantenimiento de baños y duchas Baterías Sanitarias Piso 1
- Alcance contractual No.1: Mantenimiento de baños y duchas Baterías Sanitarias Piso 2

Actividades desarrolladas:

(Mantenimiento de baños y duchas - Batería Sanitaria Piso 1)

El hito principal de este periodo fue la entrega parcial de espacios realizada el 20 de abril de 2026, contando con la participación de la Dirección del Establecimiento, la Supervisión de la USPEC y la Interventoría. Tras la inspección técnica, se verificó el cumplimiento del 100% de la ejecución en la

batería sanitaria del primer piso (pabellón único), intervención que incluyó la adecuación de seis (6) unidades sanitarias y tres (3) duchas, mediante la reposición de aparatos, enchapes, pintura y optimización de redes hidráulicas.

Como valor agregado ante la limitación presupuestal ($45.633.398), la Interventoría avaló una optimización integral que permitió el cambio de marcos metálicos con protección anticorrosiva y la modernización del sistema de iluminación. Esta última fase contempló la instalación de una red eléctrica en tubería EMT de 3/4" y luminarias LED de 20W, garantizando condiciones dignas de servicio para la población privada de la libertad (PPL) y logrando así el cierre técnico y funcional de este espacio según los estándares contratados.

Es importante precisar que, tras la entrega de las áreas, el INPEC dejó constancia de que el recibo de los espacios se efectúa exclusivamente para fines de custodia y operatividad, sin que ello represente una validación de cantidades de obra o ejecución presupuestal por parte del centro. Este acto no exonera al contratista de sus obligaciones legales y contractuales vigentes, quien además mantiene el compromiso de actualizar las garantías de estabilidad y cumplimiento según lo estipulado en el contrato principal.

Finalmente, en ejercicio del control administrativo y para asegurar la trazabilidad de los recursos, la Interventoría solicitó formalmente al contratista —vía bitácora de obra— el acta detallada de los elementos desmontados (marcos, tuberías y aparatos retirados). Este soporte documental es requisito indispensable para la disposición final de bienes ante la entidad y para concluir el ciclo administrativo de la intervención en el primer piso.

Registro fotográfico

ALCANCE N°1: Batería Sanitaria Piso 1



Descripción: Batería Sanitaria Piso 1 (enchape de lava trapero)



Descripción: Batería Sanitaria Piso 1 (enchape de lava trapero

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

Fecha de inicio: 11 de noviembre del 2025

Fecha de fin: 22 de enero del 2026.

Presupuesto $ 171.637.436

Alcances aprobados en diagnóstico:

- Instalaciones eléctricas del área de alojamiento de guardia
- Mantenimiento del área de sanidad. .

Actividades desarrolladas:

Durante el periodo evaluado, el frente de obra persistió en una condición de inactividad operativa total, situación que se mantiene desde el pasado 13 de febrero de 2026. A pesar de la parálisis física, se adelantaron mesas de trabajo críticas para la definición del proyecto. En la sesión del 07 de abril, se logró concertar un alcance preliminar para la asignación de los recursos remanentes; no obstante, la Interventoría deja constancia de que, al cierre de este informe, aún no se han recibido las indicaciones oficiales por parte de la Entidad sobre el proceder técnico y administrativo respecto a estos dineros. Asimismo, el contratista incumplió el compromiso adquirido en el comité del 09 de abril, al no entregar el balance de las áreas adicionadas proyectado para el día 11 de abril, lo que impide avanzar en la legalización del nuevo presupuesto.

Un punto crítico de la gestión quincenal fue la reunión virtual del 14 de abril, donde se analizó la responsabilidad sobre las graves filtraciones y humedades en el área de medicamentos y consultorios. En dicha sesión, el contratista del contrato de emergencia (212-2024), responsable de la cubierta, manifestó que la instalación de flanches y canales no formaba parte de su alcance, eximiéndose de responsabilidad sobre las filtraciones actuales. Ante esto, la Interventoría ratifica que el ejecutor actual (256-2024) no puede intervenir estas zonas, ya que cualquier labor sobre la cubierta anularía la garantía del contrato anterior. A la fecha de corte, persiste la incertidumbre técnica, pues la supervisión de la USPEC no ha emitido la respuesta oficial prometida para definir si estas deficiencias se cubrirán por garantía o mediante una nueva contratación, lo que mantiene el área de Sanidad en un estado de vulnerabilidad frente a la temporada de lluvias.

A la falta de definiciones administrativas se suma la contingencia de orden público reportada mediante el oficio CE-CGMC-256-2067 del 27 de abril de 2026. El contratista notificó la suspensión inmediata de actividades en Santander de Quilichao debido a los atentados terroristas y

alteraciones de seguridad en el Cauca, argumentando riesgos inminentes para el personal operativo

Registro fotográfico

No existe registro fotográfico por inactividad en el periodo evaluado.

EPMSC SILVIA

Fecha de inicio: 4 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 22 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 44.330.231

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE No.1: "Mantenimiento y reparación a toda el área administrativa del ERON, incluye cambio de pisos, luminarias y baños".

Actividades desarrolladas:

Durante esta quincena se consolidó el recibo a satisfacción de las áreas intervenidas mediante la suscripción del Acta N° 003 el 07 de abril de 2026. Tras una inspección técnica de detalle, la Interventoría determinó que las fisuras detectadas en dos dinteles eran producto de humedades preexistentes y factores ajenos al contrato, liberando de responsabilidad al contratista y permitiendo la entrega de las oficinas, baños y cambio de pisos para su inmediata puesta en servicio por el INPEC.

Aunque la obra física concluyó exitosamente, el cierre administrativo integral (entrega de planos récord y manuales) y la firma del acta final de liquidación con la sede central de la USPEC se encuentran postergados. Esta demora obedece estrictamente a las graves alteraciones del orden público y restricciones de movilidad en el Cauca, notificadas formalmente por el contratista el 27 de abril. El proyecto finaliza con una ejecución de $44.330.231, quedando a la espera de condiciones de seguridad óptimas para el cierre documental definitivo.

EPMSC RM POPAYÁN (2.6)

Fecha de inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 22 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 69.572.532

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE NO. 2 – “Mantenimiento y/o adecuación de escaleras de alojamiento femenino (actualmente no cumplen normas)”.

ALCANCE NO. 3 – “Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión”.

Actividades desarrolladas:

La entrega técnica parcial de las obras se formalizó el 07 de abril de 2026, tras subsanarse las observaciones del INPEC sobre filtraciones en la claraboya administrativa y desprendimientos en el lavatraperos. Las intervenciones ejecutadas incluyeron el cambio de estructura y tejas en administración, instalación de cielo raso en PVC, adecuación de baños con acabados epóxico y la reconstrucción de las gradas de acceso a la guardia. Con este hito, las áreas quedaron habilitadas para su puesta en servicio inmediata.

Aunque las diligencias de cierre se adelantaron entre el 15 y 19 de abril, la firma del acta final de liquidación y la entrega del dossier administrativo (planos récord y manuales) se encuentran actualmente postergadas. Esta situación deriva de las graves alteraciones del orden público y restricciones de movilidad en el Cauca, notificadas formalmente por el contratista el 27 de abril. El proyecto concluye su fase física con una ejecución de $69.572.532, quedando a la espera de condiciones de seguridad para el cierre documental definitivo.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

Presupuesto $ 1.397.671.798

Alcances aprobados en diagnóstico:

Alcance NO. 1 – “Tutela 2023-000195 construcción de las cubiertas de los pabellones 11,12,13 (se construye pabellón 11, porque el muro perimetral no tiene la resistencia para la cubierta en pabellones 12,13, por seguridad no es pertinente)”.

Alcance NO. 2 – “Intervención patio de visita familiar de mediana seguridad: instalación de sobre cubierta donde se requiere, construcción de mesas y sillas en concreto”.

Nuevo alcance No.1: “Intervención área visita intima: construcción de sobre cubierta de las dos alas”.

Nuevo alcance No. 2: “Adecuación y mantenimiento del pabellón 12”.

Nuevo alcance No.4: “adecuación y mantenimiento de celda UTE”.

Actividades desarrolladas:

ESTADO TÉCNICO Y OPERATIVO Durante el periodo evaluado, el frente de obra en el CPAMS ERE Popayán persistió en un estado de inactividad operativa absoluta. A pesar de contar con un presupuesto asignado de $1.394.520.389 para alcances críticos como la construcción de cubiertas en el Pabellón 11 y adecuaciones en el Pabellón 12, el avance ejecutado acumulado se mantiene en 0,00%. La Interventoría rechazó expresamente la pretensión del contratista de reconocer como avance la fabricación de cerchas metálicas en un taller externo en la ciudad de Popayán, ya que, según las reglas de medición y pago del contrato, el reconocimiento solo procede con la instalación física y verificación en sitio.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASPECTOS CONTRACTUALES La Interventoría, mediante oficio del 23 de abril de 2026, calificó como improcedente la postura del contratista de atribuir la parálisis total a la contingencia eléctrica (incendio de la subestación). Se enfatizó que existen frentes viables, como la adecuación del Pabellón 12 y celdas UTE, cuya ejecución no depende del fluido eléctrico. No obstante, el contratista no ha presentado un plan de acción para reactivar estos frentes ni ha gestionado ante la dirección del penal el traslado de la población privada de la libertad (PPL) necesario para intervenir dichas áreas. Asimismo, persiste el incumplimiento en la entrega de la programación actualizada con fecha de terminación al 15 de mayo de 2026.

SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SUSPENSIÓN Al cierre de la quincena, la parálisis técnica se vio agravada por factores externos. El 27 de abril de 2026, mediante el oficio CE-CGMC-256-2067, el contratista notificó la suspensión inmediata de actividades en la Regional Occidental, incluyendo este establecimiento, debido a la ola de atentados terroristas y cierres viales en el departamento del Cauca. La Interventoría deja constancia de que esta suspensión por fuerza mayor se superpone a un estado previo de inactividad no justificada, configurando un posible incumplimiento parcial por parte del contratista antes de la crisis de orden público.

ASPECTOS PRESUPUESTALES Debido a la ausencia de instalación de materiales y a la falta de personal operativo en campo (solo se contó con residente de obra), no se ha reportado ejecución presupuestal ni se han generado actas de pago. La Interventoría advierte que no se reconocerán mayores costos derivados de esta paralización, toda vez que el contratista omitió iniciar las actividades en los sectores que no requerían energía eléctrica cuando las condiciones de seguridad aún lo permitían.

EPMSC RM PASTO

Fecha de inicio: 1 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 15 de mayo del 2026.

Presupuesto $ 361.450.189

Alcances aprobados en diagnóstico:

Alcance No. 1 – Tutela 267 de 2022: Construcción centro de acopio de residuos sólidos

Alcance No. 2 – Tutela 2022-00060: Adecuación y mantenimiento de baterías sanitarias

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N° 1: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS (TUTELA 267/2022)

Durante la presente quincena, el contratista logró regularizar la documentación del personal que presentaba restricciones de ingreso, permitiendo el reinicio efectivo de las labores físicas el viernes 24 de abril. Las actividades se centraron en la logística de materiales y el inicio de la fase estructural del "Shut de basuras", adelantando el flejado de refuerzo, colocación de gatos hidráulicos y armado de encofrado para la fundición de la viga aérea. Se verificó en sitio que el personal operativo contara con los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para trabajos en alturas.

ALCANCE N° 2: ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS (TUTELA 2022-00060)

Las actividades en este frente se mantuvieron suspendidas durante el periodo. Tras finalizar la intervención en el pabellón 3, se identificó que la adecuación integral de las baterías de los pabellones 3 y 4 demandó una inversión superior a la presupuestada inicialmente. Por lo tanto, la continuidad de las obras en los pasillos internos de los demás pabellones queda supeditada a una verificación de saldos remanentes una vez concluya la ejecución del centro de acopio.

Registro Fotográfico



Entrega de equipos y materiales en obra para reinicio de actividades – Alcance Shut de basuras.




Entrega de equipos y materiales en obra para reinicio de actividades – Alcance Shut de basuras.



Colocación de gatos hidráulicos para armado de encofrado y refuerzo de viga aérea - Alcance Shut de basuras.



Colocación de gatos hidráulicos para armado de encofrado y refuerzo de viga aérea - Alcance Shut de basuras.

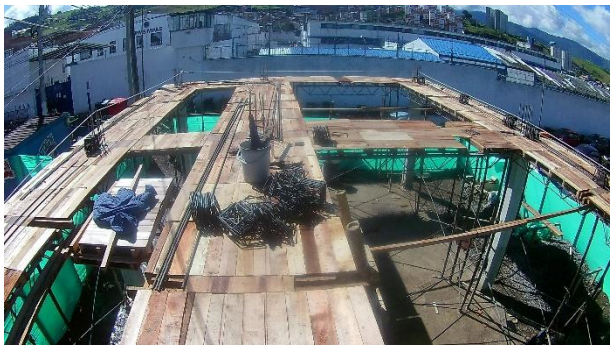

Armado de refuerzo (estribos) de viga aérea - Alcance Shut de basuras.



Colocación de gatos hidráulicos para armado de encofrado y refuerzo de viga aérea - Alcance Shut de basuras.



Colocación de gatos hidráulicos para armado de encofrado y refuerzo de viga aérea - Alcance Shut de basuras.



Colocación de gatos hidráulicos para armado de encofrado y refuerzo de viga aérea - Alcance Shut de basuras.



Armado de refuerzo (estribos) de viga aérea - Alcance Shut de basuras.



Armado de refuerzo (estribos) de viga aérea - Alcance Shut de basuras.

Se verificó que el personal contara con las respectivas EPP para trabajo en alturas.



Armado de refuerzo (estribos) de viga aérea - Alcance Shut de basuras.

Se verificó que el personal contara con las respectivas EPP para trabajo en alturas.



Armado de refuerzo (estribos) de viga aérea - Alcance Shut de basuras.

Se verificó que el personal contara con las respectivas EPP para trabajo en alturas.

EPMSC IPIALES

Fecha de inicio: 25 de junio del 2025

Fecha de terminación: 30 de enero del 2026.

Presupuesto $ 319 790 814.00

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1.

ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1.

Actividades desarrolladas.

Con fecha del 15 de abril de 2026, se formalizó el acta de recibo a satisfacción y entrega de espacios de las intervenciones ejecutadas en el establecimiento. La diligencia contó con la participación de la supervisión de la USPEC, la dirección del INPEC (Regional Occidente y dirección local), el Consorcio Mantenimientos GMC y la Interventoría (Consorcio Beta Regionales). Las áreas entregadas para su puesta en servicio inmediata corresponden a:

- Alcance N° 2: Mantenimiento integral de redes hidrosanitarias y duchas en los pabellones 1 y 3 de la estructura 1.
- Alcance N° 3: Impermeabilización técnica de cubiertas en los pabellones 1, 2, 3, 4 y estructura 1.

- EPMSC LA UNIÓN (2.10)

Fecha de inicio: 26 de junio del 2025

Fecha de terminación: 3 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 39 143 002.00

•Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Guardia Externa y Armerillo.

Actividades desarrolladas.

En el presente periodo, se formalizó el Acta de Recibo y Entrega de Espacios del establecimiento, contando con la validación de la supervisión de la USPEC, la dirección del INPEC (Regional Occidente), el contratista de obra y la Interventoría. Tras la verificación técnica en sitio, se determinó que las actividades contratadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, permitiendo la recepción a satisfacción y la inmediata puesta en servicio de las áreas por parte del cuerpo de custodia y la población privada de la libertad (PPL).

Con la suscripción del acta de entrega final, el frente de obra de La Unión se considera concluido técnicamente. El contratista ha iniciado el proceso de consolidación del dossier final, que incluye planos récord y certificados de materiales. Es importante señalar que esta entrega se realizó oportunamente antes de la suspensión general de la Regional Occidental reportada el 27 de abril, por lo que el establecimiento queda en fase de liquidación administrativa con fecha de terminación contractual al 15 de mayo de 2026.

EPMSC TUQUERRES

Fecha de inicio: 18 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 9 de diciembre del 2025.

Presupuesto: $40.621.671

Alcance aprobado

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación del área de sanidad y zona odontológica

Actividades desarrolladas.

El pasado 15 de abril de 2026, se suscribió el acta de recibo y entrega de espacios en el establecimiento de Túquerres. La diligencia contó con la presencia de la supervisión de la USPEC, la dirección del INPEC (Regional Occidente), el Consorcio Mantenimientos GMC y la Interventoría. Tras la inspección detallada, se verificó que las obras cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas, procediendo a la entrega formal para su puesta en servicio.

Con la firma del acta de entrega final, el frente de obra de Túquerres se reporta como concluido técnicamente. Esta entrega se realizó oportunamente antes de la notificación de suspensión general de la Regional Occidental (27 de abril). El proyecto entra ahora en su fase de liquidación administrativa y consolidación del dossier final, manteniendo su fecha de terminación contractual al 15 de mayo de 2026

- EPMSC CAICEDONIA

Fecha de inicio: 22 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 11 de diciembre del 2025

- Presupuesto

$ 39.136.555

- Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de pisos y paredes de patios de PPL y pabellón en general. (Patio 8 de Pabellón Ala A)

Actividades desarrolladas.

Durante la presente quincena, el proceso de cierre técnico para la intervención del Patio 8 presentó novedades administrativas. Aunque el 07 de abril de 2026 se socializó la entrega mediante mesa

de trabajo virtual ante la Regional Occidente del INPEC, el establecimiento manifestó observaciones técnicas que postergaron la firma del recibo a satisfacción. Como medida de control, la Interventoría determinó realizar una visita presencial de verificación para evaluar en sitio los puntos señalados, definir los ajustes necesarios por parte del contratista y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad antes de la entrega formal.

Las diligencias para consolidar el cierre técnico y administrativo ante la sede central de la USPEC se programaron para la quincena en curso. No obstante, al igual que en el resto de la Regional, el avance final y el desplazamiento de personal se han visto condicionados por la situación de orden público notificada el 27 de abril de 2026. El proyecto cuenta con un presupuesto de $39.136.555 y se encuentra en fase de subsanación de observaciones para proceder con la liquidación una vez se normalicen las condiciones de seguridad en la zona.

EPMSC SEVILLA

Fecha de inicio: 14 de agosto del 2025

Fecha de terminación: 11 de diciembre del 2025.

- Presupuesto

$ 48.223.407

- Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de cubierta patios 1 y 2

- Actividades desarrolladas.

Durante la presente quincena, se avanzó en la fase de cierre técnico para el mantenimiento de las cubiertas de los patios 1 y 2. Si bien las actividades principales fueron socializadas en la mesa de trabajo del 07 de abril de 2026 ante la Regional Occidente del INPEC, la Interventoría detectó una novedad administrativa crítica: el contratista utilizó recursos remanentes del presupuesto para ejecutar labores de pintura solicitadas directamente por el establecimiento, pero sin la previa supervisión ni autorización técnica de la Interventoría.

Debido a esta ejecución autónoma de recursos, la formalización del recibo a satisfacción y el cierre total del proyecto han quedado condicionados. Actualmente, se adelanta una auditoría detallada de la ejecución presupuestal y la calidad de dicho ítem para proceder con su validación o subsanación técnica, asegurando que el uso de los montos públicos se ajuste a la normativa contractual.

Aunque las diligencias de entrega final ante la sede central de la USPEC estaban programadas para la segunda quincena de abril, el proceso se encuentra afectado por la suspensión general de la Regional Occidental notificada el 27 de abril de 2026. Los desplazamientos de personal técnico y la firma de actas de liquidación quedan supeditados al restablecimiento de las garantías de seguridad en el Valle del Cauca. El proyecto finaliza su fase física con una inversión de $48.223.407, sujeta a la revisión final de los excedentes ejecutados.

EPAMS CAS JP PALMIRA

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.2: Tutela 2021-00019 - Hallazgo contraloría 13 de 2023-1 Iniciación de reparación filtraciones de aguas lluvias EPMSC Palmira – Valle del Cauca, y red hidrosanitaria obsoleta. Celdas patio 2 piso2 pasillo A (filtraciones de agua lluvia por techo de pabellón), Celdas Patio 1 Piso 2 pasillo D Piso 1 (filtraciones por deterioro de canales y tejas), Patio 3 piso 2 pasillo D(filtración en techos y paredes por fallas en las tejas)

ALCANCE No 4: Tutela 2023-00092- 01-107423 Iniciación del cumplimiento de lo ordenado en el fallo de la tutela, con el mantenimiento de garitas, red eléctrica e iluminación, marcos, puertas y ventanas, vidrios, paredes, baños y adecuación acceso a las mismas. (Requerimiento procuraduría).

Programación: Inicio 24 de junio de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1,979,965,945.00

Actividades ejecutadas en el periodo del informe.

Seguimiento Técnico – Alcances Contractuales y Actividades Ejecutadas

Alcance No. 2 – Tutela 2021-00019 / Hallazgo Contraloría 13 de 2023-1
Se da inicio a las actividades de reparación asociadas a filtraciones de aguas lluvias y a la intervención de la red hidrosanitaria en condición de obsolescencia en el EPMSC Palmira (Valle del Cauca). Las intervenciones se concentran en:

Celdas del patio 2, piso 2, pasillo A (filtraciones por cubierta).
Celdas del patio 1, piso 2 pasillo D y piso 1 (filtraciones por deterioro de canales y tejas).
Patio 3, piso 2 pasillo D (filtraciones en cubierta y muros).

Durante la inspección técnica, se evidenció la ejecución de actividades correctivas por parte del contratista, consistentes en la adecuación de pendientes y la instalación de sifones en canales de aguas lluvias en los patios 1 y 2, mitigando problemas de empozamiento.

Se identifican como pendientes:

Suscripción de acta de entrega parcial de espacios.
Acta de entrega de materiales desmontados (tejas de fibrocemento de patios 1, 2 y 3).

Para la formalización del acta de entrega parcial del alcance, el establecimiento ha solicitado acompañamiento del área de obras civiles de la regional INPEC.

Adicionalmente, se realizó la entrega formal de elementos desmontados (láminas y estructura metálica de cubierta de patio de sol) por parte de la dirección del establecimiento.
Alcance No. 4 – Estructura en concreto y cubierta patios pabellones 1 y 2

Se realizaron recorridos técnicos en el establecimiento CEPAMS CAS JP Palmira en fechas 16 de diciembre de 2025, 13 de enero, 16 de febrero y 16 de marzo de 2026, con participación de equipos técnicos de la USPEC, interventoría y contratista de obra.
Durante las visitas se verificó:
Estado adecuado de excavaciones ejecutadas (sin afectaciones por lluvias).
Actualización de permisos de trabajo e ingreso de materiales.
Articulación técnica entre las partes intervinientes.

Como resultado del seguimiento, se proyecta mesa de trabajo con regional occidente y grupo logístico del INPEC, orientada a la priorización de actividades relacionadas con el alcance de garitas, en el marco de la Tutela 2023-00092-01.

Actividades ejecutadas en el periodo:

En atención a la actualización de planos estructurales, el contratista retoma actividades como:

Excavación manual en material común (h ≤ 2,00 m).
Trasiego manual de materiales.
Fundido de zapatas en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo
Fundida de dados en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería
Suministro, figurado de acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación

Lo anterior configura un sistema estructural integral que asegura condiciones de estabilidad, resistencia y funcionalidad.

Registro fotográfico



Fundida en concreto de zapatas y vigas de cimentación , toma de muestras de concreto norma NSR-10, excavaciones para instalación de red hidráulica de agritas perimetrales.

EPAMS ERE CALI.

ALCANCE NO. 1: Mantenimiento Infraestructura Física Alojamientos de Guardias, Concertina e Iluminación Perimetral.

ALCANCE NO. 2: Mantenimiento General patios del 1 al 9.

ALCANCE NO. 3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.
ALCANCE NO. 4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterías Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Programación: Inicio 25de junio de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1,979,965,945.00

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reactivaron las actividades de obra en el establecimiento en el área de alojamientos masculinos con demoliciones de cerámica de pisos y muros.

Registro fotográfico





Alojamientos masculinos demoliciones de cerámica

EPMSC TUMACO

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de la iluminación perimetral

Programación: Inicio 24 de septiembre de 2025 Final: 15 de mayo de 2026.

Recurso asignado: $ 167,878,146.00

Novedades en el periodo del informe:

La situación actual del establecimiento EPMSC Tumaco evidencia una problemática estructural en su sistema hidrosanitario, cuya solución fue planteada desde el diagnóstico inicial mediante una intervención por etapas.

Con la aprobación de la adición presupuestal al Contrato No. USPEC-CTO-256-2024, se viabiliza la ejecución de la Etapa 2, la cual será desarrollada en su totalidad bajo el citado contrato, permitiendo avanzar hacia una solución integral de la problemática identificada, con respaldo técnico y financiero por parte de la entidad contratante.

Se deja expresa constancia que la ejecución de las actividades aquí descritas se enmarca dentro de las obligaciones contractuales del Contrato No. USPEC-CTO-256-2024, conforme a la adición presupuestal aprobada, sin que ello implique la constitución de contratos adicionales independientes.

EPMSC CARTAGO

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de la iluminación perimetral

Programación: Inicio 26 de septiembre de 2025 Final: 12 de marzo de 2026.

Recurso asignado: $ 240,701,830.00

Novedades en el periodo del informe:

Se iniciaron actividades de obras para la ampliación del puesto de guardia.



Instalación de tuberías , pasantes de muros y cajas.

EPMSC BUENAVENTURA

Conforme al análisis técnico, al informe de reconocimiento y diagnóstico, y a la revisión detallada del presupuesto objeto del presente informe, se precisa que los recursos contemplados se orientan a la ejecución de obras integrales en cinco (5) alojamientos, en los cuales se intervendrán de manera completa los componentes arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos y de acabados, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad para los funcionarios del CCV.

Presupuesto del establecimiento: $ 243,733,144.00

Programación de actividades:

Fecha de Inicio 15 de septiembre de 2025
Fecha Final: 15 de mayo de 2026.

De conformidad con el seguimiento realizado al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-256-2024, se deja constancia de que el atraso presentado en la ejecución de las actividades en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad – EPMSC Buenaventura obedece a factores ajenos a la voluntad y gestión del contratista, los cuales han impactado de manera directa la continuidad de los frentes de obra y el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado.

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se ejecutaron el raspado de pintura existente en muros, cielos rasos y caras inferiores de entrepisos mediante grata metálica y agua a presión, garantizando la obtención de superficies uniformes y aptas para acabados posteriores; incluye la recolección, limpieza y disposición de escombros generados. Se realiza pañete liso en mortero 1:3 con espesor de 2 cm, incorporando filos y juntas de dilatación conforme a diseño.

Se construyen muros en bloque de concreto de 10x20x40 cm, con resistencia de 13 MPa, acabado liso color natural, incluyendo mortero de pega y emboquillado, sin contemplar refuerzos metálicos ni grouting. Así mismo, se ejecuta el alistado de pisos en mortero 1:3 con espesor hasta 4 cm, sin pendiente.

En acabados, se instalaron pisos en baldosa cerámica de 33,8x33,8 cm o superior, con adhesivo premezclado y emboquillado según modulación de diseño, junto con guardaescobas en el mismo material. Se contempla adicionalmente enchape de piso en cerámica de 55,2x55,2 cm, incluyendo suministro, instalación, emboquillado y transporte de materiales.

Finalmente, se ejecutaron trabajos de cubierta mediante suministro e instalación de solapas, flanches o caballetes en lámina galvanizada prepintada calibre 20, para remates y sellos perimetrales. Se aplica estuco acrílico monocomponente en muros y techos, en tres capas con acabado lijado, incluyendo la preparación de superficies y medios auxiliares para trabajo en altura.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas.



Raspado de pintura existente en muros, instalación de cerámica pisos

COJAM JAMUNDI

Alcances a ejecutar:

Alcance contractual No.2: Atención Parcial por bloques Suministro de agua 24/7, acometida hidráulica y puesta en funcionamiento en todos los bloques del establecimiento. Adecuación del sistema de agua, para que el flujo sea constante durante todo el día. Unidad de atención primaria.

Alcance contractual No.3: Mantenimiento general de la iluminación perimetral en Guayanas e iluminación interna en bloques y celdas, incluye cambio de luminarias.

Programación: Inicio 26 de septiembre de 2025 Final: 15 de mayo de 2026.

Recurso asignado: $ 2,299,720,961.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Durante el periodo reportado se realizó recorrido técnico de verificación a las actividades de impermeabilización ejecutadas en el tanque No. 9, ubicado en el bloque 1 del establecimiento. En la inspección se evidencian avances en las labores programadas.

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades de intervención sobre los equipos de bombeo instalados en el establecimiento, en el marco de las afectaciones previamente identificadas en los cuartos de máquinas. En este sentido, el contratista realizó las labores correspondientes de revisión, ajuste y adecuación de los equipos, orientadas a restablecer sus condiciones operativas y mitigar las fallas evidenciadas.

Las actividades ejecutadas comprenden acciones de mantenimiento correctivo y ajustes técnicos en componentes electromecánicos, conforme a las condiciones encontradas durante las inspecciones realizadas en sitio. La interventoría realizó seguimiento a dichas actividades, verificando su ejecución en campo y la implementación de las medidas técnicas requeridas.

No obstante, el estado definitivo de operación de los equipos se encuentra sujeto a los resultados de las evaluaciones técnicas detalladas que permitan establecer la condición real de cada unidad intervenida

Registro fotográfico



Reparación de bombas, impermeabilización de tanques.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL VIEJO CALDAS.

EPMSC FRESNO.

VALOR: $ 83.474.182,00
ALCANCES: ALCANCE No.1: Mantenimiento general de las redes hidrosanitarias
ALCANCE No. 2: Mantenimiento humedad cuarto de Armerillo y comedor CCV.

Actividades ejecutadas.

Durante este periodo las actividades de obra civil en el establecimiento se culminaron a satisfacción en su 100%.

EPMSC MANIZALES

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Tutela 2023-00127 Visita técnica y Diagnostico de los espacios de visita intima
- ALCANCE No.2: Adecuación de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estándares de contención de gases
- ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perímetro del ERON.
- ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metálicas o de concreto de Área educativa y tratamiento
- ALCANCE No.5: Mantenimiento y cambio de Redes eléctricas. Deterioro de las redes eléctricas de los pabellones 2, 3, 4, 5A y 5B. Presentando permanentemente cortes de energía y daños en el alumbrado de estas áreas.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.2: Adecuación de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estándares de contención de gases (PRIORIZADO)
- ALCANCE No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perímetro del ERON. (PRIORIZADO)
- ALCANCE No.4: Mantenimiento de las escaleras metálicas o de concreto de Área educativa y tratamiento (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
4-07-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
6-11-2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 312.872.125

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC ANSERMA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Cambio de lámparas reflectores (12 lámparas) en la parte interna. $ 36.798.208,00
- ALCANCE No.2: Arreglo de las paredes patio 1, 2 y 3 debido a la humedad. $ 67.147.238,00.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

- ALCANCE No.1: Cambio de lámparas reflectores (12 lámparas) en la parte interna. $ 36.798.208,00
- ALCANCE No.2: Arreglo de las paredes patio 1, 2 y 3 debido a la humedad. $ 67.147.238,00

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:
20 de agosto del 2025

FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES:
31 de octubre del 2025.

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 103.945.445,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA:

Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC PÁCORA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Cambio de techos patio uno y dos. (recorrido de goteras)
- ALCANCE No. 2: Adecuación celdas y patios (reparación y pintura)
- ALCANCE No. 3 Mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo con la ley 594 de 2000. Art 16, y el plan de mejoramiento archivístico.
- ALCANCE No. 4 Mantenimiento alumbrado perimetral.
- ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento):

- ALCANCE No. 3 Mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo con la ley 594 de 2000. Art 16, y el plan de mejoramiento archivístico. $ 84,353,246.00.

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:
8 de septiembre del 2025.

FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES:
13 de noviembre del 2025.

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 84,353,246.00.

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC PENSILVANIA

ALCANCES CONTRACTUALES

- ALCANCE No.1: Ampliación y adecuación de la oficina de atención al ciudadano.

- ALCANCE No.2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico.
- ALCANCE NO.3 Rancho: ampliación de la bodega de alimentos.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

- ALCANCE No.2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico. $ 83.767.768,00.

FECHA DE INICIO:
11 de agosto del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
7 de noviembre del 2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 83.767.768,00.

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC RIOSUCIO

ALCANCES CONTRACTUALES

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de alojamiento para masculino Cuerpo de custodia y vigilancia Posesión Municipio. Reubicación taller de maderas. Ampliación zona administrativa. Ampliación patio 1 zona deportiva. Reubicación caniles Mantenimiento y adecuación zona de aislamiento. Mantenimiento y adecuación de esclusa patio 1 y 2. Mantenimiento y/o adecuación patio 3. Mantenimiento y/o adecuación segunda planta.
- SUBALCANCE No.1:
- Reubicación taller de maderas
- SUBALCANCE NO.2:
- Mantenimiento y/o adecuación patio 3
- SUBALCANCE NO.3
- Mantenimiento y/o adecuación de alojamiento para masculino cuerpo de custodia y vigilancia posesión municipio.
- SUBALCANCE NO.4
- Ampliación zona administrativa
- SUBALCANCE NO.5
- Ampliación patio 1 zona deportiva
- SUBALCANCE NO.6
- Reubicación caniles mantenimiento
- SUBALCANCE NO.7
- Adecuación zona de aislamiento
- SUBALCANCE NO.8

- Mantenimiento y adecuación de esclusa patio 1y2
- SUBALCANCE NO.9
- Mantenimiento y/o adecuación segunda planta

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de alojamiento para masculino Cuerpo de custodia y vigilancia Posesión Municipio. Reubicación taller de maderas. Ampliación zona administrativa. Ampliación patio 1 zona deportiva. Reubicación caniles Mantenimiento y adecuación zona de aislamiento. Mantenimiento y adecuación de esclusa patio 1 y 2. Mantenimiento y/o adecuación patio 3. Mantenimiento y/o adecuación segunda planta. Subalcance No 1 Reubicación taller de maderas los cuales fueron presupuestados en su totalidad arrojando un presupuesto para la intervención de $ 65.478.361,00.

FECHA DE INICIO:
21 de agosto del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15 de diciembre del 2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 65.478.361,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC SALAMINA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y adecuación de la red hidrosanitaria de los dormitorios y patios 1, 2

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento)

ALCANCE No.1: Mantenimiento y adecuación de la red hidrosanitaria de los dormitorios y patios 1, 2
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:
15 de septiembre del 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$106,260,117.00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA
Se debe actualizar el balance para reflejar las condiciones reales del proceso de ejecución.

RM MANIZALES

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación alojamientos de los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia
- ALCANCE No. 2: Mantenimiento de Cubierta que se encuentra en terraza que es de asbesto cemento y cambio de canales y bajantes que no son suficientes y reflejan humedad en área de tratamiento, biblioteca, en esta área se encuentra un muro próximo a desplomarse (PRIORIZADO)
- ALCANCE No. 3: adecuación sala lactante en ámbito familiar (pabellón materno)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No. 2: Mantenimiento de Cubierta que se encuentra en terraza que es de asbesto cemento y cambio de canales y bajantes que no son suficientes y reflejan humedad en área de tratamiento, biblioteca, en esta área se encuentra un muro próximo a desplomarse

FECHA DE INICIO:
14-10-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15-01-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 271.867.490

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC CALARCÁ

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE 1: Mantenimiento redes de alcantarillado e hidrosanitarias del ERON (ACCIÓN POPULAR)
- ALCANCE 2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo a la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico
- ALCANCE 3: Mantenimiento eléctrico general (ACCIÓN POPULAR)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento):

- ALCANCE 1: Mantenimiento redes de alcantarillado e hidrosanitarias del ERON (ACCIÓN POPULAR).
- ALCANCE 2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo a la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:

15 de diciembre del 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 511.567.488,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Se continua con las ejecuciones del alcance 1, para ello se hace Demolición manual de alistado de piso y material de acabado, Picada de pañete de muros, Pañete liso común, Alistado de pisos con mortero impermeabilizado, Estuco acrílico, Pintura vinilo acrílica plástica lavable.

Las actividades de desarrollan en los pisos 2 y 3 del ala derecha del pabellón, se están ejecutando de manera continua, se deberá actualizar el balance, dado que las cantidades presentan variaciones frente a lo inicialmente previsto, como también para incluir las actividades del archivo según el nuevo sitio de ubicación definido por el INPEC.

EPMSC ARMENIA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Reposición de o mantenimiento de motobombas (Alojamiento y patio No. 1) (PRIORIZADO)
- ALCANCE No.2: Reparación red eléctrica de alumbrado perimetral, aumento de luminarias en sector muro posterior (PRIORIZADO)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento):

- ALCANCE No.1: Reposición de o mantenimiento de motobombas (Alojamiento y patio No. 1) (PRIORIZADO)
- ALCANCE No.2: Reparación red eléctrica de alumbrado perimetral, aumento de luminarias en sector muro posterior (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
2 de febrero del 2026

FECHA DE FIN:
31 de marzo del 2026

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 226.765.868

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

El día 27 de enero se envía aprobación del diseño eléctrico por parte de interventoría, el contratista realiza entrega de la documentación de inicio para el día lunes 2 de febrero

RM ARMENIA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE 1 Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patios de las PPL (salón primer piso) (PRIORIZADO)

- ALCANCE 3 Mantenimiento y adecuación por humedades a la bodega de comisos, la cual está siendo afectada por las filtraciones de la tubería de los baños del módulo 7 (PRIORIZADO)

- ALCANCE 4 Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patio de sindicadas. (PRIORIZADO)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento):

- ALCANCE 1 Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patios de las PPL (salón primer piso) (PRIORIZADO)

- ALCANCE 3 Mantenimiento y adecuación por humedades a la bodega de comisos, la cual está siendo afectada por las filtraciones de la tubería de los baños del módulo 7 (PRIORIZADO)

- ALCANCE 4 Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patio de sindicadas. (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
12 de febrero del 2026

FECHA DE FIN:
31 de marzo del 2026

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 173.475.794

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Se encuentran realizando intervenciones en baños de sindicadas

EPMSC ERE PEREIRA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Hallazgo 81-2023-1 Espacio para el almacén de la cárcel (insumos para atención medica)
- ALCANCE NO.2: Adecuación de malla sobre el área del patio cuarto. para evitar el lanzamiento de objetos prohibidos desde la calle 42 hasta la parte interna

- ALCANCE No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira) (PRIORIZADO)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira) (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
28-04-2025 se realiza reinicio de actividades el día 15 de octubre del 2025.

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
22-01-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 436.214.804

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC SANTA ROSA DE CABAL

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Hallazgo 124-2017-1 Mantenimiento y adecuación de espacios para la visita conyugal de las PPL en los patios 1.
- ALCANCE NO.2: Hallazgo 34-2023-1. Mantenimiento de la fachada del establecimiento y adecuación del área administrativa y escaleras.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE NO.2: Hallazgo 34-2023-1. Mantenimiento de la fachada del establecimiento y adecuación del área administrativa y escaleras. (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
5-09-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
26-01-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 289.925.487

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

RM PEREIRA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación sala amiga para familias lactantes (PRIORIZADO)
- ALCANCE No. 3 Intervención red eléctrica pabellón 2 (PRIORIZADO)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento)

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación sala amiga para familias lactantes (PRIORIZADO)
- ALCANCE No. 3 Intervención red eléctrica pabellón 2 (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD:
26-01-2026

FECHA DE FINALIZACION:
31-03-2026

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 217.408.581

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Una vez firmada el acta de inicio el día 21 de enero de 2026 y firmada el acta de recibo de espacios a intervenir el día lunes 26 de enero de 2026 en el establecimiento, se procede a manifestar que durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades: Semana del lunes 26 al sábado 31 de enero 2026 Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades: Se ingresan materiales y herramienta menor al establecimiento, entre ellas pulidora, escalera, andamios taladro. Se inician las actividades de instalación de tuberías para celdas del Ala Izquierda. Se desmonto y cambio el tablero de distribución que había existente de 18 circuitos (breakers)





EPMSC HONDA
ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No. 1 Mantenimiento de las redes hidráulicas e hidrosanitarias.
- ALCANCE No. 2 Mantenimiento y/o adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico.

ALCANCES A EJECUTAR (Por emergencia sanitaria en el ERON)

- ALCANCE No. 1 Mantenimiento de las redes hidráulicas e hidrosanitarias.

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD:

13 noviembre del 2025.

FECHA DE FINALIZACION:
15 de diciembre del 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 110.400.739,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA
Se realizo finalizan actividades en el establecimiento realizando entregas parciales de las áreas, nos encontramos a la espera de la entrega de documentación final por parte del contratista.

EPMSC LÍBANO
ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No. 1Mantenimiento Hidrosanitario y baterías sanitarias. ALCANCE No. 2 Mantenimiento de área de caniles.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

- ALCANCE 3: Nuevo Alcance dentro de las prioridades y necesidades del Establecimiento Penitenciario EPMSC LIBANO, adecuación y construcción de un espacio para archivo, almacén, oficina de comando y batería sanitaria.

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:
24 de noviembre del 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 65.531.152,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Se encuentran realizando intervenciones en obra blanca y acabados del espacio.

EPMSC PUERTO BOYACÁ

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No. 1Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna.
- ALCANCE No. 2 Pintura: pintura del establecimiento interna y externa tipo vinilo y epóxica para el área de sanidad.
- ALCANCE No. 3 Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico.
- ALCANCE No. 4 Rancho: adecuación de infraestructura, y todas sus áreas para el correcto desempeño en las funciones de los PPL que allí laboran, cambiando en su totalidad pisos, enchapes, unidad sanitaria, implementando de manera correcta extractores y así lograr una calidad óptima en la preparación de alimentos para los PPL a cargo de este ERON.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

Alcance No. 1 Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna.

FECHA DE INICIO:
No iniciado

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 110.347.361,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA
Pendiente inicio de actividades.

EPAMS PC ERE LA DORADA
ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No. 1Acción popular 2014-00389 Mantenimiento área de sanidad (atención médica y odontológica), arreglo griferías, sanitarios, tuberías en celdas visitas conyugales, área administrativa.
- ALCANCE No. 2 INSTALACION DE MALLA EN LOS 3 PABELLONES (instalación de las mallas en los 6 pabellones restantes, mantenimiento de la concertina y el alambre de PUA y malla perimetral).

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No. 1Acción popular 2014-00389 Mantenimiento área de sanidad (atención médica y odontológica), arreglo griferías, sanitarios, tuberías en celdas visitas conyugales, área administrativa.

FECHA DE INICIO:
2 de julio del 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 766.961.089,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA Se debe realizar revisión conjunta del balance, para su actualización dado el avance de las intervenciones.

COIBA IBAGUÉ

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento de redes hidrosanitarias estructura 2 y 3 a la USPEC
- ALCANCE NO.2: Adecuación, mantenimiento y reparación rancho de las estructuras 1, 2 y 3 cambio de pisos y pintura epóxica en techos

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.1: Mantenimiento de redes hidrosanitarias estructura 2 y 3 a la USPEC (PRIORIZADO)

- ALCANCE NO.2: Adecuación, mantenimiento y reparación rancho de las estructuras 1, 2 y 3 cambio de pisos y pintura epóxica en techos (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
La fecha de inicio según programación radicada por el contratista el día 25 de agosto del 2025: 24-09-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
La fecha de inicio según programación radicada por el contratista el día 25 de agosto del 2025: 15-12-2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 1.457.494.665

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Considerando que la intervención se ejecuta de manera secuencial por ranchos y que la liberación del rancho No. 1 en su área interna depende de la culminación de actividades en el rancho No. 5, se prioriza la pronta definición técnica del sistema de acabado de piso requerido en este último, con el fin de permitir la finalización de dicho frente y la consecuente habilitación de nuevas áreas de trabajo. De manera paralela, se continuará coordinando con el establecimiento y el contratista la programación escalonada de actividades para mantener la continuidad de la ejecución.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL NOROESTE

EPAM LA PAZ (ITAGÜÍ)

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Hallazgo 19 de 2023-1 Humedad en estructura administrativa evidencia filtración de agua

Alcance N°4: ALOJAMIENTOS ACTUALES - Diseño y adecuación del tercer piso de alojamientos para funcionarios en el bloque b, teniendo en cuenta el contrato de obra No. 307 de 2019 (Modulares Penitenciarios) así como el mantenimiento a las instalaciones existentes, pintura, red eléctrica, baños comunes, puertas y ventanas

Fechas según ultima programación

Inicio: 25 de junio de 2025

Final: 15 de diciembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 20 de febrero 2026

Recurso asignado: $ 587´602.135.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, Se realiza acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- No se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento debido a que no se ha

suministrado de forma debida la totalidad de la documentación.

- Este establecimiento fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el pasado 21 de abril de 2026.





Pintura e impermeabilización bloque administrativo





Impermeabilización cubierta Limpieza de fachada

EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Hallazgo 157 de 2023-1 - Condiciones de funcionamiento del rancho, problemas en cuartos fríos, problemas de humedad.

Alcance N°2: Hallazgo 139 de 2023-1 - Zona de sanidad sin lavamanos, para que el medico se lave las manos en cada consulta. visita técnica para verificación.

Alcance N°3: Hallazgo 47 de 2023-1 - Adecuación de galpones. diagnostico ambiental, manejo de aguas residuales no domésticas.

Alcance N°4: Terminación del edificio de locativas, atención primaria.

Fechas según ultima programación

Inicio: 04 de agosto de 2025

Final: 04 de mayo de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 04 de mayo de 2025

Recurso asignado: $ 1.586´805.392.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Se ejecutan actividades en el rancho: Subsanar observaciones en las divisiones de acero inoxidable de los baños del segundo piso, Suministro e instalación de cielo raso metálico en la zona de cocción y pintar toda la zona con pintura epóxica, Suministro en instalación de pintura epóxica de la bodega de sólidos, Cubiertas instaladas con la observación de instalar tapa de la cubierta sándwich.
- Se reitera mediante comunicados la Entrega de Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra Actualizado a las cantidades medidas y verificadas en campo en especial al alcance del Rancho, Entrega de Cronograma de Obra Actualizado y plan de contingencia.
- Se remiten comunicados al Consorcio Mantenimiento GMC donde se comunica el incumplimiento reiterativo en la entrega de manera integral de la información de los Diseños de galpones del establecimiento. Aun no se tiene la información completa para poder validarla e iniciar actividades de este alcance
- Con respecto al alcance No. 4 Terminación del edificio de locativas, atención primaria. No se han realizado actividades



Actividades zona de baños del rancho





Actividades zona de preparado, cielo raso y cubierta del rancho

- Se ha remitido PRODUCTO NO CONFORME:
  - Reiterando del PNC de las cubiertas zona de rancho (Que no ha sido subsanado desde el mes de octubre de 2026 que se realizó el primer requerimiento).
  - Instalación de divisiones de acero inoxidable segundo piso del rancho



Capa central de la teja tipo Sándwich Deck



Enchape fracturado, elementos de soporte de puertas descolgados y cedidos

EPMSC ANDES

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Mantenimiento y/o adecuación muro cerramiento parqueadero al lado del rancho.

Alcance N°3: Impermeabilización techos y lozas de todo el establecimiento.

Fechas según ultima programación

Inicio: 23 de diciembre de 2025

Final: 15 de mayo de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 323´441.427.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Se solicita al Contratista de Obra hacer la entrega de los certificados del material de relleno pendientes a utilizar (Limite Liquido, Índice de Plasticidad y porcentaje de Materia orgánica) cumpliendo la norma invias. A la fecha del presente informe semanal el contratista de obra aún no ha hecho entrega de los certificados de laboratorio del material de relleno.
- Se Reitera la solicitud al contratista el aumento de personal ya que se viene presentando un avance muy reducido el cual viene arrojando un atraso referente a la programación aprobada.
- Se entregaron los resultados de laboratorio la los elementos de concretos fundidos a la fecha, aunque no fueron fallados en a las edades solicitadas en la >NSR-10 ellos están dando de acuerdo al diseño de mezcla de 21 Mpa.
- Se Comunica al Contratista de obra que los cortes del concretos realizado en las vigas de enlace se deben realizar a 45° y en el tercio de la longitud del elemento en cumplimiento de la norma NSR-10.
- Se comunica al contratista de obra que se debe utilizar material para pega de concretos viejo con concreto nuevo para garantizar la adherencia entre ellos.





Columnas en concreto, muro en bloque concreto, llenos compactados

EPMSC BOLIVAR

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento general de humedades de celdas y áreas comunes.

Fechas según ultima programación

Inicio: 27 de agosto de 2025

Final: 19 de noviembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 19 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $86.759.695,92

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, Se realiza acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- No se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento debido a que no se ha suministrado de forma debida la totalidad de la documentación.



Impermeabilización cubierta celdas y áreas comunes

EPMSC CAUCASIA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Alcance Adicional 1: mantenimiento de andenes interiores, exteriores y fachada.

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre de 2025

Final: 15 de diciembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $60.505.861,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, Se realiza acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- No se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento debido a que no se ha

suministrado de forma debida la totalidad de la documentación.



Mantenimiento e andenes interiores y exteriores

EPMSC JERICO
Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Verificación del estado de la paredes-techos del establecimiento en general, por humedades ya identificadas (celda COVID-celdas patio 1.

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre de 2025

Final: 15 de abril de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: No han presentado nueva programación de obra

Recurso asignado: $ 178´860.711.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Se reitera subsanar las observaciones de pintura que se vienen presentando en la estructura metálica suministrada (Producto no conforme) ya que dicha estructura está presentando problemas de oxidación en diferentes sectores de la estructura.
- Estamos pendiente la entrega de la subsanación de las observaciones presentadas en el balance de obra.
- Retoman actividades en obra a partir del 20 de abril de 2026, con la continuación de la instalación de la estructura de la cubierta de la zona de la celda COVID y patio 1.





Estructura de cubierta, dados en concreto protección de arranque de columnas

EPMSC PUERTO BERRÍO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Encerramiento con malla de seguridad para el techo de los pabellones 1, 2, 3 y 4 en las áreas comunes de los pabellones

Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de enero 2026

Final: 15 de mayo de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $152´994.514.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- En la actualidad no se realizan actividades de obra, el ejecutor argumenta falta de recursos
- Se encuentra pendiente el envío del balance de obra, programación de obra, plan de contingencia y plan de trabajo, adicionalmente el envío de la documentación del personal para el reinicio de actividades.



Visual de los patios 1 y 2 del establecimiento



Visual de los patios 3 y 4 del establecimiento

EPMSC SANTA BARBARA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre de 2025

Final: 15 de diciembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $48.860.711,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.

- Se otorga recibo parcial de los documentos para el cierre del establecimiento, quedando pendiente el acta de entrega parcial y final del establecimiento, al igual que el documento de disposición de residuos.
- El establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el día 22 de abril de 2026.



Cambio de cubierta tercer nivel

EPMSC SANTO DOMINGO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Adecuación de garita

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de junio de 2025

Final: 17 de octubre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 11 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 94.601.546,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante. A la fecha no han sido remitidos.
- Este establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el 24 de noviembre de 2026.



Adecuación de garita interna e instalaciones eléctricas

EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: mantenimiento áreas de aislamiento (UTE) mantenimiento de los puntos realizando pruebas posteriormente mejorar y reparar las superficies pañetadas, impermeabilizando para luego pintar.

Alcance N°2: Adicional 1: Mantenimiento de alojamientos hasta agotar recurso restante.

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de junio de 2025

Final: 15 de diciembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 26 de febrero de 2026

Recurso asignado: $ 66´900.404,08

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, No se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante. A la fecha no han sido remitidos.





Entrada alojamiento 1 y ventana alojamiento 2

EPMSC TAMESIS
Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento de los alojamientos, baños, duchas, kits sanitarios, puertas de baño, pocetas y paredes, hasta agotar el monto destinado para el establecimiento.

Fechas según ultima programación.

Inicio: 18 de noviembre de 2025

Final: 15 de diciembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 23 de febrero de 2026

Recurso asignado: $28.807.190,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades de este establecimiento se han terminado, se encuentra pendiente el acta de recibo de espacios por parte de la Dirección del establecimiento, debido que se ha presentado una novedad con el piso de los baños por lo cual se ha solicitado al ejecutor subsanar dichas observaciones para la obtención del recibo por parte del establecimiento, esta actividad fue atendida sin embargo a la fecha no se ha coordinado el recibo parcial de obras.
- Se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento.
- El establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el día 22 de abril de 2026.



Mantenimiento alojamientos y baños celdas 1 y2

EPMSC YARUMAL
Alcances a ejecutar:

- Alcance N°3: Se da AVAL a los documentos de cierre de establecimiento

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de junio de 2025

Final: 25 de octubre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 25 de octubre de 2025

Recurso asignado: $ 130´988.728.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante. A la fecha no han sido remitidos.
- Este establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el 24 de noviembre de 2026.



Iluminación establecimiento Yarumal

EPMSC APARTADO
Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Iluminación perimetral

Alcance N°3: Mantenimiento tanques elevados.

Fechas según ultima programación

Inicio: 23 de julio de 2025

Final: 15 de diciembre de 2025


Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $ 447´964.914.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante. A la fecha no han sido remitidos.

- Este establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el 24 de noviembre de 2026.

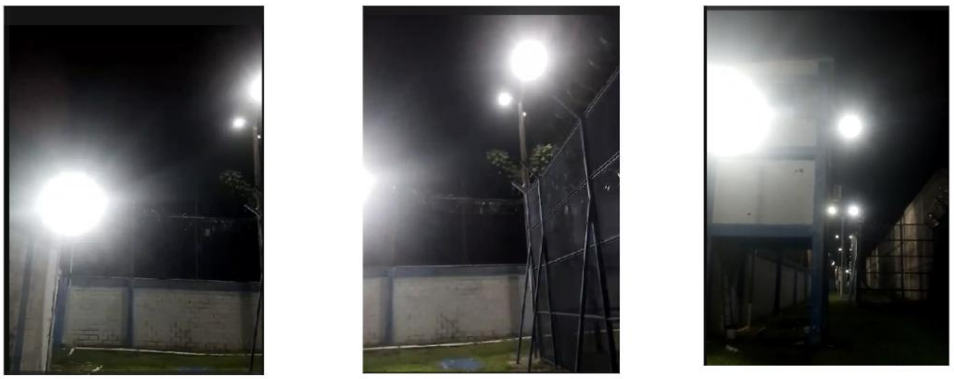

Verificación del encendido y cantidad de tiempo de exposición de las luminarias instaladas

EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE
Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Tutela 2021-00014. Insuficiencia de baños. Tutela 2022-00043. Baños patio 6 y 2.

Alcance N°3: ALCANCE NO.3: Mantenimiento Iluminación del ERON

Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de enero de 2026

Final: 14 de mayo de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 14 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1.205´663.854.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- En la actualidad no se realizan actividades de obra, el ejecutor argumenta falta de recursos
- Se encuentra pendiente el envío del balance de obra, programación de obra, plan de contingencia y plan de trabajo, adicionalmente el envío de la documentación del personal para el reinicio de actividades.



Limpieza de la red de 16" del establecimiento a la Ptar



Limpieza de la red 16" y posos de inspección

COPED PEDREGAL

Alcances a ejecutar:

Alcance Adicional N°1: Obras necesarias para la estabilización de talud, con base en los diseños realizados.

Alcance Adicional N°2: Mantenimiento y Adecuación de tuberías aguas lluvias y aguas residuales, entre las Garitas 5 y 6

Alcance Adicional N°3: Reparación del Cerramiento perimetral, mallas, concertinas entre las Garitas 5 y 6.

Fechas según ultima programación

Inicio: 30 de enero de 2026

Final: 15 de mayo de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1.794´711.480.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- De acuerdo con las comunicaciones y comités registrados entre julio de 2025 y marzo de 2026, la interventoría ha emitido más de 12 requerimientos formales (oficios, comunicados mesas de trabajo y actas de comité) solicitando información esencial para la trazabilidad técnica y contractual del proyecto. A la fecha, ninguno de estos requerimientos ha recibido respuesta completa y asertiva, lo que evidencia un patrón de incumplimiento reiterado por parte del contratista, toda vez que los diseños vienen como insumo de los entregables del contrato 321-2023.
- En el pasado comité general del 11 de abril se tocaron los siguientes temas:
  El arquitecto Johanatan explicó que En Pedregal se identificaron alertas estructurales y geotécnicas, lo que llevó a un análisis con una empresa externa. El análisis estructural carece de armonización, ya que el muro y el drenaje se analizaron de manera independiente, y no hay un estudio que conecte ambos componentes. Adicionalmente, la falla geotécnica es activa y ha progresado, debido a las observaciones de los especialistas anteriores, se contrató a una firma independiente para un estudio y verificación paralela de los diseños. Se confirmó que la

gerencia realizó un pago pendiente a este equipo de trabajo, y se espera que entreguen su concepto, sin embargo, esta información no ha sido suministrada.

La complejidad radica en controlar las saturaciones y el talud de corte para contener la vía. Se consultó sobre la implementación de provisionalidades de agua para disminuir la saturación y la contaminación del cuerpo de agua debido a la presión de las corporaciones. El asesor sugirió que la única forma de avanzar es que una empresa se responsabilice de todos los diseños, lo cual es casi imposible por la complejidad del sitio.

El ejecutor propone el acercamiento a la dirección del establecimiento para exponer la situación, explorar alternativas, y plantear la posibilidad de un cambio de alcance debido a la problemática. Se sugiere una reunión el día martes 14 de abril de 2026 para definir la propuesta.

Se debe generar una justificación que deslinde responsabilidades, ya que la complejidad es un tema externo a la cárcel, involucrando a la Alcaldía y la gestión del riesgo. La intervención requiere permisos hasta del Ministerio de Transporte para un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), dada la complejidad por la cercanía y afectación de la vía.


Se solicitó que para el día viernes 17 de abril de 2026 se tenga la respuesta sobre el tiempo y costo de la elaboración del nuevo diseño en Pedregal, si se opta por esa vía. Se hizo un llamado al cumplimiento de los compromisos de documentación por parte de los ejecutores, con la advertencia de que el incumplimiento podría llevar a trámites jurídicos.



Ubicación de estabilización de talud, reparación de cerramiento y redes sanitarias

- El día 28 de abril de 2026 se realiza mesa de trabajo, junto con la dirección del establecimiento, antiestructura del INPEC, contratista, interventoría y personal de la USPEC, con el fin de escuchar los argumentos que esta presentando el ejecutor para la no ejecución de los alcances: Alcance Adicional N°1: Obras necesarias para la estabilización de talud, con base en los diseños realizados, Alcance Adicional N°2: Mantenimiento y Adecuación de tuberías aguas lluvias y aguas residuales, entre las Garitas 5 y 6, Alcance Adicional N°3: Reparación del Cerramiento perimetral, mallas, concertinas entre las Garitas 5 y 6.
- En esta mesa de trabajo socializa el ejecutor que la propuesta es la impermeabilización de la cubierta de los pabellones 16-17-18 y unidad de medidas especiales de los pabellones de mujeres, al igual que la impermeabilización de cubierta del portal #2.
- La dirección de establecimiento reitera la preocupación frente a las medidas de seguridad de la

zona donde se esta presentando la falla activa, por lo cual el ejecutor propone realizar un cerramiento provisional de obra que mitigué el tema de seguridad

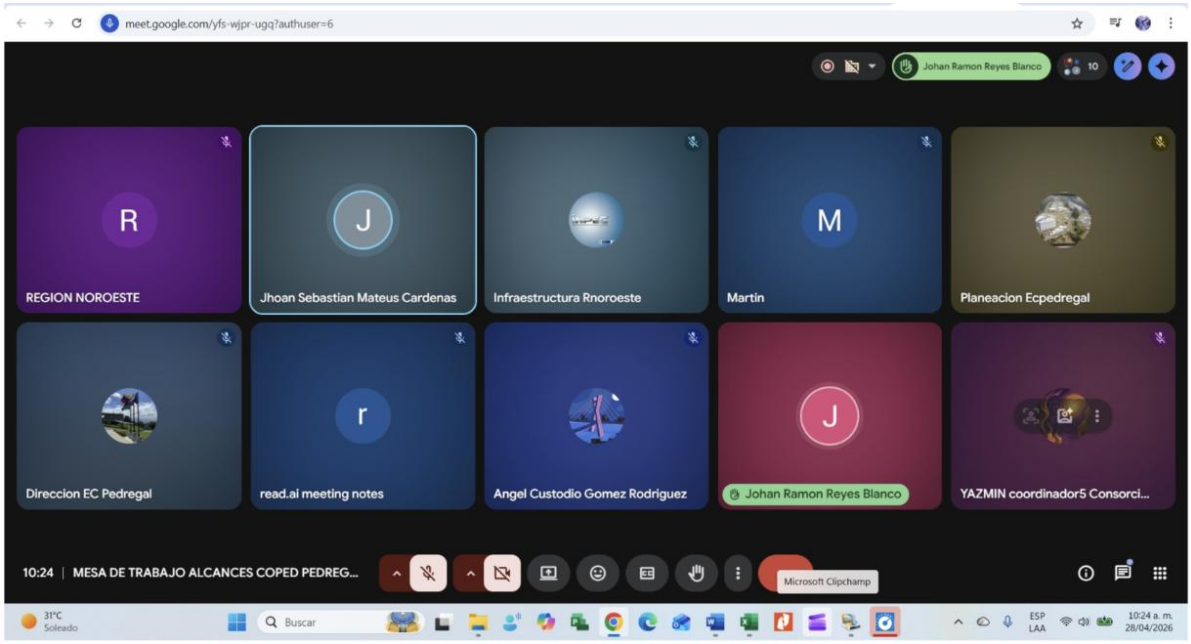

Mesa de trabajo del 28 de abril de 2026

EPMSC QUIBDÓ
Alcances a ejecutar:

Alcance N°3: Iluminación general del establecimiento.

Alcance Adicional N°3: Mantenimiento general garitas: Carpintería metálica, estucos y pintura.

Fechas según ultima programación

Inicio: 16 de julio de 2025

Final: 28 de noviembre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $ 183.706.324.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante. A la fecha han sido remitidos unos parciales de los documentos.
- Este establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el 05 de marzo de 2026.



Adecuación de garitas e instalaciones eléctricas

EPMSC ITSMINA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento red eléctrica

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de septiembre de 2025

Final: 24 de octubre de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 24 de octubre de 2025

Recurso asignado: $ 22´903.538.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Las actividades en el establecimiento ya se terminaron, ya se realizó acta de recibo parcial por parte de la dirección del establecimiento.
- Se remite comunicados reiterativos para la subsanación de los documentos de cierre y entrega de establecimientos, comunicados desde la Interventoría y de la Entidad Contratante. A la fecha han sido remitidos unos parciales de los documentos.
- Este establecimiento ya fue entregado por parte de la USPEC a la dirección del establecimiento el 04 de marzo de 2026.



Mantenimiento de Iluminación perimetral del establecimiento

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL ORIENTE

EPMSC BARRANCABERMEJA.

Durante el período evaluado el contratista en compañía de la interventoría hizo presencia en el establecimiento para toma de medidas para organizar balance de obra.

El contratista manifiesta que el problema financiero que se tiene en el contrato ha sido factor determinante para no iniciar las obras, a la fe ha del presente informe no ha entregado a esta interventoría el balance presupuestal de las actividades finales a ejecutar.

EPMSC ARAUCA.

ALCANCES CONTRACTUALES:
ALCANCE No.1: Reparación del sistema eléctrico del establecimiento y regulación de cargas eléctricas (Informe visita de Ministerio de trabajo 2023)
ALCANCE No.2: Mantenimiento de cubierta (sobre cubierta y/o Cambio de tela asfáltica) (Informe visita de Ministerio de trabajo 2023)
ALCANCE No. 3: Mantenimiento ÁREA DEL RANCHO (mesones y trampas de grasas) Hecho sobreviniente tema nacional
ALCANCE No. 4: Mantenimiento de garita #2 (Informe visita de Ministerio de trabajo 2023)
ALCANCE No. 5: Reparación de celdas primarias

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).
ALCANCE N°3 Mantenimiento ÁREA DEL RANCHO (mesones y trampas de grasas) Hecho sobreviniente tema nacional $ 165.275.117,00


FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 20 octubre del 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $ 165.275.117,00

Actividades ejecutadas:

Suministro y aplicación de pintura epóxica aséptica



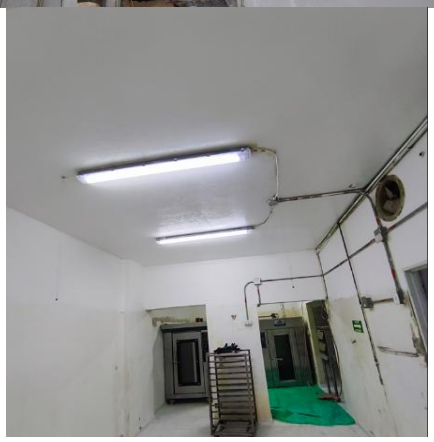


EPMSC AGUACHICA

ALCANCES CONTRACTUALES:
Alcance No.1 Mantenimiento de cubierta elevación del techo para el área del rancho (hallazgos permanentes revisar).
Alcance No.2 Ampliación de carga eléctrica del establecimiento.
ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).
ALCANCE No1Mantenimiento de cubierta elevación del techo para el área del rancho (hallazgos permanentes revisar) $ 182.218.317,68

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 14 de enero del 2026

FECHA DE FINALIZACION: 19 de abril del 2026

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $ 182.218.317,68

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
ALCANCE 7 - adecuación del espacio de consumo de alimentos de los funcionarios (cafetería) presenta riesgo para seguridad y salud en el trabajo, techo actual de palma seca.

Construcción de mesones en concreto




Estuco acrílico, de tipo monocomponente




cielo raso entre ventanearía y estructura metálica




Cielo raso y estuco en muros





EPMSC OCAÑA:

ALCANCE CONTRACTUAL:
ALCANCE No.3: Mantenimiento y adecuación Alojamiento de Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Auxiliares bachilleres, casino, casa fiscal

FECHA DE INICIO EN EL ERON: 06 de octubre de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON: 15 de diciembre de 2025

PRESUPUESTO CONTRACTUAL: $197.754.871,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EPMSC AGUACHICA: En este establecimiento se terminaron las actividades, pendiente que reciba el establecimiento. En reunión el día 11 de marzo con el director, la supervisión e interventoría, el establecimiento manifestó que ahora con las lluvias en el área de cocina se presentaron goteras en la cubierta instalada por tal razón y verificando la información enviada se solicitó al contratista realizar estas intervenciones antes de la visita programada por parte de la supervisión del USPEC, Se presentan subsanaciones de los detalles pendientes en este establecimiento por lo que se la USPEC procede a remitir al director del establecimiento registro fotográfico de los pendientes subsanados se solicita realizar entrega de fecha para programar entrega al establecimiento.

COCUC CUCUTA:

ALCANCE No.1: Condiciones de funcionamiento en los ranchos de hombres y mujeres Complejo Carcelario de Cúcuta

PRESUPUESTO CONTRACTUAL: $683.129.671

FECHA DE INICIO: 7 de noviembre del 2025

FECHA DE TERMINACION: 15 de mayo del 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Durante la semana el contratista realizo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RANCHO DE HOMBRES Y COMEDOR

Reparación de placa de contra piso una vez terminadas las instalaciones hidrosanitarias.

Cuartos fríos




Instalacion de cableado electrico y tuberia.






Levante de muros en mamposteria y aplicación de pañete









EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)

ALCANCES CONTRACTUALES:
Alcance No.1Hallazgo 163-2023-1 Condiciones de funcionamiento rancho pisos, techos con humedad, separación de las áreas incumplimiento de requisitos sanitarios y espacios. Tutela 2023-00177 arreglo del rancho pabellón 9.

Alcance No.2 Hallazgo 31-2023-1 Mantenimiento Generales (complementación pabellones) ADECUACIÓN DE CELDAS DE LOS PABELLONES 1,2,3,4,6, 9, 7, 5, 2, 8: Cambio de la red hidrosanitaria general, retiro de aparatos sanitarios en mal estado, reposición de aparatos sanitarios en aluminio, construcción de orinales y lavamanos corridos en aluminio anti vandálicos, remodelación general de la batería: cambiando pisos en cerámica y enchape de muros. Celdas: Resanes de pañetes, pintura en general, cambio de puertas metálicas en mal estado, retiro y suministro de barandas sobre el corredor frente a las celdas.

Alcance No.3 Mantenimiento y adecuación del área de Sanidad, impermeabilización de placas, muros, resane y pintura, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias y redes de comunicación. En cumplimiento a los estándares exigidos por la Secretaría de Salud, incluyendo Impermeabilización y mantenimiento del área de aislamiento.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

ALCANCE No. 2 Hallazgo 31-2023-1 Mantenimiento Generales (complementación pabellones) ADECUACIÓN DE CELDAS DE LOS PABELLONES 1,2,3,4,6, 9, 7, 5, 2, 8: Cambio de la red hidrosanitaria general, retiro de aparatos sanitarios en mal estado, reposición de aparatos sanitarios en aluminio, construcción de orinales y lavamanos corridos en aluminio anti vandálicos,

remodelación general de la batería: cambiando pisos en cerámica y enchape de muros. Celdas: Resanes de pañetes, pintura en general, cambio de puertas metálicas en mal estado, retiro y suministro de barandas sobre el corredor frente a las celdas. $ 1.020’415.578,00.

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 4 noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $ 1.020’415.578,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA
Durante la semana el contratista realizo las siguientes actividades:

1.3.5.6 Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio (baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.8.6 Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico, arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

Demolición de enchapes de pared en piso 3 del pabellón 3





Demolición de enchapes de pared y piso en piso 3 del pabellón 3





Demolición de enchapes de pared, desmonte de puertas en piso 3 del pabellón 3





Demolición de enchapes de pared, desmonte de puertas en piso 3 del pabellón 3





Demolición de muros piso 3 del pabellón 3





Se construye caja recolectora de sólidos en sifón





EPMSC MÁLAGA

ALCANCES CONTRACTUALES:
ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE No.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuación Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).
ALCANCE No. 1 Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina $ 13.874.866,00
ALCANCE No. 2 Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad $ 25.449.433,00
ALCANCE No.4 Replanteo y demarcación cancha multifuncional, realización de sobre piso $ 50.260.317,00

ALCANCES A EJECUTAR PRODUCTO DE ETAPA DE EJECUCION:
ALCANCE No.2: Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad, costo de $ 7.349.598,09.

NUEVO ALCANCE: Adecuación de terraza y zona de lavado, costo de $ 82.142.575,34.

FECHA DE INICIO: 10 noviembre de 2025

RECURSOS ASIGNADO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $ 89.584.616,00

ACTIVIDADES DE OBRA.
Ya se entregaron actividades y fueron entregadas al Uspec 4 de marzo del 2026. Sin ninguna observación.

EPMSC SAN GIL
ALCANCES CONTRACTUALES:
Alcance No.1 ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación zona de rancho de acuerdo a exigencias autoridades departamentales

Alcance No.2 ALCANCE NO. 2 - Mantenimiento General Redes eléctricas (Diagnostico Mantenimiento preventivo de redes eléctricas (incluyendo cableados, tuberías embebidas y expuestas, Cambio de Redes eléctricas perimetral e interna, Mantenimiento preventivo de tableros de distribución (incluye breakers)

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento):
Alcance No.1 ALCANCE No 1- Mantenimiento y/o adecuación zona de rancho de acuerdo a exigencias autoridades departamentales

FECHA DE INICIO: 9 de diciembre del 2025.

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $ 163.336.492,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA

Instalación de enchape en muros de zona caliente



Instalación de enchape en muros de zona caliente





Instalación de luminarias en zona caliente





Instalación de interruptor sencillo



Instalación de interruptor sencillo doble



EPMSC VÉLEZ

ALCANCES CONTRACTUALES:
ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación Alojamiento personal de guardia CCV Masculino

ALCANCE NO. 2 - Mantenimiento y/o adecuación para cuadros de mando CCV

ALCANCE NO. 3 - Unidades sanitarias en puntos de control de pabellones

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).

ALCANCE No.3 - Unidades sanitarias en puntos de control de pabellones

FECHA DE INICIO: 10 noviembre del 2025.

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $ 90.058.922,00

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA Este establecimiento fue entregado parcialmente al establecimiento el 30 de diciembre del 20206

CPMSM BUCARAMANGA (RM)

ALCANCES CONTRACTUALES:
Alcance No.1: MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y HIDROSANITARIA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO: Se hace necesaria del cambio y mantenimiento de toda la red hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento ya que esta se encuentra obsoleta y en mal estado por su tubería en gres al igual se hace necesario de que se presentan daños como tubos rotos y debido a esto se presenta mucho desperdicio de agua.

ALCANCE No.2: Mantenimiento general pabellón maternas (Mantenimiento y/o Adecuación área de sala cuna).

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Oficina de Atención al Ciudadano acorde al Documento CONPES 3785 de 2013 y NTC 6047 DE 2013.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento).
Alcance No.1: MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y HIDROSANITARIA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO: Se hace necesaria del cambio y mantenimiento de toda la red hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento ya que esta se encuentra obsoleta y en mal estado por su tubería en gres al igual se hace necesario de que se presentan daños como tubos rotos y debido a esto se presenta mucho desperdicio de agua.
ALCANCE No.2: Mantenimiento general pabellón maternas (Mantenimiento y/o Adecuación área de sala cuna).

FECHA DE INICIO: 20 de septiembre de 2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON: $139.425.314

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA
Alcance No.1 MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y HIDROSANITARIA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO: Se hace necesaria del cambio y mantenimiento de toda la red hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento ya que esta se encuentra obsoleta y en mal estado por su tubería en gres al igual se hace necesario de que se presentan daños como tubos rotos y debido a esto se presenta mucho desperdicio de agua.

20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS

20.1.25 Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

1.3.5.5 Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.6.22 Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en muro.

1.3.8.6 Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico, arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

8.1.6.7 Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.

14.1.4 Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

14.3.2.1 Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0 cm.

20.4.6 Rejilla de piso metálica redonda en aluminio con sosco 3"x2" y retícula tradicional, para caudal alto y tráfico peatonal intenso, tipo T-3"x2" uso-1 . Incluye suministro, instalación y emboquille.

21.1.2 Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

Pañete impermeabilizante celda 3 pab 3





Pañete impermeabilizante celda 7 pab 1





EPAMS CAS GIRON
Se dio reinicio a las actividades de este establecimiento el 25 de agosto.

ALCANCE APROBADO:
ALCANCE No.6: Intervención del sistema eléctrico del Portal 2 del establecimiento EPAMS CAS GIRÓN

PROGRAMACIÓN: INICIO 20 de agosto de 2025 FINAL: 15 diciembre de 2025
ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO:
Por parte de interventoría se terminó la revisión de NP, se solicitó al contratista enviar la última propuesta la cual será enviada al USPEC para su verificación.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL NORTE

EC JP BARRANQUILLA (MODELO)

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Hallazgo 3-2022-1 Redes eléctricas CMSBA La Modelo Barranquilla (D) (F). la estructura se encuentra deteriorada por la carencia de calidad y estabilidad en la ejecución y adecuación de la red eléctrica, generando riesgo de nuevo gasto de recursos públicos y riesgo de imposición de acciones legales por las deficientes condiciones laborales.
- ALCANCE No.2: Mantenimiento correctivo y preventivo de la cubierta en la zona de aulas virtuales, Mantenimiento correctivo o cambio de cubierta del pabellón No. 1, 2, 3, 6 y área de educativa, aulas de clases, incluye canaletas de desagüe.
- ALCANCE No.3: Mantenimiento correctivo a cubiertas del patio.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.1: Hallazgo 3-2022-1 Redes eléctricas CMSBA La Modelo Barranquilla (D) (F). la estructura se encuentra deteriorada por la carencia de calidad y estabilidad en la ejecución y adecuación de la red eléctrica, generando riesgo de nuevo gasto de recursos públicos y riesgo de imposición de acciones legales por las deficientes condiciones laborales.
- ALCANCE No.3: Mantenimiento correctivo a cubiertas del patio. (PRIORIZADO patio 1 y 3)

FECHA DE INICIO:
31 de octubre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
24 de marzo del 2026 - suspendido

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 662. 695. 564

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Durante el período reportado no se presentan actividades en este establecimiento se solicita al contratista por medio de comunicados reinicio inmediato.

EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
- ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut)
- ALCANCE No 3: Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios, zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias
- ALCANCE No 3: Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios, zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio (PARCIAL)

FECHA DE INICIO:
26 de junio del 2025
FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15 de diciembre del 2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 368.352.806
$185.000.000 adicional

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realiza entrega formal del establecimiento

ERON 3.3 EPMSC CARTAGENA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o Adecuación de la Oficina de Atención al Ciudadano
- ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuación de Archivos y Gestión Documental y área de Sanidad
- ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Vidrios de Seguridad, Mantenimiento a Escaleras, Suministro de Aire Acondicionado, Sillas
- Alcance No. 4: Mantenimiento a Infraestructura Celdas Primarias y Redes Hidrosanitarias Pabellones 8, 9 y 10.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuación de Archivos y Gestión Documental y área de Sanidad
- ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Vidrios de Seguridad, Mantenimiento a Escaleras, Suministro de Aire Acondicionado, Sillas

FECHA DE INICIO:
25 de junio del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
01 de febrero del 2026 - pendiente reprogramación el cual ha sido pedido al contratista en repetidas ocasiones

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 937.691.354

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realiza entrega formal del establecimiento

EPMSC MAGANGUÉ

ALCANCES CONTRACTUALES:

ALCANCE No.1: Cambio de la totalidad de las rejas por mal estado, patios, pabellones, áreas sociales, corredizas de emergencia de patios, pasillos, UTE, guardia externa, Armerillo y puerta de información
ALCANCE NO.2: Cambio de las redes eléctricas internas, todo el establecimiento.
ALCANCE No 3: Cambio de las redes hidrosanitarias internas.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

ALCANCE No.1: Cambio de la totalidad de las rejas por mal estado, patios, pabellones, áreas sociales, corredizas de emergencia de patios, pasillos, UTE, guardia externa, Armerillo y puerta de información (PARCIAL)
ALCANCE NO.2: Cambio de las redes eléctricas internas, todo el establecimiento. (PARCIAL)
ALCANCE No 3: Cambio de las redes hidrosanitarias internas (PRIORIZADO)

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 186.076.441

FECHA DE INICIO:
18-11-2025

FECHA DE FIN:
16-01-2026 – suspendido

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Se realiza reinicio de actividades una vez se encuentren las luminarias en el establecimiento

EPMSC ERE VALLEDUPAR

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No. 1: Mantenimiento y/o adecuación de área de rancho en el ERON incluyendo redes sanitarias, aguas servidas, Aguas residuales y ÁREA de RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (ZONA DE BASURAS). - requerimiento procuraduría.
- Alcance No. 2: MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CUBIERTAS - deterioro humedad en bases, techos presenta hongos y grietas

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No. 1: Mantenimiento y/o adecuación de área de rancho en el ERON incluyendo redes sanitarias, aguas servidas, Aguas residuales y ÁREA de RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (ZONA DE BASURAS). - requerimiento procuraduría. (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
4-11-2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 107.680.472

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Se solicito al contratista la entrega del Balance y la programación actualizada bajo varios comunicados y mesas de trabajo. Se encuentra suspendido pendiente instalación de piso en rancho.

EPAMS CAS VALLEDUPAR

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No. 1: Mantenimiento y/o adecuación de celdas visita íntima
- ALCANCE No. 2: Mantenimiento e Intervención celdas área del rancho
- ALCANCE No. 3: Estabilización del muro de cerramiento del penal entre garitas 3 y 6
- ALCANCE No. 2 ADICIONAL: Atención a Sentencia T-386 del 2024

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No. 1: Mantenimiento y/o adecuación de celdas visita íntima
- ALCANCE No. 2 ADICIONAL: atención a Sentencia T-386 del 2024

FECHA DE INICIO:
1-06-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
7-11-2025
RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:

$ 383.262.796

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realiza entrega formal del establecimiento

ERON 3.7 EPMSC JP MONTERÍA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento general Alojamientos Para CCV y auxiliares
- ALCANCE NO.2: Mantenimiento red eléctrica bloque administrativo y alojamiento de funcionarios - incluye iluminación
- ALCANCE No3: Mantenimiento general y adecuación de las puertas de ingreso (puerta corrediza) tanto de vehículos como del personal

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.1: Mantenimiento general Alojamientos Para CCV y auxiliares

- ALCANCE ADICIONAL: Intervención en la Panadería

FECHA DE INICIO:
10-10-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15-05-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 476.892.912

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Instalación de láminas de cubierta




Aplicación de pañete en muros de panadería




Aplicación de estuco en muros en muros de alojamiento de auxiliares






EPC TIERRALTA

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento del Alumbrado del área perimetral. Las luminarias no tienen durabilidad, se requiere que sean para exteriores y de alta intensidad.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.1: Mantenimiento del Alumbrado del área perimetral. Las luminarias no tienen durabilidad, se requiere que sean para exteriores y de alta intensidad. (PRIORIZADO)

FECHA DE INICIO:
5-09-2025
FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15-10-2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 62.419.007

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Se realiza finalización de la instalación de 37 luminarias en el establecimiento el día 27 de marzo se realiza reunión en el establecimiento, contratista, interventoría, USPEC y la dirección.
En atención a la visita técnica realizada conjuntamente entre director del establecimiento penitenciario, la profesional de apoyo de USPEC, el contratista de obra y la Interventoría de obra, en donde se manifestó el inconformismo por parte del director del establecimiento, el cual informo que las lámparas instaladas presentan las siguientes condiciones. Se llegaron a unos compromisos el cual el contratista debe cumplir y esta interventoría realizara el respectivo seguimiento para que se cumplan los compromisos adquiridos por el contratista.

EPMSC RIOHACHA

ALCANCES CONTRACTUALES:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria
ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2
FECHA DE INICIO:
18-11-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
23-02-2026 - Suspendido

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 163.837.031

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA
Se requiere reinicio de actividades cuanto antes.

ERON 3.10 EPMSC SANTA MARTA

ALCANCES CONTRACTUALES:
ALCANCE No.1: Adecuación de Área de Ingreso.
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuación de Oficinas Área Administrativa, Parqueaderos, Portón Eléctrico.

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

ALCANCE No.1: Adecuación de Área de Ingreso.
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuación de Oficinas Área Administrativa, Parqueaderos, Portón Eléctrico.

FECHA DE INICIO:
18-11-2025

FECHA DE INICIO:
23-02-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:

$ 500.193.727

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se solicito al contratista el incremento del personal para poder cumplir con los tiempos.

Armado de acero para zapatas



ERON 3.11 EPMSC EL BANCO

ALCANCES CONTRACTUALES:
ALCANCE No.1: Tutela incidente de desacato, Adecuación de rancho, se está dando la alimentación desde la parte externa

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):
ALCANCE No.1: Tutela incidente de desacato, Adecuación de rancho, se está dando la alimentación desde la parte externa

FECHA DE INICIO:
24-11-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
12-05-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 225.167.920

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se solicitó al contratista, los ensayos de los materiales usados en la fabricación de concretos en obra, para poder continuar con dicha actividad.









EPMSC SAN ANDRÉS

ALCANCES CONTRACTUALES:

ALCANCE No.1: Adecuación y mantenimiento al área donde está ubicada la subestación eléctrica MUROS FRACTURADOS. Se presenta deterioro en los muros de todo el centro carcelario, adicionalmente el terreno está cediendo por las filtraciones y mal estado de la red de aguas residuales, lo que puede generar colapso de la estructura, pabellones, áreas comunes y

alojamientos, mejorando a los muros perimetrales y refuerzo con elementos de protección y seguridad (mallas y concertinas) y levantamiento de los mismos. Estudio CM A-2023-0027

ALCANCE No.2: Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

ALCANCE No.2: Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

FECHA DE INICIO:
15-12-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
4-03-2026

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 102.557.305

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.
Se realiza finalización de actividades en el establecimiento y se procede a realizar entrega parcial de las obras, se le solicita al contratista se realice entrega de la documentación para cierre del contrato.

EPMSC SINCELEJO

ALCANCES CONTRACTUALES:

- ALCANCE No.1: Mantenimiento, adecuación y ampliación del aula virtual

ALCANCES A EJECUTAR (Resultado de la Etapa I – Alistamiento, cambios de alcances por Obras Civiles INPEC):

- ALCANCE No.1: Mantenimiento, adecuación y ampliación del aula virtual

FECHA DE INICIO:
9-09-2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
24-15-2025

RECURSOS ASIGANDO AL ERON O INVERSION EN EL ERON:
$ 101.972.106

OBSERVACIONES NOVEDADES Y/O GENERALIDADES DEL FRENTE DE OBRA.

Se realiza entrega final del establecimiento con la USPEC Y la dirección del mismo, no obstante, seguimos a la espera de la entrega formal de los documentos para liquidación.

7. CORRESPONDENCIA

Se Carga archivo digital a la CARPETA 7 - CORRESPONDENCIA ENVIADA
Se Carga archivo digital a la CARPETA 7 - CORRESPONDENCIA RECIBIDA

8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL:

FACTURACION
CONTROL DE FACTURACION CONTRATISTA
No hay facturación para el contrato de obra de acuerdo con la forma de pago.
CONTROL DE FACTURACION INTERVENTORIA
información de la facturación de interventoría se relaciona en la CARPETA 8.

9. CONTROL DE MANEJO DE ANTICIPO

CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTION DE PAGOS
Anticipo aprobado.
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y CONTROL ORDENES DE PAGO
El plan de inversión del anticipo fue avalado por esta interventoría el pasado 4 de diciembre de 2024 bajo el oficio USPEC-BETAREGIONALES-00. No hay pagos aprobados para el contratista cargados al anticipo aprobado.

10. GESTION AMBIENTAL.

Ver CARPETA 10 – GESTION AMBIENTAL

11. CONTROL DE CALIDAD

Para el seguimiento y control esta interventoría adjunta certificados de calidad emitidos por el contratista para el establecimiento:

12. INFORME SST

Ver CARPETA 11 – INFORME SST

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

12.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

PERSONAL CONTRATISTA	CARGO	EMPRESA
Sergio Méndez	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Adriana Arévalo	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Alejandro Fonseca	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Arquímedes Contreras Gutierrez	Director de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Carlos Cujia	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Daniel Achinte	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Jeison Mogollón	Apoyo Residente de	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Johana Diaz	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Juan Camilo Cristancho	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Lorenzo Cardona	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Luisa Proaños	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
María Angela Tarazona	SST - HSEQ	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Terecita Argoty	Presupuesto y	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Doris De Leon Polo	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
sandra Pinzon	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Irene Zambrano	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Jisseth Romero	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Pedro Mora	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Francisco Cuentas	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Yuliana Serna	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
1	Dairo Alonso Montaño Niño	1024503523	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
2	Diego Mauricio Ávila Pérez	79976026	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
3	Dilmer Jovanny Bayona Rodríguez	80777530	Ayudante	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
4	James Avilés Narváez	16704152	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
5	José Leonardo Diaz Ulloa	1020748096	Ayudante	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
6	Luis Alfonso Rodríguez Bonilla	93413044	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
7	Pablo José Pacacira	7177181	Supervisor	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
8	Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador	Regional central	11/06/2025
9	Frannkyn Roosevelth Méndez	1024484580	Instalador	Regional central	11/06/2025
10	Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador	Regional central	11/06/2025
11	Jorge Emanuel Ospina Solano	1006596186	Residente de obra	Regional central	11/06/2025
12	Yesid Alexis Pantoja Trejo	1087408073	Residente de obra	Regional central	11/06/2025
13	Wbeimar Martínez Mosquera	1078917036	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
14	Juan José Ávila Perez	11622036	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
15	John Jairo Hincapie	79482086	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
16	John Alexander Bernal Vargas	79566080	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
17	Guillermo Hincapie	79410724	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
18	José Calderón Jaimes	4342875	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
19	Breyner Jhoan Villamizar Rozo	1148963473	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
20	Ermis Bastos Mora	1094276006	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
21	Carlos Alfonso Cujia Manjarrez	1065577261	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
22	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
23	Erick Fernando Colmenares Quesada	1094947865	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
24	Luisa Fernanda Proaños Casallas	53036744	Coordinadora	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
25	Teresita Del Pilar Argoty Cepeda	1085254230	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
26	Andrés Mauricio Dueñas Santa Cruz	98394727	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
27	Arnulfo Jesús Cárdenas Calpa	13005773	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
28	Dany Mauricio Telag Maya	1087958143	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
29	Delfín Edmundo Jamanoy López	5249734	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
30	Jaime Florentino Montilla Barrera	98382147	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
31	Jorge Alonso Ramirez Miranda	98399710	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
32	Juan Alexander Guerra Vallejo	1083752233	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
33	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
34	Andrés Collazos Cosme	76045921	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
35	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
36	Juan José Ávila Pérez	11522038	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
37	Pablo Estifer Cuero Pino	1113513135	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
38	ANDRES FELIPE TORRES CAMARGO	1014290145	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
39	CRISTIAN ALEJANDROO RODRIGUEZ MARQUEZ	1022429478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
40	FELIX JOSE DEVIA LOZANO	1108928763	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
41	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
42	FABIO DE JESUS PATIÑO CARDENAS	18414360	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
43	JHON ALEXANDER MARTINEZ HERNANDEZ	1010048944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
44	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
45	JOSE ANTONIO GARAVITO BEMTRAL	3099451	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
46	JOSE GIOVANNY BERMUDEZ PALACIO	1024512750	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
47	JUAN PABLO VANEGAS BERMUDEZ	1073328596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
48	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
49	JEYSON DAVID ROJAS PAYARES	1033712661	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
50	JOAN JOSE RUZ PRADA	5289478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
51	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
52	JOSE MIGUEL MALAMBO AGUJA	93445450	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
53	PAOLA CRISTINA JARAMILLO BELALCAZAR	27253926	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
54	OSCAR RICARDO JARAMILLO BELALCAZAR	1045021324	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
55	WBEIMAR MENA PALACIOS	1001637157	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
56	ADOLFO JOSE FLOREZ HERNANDEZ	1102854417	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	24/06/2025
57	ALEJANDRO FONSECA CACERES	1098764868	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	24/06/2025
58	ELKIN ANTONIO BANQUEZ ALVAREZ	92532211	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
59	JORGE ANDRES ALVARADO BERRIO	1101450710	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
60	JOSE ARMANDO HERRERA OJEDA	1065596250	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
61	JUAN PABLO PUELLO ZAGARRA	1065577385	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
62	LEINER RICARDO TAPIAS ALMANZA	1002163243	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
63	OSCAR JULIAN ARRIETA GALE	1100623119	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
64	ALEX ALFONSO PRIMERA NIEBLES	1002093520	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
65	ANDERSON LONDOÑO SALAMANCA	1110518853	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
66	ARCESIO GONZALEZ LEON	16802506	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
67	ARNULFO JESUS CARDENAS CALPA	13005773	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
68	BRANDON PRIMERA CORTES	1047222741	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
69	BREYNER JHOAN VILLAMIZAR ROZO	1148963473	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
70	CARLOS ERNESTO SALAS RIVERA	75036072	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
71	DANY MAURICIO TELAG MAYA	1087958143	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
72	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
73	EIDER ANDRES QUINTERO BERNATE	1022977870	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
74	GERMAN JARAMILLO RODRIGUEZ	10254889	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
75	HUGO HERNAN VILLAMAR MOSQUERA	10692253	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
76	JESUS EDUARDO GARZON AGUIRRE	76329032	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
77	JORGE GENTIL OCAMPO MONTOYA	16630816	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
78	JOSE CALDERONJAIMES	4342875	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
79	JOSEPH ALEJANDRO CIFUENTES GAITAN	1000018036	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
80	JUAN CARLOS ANGULO OBANDO	1059912736	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
81	JUAN SEBASTIAN GOMEZ MOYANO	1023967457	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
82	LUIS EDUARDO VILLAMAR PEREZ	1059901577	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
83	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
84	YOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ	76328284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
85	CRISTIAN MAURICIO ALVARADO	1012358977	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
86	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
87	MELQUISEDEC CALDERON ARRIETA	1192896362	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
88	ALEXANDER VILLAMIZAR CORREA	1117515429	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
89	ASTRID CAROLINA MEDINA BOBADILLA	1119217740	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
90	JAIR DIAZ CARDOZO	96340837	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
91	JHON JEISLER DUQUE HOLGUIN	10177384	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
92	BREINER ALEXIS VALBUENA OBANDO	1117504580	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
93	LUIS EDUARDO ROBLES CERON	1048283235	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	25/06/2025
94	BRIAN STIVEN VELASQUEZ ROBLES	1002230143	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	25/06/2025
95	TITO ALONSO GORDILLO SIERRA	79910341	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
96	JOSE ALBERTO CONTRERAS	80296805	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
97	PEDRO FELIPE MORA CARVAJALINO	1072705806	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
98	DAIRO ALONSO MONTAÑO NIÑO	1024503523	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
99	DIEGO MAURICIO ÁVILA PÉREZ	79976026	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
100	DILMER JOVANNY BAYONA RODRÍGUEZ	80777530	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
101	JAMES AVILÉS NARVÁEZ	16704152	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
102	JOSÉ LEONARDO DIAZ ULLOA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
103	LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BONILLA	93413044	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
104	PABLO JOSÉ PACACIRA	7177181	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
105	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
106	DIEGO ANDRES AGUIRRE REYES	1079035142	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
107	HERNANDO RODRIGUEZ	4276349	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
108	YOMAR SANTIAGO URIBE ROJAS	1043302232	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
109	ISRAEL TORRES CASTEL	1054678525	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
110	CARLOS ARTURO GONZALEZ SANCHEZ	1054680256	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
111	GENEISY YULIANA SERNA ARIAS	1077441917	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	27/06/2025
112	FRANKLIN HERNAN CASTELLANOS JAIMES	1090479205	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
113	GUILLERMO ALEXANDER SANCHEZ AVENDAÑO	11275648	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
114	JESUS IVAN IBARRA FUENTES	1127337620	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
115	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
116	LUIS ANGEL MOJICA VILLALOBOS	1003314689	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
117	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
118	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
119	YIMMY ANDRES SANTAFE JIMENEZ	1069257709	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
120	DISNARDO CHACON MENESES	1003175221	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/07/2025
121	CARLOS MARIO CHACON MEJIA	1064838716	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/07/2025
122	WBEIMAR ORLANDO MUÑOZ TORRES	1007847136	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
123	ROSENDO GARCIA PRADA	1022978343	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
124	JOSE DANIEL RUBIO GUTIERREZ	79805550	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
125	JONATHAN ORLANDO ESPITIA RODRIGUEZ	1022967079	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
126	YOIMER JESUS MOENO MARRUGO	1044909113	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
127	RAFAEL MONROY CABALLERO	13456598	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
128	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
129	CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MARQUEZ	1022429478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
130	ANDRES PABON LAGUADO	1090475005	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
131	ANGUIE LIZETH MURCIA MOLINA	1065611154	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
132	JHONATAN DE JESUS HERAZO BARRIOS	1001934780	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
133	JIMMY ALEXANDER GARZON	79704838	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
134	JUAN PABLO VANEGAS BERMUDEZ	1073328596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
135	KEVIN ALEXANDER GARZON MORENO	1015468890	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
136	MARCO JOSE DE LA HOZ RIVERA	1043606712	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
137	NESTOR GUILLERMO VARGAS ROJAS	1022357442	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
138	WRAYAN ESTIVEN GOMEZ ACOSTA	1012454441	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
139	YEISON MOGOLLON ORTEGA	1093775476	RESIDENTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
140	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	1087408073	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/07/2025
141	JHONATAN DE JESUS HERAZO BARRIOS	1001934780	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/07/2025
142	JOSE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ	79742171	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
143	JOSE ANDRES SANCHEZ ROMERO	79650231	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
144	MOISES GAONA MARTINEZ	72325741	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
145	JOSE RAMON SUAREZ SALCEDO	8980183	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
146	DIEGO MAURICIO POVEDA ROCHA	1076653980	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
147	WRAYNT JHONATAN CHAVARRO ANDRADE	1006523262	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
148	PEDRO NEL OCAMPO ESTERLING	1125178774	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
149	NELSON VALDERRAMA LOZANO	1117524890	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
150	LUIS ALBERTO SEGURA ROMERO	15888239	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
151	ANDRES ALEJANDRO PAYAN MEDINA	1006772962	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
152	CRISTHIAN ALEJANDRO OCAÑA CHAVEZ	1111542219	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
153	DIEGO ALEJNDRO GASCA CORREA	1024591885	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
154	JOSE LIBARDO RUBIANO MANCERA	1032387698	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
155	ROBINSON CARMONA CAICEDO	1117530555	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
156	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	15/07/2025
157	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	15/07/2025
158	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	17/07/2025
159	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	17/07/2025
160	CAMILO ANDRES MEZA TORRES	1062906307	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/07/2025
161	JORGE ENRIQUE CUELLAR PLAZAS	7710284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/07/2025
162	YORLEY ALVARADO RAMOS	1023006152	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
163	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
164	MIGUEL ANGEL GARCIA BUITRAGO	1022939993	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
165	EDISSON NOE DIAZ VARGAS	1101691571	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	18/07/2025
166	JANER ESTEVEN DAZA YARPA	1004580102	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
167	JESUS MANUEL TAIMBUD QUENGUAN	87100688	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
168	JOSE BOLIVAR MARTINEZ TENGANAN	87103284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
169	HENRY LISARDO HERNADEZ	13073245	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
170	DANNY DANIEL SANCHEZ NIÑO	80129218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
171	JAVIER FLORENCIO TORRES NIÑO	1033677695	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
172	JEFFERSON DANIEL CRUZ NARANJO	80247323	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
173	JESUSALDO CENTENO MONTENEGRO	7997248	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
174	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
175	JOSE ANIBAL TORRES SANCHEZ	79529020	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
176	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
177	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
178	DIEGO CASTIBLANCO HERNANDEZ	1070331867	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
179	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
180	JORGE ELIECER VANOY HERRERA	1000985335	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
181	SANTIAGO JOSE RINCON MATEUS	1002998707	TECNICO ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
182	BRAYAN STEVEN HURTADO JURADO	1094961642	TECNICO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
183	MARLON SEGUNDO CANOLES PEREZ	73190904	TECNICO EN MANTENIMIENTO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
184	JESUS ALBERTO CHAMARRO RODRIGUEZ	87532204	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	28/07/2025
185	EDISON OSWALDO FLOREZ GOMEZ	1128430135	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	30/07/2025
186	ALBEIRO QUINTERO BERNATE	14278474	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
187	ALEX ALFONSO PRIMERA	1002093520	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
188	ANDERSON LONDOÑO SALAMANCA	1110518853	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
189	BRANDON Y ALEX PRIMERA MAYO	1047222741	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
190	CARLOS ALBERTO TORO RESTREPO	98535012	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
191	DILMER BAYONA	80777530	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
192	EIDER ANDRES QUINTERO BERNATE	1022977870	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
193	FREDDY JOSE REYES VELAIDES	1043434375	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
194	JOHN ESTIVEN CLAVIJO FERNANDEZ	5826934	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
195	JOSEP ALEJANDRO CIFUENTES GAITAN	1000018036	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
196	LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	93413044	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
197	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
198	CHRISTIAN DAVID HURTADO QUILINDO	1061776071	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
199	ERICK FERNANDO COLMENARES	1094947865	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
200	HUELMER GERSAIN GAON MUÑOZ	76331652	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
201	HUGO HERNAN VILLAMAR	10692253	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
202	JAIME SOLARTE	10720889	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
203	JESUS EDUARDO GARZON	76329032	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
204	JOSE FREDY LAME CAPOTE	4616328	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
205	JOSE LUIS MOLINA	1061774713	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
206	JOSE MARIA RIVERA	10720643	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
207	JUAN CARLOS ANGULO OBANDO	1059912736	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
208	LUIS CARLOS CAPOTE COTAZO	1061719679	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
209	LUIS ESUARDO VILLAMAR	1059901577	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
210	MILLER DANIEL OROZCO	1064434924	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
211	YOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ	76328284	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
212	BREYNER VILLAMIZAR	1148963473	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
213	ERMIS BASTOS	1094276006	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
214	FERNANDO DUARTE HERNANDEZ	69882265	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
215	GRATINIANO NATVAEZ NARVAEZ	12580397	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
216	JOSE CALDERON	4342875	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
217	JOSE GREGORIO CAICEDO GARCIA	88162737	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
218	OSCAR LARRARTE	93286333	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
219	GUILLERMO HINCAPIE	79410724	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
220	JHON BERNAL	79566080	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
221	JOHN HINCAPIE	79482086	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
222	CARLOS ERNESTO SALAS RIVERA	75036072	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
223	DAIRO MONTAÑO	1024503523	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
224	JUAN SEBASTIAN GOMEZ MOYANO	1023967457	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
225	MAURICIO AVILA	79976026	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
226	JUAN JOSE AVILA PERES	11522038	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
227	DANIEL SANTIAGO VALLEJO PORTILLA	1192891870	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
228	CARLOS JONATHAN SANCHEZ GALINDO	1019058760	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
229	JHON EDWAR ARANGON OYOLA	1110232752	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
230	JOHN ALEXANDER PAIPILLA NORENO	1000142579	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
231	PABLO JOSE PACACIRA	7177181	SUPERVISOR	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
232	JAMES AVILÉS NARVÁEZ	16704152	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
233	JOSÉ LEONARDO DIAZ ULLOA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
234	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
235	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
236	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
237	ANGEL MARIA GARZON FUENTES	83115511	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/08/2025
238	LEONARDO JAIDER BRAVO GUZMAN	12266998	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/08/2025
239	DANIELA DEL PILAR GAITAN GARZON	1121851915	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-NORTE	20/08/2025
240	JACKSON FABIAN ROJAS MORENO	86053901	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-NORTE	20/08/2025
241	JUAN CAMILO CRISTANCHO BOHADA	1018843507	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-NORTE-ORIENTE	21/08/2025
242	DANIEL FELIPE GRIMALDOS PEREZ	1006876619	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-NORTE-ORIENTE	21/08/2025
243	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ BARRERA	1022938529	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
244	DULIS CESAR ALVARADO PADILLA	7617663	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
245	KEVIN ROBIN ELLIS MORALES	1000930480	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
246	LEONARDO CASTIBLANCO PUENTES	79247553	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
247	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
248	HERNAN DARIO DE LA ROSA ARIAS	1103119376	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
249	JAIDER MANUEL SIERRA ATENCIA	1047338449	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
250	JAIRO ALFONSO PALLARES PACHECO	72224929	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
251	JULIO CESAR AGAMEZ	1003562850	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
252	DIANA LUCIA BASTIDAS FERNANDEZ	1045724856	SST	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
253	JUAN CAMILO CRISTANCHO BOHADA	1018843507	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
254	JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON	1233692117	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
255	EDGAR MORENO REYES	1005195748	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
256	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
257	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
258	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
259	FRANNKYN ROOSEVELTH MÉNDEZ	1024484580	Instalador	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
260	ALEXIS JOSE RAUSEO UGAS	6197399	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
261	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
262	CESAR GIOVANNY ESPITIA HOME	1019098213	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
263	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
264	IRBIN ALEXANDER MENA MORENO	1010102279	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
265	YOHAN MANUEL MOSQUERA PEREA	1077422862	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
266	CARLOS GUILLERMO TUTALCHA BOTINA	98390352	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
267	FABIO ALIRIO PAZ OBANDO	87066132	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
268	JESUS ESPERIDION OBANDO TORO	12746343	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
269	LUIS EDUARDO POTOSI YAQUENO	1085296983	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
270	LUIS ORLANDO LUNA MARTINEZ	12746960	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
271	OSMALDO OBANDO TORO	13068176	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
272	SEGUNDO DARIO OBANDO TORO	5252424	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
273	HERNAN DARIO DE LA ROSA ARIAS	1103119376	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
274	JAIDER MANUEL SIERRA ATENCIA	1047338449	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
275	JAIRO ALFONSO PALLARES PACHECO	72224929	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
276	JADER ENRIQUE PEREZ MARQUEZ	72280530	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
278	RUBEN DARIO MARIN CASTRO	71172895	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	28/08/2025
279	JESUS DAVID ROMERO PAYARES	1102861496	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	28/08/2025
280	VICTOR ALFONSO RIOS RESTREPO	1020400695	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/09/2025
281	JOSE ALEXANDER SALDARRIAGA PIMIENTA	71878546	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/09/2025
282	BLADIMIR RUGELES LUGO	86009466	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
283	EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	1120354645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
284	GUSTAVO MORENO GARCIA	7332092	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
285	SANTIAGO JOSE RINCON MATEUS	1002998707	TECNICO ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
286	VICTOR MANUEL OCHOA DUCUARA	1015408267	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
287	JULIO ENRIQUE SOTO DIAZ	92130029	SUPERVISOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
288	ALEXANDER QUIROGA HERREÑO	1099207267	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
289	JHONATAN STHIVEN RUCINQUE LOPEZ	1106901060	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
290	PEDRO MALAMBO GUARDO	73200173	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
291	CAMILO ANDRES SEGURA SALDAÑA	1117535618	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
292	PEDRO ANTONIO BAUTUISTA CARDENAS	91257451	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
293	CIRO ALFONSO ORTIZ VILLABONA	1101597947	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
294	ALEXIS OJEDA BETANCOURT	1121930159	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	11/09/2025
295	MIGUEL ANGEL AVILA LIZCANO	91347317	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/09/2025
296	LUIS FERNANDO CORREA JAIME.	79622344	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
297	KEVIN DUVAN BALLESTEROS SOTO	1007184968	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
298	ESTEFANIA BALLESTEROS SOTO	1003292614	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
299	NICOLAS SANTIAGO BOHORQUEZ BERNAL	1006799502	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/09/2025
300	OSCAR FIDEL MONROY	86062113	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/09/2025
301	LUIS EUCLIDES RAMIREZ MENDEZ	91349612	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
302	YORLIN URBINA MARQUEZ	1137195346	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
303	JEAN CARLOS PALOMINO PADILLA	1049940525	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
304	JHONNY ALEXANDER MENDOZA ZAMBRANO	1032364379	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
305	MAICOL FABIAN DIAZ LOAIZA	1019096220	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
306	MARTIN GUERRERO DIAZ	1019037888	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
307	ALCIDES MANUEL LEAL NARVAEZ	1045703284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
308	JHON EDWAR ARANGON OYOLA	1110232752	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	18/09/2025
309	JORGE FERNANDO MENESES VILLAREAL	1010069951	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	18/09/2025
310	MARTIN JOSE GONZALEZ AÑEZ	5067052	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
311	VICTOR MANUEL OCHOA DUCUARA	1015408267	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
312	RONAL ALBERTO MOLANO ROBLES	8787336	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
313	VICTOR ALFONSO ORTEGA MALDONADO	1129573469	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
314	JESUS ALBERTO ESTRADA MENDOZA	5462085	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
315	JONNY ALEJANDRO GONZALEZ CELIS	86082783	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
316	MAURICIO HERNANDEZ PACHON	86053533	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
317	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRA	1002047944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
318	REINALDO ISIDRO GUTIERREZ MARQUEZ	3161886	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
319	CRISTIAN ANDRES ARTUNDUAGA MOYA	1057215930	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
320	WILLIAM RICARDO ARIAS ARIAS	1053346103	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
321	YEISON MONROY CORTES	1053340982	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
322	ALDEMAR PINEDA	10274501	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
323	FRANK EDUAR ESPINOSA QUINTERO	1093984533	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
324	ISRAEL ANTONIO REMOLINA SILVA	80072455	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	25/09/2025
325	EDILSON GIOVANY BERMUDEZ QUINTERO	1053841049	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	25/09/2025
326	GABRIELA MORGENSZTERN	1090534584	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
327	DARIO ALEXANDER PALACIOS ARDILA	1001021842	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
328	MELKIN ESCOBAR BERONA	1028014959	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
329	RONAL ALBERTO MOLANO ROBLES	8787336	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
330	ANGELA FAHISURY CARVAJAL BARRERA	1052400259	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
331	JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ	92524885	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
332	RAFAEL GERMAN DE LA ROSA SALASAR	92534621	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
333	JADER PATIÑO JIMENEZ	13568486	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
334	WILLIAM CAICEDO CASTILLO	80372534	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
335	EDER MANUEL ANGULO MARTINEZ	8527321	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
336	SAMIR JUNIOR GONZALEZ	1045229070	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
337	NICOLAS ESTEBAN RINCON MATEUS	1002998708	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
338	ROQUE ANTONIO MACHADO DAZA	13279123	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
339	JULIO CESAR BELTRAN GOMEZ	92601891	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
340	RUBEN DARIO CABALLERO RODIRGUEZ	1000241016	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
341	RONIEL JOSE GARCIA	6530626	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
342	JOSE ORLANDO ALARCON MONTES	7713367	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
343	HECTOR CHARRY GALINDO	12137324	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
344	JUNIOR ALEXANDER PINEDA PINEDA	6263639	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
345	JESUS RAMON CONTRERAS ALBARRACIN	6721275	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
346	ANGEL SIMON LUNA VIDES	1081930172	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
347	ANGEL MAURICIO ALVAREZ SALAS	1111760404	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
348	AGUSTIN RAFAEL OLIVO ANAYA	1001851618	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
349	JORGE ARMANDO CANO MOSCOSO	1116437317	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
350	JOSE JOAQUIN FRIAS MUÑOZ	9146684	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
351	LEONARDO ANDRES GIRALDO CASIERRA	94230398	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
352	LUIS ALEXANDER RIASCOS CAICEDO	1111786654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
353	JOHN ALEXANDER PAIPILLA MORENO	1000142579	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
354	SEBASTIAN GIRALDO MOSCOSO	1059990047	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
355	JAVIER GUILOMBO MONTES	7687771	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
356	JHONNY ALEXANDER MENDOZA ZAMBRANO	1032364379	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
357	MAICOL FABIAN DIAZ LOAIZA	1019096220	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
358	MARTIN GUERRERO DIAZ	1019037888	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
359	EDINSON BENITO ARIAS	1096219784	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
360	WILLIAM JOSE PEREZ MARTINEZ	1005486694	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
361	YEINER JOSE BELTRAN GOMEZ	1101783832	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
362	ROMARIO ANDRES PINZON SANGUINO	1090501941	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
363	YEISON JOHAN RINCON DURAN	1090454019	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
364	MISAEL NAVARRO BONILLA	5035440	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
365	ANDRYS JESUS SANTIAGO JIMENEZ	1007961913	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
366	RHASID NAIR HERNANDEZ ANDRADE	1073823274	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
367	JAIME ORLANDO ACOSTA RIOS	79157190	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
368	JESUS EDUARDO YAÑEZ LOPEZ	1110514830	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
369	DUVAN DAVID ARIAS BAQUERO	1005776670	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
370	ALBER ESNEIDER MUÑOZ APONTE	86081922	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
371	ROSNEY ARGEMIRO SUAREZ CRUZ	19001680	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
372	CARLOS MATERAN	6838108	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
373	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ BARRERA	9396959	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
374	JHON ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	1054545625	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
375	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
376	JUAN SEBASTIAN LUGO AVILES	1140920050	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
377	AZAEL NOGUERA FRANCO	10546961	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
378	HERNAN CHICANGANA BELTRAN	76331869	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
379	DIEGO ANDRES PINZON LOPEZ	1005064061	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
380	CIRO ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	1065641069	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
381	MIGUEL GEOVANY SUAREZ AYALA	1004944826	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
382	DANILO ANDRES SUAREZ AYALA	1004944825	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
383	ALDAIR SOTO SANDOVAL	1042242931	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
384	CRISTIAN EDUARDO ARANGO BAQUERO	1072395652	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
385	DARIUN DANIEL ARANGO CASTRO	1121836458	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
386	FERNANDO ALFONSO MANCHEGO CANEO	1045674440	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
387	JOHAN ALEJANDRO ARANGO BAQUERO	1121955360	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
388	DEIVIS ALBERTO FERRER RUDAS	1048290350	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
389	DIVIER ALEXANDER FONSECA	1007419879	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
390	ANDERSON LEINER QUILCE JURADO	1109419579	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
391	JORGE MARIO LEAL GONZALEZ	93413074	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
392	JUAN GABRIEL VARON MURCIA	5822926	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
393	ROBERTO CARVAJAL GONZALEZ	10109284	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
394	FERNANDO JOSE DE LA OSSA COGOLLO	1007781505	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
395	JAIRO AGUSTIN BRAVO PEÑATA	1067895836	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
396	WILLIAM VALENCIA SOTO	1055755645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
397	DUVAN ALBERTO TENORIO PUYO	1007150565	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
398	LUIS ALEJANDRO ROZO SANTOS	1245278762	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
399	GUSTAVO MATEUS CARDONA	94252218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
400	MAX RAFAEL RIVERO RODRIGUEZ	4990730	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
401	RANDY JOSE GONZALEZ PIÑERO	4870728	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
402	CARLOS MARIO SERNA GIL	98707930	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
403	NESTOR IRIARTE PEREZ	1047365945	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
404	LUIS RAFAEL DOMINIQUETTI SERRA	9148961	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
405	EDUARDO ENRIQUE CERVANTES CABALLERO	1041976650	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
406	JUAN ROMAN APOLINAR GUEVARA	17337676	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
407	JAIR ARTURO TREJOS ORTIZ	15915439	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
408	OSCAR DE JESUS ORTIZ	15920158	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
409	CARLOS EFREN LOZANO	17700924	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
410	EDUARDO ANTONIO TOVAR YANCE	17589709	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	20/10/2025
411	CARLOS SANCHEZ FAJARDO	17287335	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	20/10/2025
412	FABIO ESTEVAN GARCIA BARROS	1030625946	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	21/10/2025
413	JORGE LUIS GONZALEZ CASTELLANOS	80744773	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	21/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
414	JAN CARLOS LOZANO VALDERRAMA	1015459196	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	22/10/2025
415	REINEL GUEVARA NAVARRO	18972384	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
416	EILER CHONA LAZARO	13379544	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
417	ISMAEL ANTONIO VERA SANCHEZ	1127666567	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
418	WILLIGTON ALEXANDER RUIZ RIAÑO	1094045357	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
419	DANIEL ALEJANDRO CASTRILLON MOLINA	1054925165	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
420	OSCAR ANDRES VILLEGAS GONZALEZ	4519439	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
421	VICTOR HUGO CORTES BEDOYA	1054922390	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
422	EDINSON BENITO ARIAS DIAZ	1096219784	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
423	HORACIO GELVES NIÑO	91470413	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
424	OMAR HERNANDEZ SANCHEZ	91435391	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
425	ADALBERTO ORTIZ VELASQUEZ	71985421	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
426	ARBENIS EZEQUIEL HERNANDEZ PARRA	5505505	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
427	LUIS ALBERTO VENERA MATUTE	1193546254	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
428	CARLOS RONALDO TIQUE HURTADO	1116807138	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
429	ANDRES FANDIÑO PEÑA	80748984	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
430	RODRIGO SUAREZ VIVAS	80165589	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
431	JOSE ABELARDO GOMEZ PIAMBA	76336429	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	29/10/2025
432	ALVARO ALEXANDER GOMEZ NARVAEZ	1004631289	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
433	ANGELA MERCEDES GONZALEZ SANTACRUZ	1085269054	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
434	FIDENCIO FERNANDO URBANO MUÑOZ	1084222993	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
435	JESUS ADRIANO OCAMPO GOMEZ	9870154	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
436	JOHN ANDERSON GELPUD LOPEZ	1004439559	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
437	JOSE JUVENCIO GARCIA TABLA	12975881	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
438	LUIS ARMANDO GARCIA TABLA	12986773	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
439	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
440	CRISTIAN CAMILO DOMINGUEZ OROZCO	1123620560	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
441	IVAN ALFONSO HERRERA MONTAÑEZ	1123622310	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
442	GUILLERMO MORALES JOHNSON	18001008	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
443	SANDY JOHANA FLOREZ PABON	30188331	APOYO DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
444	ANDRES FELIPE NOGUERA CARDENAS	1106895862	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
445	ANDERSON POSADA MORENO	1001021122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
446	DAIRO ALEXANDER PALACIOS ARDILA	1001021842	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
447	JADER STIVEN ORTIZ ORTEGA	1028035015	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
448	JOHAN ANDRES RIVAS MURILLO	1192751615	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
449	SADIR DE JESUS MORALES FERREIRA	78645193	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	6/11/2025
450	LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ	1051240768	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	6/11/2025
451	EDISON REINEL SUAREZ DAVILA	13271080	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
452	HERNRY ALBERTO VARGAS	88178439	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
453	HILARIO VILLARRUEL BAÑOS	3886487	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
454	PASTOR MAJIN VARGAS	16726720	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
455	RONALDO CORTES	1093292094	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
456	WILLIAM ALEJANDRO HERNANDEZ	1090389025	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
457	JAIME ALEXANDER CARDENAS BUENO	1233489884	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	9/11/2025
458	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	9/11/2025
459	JONIER STIVEN MARTINEZ VALENCIA	1007825351	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	9/11/2025
460	ADRIANA NIETO MORENO	1022929595	SST	REGIONAL OCCIDENTE	9/11/2025
461	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
462	CRISTIAN CAMILO DOMINGUEZ OROZCO	1123620560	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
463	IVAN ALFONSO HERRERA MONTAÑEZ	1123622310	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
464	GUILLERMO MORALES JOHNSON	18001008	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
465	GILDARDO ANTONIO DAVID MAZO	1027946372	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	13/11/2025
466	LUIS EDGAR YANEZ PEÑARANDA	1148694641	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
467	JUAN DIEGO ROLON LUNA	1092154433	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
468	OLIER MANUEL UBARNE CUADRADO	1068808704	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
469	CESAR AUGUSTO TRIANA	1102348912	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
470	PEDRO JESUS GONZALEZ DIAZ	91353046	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
471	YHERSON ANDRES LUNA BARRAGAN	1095790466	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
472	JOHN EDUARDO ROJAS	98363542	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	14/11/2025
473	FRANCISCO ALBERTO BENAVIDEZ PAZ	79728853	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
474	JAVIER ARMANDO PARRA SALCEDO	12968327	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
475	MARIO ALBERTO CAICEDO CHAVES	1085244357	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
476	MICAHEL SALCEDO CASTEÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
477	LUIS FERNANDO CORREA JAIME	79622344	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	18/11/2025
478	JOHN JAIRO JAMES ACEVEDO	1092342458	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
479	JOHN MARCOS PALENCIA VELASCO	1093776437	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
480	JHON FREDY PANCHE PRADA	1023032909	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
481	CAMILO ANDRES URREA PINEDA	1023027096	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
482	EDUARDO ALEXIS NIÑO ORTIZ	1102370775	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	18/11/2025
483	ADREANYER MANUEL HURTADO ABAD	7165651	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/11/2025
484	WELFER ESTEBAN HERNÁNDEZ CIRO	1098820760	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL ORIENTE	19/11/2025
485	CRISTIAN GIOVAN LUNA BARRAGAN	91526410	OFICIAL	REGIONAL NORTE	19/11/2025
486	GABRIEL OVIEDO GIL	1065233222	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025
487	OMAR ENRIQUE OVIEDO GIL	73015076	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025
488	DALCIA PAOLA RIVADENEIRA CASTRILLO	1118839606	APOYO DE OBRA	REGIONAL NORTE	19/11/2025
489	JOSE ANTONIO VARGAS	7592807	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
490	EIMAR ALFONOS YACUMAL	1061789307	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	20/11/2025
491	GERMAN ALONSO YACUMAL MOMPOTES	76325358	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	20/11/2025
492	ARGEL RAAD ALTAMAR	1098741210	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
493	CARMEN PAOLA CACERES AMADO	63505804	TECNICO	REGIONAL NORTE	21/11/2025
494	CRISTOBAL FLOREZ ESCOBAR	18974955	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
495	ELADIO JOSE MENDEZ SERPA	1102858170	OFICIAL	REGIONAL NORTE	21/11/2025
496	GREGORIO BENEDITO PERALTA GONZALEZ	7167818	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
497	JHON JAIDER STIVEN HERRERA CABEZA	1099940062	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
498	MAYCOL DE JESUS ARRIETA ALMARIO	1066754180	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
499	BRAYANT BEDOYA CHAVEZ	1124243021	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
500	EDICSON DARLEY CRUZ ROMERO	1124244654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
501	FAVIO ALEXANDER GONZALEZ MONTAÑO	17293348	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
502	JOHN EMILIANO YEPES JARAMILLO	71269407	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	21/11/2025
503	SERGIO ANDRES CASTAÑO DAVID	1151447546	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	21/11/2025
504	ALEJANDRO ENRIQUE MANJARRES CARRASCO	8534857	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
505	CRISPINIANO HURTADO CARO	1052944045	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
506	CHRISTIAN DAVID RAMOS VILLALBA	11255087	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
507	JHON WILMAR RODRIGUEZ NIETO	1122119531	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
508	LUIS ALBERTO SILVA CRUZ	80262833	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
509	SERGIO STEVEN GOMEZ PEREZ	1122142205	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
510	CARLOS ANTONIO CARDENAS CARDENAS	88311818	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
511	LUISA FERNANDA LEGARDA ORELLANA	1004509882	RESIDENTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
512	VICTOR JULIO MILQUES ROJAS	19497338	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
513	WILMER POVEDA HERNANDEZ	1090439158	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/11/2025
514	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
515	CARLOS MARIO VILLADA NAVAS	1042061980	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
516	CARLOS MAURO BENAVIDES PALACIO	1071579008	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
517	CRISTIAN DAVID ATENCIA	1038107816	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
518	EDWIN GUSTAVO CASTAÑEDA DELGADO	1104711901	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
519	HERASMO JOSE ROMERO HERNANDEZ	1002442293	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
520	ISAIAS MANUEL SANDOVAL MAESTRA	1002206793	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
521	JAIME ALBERTO RAMIREZ PALACIOS	79214638	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
522	RODRIGO DE JESUS GRAJALES	16856730	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
523	LUIS CARLOS CADENA SEGOVIA	85434555	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
524	MANUEL ESTEBAN PINEDA CORONADO	12583746	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
525	TITO LUCIANO RANGEL CADENA	85272423	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
526	MARCO AURELIO ARIAS	1093747032	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/11/2025
527	ABIGAIL PRADA	88213982	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/11/2025
528	DANIEL JEOVANI ACOSTA COLON	9140839	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/11/2025
529	JESUS LISANGEL AGRIZONES	5281178	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	28/11/2025
530	CARLOS EDUARDO MORALES MARIN	1058198303	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
531	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	11054659034	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
532	JHON ALEXANDER OCHOA FIGUEROA	1002444097	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
533	JAIRO ALBERTO GARAVITO QUINTERO	7171245	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
534	VICTOR ALBERTO GALINDO VEGA	1049633563	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
535	WILMAR YAIR BENITEZ GUEVARA	1056028443	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
536	YUSEPI ALEJANDRO LUNA RIVAS	7166272	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	1/12/2025
537	LUIS CARLOS VIDAL REINES	84007805	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	1/12/2025
538	EDILBERTO RINCON VILORIA	85443431	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	1/12/2025
539	HENRY SERRANO QUINTERO	1065205036	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/12/2025
540	JAIRO ALONSO LEAL LUNA	88263537	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/12/2025
541	JHON ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	1054545625	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	2/12/2025
542	JULIO ESTEBAN BONILLA ROJAS	1001090565	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	2/12/2025
543	ALBER SANABRIA PALENCIA	72294692	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
544	ENDER ENRIQUE HERRERA PAREJO	1007122386	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
545	JOSE CARLOS PEREZ DE LA HOZ	72210275	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
546	JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1045679572	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
547	EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA	1023024591	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
548	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
549	JHONATAN ESNEIDER VELASCO LEON	1033817675	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
550	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
551	NIXON NICOLAS AVILA AGUILERA	1014303660	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
552	DIEGO ALEJANDRO PARRA ALMEYDA	1120505380	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
553	BRAYANT BEDOYA CHAVEZ	1124243021	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
554	JORGE LUIS ACONCHA LUNA	18927275	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
555	ALDREY MOROMBIA TOCRESAMA	11205000063	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
556	MICHAEL JAVIER RUBIANO SERRANO	1006697596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
557	ALBINO PEREZ AVILA	79650369	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	4/12/2025
558	LUIS ALEXANDER VERDUGO RANGEL	91522205	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	4/12/2025
559	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
560	ANDERSON FABIÁN BAUTISTA PABÓN	1098734552	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	5/12/2025
561	HARLEY ANTHONY BENT BARRANCO	1123627567	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
562	LUIS ANTONIO AGUILAR ALONSO	80643994	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
563	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
564	JIAN FRANCO SANCHEZ OSORI	1007764073	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	17/12/2025
565	JACKELINE EDELMIRA STEELE PARRA	40986214	RESIDENTE	REGIONAL NORTE	18/12/2025
566	MARCOS FIDEL CASTILLO RINCON	1120378902	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/12/2025
567	MAYCOL ESTIBEN ROJAS TAPIERO	1006688684	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/12/2025
568	JESUS DAVID ALEMAN ANGULO	1103116668	RESIDENTE	REGIONAL NORTE	19/12/2025
569	RENSSON ALBERTO PINZON ALFONSO	17594026	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/12/2025
570	CESAR AUGUSTO SILVA MARTINEZ	1100952723	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
571	JHON MARIO ACEVEDO FLÓREZ	1098714434	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
572	JHONNY ANDRES MARULANDA CARVAJAL	1039693860	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
573	MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR CONTRERAS	1098788331	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
574	MANUEL JOSE LOZANO BETANCOURT	93134611	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
575	CLIMACO CARDENAS PEREZ	3171665	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
576	DUBAN ARLEY CARDENAS GOMEZ	1000353254	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
577	RICHARD ARLEY SEPULVEDA ONTIVEROS	1093738984	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
578	RICARDO SANDOVAL PEÑA	18262125	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
579	JESUS MARIA FUYA MOZO	1056708491	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
580	HUGO ENRIQUE SEPULVEDA JACOME	1090496944	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
581	CARLOS ALBERTO CAMACHO JAIMES	1098622542	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
582	JHORMAN SNEYDER GOMEZ PITA	1006408695	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
583	CESAR AUGUSTO SILVA MARTINEZ	1100952723	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/01/2026
584	ANDRES FELIPE GONZALEZ MARTIN	1000774243	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
585	LEONARDO JAIDER BRAVO GUZMAN	12266998	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
586	RAFAEL MONROY CABALLERO	13456598	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
587	DENIS MANUEL TORO MORALES	15671609	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
588	HINZ EDUARDO BERJAN AMAYA	4437661	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
589	JOSE SILVESTRE MORALES HOYOS	15676942	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
590	JUAN DAVID LUNA GAITAN	1054538753	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
591	ROBERTO ANTONIO SIERRA MALDONADO	7166646	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
592	ULISES MURILLO MADRID	1054555053	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
593	YULEYDA PATRICIA MORALES GOMEZ	50936407	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
594	ANDERSON JULIAN FLORES ALVIS	1030670601	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
595	JORGE DIONICIO VEGA CACERES	1010113402	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
596	JUAN ANDRES JURADO BENAVIDES	1006947590	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
597	LUIS FERNANDO TORRES CASTEL_	74245031	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
598	NAZAEL RODRIGUEZ LOPEZ	4050800	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
599	ANGELA FAHISURY CARVAJAL BARRERA	1052400259	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
600	ANGUIE LIZETH MURCIA MOLINA	1065611154	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
601	EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA	1023024591	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
602	HUMBERTO ROA	13444945	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
603	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
604	JHONATAN ESNEIDER VELASCO LEON	1033817675	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
605	JUAN FELIPE CORDERO NAVARRO	1136911704	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
606	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
607	OMAR NARANJO PICO	1098406778	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
608	KEVIN STEPHAN CARO VERGARA	1005581365	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
609	MANUEL JOSE NAVARRO MARTINEZ	1100624160	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
610	JOSE ORLANDO OSSA GONZALEZ	4403296	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
611	BRAYAN RENE CALDERON CAMARGO	1090476702	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
612	DANIEL DAVID CASAS VEGA	88245358	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
613	ISMAEL CRESPO JAIMES	1127361855	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
614	JOSE VICENTE VERA GUTIERREZ	88226733	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
615	JUNIOR ANDRES HERRERA CALDERON	1090373365	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
616	LUIS CARLOS VILLEGAS BALLENA	5092805	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
617	LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ BARRAGAN	1101622267	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
618	MILLER ANDRES MENDEZ BARRAGAN	1101546565	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
619	PLUTARCO SOLANO MARTINEZ	91344588	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
620	ROQUE ANTONIO MACHADO DAZA	13279123	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
621	ALBERTO MARIO PEREZ NAVARRO	3738522	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	16/01/2026
622	CARLOS JAVIER BORJA JORDAN	1143227061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	16/01/2026
623	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	16/01/2026
624	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	16/01/2026
625	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	20/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
626	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	20/01/2026
627	JOHAN STIVEN RUIZ ALMECIGA	1071169654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
628	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
629	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
630	DULIS CESAR ALVARADO PADILLA	7617663	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
631	IGNACIO MILLAN ORJUELA	17267505	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
632	JORGE MARIO LEAL GONZALEZ	93413074	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
633	LEONARDO MONTOYA TOVAR	5973089	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
634	ANDRES FELIPE GONZALEZ MARTIN	1000774243	ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
635	CHRISTIAN DAVID RAMOS VILLALBA	11255087	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
636	ELIO JOSE CARPAVIRE	8296978	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
637	FRANKLIN HERNAN CASTELLANOS	1090479205	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
638	JUAN DIEGO ROLON LUNA	1092154433	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
639	LUIS ALBERTO SILVA CRUZ	80262833	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
640	LUIS EDGAR YANEZ PEÑARANDA	1148694641	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
641	WILLIAN JOSE DURAN	5731911	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
642	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1129593	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
643	HAROLD SNEIDER PINTO SUAREZ	1019602207	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
644	CRISTANCHO CARDENAS SAENZ	74328190	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
645	ARGEL RAAD ALTAMAR	1098741210	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
646	CARLOS JAVIER BORJA JORDAN	1143227061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
647	CARMEN PAOLA CACERES AMADO	63505804	ELECTRICO	REGIONAL NORTE	22/01/2026
648	CRISTIAN GIOVANNY LUNA BARRAGÁN	91526410	OFICIAL	REGIONAL NORTE	22/01/2026
649	DALCIA PAOLA RIVADENEIRA	1118839606	APOYO DE OBRA	REGIONAL NORTE	22/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
650	ENDER ENRIQUE HERRERA PAREJO	1007122386	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
651	GREGORIO BENEDITO PERALTA	7167818	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
652	JADER LUIS ARAUJO PINEDA	19595428	OFICIAL	REGIONAL NORTE	22/01/2026
653	JHON JAIDER STIVEN HERRERA	1099940062	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
654	JOHANA LICETH DIAZ OSORIO	1098787392	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	22/01/2026
655	JOSÉ ANTONIO VARGAS	7592807	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
656	JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1045679572	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
657	ALBERTO MARIO PEREZ NAVARRO	3738522	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
658	MANUEL ANTONIO PEREZ LINERO	1129524006	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
659	EDUARDO ENRIQUE CERVANTES CABALLERO	1041976650	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
660	JOSE CARLOS PEREZ DE LA HOZ	72210275	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
661	PEDRO MALAMBO GUARDO	73200173	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
662	ALEXANDER DIONISIO RAMOS CARO	73182082	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
663	CARLOS ANDRES VILLANUEVA NUÑEZ	1143454702	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
664	EDILBERTO CHINCHILLA PALLARES	12568317	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
665	RAFAEL MERCADO SILGADO	9042982	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
666	CAMILO ANTONIO LOPEZ OCAMPO	1123531291	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
667	CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA ALVAREZ	86013281	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
668	ANDRES FELIPE GONZALEZ PEREZ	1100627390	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
669	CARLOS ANDRES ZAPATA PRESIGA	1001145197	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
670	JAVIER ARMANDO PARRA SALCEDO	12968327	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
671	JESUS DANIEL ARTEAGA LUGO	1003071663	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
672	MICHAEL SALCEDO CASTAÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
673	ASTRID CAROLINA MEDINA BOBADILLA	1119217740	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
674	DEYBI ANDRÉS JAIMES TARAZONA	80921707	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
675	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
676	JORGE ARMANDO MARTINEZ CAMELO	80226139	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
677	JORGE LUIS GONZÁLEZ PALLARES	1091803887	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
678	WILLIAM CAICEDO CASTILLO	80372534	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
679	MAICOL ESTEBAN BRACAMONTE MARTÍNEZ	1005108009	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/01/2026
680	ALEJANDRO FONSECA CACERES	1098764868	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/01/2026
681	JAIRO AGUSTIN BRAVO PEÑATA	1067895836	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/01/2026
682	CARLOS ALBERTO CAMACHO JAIMES	1098622452	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
683	CARLOS AUGUSTO VAQUIRO	11316941	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
684	HAROLD ANDRES MEJIA OSORIO	9874579	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
685	JEFFERSON ESTIVEN OSORIO	1088022764	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
686	VICTOR MANUEL SANDOVAL MORALES	1003304880	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
687	ANDRES FERNANDO TIBAQUIRA PIRAVAN	1010050473	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
688	DAVID SEBASTIAN HERNANDEZ GALVIS	1023037023	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
689	DIEGO ALEXANDER MARIN ARCILA	1032465108	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
690	JAIME EDUARDO MANZANO BALDION	16801648	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
691	MARTIN ACOSTA LINARES	79610836	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
692	ANDRES FELIPE TORRES CAMARGO	1014290145	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
693	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	15647682	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
694	ERASMO MARTINEZ	323432	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
695	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
696	MILLER ALEJANDRO MENDEZ CHIVATA	80742891	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
697	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
698	STEED BARCENAS ROBAYO	80232649	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
699	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
700	JESUS ORLANDO COLORADO OLAYA	1006693731	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
701	JUAN ESTEBAN BARON GALINDO	1050603645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
702	WILIAN ORLEY MARTINEZ CUESTA	79667092	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
703	FAVIO ALEXANDER GONZALEZ MONTAÑA	17293348	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	3/02/2026
704	PEDRO JESUS GONZALEZ DIAZ	91353046	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	3/02/2026
705	ERICK FERNANDO COLMENARES	1094947866	APOYO DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	3/02/2026
706	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	1064983252	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	4/02/2026
707	EDWIN ESPINOSA UZETA	1015396112	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
708	JEYSON DAVID ROJAS PAYARES	1033712661	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
709	JOSE GIOVANNY BERMUDEZ PALACIO	1024512750	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
710	ELVER JAVIER MORA MOLINA	1003045498	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
711	FILIBERTO MIGUEL PICO SANCHEZ	6877061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
712	LUIS CARLOS CHIMA NORIEGA	1067952224	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
713	MAURICIO JOSE OROZCO HERNANDEZ	1067950867	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
714	LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ	1051240768	APOYO DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	11/02/2026
715	MIGUEL ANTONIO GÓMEZ FLOREZ	1064983252	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	12/02/2026
716	JOSE MIGUEL GARCES FUENTES	1045492912	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	12/02/2026
717	URIEL ANTONIO MANCO MANCO	3420743	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE	12/02/2026
718	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	15647682	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	13/02/2026
719	ANTONIO ALEXANDER LABRADOR CONTRERAS	5496954	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	13/02/2026
720	LUISA FERNANDA PROAÑOS CASALLAS	53036744	COORDINADORA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
721	JAIME ORLANDO ACOSTA RIOS	79157190	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
722	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
723	NIXON NICOLAS AVILA AGUILERA	1014303660	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/02/2026
724	OSCAR IVAN CUESTAS ESPINOSA	1032939738	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/02/2026
725	YEISON MOGOLLON ORTEGA	1093775476	RESIDENTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
726	JOHN MARCOS PALENCIA VELASCO	1093776437	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
727	JOSE LEONARDO DIAZ ULLUA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
728	ANDRES FANDIÑO PEÑA.	80748984	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
729	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRIA	1002047944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
730	WILFRAN ANTONIO DE HOYOS MORELO	1001671387	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
731	JOSE ALFREDO JIMENEZ REINOS	14013920	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
732	JOSE LUIS AVILA CARDALES	6494532	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
733	CRISTIAN FERNANDO HINCAPIE TORO	1058842570	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
734	DANILO RIOS VALENCIA	1055918321	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
735	GEIMAR ANDRES ORTIZ CORREDOR	16115435	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
736	JESUS BERNARDO CORREA MARTINEZ	1054550756	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
737	LUIS ALBERTO ECHAVARRIA AVILA	1054543717	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
738	ANTHONY DUVAN VILLASMIL PUCHE	5413107	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
739	FRANKLIN JAVIER SALINAS SAAVEDRA	5024133	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
740	REINALDO ISIDRO GUTIERREZ MARQUEZ	3161886	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
741	DAVID FELIPE DUARTE ESPITIA	1122133473	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
742	BAIRON STEVEN MULFORD OCAMPO	1121932950	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
743	EDWIN LEONARDO HERRERA	1122131303	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
744	DANIEL FELIPE QUINTERO HERRERA	1027891496	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
745	YOHAN DAVID FLOREZ IBARRA	1013556518	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
746	ADOLFO PACANCHIQUE	79134013	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
747	WILSON PAVA CARDENA	18921693	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
748	MARCO FIDEL PEDRAZA GALLO	79838222	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
749	KEVIN ANDRES GONZALEZ MURILLO	1033770247	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
750	EDWIN CAICEDO MINA	1006190692	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
751	NELSON ANDRES PARDO MANCERA	1071304077	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
752	FARY CABRERA	18261964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
753	EDUARD ARIEL BERNAL BUENO	1057690218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
754	DANIEL DAVID ESPITIA GUZMAN	1004307150	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
755	JESUS ALBERTO TRESPALACIOS SANCHEZ	1090478543	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
756	SAMIR ALFONSO RODRIGUEZ GUERRERO	1093737726	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
757	DAVID TRESPALACIOS CAPATAZ	13470788	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
758	GEYLER JHANS SIERRA SANABRIA	1013630766	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
759	RAFAEL STEVEN ROJAS BECERRA	1014226170	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
760	JUAN DAVID MONTOYA BLANCO	1006423850	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
761	JUAN JOSE AVILA PEREZ	11522038	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
762	FRANKY JAVIER GUERRERO CALDERON	1090414551	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	5/03/2026
763	ANDREY ALBARRACIN TORRES	1118553052	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/03/2026
764	ALEXANDER SUAREZ FIGUEROA	13541878	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	9/03/2026
765	MAIKOL STICK MAHECHA MAHECHA	1120955621	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	9/03/2026
766	HECTOR ANDRES ZAPATA CARDONA	14567661	OFICIAL	REGIONAL VIEJO CALDAS	13/03/2026
767	ROBERT MANUEL VELASCO CONTRERAS	4372065	OFICIAL	REGIONAL VIEJO CALDAS	13/03/2026
768	ROBINSON BLANCO FIGUEROA	91279527	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
769	CRISTIAN FABIAN MARTINEZ POVEDA	1095814349	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
770	EDGAR BENAVIDES	79634045	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
771	ENRIQUE YOHANNY SILVA AVENDAÑO	1149465700	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
772	DUVAN FERNANDO SICHACA GONZALEZ	1057187035	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
773	GEYLER JHANS SIERRA SANABRIA	1013630766	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
774	RAFAEL STEVEN ROJAS BECERRA	1014226170	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
775	CONAL YEFRY FERREIRA NIÑO	1098741598	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
776	ERWIN GIOVANNI MURILLO PIMIENTO	137720769	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
777	LUIS ALBERTO PASACHOA HERNANDEZ	1098708028	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
778	DUVAN FERNANDO SICHACA GONZALEZ	1057187035	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/03/2026
779	JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ESPEJO	80243991	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
780	JOHN ALEXANDER ENCISO BELLO	80049708	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
781	OSCAR ANDRES RIAÑO RAMIREZ	80201646	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
782	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
783	JOHAN SEBASTIAN VARGAS CARDENAS	1028784824	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
784	JORGE ARIEL SEGURA URUEÑA	1122120225	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
785	MANUEL MARIA VILORIA RIVALDO	1082243908	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	26/03/2026
786	ROBERTH DANIEL ROJAS VARGAS	1082920794	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	26/03/2026
787	ANGELA MERCEDES GONZALEZ SANTACRUZ	1085269054	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
788	CARLOS ALBERTO TORO RESTREPO	98535012	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
789	CARLOS ANTONIO CARDENAS CARDENAS	88311818	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
790	DILMER JOVANNY BAYONA RODRÍGUEZ	80777530	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
791	FRANKLIN QUIÑONES QUIÑONES	16938024	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
792	GERARDO BORJA RUIZ	87941998	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
793	HECTOR LUIS ROSERO PRECIADO	1004614796	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
794	JAVIER GUILOMBO MONTES	7687771	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
795	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1105465903 4	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
796	LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BONILLA	93413044	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
797	MICAHEL SALCEDO CASTEÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
798	VICTOR JULIO MILQUES ROJAS	19947338	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
799	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
800	DANIEL ADOLFO TABARES BASTIDAS	1110443602	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
801	JHON JAIRO POLO FUENTES	78036808	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
802	DANIEL MARIA CARVAJAL LOPEZ	6212586	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
803	ALBERSON MOLINA ORDOÑEZ	1117544255	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
804	PAVA ROMAN WILSON	1093762615	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
805	WILMAR CAMILO PEREZ AVILA	1000323598	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
806	HELI YIMMI CORDERO GALVIS	80361570	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
807	JOHN JAIRO CORDERO MOLINA	1033681680	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
808	JIMMY CORDERO MOLINA	1033707764	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
809	CESAR AUGUSTO MORENO MONTES	79954245	INGENEIRO	REGIONAL CENTRAL	20/04/2026
810	JOSE DEL CARMEN MERCHAN CARDENAS	79127801	OPERADOE	REGIONAL CENTRAL	20/04/2026
811	ANGELO FERNANDO RIOS	1027886187	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
812	CLAUIDO GUALTERO BERMUDEZ	17711065	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
813	SEBASTIAN ZAPATA ROJAS	1001020775	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
814	NEY DE JESUS GARCIA	7252410	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
815	MAICOL MONTOYA CARMONA	1056780119	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
816	LUIS ALBERTO FONSECA RIVERA	1042436454	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/04/2026
817	OSCAR DANIEL PACHECO CAMARGO	1048315979	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/04/2026
818	DAVID JESUS CHAPAL BOTINA	1085320313	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
819	HERMES FROILAN DELGADO LUNA	1083752578	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
820	JESUS ESPERIDION DOBANDO TORO	12746343	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
821	JUAN ALEXANDER GUERRA VALLEJO	1083752233	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
822	LUIS ORLANDO LUNA MARTINEZ	12746960	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
823	OBANDO TORO OSMALDO	13068176	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
824	OSCAR HERNAN GELPUD CORAL	1085291531	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
825	SEGUNDO DARIO OBANDO TORO	5252424	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
826	JESUS MARIA FUYA MOZO	1056708491	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
827	JOAQUIN DIAZ GONZALEZ	79631616	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
828	JORGE ELIECER VIASUS MOLINA	7173051	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
829	JOSE LUIS HERNANDEZ OCHOA	4081320	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
830	PEDRO ANTONIO BONILLA ARTUNDUAGA	93061247	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
831	MICHAEL STIVEN HERRERA GUTIERREZ	1109292308	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
832	RAFAEL ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	79318824	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
833	ROSANA DE FREITAS PEREZ	5306212	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
834	YEREMY GUEVARA GONZALEZ	6271724	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
835	DIEGO FERNEY ROJAS ABRIL	79223760	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
836	EDUARDO PARRA	79332484	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
837	JHON ALEXANDER PUENTES ROJAS	79836472	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
838	CRISTIAN FABIAN VARGAS MOROS	1090413023	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
839	JOSE GREGORIO ALEAN BUITRAGO	88176564	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
840	LUIS ALEXIS BURGOS CASTELLANOS	88241324	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
841	DIDIAN ANDRES GAVIRIA ESPINOSA	1061535954	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	23/04/2026
842	ARMANDO GOMEZ PIAMBA	10316793	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	23/04/2026
843	ROBERTO JOSE FERNANDEZ MURILLO	5639720	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	27/04/2026
844	GERMAN LUIS DONADO GUZMAN	8566318	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	29/04/2026
845	CAMILO ALBERTO VARGAS BAEZ	1052404026	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
846	CRISTIAN FABIAN ACUÑA LOZANO	1007139969	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
847	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
848	ALFONSO CORONADO	80371284	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
849	FABIAN CAMILO DEL VALLE PINZON	1012391807	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
850	FRANKLIN JOSE OVALLE DOVALES	1127669165	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
851	JAMER ROJAS RAMOS	1083908005	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
852	JORGE ENRIQUE BERMUDEZ DIAZ	1023936707	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
853	LUIS ALBERTO BERMUDEZ DIAZ	1023912742	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
854	OLGA PIEDAD MEJIA GONZALEZ	24645529	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
855	YOLANDA MORA AGUILAR	52489217	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
856	MARTIN JAVIER CARDOZO RAMIREZ	79453907	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
857	ALEXANDER CASTAÑO RAMOS	93382606	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
858	BENJAMIN ROJAS ABRIL	79219297	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	4/05/2026
859	JEISSON ALEXANDER RIGUEROS BARRETO	1013628069	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	4/05/2026

Tabla 4 Personal del Contratista

12.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL INTERVENTORIA	CARGO
Diego Alejandro Leiva Ortiz	Representante Legal
Angelica María Artunduaga	Secretaria
Luis Jorge Cortes	Costos y Presupuestos
Paulo Cesar Silva Morales	Director
María Amelia Zabaleta Andrade	profesional SST
Greis Leiva Bolaños	profesional SST
Natalia Isabel Martínez Campo	Coordinador
Jarkelys Ospino Gómez	Coordinador
Jesús David Polo Meza	Coordinador
Yazmin Dominguez Suarez	Coordinador
Juan Sebastián González	Asistente Administrativo
Augusto Angarita Joya	Residente
Camilo Andrés Macualo Pérez	Residente
Carlos Armando Oviedo Morales	Residente
Diana Olaya Castro	Residente
Eva Evans Pineda	Residente
francisco Alban	Residente
Hernán Rodrigo Aza Rodríguez	Residente
Huber Villareal Rubio	Residente
Iván Ochoa Barajas	Residente
Javier Mamian Vargas	Residente
Janner Murillo Riascos	Residente
John Leandro Hernández Parra	Residente
Juan Sebastián Bermeo Llanos	Residente
Lenin Lupercio Bohórquez Martínez	Residente
Kelin Yanida Marín ruiz	Residente
Plinio Rafael Gómez Archbold	Residente
Miguel Garzón Rojas	Residente
Miguel Ángel Tovar Perdomo	Residente
Ricardo Sarmiento Chaves	Residente
Rodrigo Alberto ascanio mantilla	Residente
Alejandro Torres Torres	Residente

Tabla 5 Personal de Interventoría

13. CONTROL DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES.

Para el seguimiento y control la interventoría informa que durante este periodo se presentó de ingreso de materiales en los establecimientos en ejecución.

14. ACTAS DE COMITÉ

Para el seguimiento y control de la interventoría se adjunta las actas de comité de los establecimientos en ejecución.

15. INFORMES QUINCENALES

Se realiza entrega de 2 informes quincenales los cuales informan el avance del contrato y el registro de actividades realizadas en los periodos del 1 al 15 de diciembre y del 16 al 31 de diciembre del 2025.

16. BITACORA DE OBRA

Para el seguimiento y control la interventoría se adjunta la bitácora de los establecimientos en ejecución.

17. ESTADO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO.

Pólizas Contrato de Obra

POLIZAS PRORROGA 1

Póliza No.	Fecha de Expedición	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
81880 Berkley internacional seguros Endoso 0	10/10/2024	CUMPLIMIENTO	1/10/2024	30/06/2025	$ 16.050.956.679,00
	10/10/2024	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	1/10/2024	30/06/2025	$ 16.050.956.679,00
	10/10/2024	PRESTACIONES SOCIALES	1/10/2024	30/06/2025	$ 5.350.318.893.00
	10/10/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	1/10/2024	31/12/2029	$ 16.050.956.679.00
	10/10/2024	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	$ 10.700.637.786,00
23731 Berkley internacional seguros Endoso 0	10/10/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1/10/2024	31/12/2024	$ 2.675.159.447,00

POLIZAS PRORROGA 2

Póliza No.	Fecha de Expedición	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
84880 Berkley internacional seguros Endoso 0	9/04/2025	CUMPLIMIENTO	28/11/2024	30/11/2025	$ 16.050.956.679,00
	9/04/2025	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	28/11/2024	30/11/2025	$ 16.050.956.679,00
	9/04/2025	PRESTACIONES SOCIALES	28/11/2024	30/08/2028	$ 5.350.318.893,00
	9/04/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2025	31/05/2025	$ 16.050.956.679,00
	9/04/2025	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/05/2025	31/05/2030	$ 10.700.637.786,00
23731 Berkley internacional seguros Endoso 0	10/10/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2024	31/05/2025	$ 2.675.159.447,00

Ilustración 7 Pólizas del Contrato de Obra

Pólizas Contrato de interventoría

CONSORCIO BETA REGIONALES			CONTRATO DE INTERVENTORIA USPEC-CTO-271-2024		
POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	0	7/11/2024	30/06/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	0	7/11/2024	31/12/2027	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	0	7/11/2024	31/12/2027	$ 778.940.802,70
POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO OTROSI 1					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	2	7/11/2024	30/06/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	2	7/11/2024	31/12/2027	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	2	31/12/2024	31/12/2029	$ 778.940.802,70
POLIZAS DEL ACTA DE INICIO					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	4	29/11/2024	22/07/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	4	29/11/2024	22/01/2029	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	4	22/01/2025	22/01/2030	$ 778.940.802,70
POLIZAS OTROSI 2					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	6	29/11/2024	22/07/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	6	29/11/2024	22/01/2029	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	6	22/01/2025	22/01/2030	$ 778.940.802,70

POLIZAS OTROSI 2					
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	7	29/11/2024	30/09/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	7	29/11/2024	31/03/2029	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	7	31/03/2025	22/01/2030	$ 778.940.802,70

POLIZAS OTROSI 2					
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	8	29/11/2024	30/09/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	8	29/11/2024	31/03/2029	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	8	31/03/2025	31/03/2030	$ 778.940.802,70

POLIZAS OTROSI 3					
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	9	29/11/2024	30/11/2025	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	9	29/11/2024	31/05/2029	$ 259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	9	31/03/2025	31/03/2030	$ 778.940.802,70

CONSORCIO BETA REGIONALES					CONTRATO DE INTERVENTORIA USPEC-CTO-271-2024
POLIZAS OTROSI 5					
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	13	29/11/2024	15/06/2026	$ 778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	13	29/11/2024	15/12/2028	$ 549.926.053,70
	CALIDAD DEL SERVICIO	13	15/12/2025	15/12/2030	$ 1.646.479.161,10

Tabla 6 Pólizas Contrato de interventoría

18. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Durante el periodo correspondiente al presente informe se resalta:

Se presenta un atraso significativo (-38.02%) en el avance general del proyecto, es decir se presenta un aumento del atraso con respecto al mes inmediatamente anterior.

Se entiende que en una pequeña parte de esta desviación está representada en situaciones ajenas al contratista, pero en la mayoría de los casos, es decir de un peso porcentual mayor, son por causas inherentes a la actividad del contratista como son:

- Establecimientos que iniciaron actividades, pero no se evidencia avance.
- La no entrega de diseños completos en la documentación respectiva requerida para aprobación por parte de la interventoría.
- Suspensión unilateral por manifestación expresa de falta de recursos.
- Poco personal en obra para la ejecución de actividades y en algunos casos ausencia total de personal operativo en el frente de obra.
- Falta de planeación en la compra de insumos, como también en la vinculación del personal para el proceso constructivo.
- Productos no conformes por la calidad de obra.

Y en otros no imputables al contratista de obra como son:

- Orden público en algunas zonas del país.
- Emergencia climática en el Valle del Cauca (COJAM-Jamundí)
- Entrega de algunos espacios a intervenir.
- Entrega de insumos técnicos por parte del INPEC

Es fundamental recordar que el cronograma de ejecución fue ajustado con el fin de contar con la aprobación de la prórroga 4 que va hasta el 15 de mayo de 2026 hecha por solicitud del contratista y cuenta tanto con aval de la interventoría como de la entidad contratante, motivo por el cual el incumplimiento de las actividades programadas constituye, podría poner en riesgo la entrega oportuna de los establecimientos penitenciarios incluidos en dicha prorroga.

Se evidencia a la fecha que no se va a poder cumplir con la entrega de todos los establecimientos dentro de la fecha contractual (15 de mayo de 2026, lo cual seguramente se requerirá una prorroga

Además, se han presentado observaciones a los informes mensuales ambientales y sst presentados por el contratista.

- Se han enviado solicitud de subsanaciones a los informes técnicos, ambientales y sst .
- Se le ha reiterado al contratista el cumplimiento de entrega de informes sst y ambiental al igual del cumplimiento de normas ambientales y de seguridad en algunos frentes de obra.

Se le ha recomendado a la entidad contratante tomar medidas drásticas, como la imposición de multas, por el reiterado incumplimiento a las obligaciones contractuales.

19. ANEXOS

A continuación, se enuncian los anexos del Informe enumerados de acuerdo con el capítulo referido:

- CARPETA 5 AVANCE GENERAL
- CARPETA 6 ACTIVIDADES EJECUTADAS
- CARPETA 7 – CORRESPONDENCIA
- CARPETA 9 – GESTION AMBIENTAL
- CARPETA 8- CONTROL DE FACTURACION INTERVENTORIA
- CARPETA 11 – INFORME DE HSE Y ANEXOS
- CARPETA 14 – ACTAS DE COMITE
- CARPETA 15 – INFORMES QUICENALES
- CARPETA 17 – DOCUMENTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS (Actas de suspensión y reinicio, Otro si y prorrogas).

PAULO CESAR SILVA MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BETA REGIONALES
