INFORME DEL CONTRATISTA NO. 02.

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA"

" CONTRATO N° 003-2026"

CONTRATANTE:
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE.

SUPERVISIÓN:
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE – MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.

CONTRATISTA:
INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES

INTERVENTORIA:
CORPORACIÓN CONSTRULET S.A.S

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 Descripción General del Proyecto: 5
2.2 Actividades Principales a realizar en contrato de obra: 5
2.3 El alcance técnico del proyecto comprende principalmente: 6
3 OBJETIVO DEL PROYECTO: 6
4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
RELACIÓN DE CÓDIGOS VIALES INTERVENIDOS ACTA 2 8
5. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 10
6. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 11
6.1 ACTA DE INICIO CONTRATISTA 11
6.2. OTROSI N°1 11
6.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS 12
6.4 ASPECTOS FINANCIEROS 14
7. ASPECTOS TÉCNICOS 15
7.1 EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 15
7.2 ALCANCE DEL PROYECTO 15
7.3. UBICACIÓN POR VEREDAS O TRAMOS DE VIAS: 16
8 EJECUCION DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO 21
8. CRONOGRAMA 24
10 CONTROL DE CALIDAD – VERIFICACIÓN DE DENSIDAD Y COMPACTACIÓN 25
10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DENSIDADES 26
10.2 REGISTRO FOTOGRAFICO RECOLECCION DE MUESTRAS PARA ENSAYO DE DENSIDADES. 28
11 DUDAS, PREGUNTAS Y CONCEPTOS DADOS POR LA ENTIDAD. 28
12 RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS 28
13 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 28

Tablas

Tabla 1 propuesta económica 5
Tabla 2 Cuadro resumen del contrato 10
Tabla 4 acta de inicio contrato 11
Tabla 4 control financiero acta 15
Tabla 6 Resumen de vías intervenidas 16
Tabla 7 Detalles de ejecución 24
Tabla 8 Diagrama de ejecución 25

Ilustraciones

Ilustración 1 Localización municipio de San Vicente 8
Ilustración 1 Localización de vías acta 2 intervenidas municipio de San Vicente 10
Ilustración 4 Alto del Indio – La Sonadora, ver ilustración correspondiente. 18
Ilustración 5 Chaparral Escuela – El Yolombo San Antonio, ver ilustración 19
Ilustración 6 Piedra Gorda – Peñólcito Escuela, ver ilustración correspondiente 21
Ilustración 9 Grafico de ensayos de densidades 27

LISTADO DE ANEXOS

1. ANEXO 1. CONTRATO
2. ANEXO 2. POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
3. ANEXO 3. POLIZA DE CUMPLIMIENTO
4. ANEXO 4. ACTA DE INICIO
5. ANEXO 5. PRESUPUESTO
6. ANEXO 6. TRAMITE ACTA 2
7. ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO TRABAJO CONTRATISTA
8. ANEXO 8. HOJAS DE VIDA EQUIPO TRABAJO CONTRATISTA
9. ANEXO 9. DENSIDADES SAN VICENTE FERRER
10. ANEXO 10. CANTERA LA ESMERALDA
11. ANEXO 11. AUTO CANTERA LA ESMERALDA

1. INTRODUCCIÓN

El propósito del presente informe es documentar de manera escrita y digital el seguimiento correspondiente al Informe de Avance de Obra No. 02 de la ejecución del Contrato de Obra No. 003 de 2026, permitiendo a la Empresa Autónoma de Guatapé contar con un registro detallado del estado de ejecución técnica, administrativa, financiera, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.

El contrato tiene como objeto la "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA", mediante la ejecución de actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones de las vías rurales intervenidas, contribuyendo al fortalecimiento de la movilidad, conectividad y desarrollo de las comunidades beneficiadas.

En el presente Informe de Avance de Obra No. 02 se consolidan las actividades ejecutadas durante el período reportado, el avance físico y financiero alcanzado, las verificaciones realizadas por la interventoría y las observaciones técnicas derivadas del seguimiento efectuado a las obras ejecutadas, conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas establecidas.

.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Descripción General del Proyecto:

El presente informe corresponde al segundo avance y cobro parcial de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. 003 de 2026, cuyo objeto es la "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA".
Durante el período reportado se ejecutaron actividades de adecuación y mejoramiento de la estructura de rodadura en diferentes tramos viales priorizados por la Secretaría de Planeación Municipal, las cuales fueron objeto de seguimiento y verificación por parte de la interventoría.
El presente informe consolida las cantidades de obra ejecutadas, el avance físico y financiero alcanzado y las actividades correspondientes al segundo cobro parcial del contrato, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales establecidas.

Tabla 1 propuesta económica

PROPUESTA ECONÓMICA	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA			INTERSERVICIOS GUARNE SAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de afirmado para vías terciarias. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1474,40	$ 224.218	$ 330.587.019
TOTAL, OBRA					**$ 330.587.019**
AU				**25%**	**$ 82.646.755**
TOTAL					**$ 413.233.774**
ADICION 1					**$ 205.383.688**
NUEVO TOTAL					**$ 618.617.462**

2.2 Actividades Principales a realizar en contrato de obra:

La actividad principal del contrato corresponde al mejoramiento de la capa de rodadura de las vías terciarias mediante la ejecución de las siguientes labores:

- **Suministro del material de afirmado**, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
- **Transporte del material** desde la fuente de abastecimiento hasta los tramos de vía a intervenir.
- **Colocación y extendido del material** sobre la superficie de la vía, garantizando una adecuada distribución.
- **Conformación de la capa de afirmado**, asegurando la geometría y sección transversal de la vía.
- **Compactación mecánica del material**, hasta alcanzar una densidad mínima del 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Estas actividades incluyen todas las operaciones, equipos, mano de obra y controles necesarios para su correcta ejecución, garantizando condiciones adecuadas de Operatividad de la vía, estabilidad y durabilidad de la vía intervenida.

2.3 El alcance técnico del proyecto comprende principalmente:

- Suministro, transporte y disposición de material de afirmado.
- Colocación, extendido y conformación del material en la vía.
- Compactación mecánica hasta alcanzar una densidad mínima del 95% respecto al ensayo Proctor modificado.
- Perfilado y mejoramiento de la superficie de rodadura.

Estas actividades se ejecutan en vías rurales identificadas mediante códigos viales específicos, entre las que se encuentran:

Chaparral – Santa Rita – El Coral
Magdalena – San José hasta caserío
San José – La Cejita
Alto de la Compañía – Compañía Abajo
Planes Ovejas – Guamito – Quebrada Pantanillo

3 OBJETIVO DEL PROYECTO:

Durante el periodo correspondiente al segundo informe de ejecución,

se continuó con las actividades de mejoramiento de vías terciarias en el municipio de San Vicente Ferrer – Antioquia, con el fin de mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de las comunidades rurales.

Las actividades se desarrollaron bajo criterios técnicos de calidad, realizando controles de humedad y densidad del material, así como verificaciones mediante ensayos de campo y laboratorio, garantizando el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de San Vicente Ferrer, ubicado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, el cual hace parte de la Provincia de Agua, Bosques y Turismo. El municipio limita al norte con Barbosa y Concepción, al oriente con Concepción y El Peñol, al sur con Marinilla y Rionegro, y al occidente con Guarne y Girardota.

Las intervenciones objeto del contrato se localizan específicamente en la red vial terciaria del municipio, en zonas rurales correspondientes a diferentes veredas previamente priorizadas por la Secretaría de Planeación Municipal, en función de sus condiciones de accesibilidad y nivel de afectación.



Ilustración 1 Localización municipio de San Vicente

Fuente: *Secretaría de Planeación*

Los tramos viales intervenidos se identifican mediante los siguientes códigos y denominaciones:

RELACIÓN DE CÓDIGOS VIALES INTERVENIDOS ACTA 2

Las siguientes vías corresponden a los tramos priorizados dentro del contrato "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA".

ÍTEM	CÓDIGO VIAL	NOMBRE DE LA VÍA	DESCRIPCIÓN
1	**05674VT02**	Chaparral Escuela hasta El Yolombo San Antonio	Tramo vial rural que conecta el sector de Chaparral con el sector San Antonio, facilitando la movilidad de las comunidades rurales y el transporte de productos agrícolas.

1. 2	**2. 05674VT09**	3. Piedra Gorda hasta Peñolcito Escuela	4. Vía terciaria ubicada entre los sectores Piedra Gorda y Peñolcito Escuela, utilizada para la conectividad rural y el acceso de la comunidad estudiantil.
3	**05674VT51**	Alto del Indio – La Sonadora	Tramo vial rural que comunica los sectores Alto del Indio y La Sonadora, permitiendo el acceso a predios productivos y viviendas rurales.

Las vías anteriormente relacionadas hacen parte de la red vial terciaria del municipio de San Vicente Ferrer – Antioquia y fueron priorizadas para intervención debido a las condiciones actuales de deterioro de la estructura vial.



Ilustración 2 Localización de vías acta 2 intervenidas municipio de San Vicente

Estas vías corresponden a corredores rurales de carácter estratégico, utilizados principalmente para la movilidad de la población, el transporte de productos agrícolas y la conexión entre veredas y centros poblados.

Debido a su ubicación en zonas de topografía variable y a la incidencia de condiciones climáticas propias de la región (altos niveles de precipitación), estos tramos presentan deterioro en su superficie de rodadura, lo cual justifica la intervención mediante actividades de mejoramiento con material de afirmado.

5. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Cuadro resumen del contrato

Contratista:	INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE S.A.S. con NIT 901.279.384-1
Objeto:	**" EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA**
Valor del contrato:	*$ 413.233.774*
Plazo de ejecución:	**CUATRO (4) MESES** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de inicio:	*29 de enero de 2026*
Fecha de finalización:	*29 de mayo de 2026.*
Prórroga 1	*29 de julio de 2026*
Adición 1	*$205.383.688*

6. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 ACTA DE INICIO CONTRATISTA

Tabla 3 acta de inicio contrato

EAG Empresa Autónoma de Guatapé	ACTA DE INICIO	Código: RE.SGJ.004 Versión: 00 Fecha: 29.11.2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: contratación directa					
Contrato número:	003	de	2026		
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA"					
Supervisor:	**JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO**				
Contratista:	INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE S.A.S.				
Valor del contrato:	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC ($413.233.774)				
Duración del contrato:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE **CUATRO (4) MESES** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha:	29	de	01	de	2026

6.2. OTROSI N°1


EAG Empresa Autónoma de Guatapé	OTROSÍ PRORROGA	Código: RE.SGJ.031 Versión: 00 Fecha: 29.11.2024

OTROSI N° 001
CD-003-2026

CONTRATANTE:	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
CONTRATISTA:	INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE S.A.S.
C.C-NIT:	901.279.384-1
OBJETO:	"EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA"
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC ($413.233.774)
DURACIÓN INICIAL:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE **CUATRO (4) MESES** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACION No 1	DOS (2) MESES
PLAZO DESPUES DE LA AMPLIACION No 1:	HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE JULIO DEL 2026
ADICION 1:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($205.383.688)

Entre los suscritos a saber, De una parte JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO, mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.037.236.681, quien actúa en calidad de Gerente encargado y representante Legal de la Empresa Autónoma de Guatapé, entidad derecho público con NIT 800105497-0, tal y como consta en el Decreto de nombramiento N°070 del 18 de noviembre de 2025, facultado para adquirir obligaciones y ejercer derechos en nombre de la Empresa tal como se prescribe en los Estatutos de la misma y que para los efectos del presente acto se denominará **"LA ENTIDAD CONTRATANTE"**

6.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS

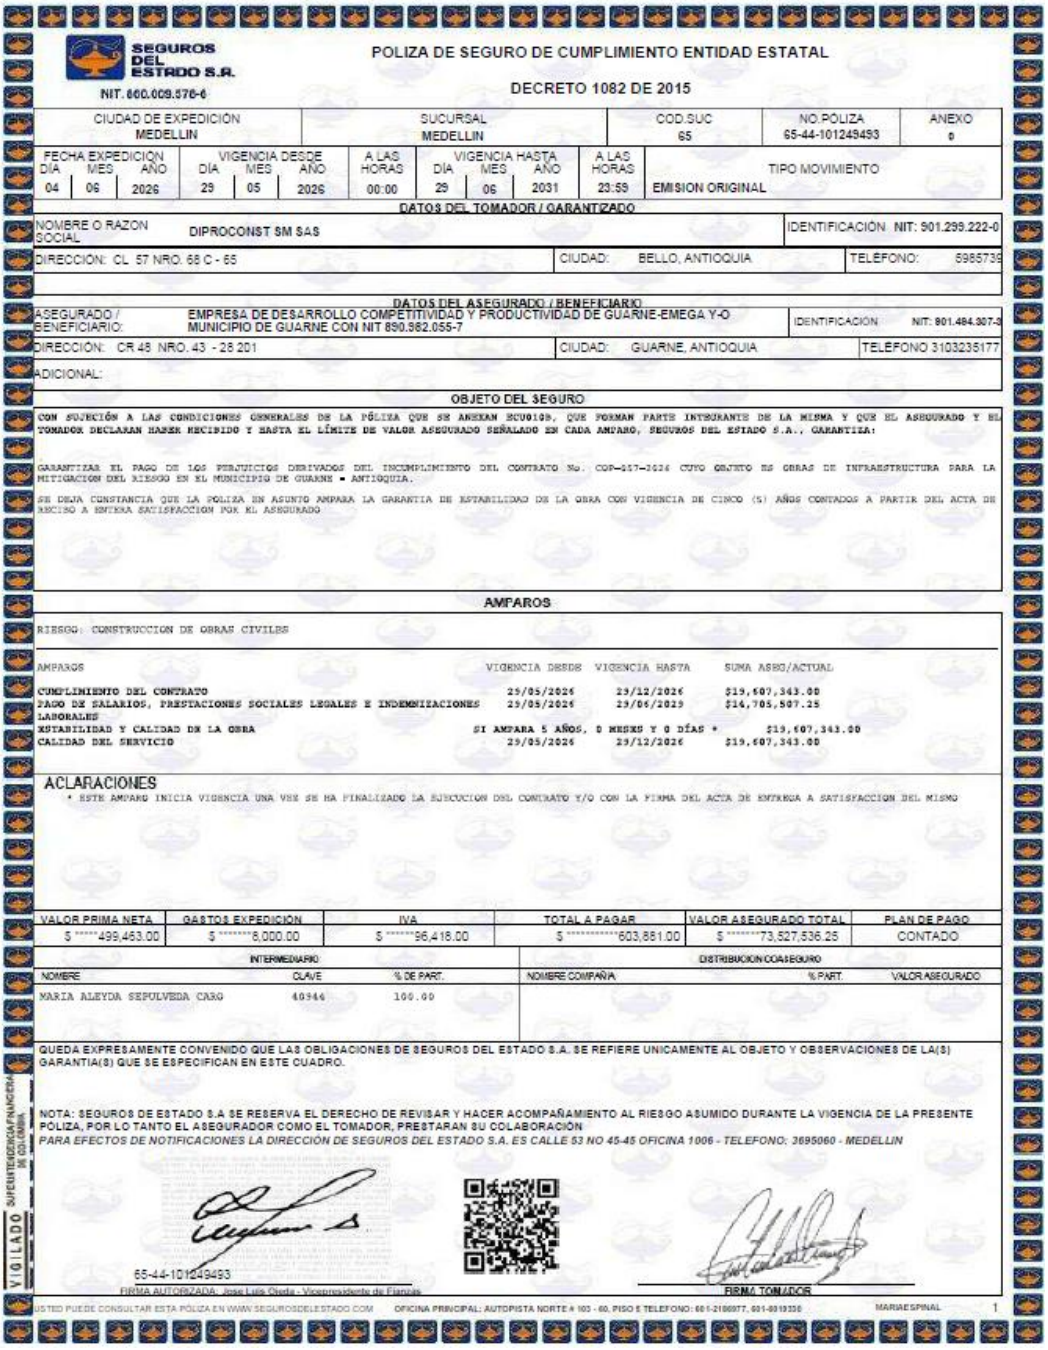

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101249493	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	06	2026	29	05	2026	00:00	29	06	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DIPROCONST SM SAS	NIT: 901.299.222-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 57 NRO. 68 C - 65	BELLO, ANTIOQUIA	5985739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACION
EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE-EMEGA Y-O MUNICIPIO DE GUARNE CON NIT 890.982.055-7	NIT: 901.484.307-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO
CR 48 NRO. 43 - 28 201	GUARNE, ANTIOQUIA	3103235177

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIGB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. COP-017-2026 CUYO OBJETO ES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2026	29/12/2026	$19,607,343.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/05/2026	29/06/2029	$14,705,507.25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$19,607,343.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2026	29/12/2026	$19,607,343.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******499,463.00	$ ******8,000.00	$ ******96,416.00	$ *********603,881.00	$ *******73,527,536.25	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA ALEYDA SEPULVEDA CARO	40946	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN


65-44-101249493

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2100977, 601-6010330 MARIAESPINAL 1

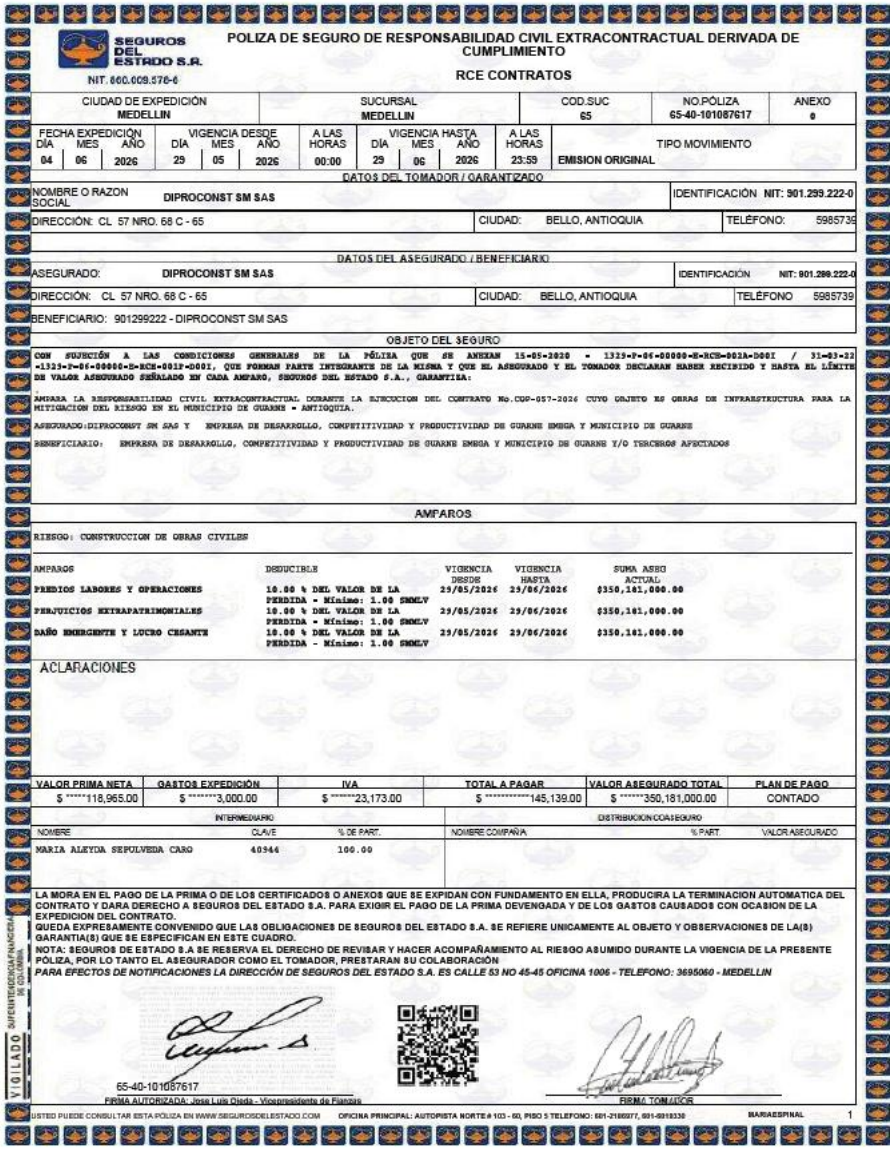

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101087617	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	06	2026	29	05	2026	00:00	29	06	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIPROCONST SM SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.299.222-0

DIRECCIÓN: CL 57 NRO. 68 C - 65 — CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 5985739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DIPROCONST SM SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.299.222-0

DIRECCIÓN: CL 57 NRO. 68 C - 65 — CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 5985739

BENEFICIARIO: 901299222 - DIPROCONST SM SAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1323-7-06-00000-B-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.COP-057-2026 CUYO OBJETO ES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA.

ASEGURADO:DIPROCONST SM SAS Y EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE EMDGA Y MUNICIPIO DE GUARNE

BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE EMDGA Y MUNICIPIO DE GUARNE Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/05/2026	29/06/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/05/2026	29/06/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/05/2026	29/06/2026	$350,181,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****118,965.00	$ *****3,000.00	$ *****23,173.00	$ **********145,139.00	$ *****350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEYDA SEPULVEDA CARO	40344	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101087617
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planzas
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2160377, 601-5018330 BARRAESPINAL 1

6.4 ASPECTOS FINANCIEROS

CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

El contratista de obra tramito ACTA 1 VALOR $ 336.327.000 OK
El contratista de obra tramitara ACTA 2 VALOR $ 75,673,575. EN PROCESO

Tabla 4 control financiero acta

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	AIU (25%)	VALOR TOTAL
ACTA 1	1.200 m³	$269.061.600	$67.265.400	$336.327.000
ACTA 2	270 m³	$56.755.181	$ 18.918.394	$75.673.575
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.470 m³	$334.309.038	$83.577.260	$ 412.000.575

Durante el período correspondiente al segundo informe de avance y cobro del Contrato de Obra No. 003 de 2026, se ejecutaron actividades orientadas al mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de San Vicente Ferrer – Antioquia, mediante el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de material de afirmado.

La interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero a las actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas contractualmente, especialmente en lo relacionado con los procesos de compactación, control de humedad y densidad del material granular utilizado en obra.

Como resultado de las actividades ejecutadas, se alcanzó un volumen acumulado de 1.491 m³ de afirmado, correspondiente a un valor total ejecutado de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($412.000.575), incluyendo costos directos y AIU contractual.

El avance alcanzado evidencia cumplimiento satisfactorio de las metas programadas para el período reportado, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad y conectividad de las comunidades rurales beneficiadas por el proyecto.

7. ASPECTOS TÉCNICOS

7.1 EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Profesional Residente de obra ALEXANDER ALBERTO ROJAS REYES

7.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Se detalla el alcance del proyecto

ACTIVIDADES PRINCIPALES A EJECUTAR EN EL CONTRATO

Se actualiza la priorización de vías rurales del municipio de San Vicente Ferrer – Antioquia, incorporando los corredores viales código 05674VT09 Piedra Gorda – Peñólcito Escuela, con una longitud aproximada de 4,615 km, ubicado en el sector noroccidental del municipio y conectando las veredas Piedra Gorda, La Cabaña y Peñólcito; código 05674VT02 Chaparral Escuela – El Yolombo San Antonio, con una longitud aproximada de 2,659 km, localizado en el sector oriental y articulando las veredas Chaparral, El Yolombo y San Antonio; y código 05674VT51 Alto del Indio – La Sonadora, con una longitud aproximada de 3,110 km, ubicado en la zona suroriental del municipio, comunicando los sectores Alto del Indio, La Travesía y La Sonadora. En conjunto, estas vías suman aproximadamente 10,38 km de corredores rurales estratégicos que permiten la conectividad entre comunidades, centros educativos, zonas productivas y corredores principales del municipio. Las intervenciones contemplan actividades de mejoramiento y mantenimiento vial, incluyendo conformación de banca, afirmado, limpieza y conformación de cunetas, manejo de aguas superficiales y atención de puntos críticos, con el propósito de mejorar la transitabilidad, reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de productos agrícolas y fortalecer la seguridad vial y el acceso de las comunidades rurales a servicios básicos y equipamientos comunitarios.

7.3. UBICACIÓN POR VEREDAS O TRAMOS DE VIAS:

Tabla 5 Resumen de vías intervenidas

Código vía	Nombre vía	Longitud total (Km)	Longitud intervenida (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Inicio	Termina	Volumen (m³)
05674VT09	Piedra Gorda – Peñólcito Escuela	4,615	175	4,00	0,10	K0+000	K0+500	70

05674VT02	Chaparral Escuela – El Yolombo San Antonio	2,659	100	4,00	0,10	K1+200	K1+600	40
05674VT51	Alto del Indio – La Sonadora	3,110	400	4,00	0,10	K2+000	K2+500	160
	TOTAL		**1.400**					**210**

Tramo 1: Código 05674VT51

Vía: Alto del Indio – La Sonadora, ver ilustración correspondiente.

En desarrollo de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de San Vicente Ferrer, se ejecutó la intervención del tramo comprendido entre las abscisas K2+000 y K2+500, correspondiente a una longitud efectiva de 500 m. La localización del tramo fue previamente verificada mediante reconocimiento en campo y apoyo cartográfico, identificando sectores con afectaciones asociadas a pérdida de material de afirmado, deformaciones superficiales, deficiencias de drenaje y deterioro de la capacidad de rodadura, especialmente en zonas de pendiente y escorrentía superficial.

La vía se encuentra ubicada en el sector rural que comunica Alto del Indio con La Sonadora, en una zona de topografía montañosa y tránsito asociado principalmente a actividades agrícolas y movilidad de las comunidades rurales. Debido a las condiciones geométricas y de drenaje observadas, se priorizó la intervención de los puntos con mayor afectación estructural y funcional.

La intervención contempló la conformación, extensión y compactación de una capa de afirmado granular, con un ancho promedio de 4,00 m, acorde con la sección típica existente de la vía y las condiciones de confinamiento lateral presentes en el corredor vial. El espesor de la capa fue de 0,10 m, definido con base en las condiciones de la subrasante y el nivel de deterioro evidenciado durante la inspección técnica.

El volumen total ejecutado fue de aproximadamente 160 m³ de material granular, cuantificado mediante control de suministro, extendido y compactación en sitio, garantizando el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad vial y conectividad para las comunidades

beneficiadas.

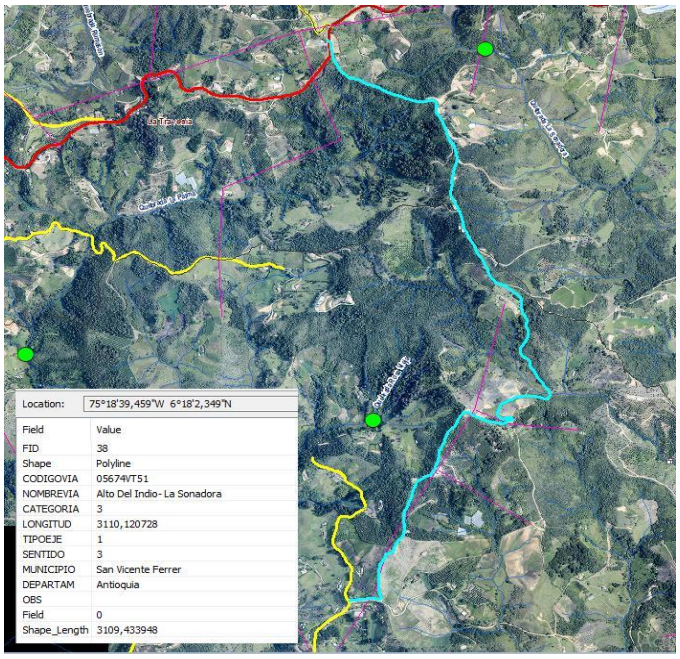


Ilustración 3 ***Alto del Indio – La Sonadora, ver ilustración correspondiente.***

Tramo: Código 05674VT02

Vía: Chaparral Escuela – El Yolombo San Antonio, ver ilustración

En desarrollo de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de San Vicente Ferrer, se ejecutó la intervención del tramo comprendido entre las abscisas K1+200 y K1+600, correspondiente a una longitud efectiva de 400 m. La localización del tramo fue previamente verificada mediante reconocimiento en campo y apoyo cartográfico, identificando sectores con afectaciones asociadas a pérdida de material granular, presencia de huellas longitudinales, erosión superficial y deficiencias en el drenaje lateral, condiciones que afectaban la circulación y seguridad de la vía.

La vía se encuentra ubicada en el sector rural que comunica las veredas Chaparral, El Yolombo y San Antonio, constituyéndose en un corredor estratégico para la movilidad de las comunidades rurales, el transporte de productos agrícolas y el acceso a centros poblados y equipamientos comunitarios. Debido a las condiciones topográficas y al tránsito permanente de vehículos livianos y de carga, se priorizó la intervención de los sectores con mayor deterioro superficial y pérdida de capacidad estructural.

La intervención contempló la conformación, extensión y compactación de una capa de afirmado granular, con un ancho promedio de 4,00 m, acorde con la sección transversal existente de la vía y las condiciones de confinamiento lateral presentes en el corredor vial. El espesor de la capa fue de 0,10 m, definido con base en las condiciones observadas de la subrasante y el nivel de deterioro evidenciado durante la inspección técnica.

El volumen total ejecutado fue de aproximadamente 40 m³ de material granular, cuantificado mediante control de suministro, extendido y compactación en sitio, permitiendo mejorar las condiciones, seguridad vial y conectividad de las comunidades beneficiadas.

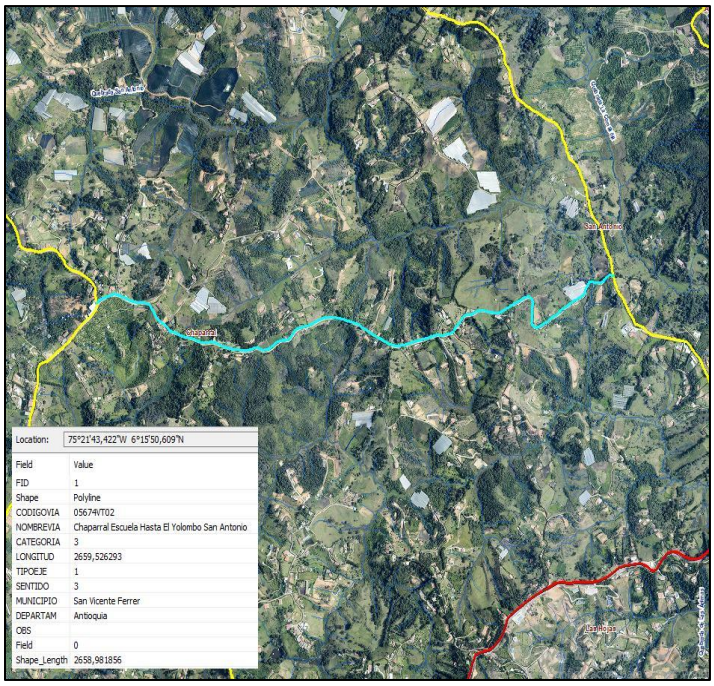


Ilustración 4 Chaparral Escuela – El Yolombo San Antonio, ver ilustración

Tramo: Código 05674VT09

Vía: Piedra Gorda – Peñólcito Escuela, ver ilustración correspondiente.

En desarrollo de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de San Vicente Ferrer, se ejecutó la intervención del tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+500, correspondiente a una longitud efectiva de 500 m. La localización del tramo fue previamente verificada mediante reconocimiento en campo y apoyo

cartográfico, identificando sectores con afectaciones asociadas a pérdida de material de afirmado, presencia de erosión superficial, deformaciones longitudinales y deficiencias en el manejo de aguas lluvias, condiciones que afectaban la accesibilidad y estabilidad de la vía.

La vía se encuentra ubicada en el sector rural que comunica las veredas Piedra Gorda, La Cabaña y Peñólcito Escuela, constituyéndose en un corredor estratégico para la movilidad de las comunidades rurales, el acceso a instituciones educativas y el transporte de productos agrícolas. Debido a las condiciones topográficas y al tránsito constante de vehículos y maquinaria agrícola, se priorizó la intervención de los sectores con mayor deterioro superficial y pérdida de capacidad estructural.

La intervención contempló la conformación, extensión y compactación de una capa de afirmado granular, con un ancho promedio de 4,00 m, acorde con la sección transversal existente de la vía y las condiciones de confinamiento lateral presentes en el corredor vial. El espesor de la capa fue de 0,10 m, definido con base en las condiciones observadas de la subrasante y el nivel de deterioro evidenciado durante la inspección técnica.

El volumen total ejecutado fue de aproximadamente 70 m³ de material granular, cuantificado mediante control de suministro, extendido y compactación en sitio, permitiendo mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y conectividad de las comunidades beneficiadas.

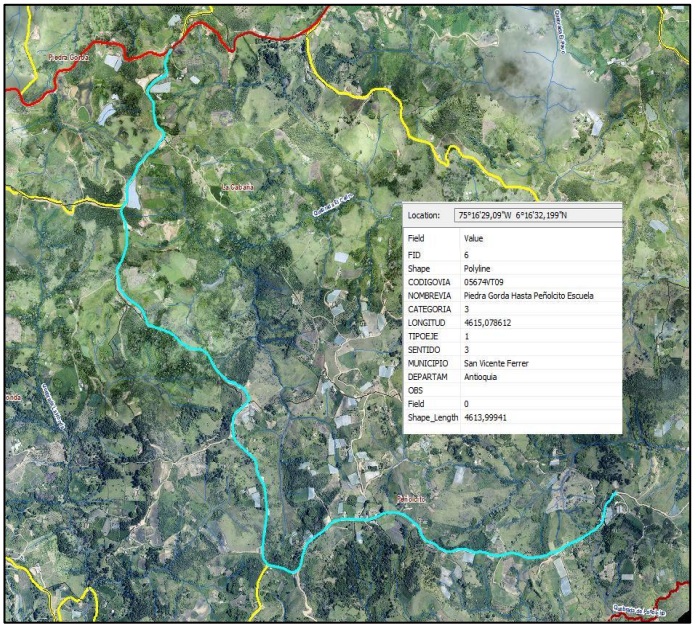



Ilustración 5 Piedra Gorda – Peñólcito Escuela, ver ilustración correspondiente

8 EJECUCION DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITAS A LOS FRENTES A INTERVENIR. A continuación, informamos las visitas realizadas desde el inicio del contrato y actividades realizadas en el primer y segundo mes de ejecución.






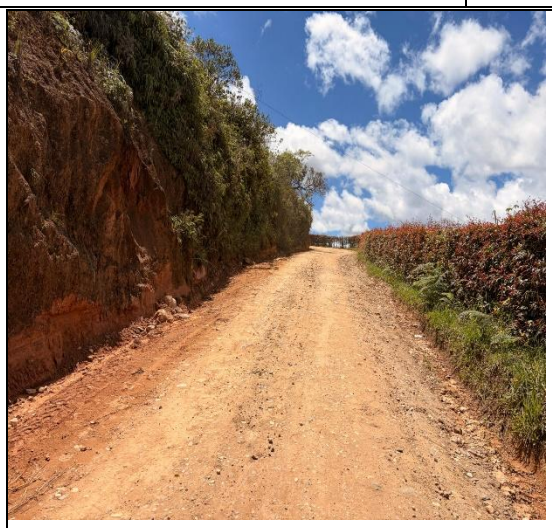





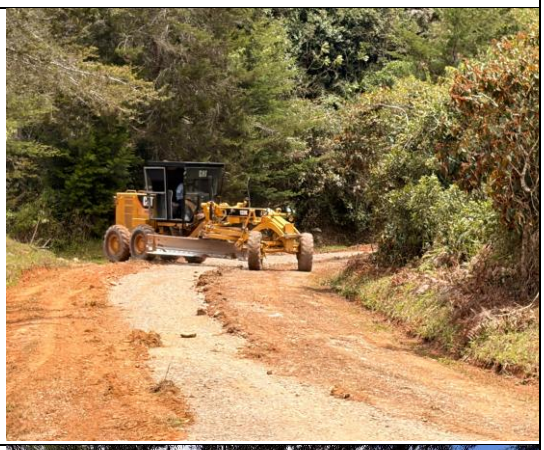
















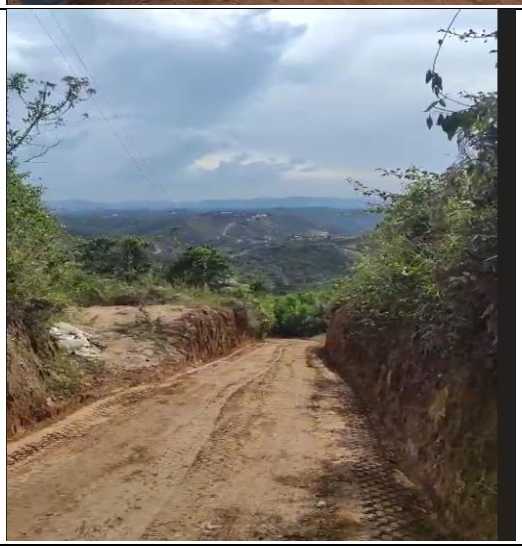





8. CRONOGRAMA

Tabla 6 Detalles de ejecución

PROGRAMADO A FECHA DE ACTA	$ 413.233.774			
EJECUTADO ACTA	$ 412.000.575	99.70%		
ATRASO	0.30%			
	FEBRERO	PROGRAMADO	$ 90.000.000	
		EJECUTADO	$ 90.000.000	
	MARZO	PROGRAMADO	$ 210.000.000	
		EJECUTADO	$ 210.000.000	
	ABRIL	PROGRAMADO	$ 350.000.000	
		EJECUTADO	$ 350.000.000	
	MAYO	PROGRAMADO	$ 413.233.774	
		EJECUTADO	$ 412.000.575	

En conclusión, en el tiempo transcurrido entre 29 de enero hasta 20 de mayo de 2026, se ha ejecutado un aproximado a un 99.70% del valor del contrato, vemos que se tiene un atraso de 0.30 % no significativo y que se terminara el contrato para 29 de MAYO de 2026.

Tabla 7 Diagrama de ejecución

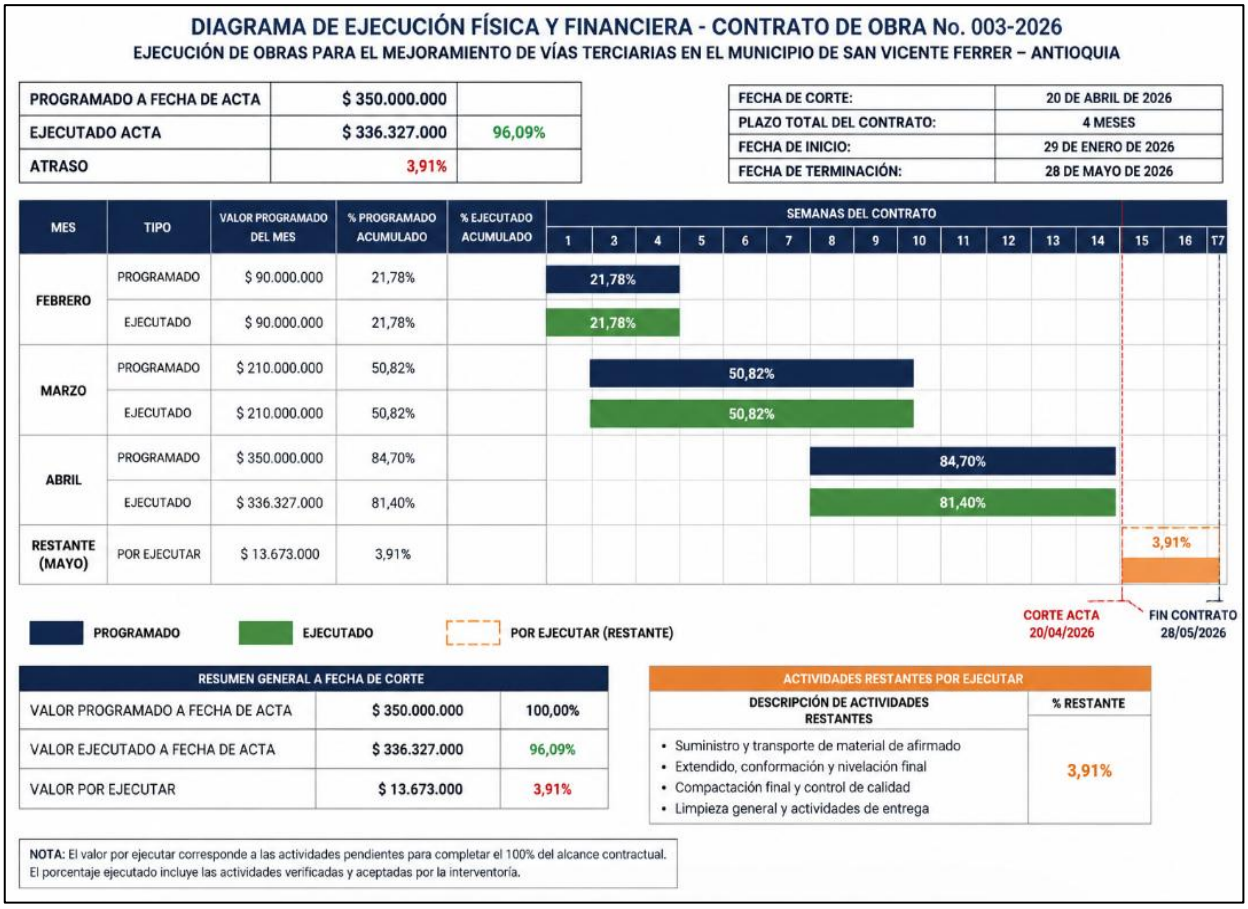


DIAGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - CONTRATO DE OBRA No. 003-2026

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA

PROGRAMADO A FECHA DE ACTA	$ 350.000.000	
EJECUTADO ACTA	$ 336.327.000	96,09%
ATRASO	3,91%	

FECHA DE CORTE:	20 DE ABRIL DE 2026
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE MAYO DE 2026

MES	TIPO	VALOR PROGRAMADO DEL MES	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
FEBRERO	PROGRAMADO	$ 90.000.000	21,78%	
	EJECUTADO	$ 90.000.000	21,78%	
MARZO	PROGRAMADO	$ 210.000.000	50,82%	
	EJECUTADO	$ 210.000.000	50,82%	
ABRIL	PROGRAMADO	$ 350.000.000	84,70%	
	EJECUTADO	$ 336.327.000	81,40%	
RESTANTE (MAYO)	POR EJECUTAR	$ 13.673.000	3,91%	

SEMANAS DEL CONTRATO: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T7

21,78% · 21,78% · 50,82% · 50,82% · 84,70% · 81,40% · 3,91%

CORTE ACTA 20/04/2026 · FIN CONTRATO 28/05/2026

PROGRAMADO · EJECUTADO · POR EJECUTAR (RESTANTE)

RESUMEN GENERAL A FECHA DE CORTE		
VALOR PROGRAMADO A FECHA DE ACTA	$ 350.000.000	100,00%
VALOR EJECUTADO A FECHA DE ACTA	$ 336.327.000	96,09%
VALOR POR EJECUTAR	$ 13.673.000	3,91%

ACTIVIDADES RESTANTES POR EJECUTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTANTES	% RESTANTE
• Suministro y transporte de material de afirmado • Extendido, conformación y nivelación final • Compactación final y control de calidad • Limpieza general y actividades de entrega	3,91%

NOTA: El valor por ejecutar corresponde a las actividades pendientes para completar el 100% del alcance contractual. El porcentaje ejecutado incluye las actividades verificadas y aceptadas por la interventoría.

10 CONTROL DE CALIDAD – VERIFICACIÓN DE DENSIDAD Y COMPACTACIÓN

Como parte del soporte técnico de las cantidades ejecutadas en los tramos intervenidos, se realizó la comprobación del estado de compactación del material de afirmado colocado, con el fin de validar que la capa construida cumple con las condiciones requeridas para su estabilidad y permanencia en servicio.

Las mediciones se efectuaron el 06 de mayo de 2026, directamente sobre los sectores intervenidos, tomando puntos representativos de las zonas donde se ejecutó el extendido y conformación del material. Para la verificación se empleó el

método de cono y arena en campo, complementado con el análisis de humedad del material y la comparación frente a la densidad de referencia obtenida mediante ensayo Proctor modificado.

Durante la evaluación se evidenció que el material fue trabajado bajo condiciones de humedad que oscilaron entre 6,1% y 6,6%, rango que permitió su adecuada acomodación durante el proceso de compactación. La densidad seca máxima utilizada como referencia se encontró entre 22,44 y 22,55 kN/m³, lo que permitió establecer un criterio claro de comparación para los resultados obtenidos en sitio.

Los valores medidos en campo muestran que la compactación alcanzada se mantiene dentro de un rango general entre 95% y 100%, con una concentración predominante de resultados cercanos al 96% – 99%, lo cual refleja un comportamiento consistente en los diferentes puntos evaluados. Los registros que superan el 100% corresponden a condiciones particulares de confinamiento y respuesta del material durante la aplicación de energía de compactación.

Con base en lo anterior, se puede establecer que el material colocado en los tramos intervenidos presenta un nivel de compactación adecuado frente a la referencia adoptada, lo cual respalda técnicamente las actividades reportadas en la presente acta. Estos resultados son coherentes con los volúmenes ejecutados y evidencian que la capa conformada cuenta con condiciones suficientes para su desempeño dentro de la estructura de la vía.

10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DENSIDADES

En desarrollo de las actividades de mejoramiento vial, se efectuó el control de calidad del material de afirmado mediante ensayos de densidad in situ por el método del cono y arena, complementados con determinación de humedad y correlacionados con el ensayo Proctor Modificado, conforme a las normas INV E-161-13, INV E-150-13 e INV E-142-13. Según el informe de laboratorio fechado el 24 de marzo de 2026, se establecieron como parámetros de referencia densidades secas máximas entre 22,44 y 22,58 kN/m³ y humedades óptimas entre 6,1% y 6,6%.

Los resultados obtenidos en campo evidencian porcentajes de compactación comprendidos entre 95% y 100%, con un promedio global aproximado de 97,9%, lo que confirma el cumplimiento integral del criterio técnico exigido (≥95%). A nivel de comportamiento por sectores, se identifica una tendencia uniforme en la respuesta del material, destacándose el tramo Piedra Gorda- Peñolcito Escuela con el mayor nivel de compactación promedio (≈100%), seguido de los demás tramos con valores entre 96% y 99,3%, lo cual indica consistencia en el proceso constructivo y en la aplicación de la energía de compactación.

Desde el punto de vista geotécnico, las densidades secas de campo registradas (entre 2,00 y 2,40 g/cm³) reflejan un adecuado reacomodo de partículas y un buen nivel de interbloqueo granular, favoreciendo la capacidad portante de la estructura. La variación en los contenidos de humedad (4,6% a 8,9%) muestra que, aunque en algunos puntos se superó ligeramente la humedad óptima, no se generaron pérdidas significativas en la eficiencia de compactación, manteniéndose los valores dentro de rangos aceptables.

Es importante resaltar que los valores de compactación superiores al 100% no representan inconsistencias, sino que corresponden a condiciones de campo donde la energía aplicada, sumada a características particulares del material (gradación y contenido de finos), permite alcanzar densidades mayores a las obtenidas en laboratorio bajo condiciones controladas. Este comportamiento es indicativo de un proceso constructivo eficiente y bien ejecutado.

A continuación, se presenta la gráfica de elaboración propia que resume el comportamiento promedio de compactación por tramo y ensayo realizado en los tramos:

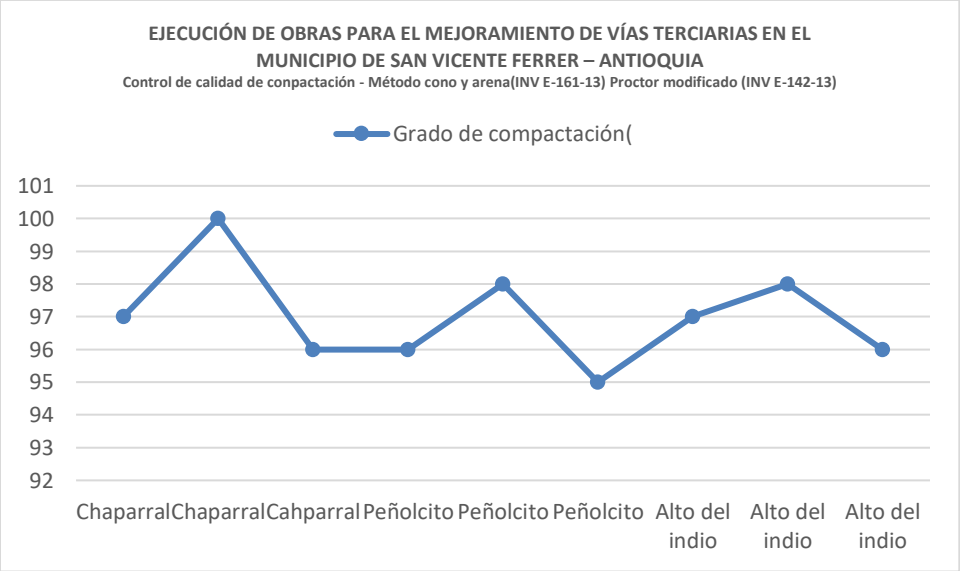


Ilustración 6 Grafico de ensayos de densidades

10.2 REGISTRO FOTOGRAFICO RECOLECCION DE MUESTRAS PARA ENSAYO DE DENSIDADES.





11 DUDAS, PREGUNTAS Y CONCEPTOS DADOS POR LA ENTIDAD.

Durante este periodo de ejecución no se han presentado dudas, todo se ha resuelto por las juntas de acción comunales, ASOCOMUNAL, secretario de Planeación y el alcalde Municipal.

12 RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

En el momento no se han encontrado actividades no previstas, tampoco cantidades mayores o menores.

13 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Se anexa seguridad social del mes de mayo 2026 ver anexo 7.
Certificados de parafiscales ver anexo

Firma

Alexander Alberto Rojas Reyes
Ingeniero Residente de obra.

ANEXOS

Municipio de SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA	MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA	PRESUPUESTO GENERAL

MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro, transporte, colocacion, conformacio y compactacion de afirmado para vias terciarias. Compactacion hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	1200,00	$ 224.218	$ 269.061.600
TOTAL OBRA					**$ 269.061.600**
AU				**25%**	**$ 67.265.400**
TOTAL					**$ 336.327.000**
AMORTIZACION PRIMER PAGO				**20%**	**$ 82.646.755**
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 253.680.245**

Alexander Alberto Rojas
RESIDENTE OBRA

Mabel Cristina Usuga
RESIDENTE DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

Elkin Alexandeer Hurtado Gomez
Secretrio de Planeacion
SUPERVISIÓN MUNICIPIO

Juan Diego Martinez Quintero
SUPERVISIÓN AUTONOMA GUATAPE

INTERVENTORIAS SERVICIOS INTEGRALES CONSTRUCCIONES GUARNE SAS
NIT 901.279.384-1
CRA 50 5174
Tel: (604) 3176789376
Guarne - Colombia
interserviciosguarnesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IC 18

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 8610555
Dirección	CL 31 30 53	**Ciudad**	Guatape - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2026, 09:29
Expedición	16/06/2026, 09:29
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO PARA VÍAS TERCIARIAS. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	75,673,575.00	0 %	0 %	75,673,575.00	75,673,575.00	0.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	75,673,575.00
Total a Pagar	75,673,575.00

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones seiscientos setenta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 75,673,575.00

Observaciones:
CONTRATO: CONTRATACIÓN DIRECTA CD003-2026 "EJECUCIÓN DE OBRAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA" (ACTA #2)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095337360 aprobado en 20250708 prefijo IC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 16209dbb4513f6fdecc6c9939c5175d000c48abfdd46589eaad708f7304db9ea4b72fefbc77330a6fa38ef77e2b9d8c9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6020380721**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		323325810	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	16	$ 4.945.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.945.000	$ 0	$ 4.945.000
230201	230201- PROTECCION	29	$ 8.290.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.290.700	$ 0	$ 8.290.700
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 992.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 992.100	$ 0	$ 992.100
230301	230301-PORVENIR	27	$ 7.999.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.999.400	$ 0	$ 7.999.400
SUBTOTALES:										**$ 22.227.200**	**$ 0**	**$ 22.227.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 926.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 926.600	$ 0	$ 0	$ 926.600
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.000	$ 0	$ 0	$ 257.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 122.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	28		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.053.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.053.200	$ 0	$ 0	$ 2.053.200
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 451.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.000	$ 0	$ 0	$ 451.000
EPS041	NUEVA EPS CM	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 593.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.800	$ 0	$ 0	$ 593.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 989.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 989.800	$ 0	$ 0	$ 989.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 74.500
SUBTOTALES:													**$ 5.468.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.468.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	76		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.161.000	$ 7.161.000	$ 0	$ 0	$ 7.161.000
SUBTOTALES:									**$ 7.161.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.161.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	76	$ 5.446.700	$ 0	$ 5.446.700
SUBTOTALES:			**$ 5.446.700**	**$ 0**	**$ 5.446.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000295129	LOPEZ RIVAS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										19-22							230201-PROTECCION	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 0	4	$ 233.454	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000295129	LOPEZ RIVAS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18	30							29-29								230201-PROTECCION	9	$ 555.129	$ 88.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 88.900	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 555.129	$ 22.300	$ 0	$ 22.300	14-11 - ARL SURA	9	$ 555.129	1	$ 38.700	9	$ 555.129	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 22.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000899047	LAMAR URRUTIA ERIK DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230201-PROTECCION	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726	1	$ 52.900	13	$ 758.726	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1001477731	FRANCO VALENCIA DAVIRSON MATEO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1002276422	MORENO SANTOYA HAROLD ANDRES	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI														01-15			230201-PROTECCION	15	$ 1.437.126	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.000	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 1.437.126	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.437.126	2	$ 0	15	$ 1.437.126	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1002276422	MORENO SANTOYA HAROLD ANDRES	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	15	$ 1.437.126	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.000	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 1.437.126	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.437.126	2	$ 62.600	15	$ 1.437.126	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1002476545	JULIO ALVAREZ WILSON ANDRES	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.778.444	$ 444.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 444.600	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.778.444	$ 111.200	$ 0	$ 111.200	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.778.444	2	$ 120.900	29	$ 2.778.444	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6020380721**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			323325810

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1002476545	JULIO ALVAREZ WILSON ANDRES	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									01-01								230301-PORVENIR	1	$ 95.809	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 95.809	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 95.809		$ 0	1	$ 95.809	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1003456693	POLO MUSLACO VICENTE JOSE	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	26	$ 2.491.019	$ 398.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 398.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	26	$ 2.491.019	$ 99.700	$ 0	$ 99.700	14-11 - ARL SURA	26	$ 2.491.019	2	$ 108.400	26	$ 2.491.019	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 99.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1003456693	POLO MUSLACO VICENTE JOSE	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									01-04								230201-PROTECCION	4	$ 383.234	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	$ 383.234	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	4	$ 383.234		$ 0	4	$ 383.234	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1003458174	NARANJO NARANJO GEOVANI DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230201-PROTECCION	30	$ 2.121.481	$ 339.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 339.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.121.481	$ 84.900	$ 0	$ 84.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.121.481	2	$ 92.300	30	$ 2.121.481	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1003458924	MUSLACO SAEZ HEIDER DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-15-15			231001-COLFONDOS	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	2	$ 0	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1003458924	MUSLACO SAEZ HEIDER DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								231001-COLFONDOS	29	$ 2.097.936	$ 335.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.700	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.097.936	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.097.936	2	$ 91.300	29	$ 2.097.936	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1003459002	MURLACO POLO ELIAS JOSE	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1003589029	ORTIZ MENDOZA YAN CARLOS	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1005065829	BAUTISTA VERA RAMON EDUARDO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI												08-09					230201-PROTECCION	2	$ 191.617	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.700	NUEVA EPS CM	2	$ 191.617	$ 7.700	$ 0	$ 7.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 191.617	2	$ 0	2	$ 191.617	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1005065829	BAUTISTA VERA RAMON EDUARDO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	28	$ 2.682.636	$ 429.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 429.300	NUEVA EPS CM	28	$ 2.682.636	$ 107.400	$ 0	$ 107.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.682.636	2	$ 116.700	28	$ 2.682.636	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1007311530	GONZALEZ RIOS CARLOS MARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																230201-PROTECCION	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816	1	$ 65.000	16	$ 933.816	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1007396100	CORONADO CONTRERAS YOHAN DARIO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1014276646	CEBALLOS CASTAÑO DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15																231001-COLFONDOS	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816	1	$ 65.000	16	$ 933.816	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1017922023	DUQUE GARCIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1020423119	HENAO MARIN YESID ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	13																230201-PROTECCION	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.050.543	1	$ 73.200	18	$ 1.050.543	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1035770062	GOMEZ TORO YEISON ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14																230201-PROTECCION	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180	1	$ 69.100	17	$ 992.180	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1035770525	JARAMILLO RAMIREZ YEISON ALEXIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14	14															25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1035864035	ZAPATA GRISALES JHON PIERRI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230201-PROTECCION	21	$ 1.275.376	$ 204.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	21	$ 1.275.376	$ 51.100	$ 0	$ 51.100	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.275.376	1	$ 88.800	21	$ 1.275.376	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1035864035	ZAPATA GRISALES JHON PIERRI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-09							230201-PROTECCION	9	$ 525.272	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 84.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	9	$ 525.272	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	9	$ 525.272		$ 0	9	$ 525.272	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6020380721**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		323325810	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
27	CC 1035910042	GALLEGO GUTIERREZ CARLOS IVAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		13														230201-PROTECCION	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726	1	$ 52.900	13	$ 758.726	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1035922315	ORREGO CARDENAS JAIME ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	30															230201-PROTECCION	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1036337196	GALLEGO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI									30-30							231001-COLFONDOS	30	$ 2.291.392	$ 366.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 366.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.291.392	$ 91.700	$ 0	$ 91.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.291.392	1	$ 159.500	30	$ 2.291.392	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1036424400	ARANDA CASTAÑO KEVIN NEGITH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14															230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180	1	$ 69.100	17	$ 992.180	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1036966793	AGUIRRE SALAZAR DANIEL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI									30-30							230201-PROTECCION	30	$ 2.036.563	$ 325.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.036.563	$ 81.500	$ 0	$ 81.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.036.563	1	$ 141.800	30	$ 2.036.563	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1037639836	MARIN DURANGO CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	13															230301-PORVENIR	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.050.543	1	$ 73.200	18	$ 1.050.543	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1040871766	ZULUAGA DUQUE LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-20-20			25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 0	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1040871766	ZULUAGA DUQUE LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												19-20				25-14 COLPENSIONES	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727	1	$ 0	2	$ 116.727	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1040871766	ZULUAGA DUQUE LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.517.451	1	$ 105.700	26	$ 1.517.451	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1040871766	ZULUAGA DUQUE LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										18-18						25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1041205166	QUICENO GIRALDO CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	15															230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	16	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 933.816	1	$ 65.000	16	$ 933.816	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1041327918	MURILLO CARDONA EDDIER ESTIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1041328261	VERGARA CASTAÑO YAMID ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 1041328830	MORALES DUQUE JHONATAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	17															231001-COLFONDOS	14	$ 817.089	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 32.700	14-11 - ARL SURA	14	$ 817.089	1	$ 56.900	14	$ 817.089	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 1043976710	CANCHILA TOVAR CARLOS DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	10	13														25-14 COLPENSIONES	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454	1	$ 16.300	4	$ 233.454	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 1044930302	CASTILLO PADILLA LORENZO JUNIOR	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									30-30							230301-PORVENIR	30	$ 3.064.998	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.064.998	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.064.998	2	$ 133.400	30	$ 3.064.998	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 1048932801	OSPINO BELTRAN JUAN ANDRES	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 2.778.444	$ 444.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 444.600	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 2.778.444	$ 111.200	$ 0	$ 111.200	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.778.444	2	$ 120.900	29	$ 2.778.444	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

achSOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6020380721**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	323325810

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
44	CC 1048932801	OSPINO BELTRAN JUAN ANDRES	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									06-06								230301-PORVENIR	1	$ 95.809	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 95.809	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 95.809		$ 0	1	$ 95.809	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 1048939109	LLERENA GONZALEZ JAVIER FRANCISCO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 1.437.126	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 1.437.126	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.437.126	2	$ 62.600	15	$ 1.437.126	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 1048942817	VALIENTE JULIO YESITH OMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.800.647	$ 288.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.800.647	$ 72.100	$ 0	$ 72.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.647	1	$ 125.400	30	$ 1.800.647	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 1050483066	YOLI DIVASTO JESUS DAVID	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	28	$ 2.873.382	$ 459.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	28	$ 2.873.382	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.873.382	2	$ 125.000	28	$ 2.873.382	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 1050483066	YOLI DIVASTO JESUS DAVID	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI										09-10							230301-PORVENIR	2	$ 191.617	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 191.617	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	2	$ 191.617		$ 0	2	$ 191.617	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 1051817169	CASTAÑO NAVARRO YAIR YESID	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 1065293213	DIAZ MONTES AVID DAVID	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.150.498	$ 504.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.100	NUEVA EPS CM	30	$ 3.150.498	$ 126.100	$ 0	$ 126.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.150.498	2	$ 137.100	30	$ 3.150.498	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 1066740572	PEREZ DIAZ OBEIDER ONED	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.060.424	$ 489.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 489.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 3.060.424	$ 122.500	$ 0	$ 122.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.060.424	2	$ 133.200	30	$ 3.060.424	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 122.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 1070996735	CONTRERAS LEON YEFERSON ERASMO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.778.444	$ 444.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 444.600	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.778.444	$ 111.200	$ 0	$ 111.200	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.778.444	2	$ 120.900	29	$ 2.778.444	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 1070996735	CONTRERAS LEON YEFERSON ERASMO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI										01-01							230301-PORVENIR	1	$ 95.809	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 95.809	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 95.809		$ 0	1	$ 95.809	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 1071355551	MURILLO COGOLLO HERALDO ANTONIO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	26	$ 2.491.019	$ 398.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 398.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	26	$ 2.491.019	$ 99.700	$ 0	$ 99.700	14-11 - ARL SURA	26	$ 2.491.019	2	$ 108.400	26	$ 2.491.019	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 99.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 1071355551	MURILLO COGOLLO HERALDO ANTONIO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI										06-09							25-14 COLPENSIONES	4	$ 383.234	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	$ 383.234	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	4	$ 383.234		$ 0	4	$ 383.234	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 1084787038	ALVAREZ VALLE JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 1093798085	MONROY FERNANDEZ JOSE RONALDO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI												08-09					230201-PROTECCION	2	$ 191.617	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.700	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 191.617	$ 7.700	$ 0	$ 7.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 191.617	2	$ 0	2	$ 191.617	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 1093798085	MONROY FERNANDEZ JOSE RONALDO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									30-30								230201-PROTECCION	28	$ 2.783.536	$ 445.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 445.400	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.783.536	$ 111.400	$ 0	$ 111.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.783.536	2	$ 121.100	28	$ 2.783.536	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 1094272046	CONDE GUTIERREZ EDINSON JAVIER	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 1094370780	BAUTISTA VERA LUIS FERNEY	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 1097398382	CARDONA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6020380721**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	323325810

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS														CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
62	CC 1110042656	DURAN VASQUEZ ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.119.988	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 339.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.119.988	$ 84.800	$ 0	$ 84.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.119.988	2	$ 92.300	30	$ 2.119.988	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 1143836351	SANTIAGO ZAPATA ALVARO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 1143851310	CONTO CHAVERRA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726	1	$ 52.900	13	$ 758.726	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 1148959873	RODRIGUEZ VILLAMIZAR ANTONIO JOSUE	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	NUEVA EPS CM	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 1148959875	RODRIGUEZ VILLAMIZAR JACKSON ISMAEL	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	NUEVA EPS CM	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 1193285070	HERNANDEZ ZAPATA CRISTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-03							230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	3	$ 175.091		$ 0	3	$ 175.091	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 1193285070	HERNANDEZ ZAPATA CRISTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	27	$ 1.625.557	$ 260.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.100	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.625.557	$ 65.100	$ 0	$ 65.100	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.625.557	1	$ 113.200	27	$ 1.625.557	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 16053818	MEDINA UBEIMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	13	19															230201-PROTECCION	7	$ 408.545	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 16.400	14-11 - ARL SURA	7	$ 408.545	1	$ 28.500	7	$ 408.545	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 43211998	RUIZ OSSA EUCARIS MILENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												08-09					230201-PROTECCION	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727	2	$ 0	2	$ 116.727	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
71	CC 43211998	RUIZ OSSA EUCARIS MILENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-21-21			230201-PROTECCION	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	2	$ 0	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
72	CC 43211998	RUIZ OSSA EUCARIS MILENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230201-PROTECCION	27	$ 1.769.807	$ 283.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 283.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.769.807	$ 70.800	$ 0	$ 70.800	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.769.807	2	$ 77.000	27	$ 1.769.807	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 5292121	NARVAEZ ADARMES FREDY ARMANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-11 - ARL SURA	3	$ 175.091	1	$ 7.700	3	$ 175.091	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 70382692	VARGAS ZULUAGA CONRADO DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.800.647	$ 288.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.647	$ 72.100	$ 0	$ 72.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.647	1	$ 125.400	30	$ 1.800.647	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 70752238	CEBALLOS SEPULVEDA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.792.026	$ 286.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 286.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.792.026	$ 71.700	$ 0	$ 71.700	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.792.026	1	$ 124.800	29	$ 1.792.026	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
76	CC 70752238	CEBALLOS SEPULVEDA JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										25-25							25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
77	CC 70753808	RUIZ GAVIRIA JHON MAURICIO	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 0	$ 140.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.501.810	1	$ 243.800	30	$ 3.501.810	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6020380721**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	323325810		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
78	CC 70909686	PALACIO LOPERA WALTER DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
79	CC 71227324	RIOS SUAREZ WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	25																230201-PROTECCION	6	$ 350.181	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 14.100	14-11 - ARL SURA	6	$ 350.181	1	$ 24.400	6	$ 350.181	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
80	CC 71375529	GARCIA OSPINA CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI									30-30								230201-PROTECCION	30	$ 2.007.415	$ 321.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.007.415	$ 80.300	$ 0	$ 80.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.007.415	1	$ 139.800	30	$ 2.007.415	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
81	CC 71385816	VELEZ ROBER ESTID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	1	$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
82	CC 71607780	CALVO ZULETA HUMBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
83	CC 71782216	ROJAS REYES ALEXANDER ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
84	CC 7383460	SALUM CARABALLO JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		06															25-14 COLPENSIONES	6	$ 350.181	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.100	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	6	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 14.100	14-11 - ARL SURA	6	$ 350.181	1	$ 24.400	6	$ 350.181	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
85	CC 78037816	LIÑAN ORTIZ DIOMEDES ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												16-17					230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727	2	$ 0	2	$ 116.727	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
86	CC 78037816	LIÑAN ORTIZ DIOMEDES ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	28	$ 2.036.091	$ 325.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.800	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 2.036.091	$ 81.500	$ 0	$ 81.500	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.036.091	2	$ 88.600	28	$ 2.036.091	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
87	CC 79774559	VALENCIA MONTAÑO FEDERICO	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI									30-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.180.114	$ 508.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 508.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.180.114	$ 127.300	$ 0	$ 127.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.180.114	1	$ 221.400	30	$ 3.180.114	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 127.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
88	CC 84076814	GARCIA SUAREZ MANUEL DE LOS REYES	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI									30-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.289.120	$ 366.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 366.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.289.120	$ 91.600	$ 0	$ 91.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.289.120	2	$ 99.600	30	$ 2.289.120	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
89	CC 94227692	GIRALDO ORTIZ OSCAR ALBERTO	DEPEND		$ 3.804.348	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 1.648.551	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 263.800	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 1.648.551	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-11 - ARL SURA	13	$ 1.648.551	1	$ 114.800	13	$ 1.648.551	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
90	CC 98623268	MORALES NARANJO WILSON DE JESUS	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	1	$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
91	CC 98641977	LEZCANO GOEZ EDISON	DEPEND		$ 3.700.000	FIJO			SI	21								30-30								230201-PROTECCION	10	$ 1.254.357	$ 200.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.700	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 1.254.357	$ 50.200	$ 0	$ 50.200	14-11 - ARL SURA	10	$ 1.254.357	1	$ 87.400	10	$ 1.254.357	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
92	PT 1222673	LOPEZ VILLASMIL RICHARD OMAR	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI	21								30-30								230201-PROTECCION	10	$ 896.212	$ 143.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 143.400	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 896.212	$ 35.900	$ 0	$ 35.900	14-11 - ARL SURA	10	$ 896.212	1	$ 62.400	10	$ 896.212	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 35.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
93	PT 5374137	FUENTES GUTIERREZ VICTOR GERARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									30-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.059.304	$ 329.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.059.304	$ 82.400	$ 0	$ 82.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.059.304	2	$ 89.600	30	$ 2.059.304	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
94	PT 5607008	VERA ZAMBRANO ANTHONY JOSE	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI									30-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.064.998	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400	NUEVA EPS CM	30	$ 3.064.998	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.064.998	2	$ 133.400	30	$ 3.064.998	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
95	PT 6819507	MORAN ZERPA ADONIS ANTONIO	DEPEND		$ 2.874.252	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.874.252	$ 459.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.874.252	$ 115.000	$ 0	$ 115.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.874.252	2	$ 125.100	30	$ 2.874.252	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
96	PT 6874496	MACHADO GONZALEZ AGUSTIN NERIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI	24																25-14 COLPENSIONES	7	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-11 - ARL SURA	7	$ 606.667	1	$ 42.300	7	$ 606.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901279384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL SALADO	TELÉFONO:	3116221
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6020380721**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			323325810

TOTAL PAGADO:	**$ 40.302.900**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Certificación Bancaria

Miércoles, 21 de enero de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INTERVENTORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y CONTRUCCION** identificado(a) con NIT. **901279384** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	161-000032-48	2025/06/03	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

INTERSERVICIOS GUARNE SAS

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES

Guarne, 09 de Junio de 2026

Señores

EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ

Guatapé

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA CD003-2026

Objeto: CD003-2026 "EJECUCIÓN DE OBRAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA"

Asunto: **Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales**

El suscrito JUAN ESTEBAN DUQUE GARCÍA con cédula de ciudadanía número 1.017.922.023 de Sabaneta y SARA LUCRECIA OLAVE VILLANOVA con cedula de ciudadanía número 1.102.548.053 de Zapatoca-Sder, certifican que la empresa INTERVENTORÍAS, SERVICIOS INTEGRALES & CONSTRUCCIONES GUARNE S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN DUQUE GARCÍA
C.C. 1.017.922.023
REP. LEGAL

SARA LUCRECIA OLAVE VILLANOVA
C.C. 1.102.548.053
Contador Publico
TP 277526-T.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.548.053

OLAVE VILLANOVA

APELLIDOS

SARA LUCRECIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1986

ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

18-MAR-2004 ZAPATOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-2700100-00375096-F-1102548053-20120511 0029853444A 1 36778570

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

277526-T



SARA LUCRECIA
OLAVE VILLANOVA
C.C. 1102548053
RES. INSCRIPCION 5 DEL 27/01/2021
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

299389 312475

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E7B70E979C3CB5F7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA LUCRECIA OLAVE VILLANOVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102548053 de ZAPATOCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 277526-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
