INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 05 de junio de 2026

MES DE INFORME: Mayo

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	098 – GINREDPA - 2026		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"		
CONTRATISTA:	TOOLS & SERVICES S.A.S.		
NIT / C.C:	900744289-9		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	09/04/2026	FECHA DE INICIO:	10/04/2026
FECHA TERMINACIÓN:	30/07/2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 11.539.000	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 11.539.000
SUPERVISOR:	AS13 JULIO CESAR IBARRA CASTAÑEDA		
DEPENDENCIA:	SEMAP		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	$ 220.000
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-02-008-007	$ 11.319.000
	VALOR TOTAL	$ 11.539.000

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción,	FECHA			DESCRIPCIÓN

	prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.		MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. **VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.**
ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($11.539.000) M/CTE. incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

TIPO contrato/convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Prestación de servicios	INICIAL	$ 11.539.000	$	$ 11.539.000
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$ 11.539.000

3. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

3.1. **RESUMEN DE PÓLIZAS**
Garantía No:560-47- 994000199267 Anexo: 0
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 10/04/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**09/04/2026**	**30/01/2027**	**$ 2.307.800**
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	**20**	**09/04/2026**	**30/11/2026**	**$ 2.307.800**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**20**	**09/04/2026**	**30/11/2026**	**$ 2.307.800**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	**09/04/2026**	**30/07/2029**	**$ 576,950**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A

Anexo: N/A Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Contrato principal	2026	12626 04/02/2026	$ 20.456.480	N/A	12526 10-04-2026	$ 11.539.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
SEÑALIZACIÓN MARITIMA DELPACIFICO - SEMAP				
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MÁQUINA DE SOLDAR LINCOLN				
1	Mantenimiento a carburadores. Suministro, cambio e instalación de ser necesario.	1	1	Mayo
2	Suministro cambio e instalación de aceite	1	1	Mayo
3	Suministro cambio e instalación de filtro de aire	1	1	Mayo
4	Inspección a la bujía (limpieza). Suministro cambio e instalación si es necesario	1	1	Mayo
5	Revisión y prueba de enchufe	1	1	Mayo
6	Lijado y pintura con anticorrosivo del marco tubular de la máquina	1	1	Mayo
7	Pintura en general de la máquina de soldar	1	1	Mayo
8	Revisión y limpieza del tanque de gasolina	1	1	Mayo
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIERRA SIN FIN				
1	Suministro cambio e instalación de manguera plástica de refrigerante de 1/2"	1	1	Mayo
3	Suministro cambio e instalación de bornera y/o sustitución de bloque de terminales principales	1	1	Mayo
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRESOR DE BUCEO				
1	Desarme completo del compresor por etapas.	1	1	Mayo
2	Revisión general de componentes	1	1	Mayo
3	Limpieza general del equipo utilizando Varsol inoloro	1	1	Mayo
4	Suministro 01 galón de aceite chemlube 800	1	1	Mayo
5	Suministro y cambio filtro purificador sistema de filtrado P0	1	1	Mayo
6	Suministro y cambio de válvula de sobrepresión primera etapa	1	1	Mayo
7	Suministro y cambio de válvula de sobrepresión segunda etapa	1	1	Mayo
8	Suministro y cambio de	1	1	Mayo

	válvula de admisión segunda etapa			
9	Suministro y cambio de válvula de descarga segunda etapa	1	1	Mayo
10	Suministro y cambio válvula de descarga tercera etapa con su Oring	1	1	Mayo
11	Suministro y cambio filtro de admisión de aire	1	1	Mayo
12	Suministro cambio de anillos segunda etapa	1	1	Mayo
13	Suministro y correa trapezoidal regencia 15350	1	1	Mayo
14	Reemplazo preventivo de empaques y sellos	1	1	Mayo
15	Confirmación de cierre/activación adecuada en condiciones de presiones por etapa (1.ª, 2.ª y 3.ª).	1	1	Mayo
16	Verificación de presión de activación de las nuevas válvulas de sobrepresión	1	1	Mayo
17	Verificación válvulas de alivio y calibración de la misma.	1	1	Mayo
18	Puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para verificar su correcto desempeño	1	1	Mayo

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un 85%

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No aplica

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los mantenimientos fueron realizados por el contratista según los estipulado en la aceptación de oferta en cantidades, términos y demás aspectos contractuales.
- Se deja constancia de la prestación de servicio por parte del contratista con informe de trabajos realizados.
- Se anexa evidencia fotográfica pertinente a los mantenimientos realizados en informe de trabajos realizados.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCION		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						TOTAL DE EJECUCION	0%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 11.539.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTA No.1	-
TOTAL VALOR PAGADO	-
VALOR ACTA EN TRÁMITE	-
SALDO	**$ 11.539.000**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista TOOLS & SERVICES S.A.S. frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El suministro cambio e instalación de tanque de líquido refrigerante no se ha podido realizar por motivo de que es muy difícil de conseguir uno igual o parecido debido a que el modelo del equipo de la sierra sin fin está obsoleto y ya no se consigue se está a la espera de buscar alguna solución para realizar el trabajo.


8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Informe de trabajos realizados

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

No aplica

Atentamente,



AS13 JULIO CÉSAR IBARRA CASTANEDA
C.C. 1.111.745.163 B/TURA SEMAP
jibarra@dimar.mil.co
3017979800
Supervisor contrato 098-GINREDPA-2026

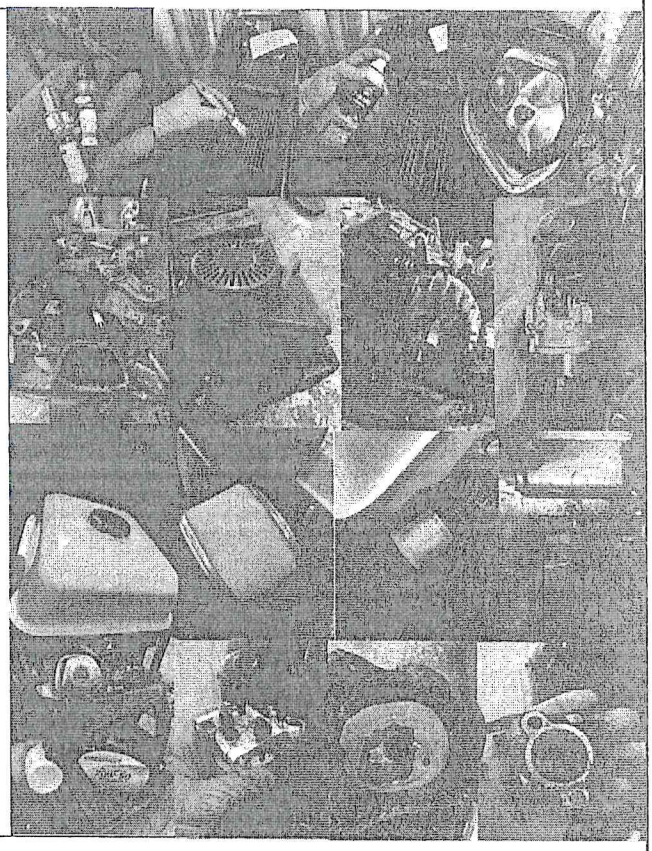
TOOL SERVICES S.A.S.
¡Su Socio en Productividad!

INFORME TRABAJOS REALIZADOS

DATOS DEL CLIENTE

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	
CONTACTO:	JULIO IBARRA
TELEFONO:	3017979800

CLASE DE MANTENIMIENTO: [X] Mantenimiento Preventivo [X] Mantenimiento Correctivo/Reparación [ ] Certificación/Verificación

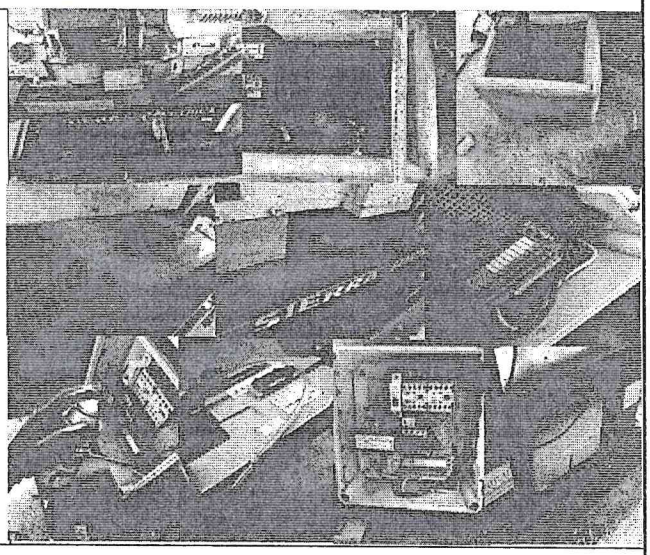
ITEM	DESCRIPCION	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	**MÁQUINA DE SOLDAR LINCOLN**		
	Mantenimiento a carburadores. Suministro, cambio e instalación de ser necesario.	1	
	Suministro cambio e instalación de aceite		
	Suministro cambio e instalacion de filtro de aire		
	Inspección a la bujía (limpieza). Suministro cambio e instalación si es necesario		
	Revisión y prueba de enchufe		
	Lijado y pintura con anticorrosivo del marco tubular de la máquina		
	Pintura en general de la máquina de soldar		
	Revisión y limpieza del tanque de gasolina		

CONCLUSIONES

Se realizó mantenimiento general del motosoldador, ejecutando actividades de inspección, limpieza, revisión y acondicionamiento de sus componentes principales. Dentro del proceso se incluyó el mantenimiento al carburador, cambio de aceite, revisión y/o cambio del filtro de aire, inspección y limpieza de la bujía, verificación del enchufe y revisión del tanque de gasolina, garantizando mejores condiciones para el correcto funcionamiento del equipo.

Adicionalmente, se llevó a cabo el lijado y aplicación de pintura anticorrosiva en el marco tubular, así como pintura general de la máquina, con el fin de proteger su estructura contra la corrosión, mejorar su presentación y prolongar su vida útil.

Durante la intervención se realizó el suministro e instalación de repuestos requeridos para restablecer la funcionalidad del equipo, incluyendo tanque nuevo, exosto y empaque de tapa de válvulas. Estos elementos permitieron corregir condiciones que afectaban el desempeño del motosoldador, asegurando su adecuada operación y disponibilidad para el servicio.

2	SIERRA SIN FIN		
	Suministro cambio e instalación de manguera plástica de refrigerante de 1/2"	1	
	Suministro cambio e instalación de bornera y/o sustitución de bloque de terminales principales		
	CONCLUSIONES		
	Se realizó mantanimiento correctivo y el suministro, cambio e instalación de la manguera plástica de refrigerante de 1/2", la bornera o bloque de terminales principales, con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema de refrigeración y garantizar conexiones eléctricas más seguras y confiables. Con esta intervención se reducen riesgos de fugas, recalentamiento, falsos contactos y fallas eléctricas, dejando el equipo en mejores condiciones de operación, seguridad y disponibilidad para su uso.		

3	COMPRESOR DE BUCEO		
	Desarme completo del compresor por etapas	1	
	Revision general de componentes		
	Limpieza general del equipo utilizando varsol inoloro		
	Suministro de un galon de aceite chemlube 800		
	Suminisitro y cambio filtro purificador sistema de fltrrado P0		
	Suminisitro y cambio de valvula de sobrepresion primera etapa		
	Suminisitro y cambio de valvula de sobrepresion segunda etapa		
	Suminisitro y cambio de valvula de admision segunda etapa		
	Suminisitro y cambio de valvula de descarga segunda etapa		
	Suminisitro y cambio de valvula de descarga tercera etapa con su Oring		
	Suminisitro y cambio filtro de admision de aire		
	Suminisitro y cambio de anillos segunda etapa		
	Suminisitro y correa trapezoidal regencia 15350		
	Reemplazo y preventivo de empaques y sellos		
	Confirmacion de cierre/activacion adecuada en condiciones de presiones por etapa (1,2 y 3)		
	Verificacion de presion de activacion de las nuevas valvulas de sobrepresion		
	Verificacion valvulas de alivio y calibracion de la misma		
	Puesta en marcha y prueba de fucionamiento del equipo para verificar su correcto desempeño		

CONCLUSIONES

Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo al compresor, ejecutando el desarme completo por etapas, revisión general de componentes, limpieza integral del equipo y suministro de insumos y repuestos necesarios para restablecer sus condiciones adecuadas de operación. Durante la intervención se efectuó el cambio de filtros, válvulas de sobrepresión, válvulas de admisión y descarga, anillos, correa, empaques y sellos, además de la verificación de presiones por etapa y calibración de las válvulas de alivio.

Una vez finalizadas las actividades, se realizó la puesta en marcha y prueba de funcionamiento, evidenciando que el equipo queda en mejores condiciones mecánicas y operativas, con mayor confiabilidad, seguridad y eficiencia para su uso. Se recomienda continuar con mantenimientos periódicos preventivos, inspección de niveles de aceite, revisión de filtros y control de presiones, con el fin de prolongar la vida útil del compresor y evitar fallas mayores durante su operación.

Consuelo Sanchez

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Consuelo Sanchez
36167395 de Neiva
TOOLS & SERVICES S.A.S
900744289-9
Gerente / Representante Legal

Calle 2 # 1 i - 25 Barrio San Pedro (Neiva - Huila) Tel. Fijo (8) 863 97 87 Tel. Movil 317 534 4051 / 317 894 7296
e-mail: centrodeservicios@tools-services.com.co Web: www.tools-services.co.co
