6259

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Recibido
Mauricio Rinc
10-04-26
9:35a.

Tame, 10 de abril del 2026

Señores:
CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Municipio de Tame

Ref: Radicado de Informe Mensual No. 08 – Contrato de Obra N.° 204 de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar la entrega del Informe Mensual No. 08, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, del Contrato de Obra N.° 204 de 2025, cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que comunica las veredas Puerto San Salvador – San Joaquín – Puerto Gaitán del municipio de Tame, departamento de Arauca."

Lo anterior se remite con el fin de que se realice la verificación correspondiente y se proceda con la emisión del informe a la administración municipal, conforme a los lineamientos contractuales establecidos.

Anexo:

- INFORME MENSUAL 8 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026.

Sin otro particular,

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
CC. 68.302.258

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com

6260

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

INFORME MENSUAL No. 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025



CONTRATO DE OBRA No.204 DEL 2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

6261

INFORME MENSUAL No. 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026.



CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.

CONTRATISTA:	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R. CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R. EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUÍN-PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SUPERVISOR:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUPERVISOR DESIGNADO

TAME, MARZO DEL 2026.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONTENIDO

INTRODUCCION....3

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES....6
1.1 PROCESO DE SELECCIÓN....6
1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO....6

2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO....7
2.1 DESCRIPCION GENERAL....7
2.2 LOCALIZACION....7
2.3 ALCANCE....8
2.4 REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO....10

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS....10
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA....10
3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA....10
3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO....11
3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN....11
3.2.2 AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS....12
3.2.3 AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS....12
3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES....13
3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS....13
3.4.1 MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO....14
3.4.2 COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES....14
3.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS....15
3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA....16
3.7 BITACORA DIARIA DE OBRA....19
3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA....20
3.8.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO....20
3.8.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA....20
3.8.3 ACTAS Y REUNIONES SUSCRITAS POR LA VEEDURÍA CIUDADANA....21
3.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES....21
3.9.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO....22
3.9.2 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL....34
3.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL....34
3.10.1 DOTACIÓN DEL PERSONAL....34
3.10.2 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y/O DE SEÑALIZACION....36
3.10.3 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA....39
3.10.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)....39
3.11 PERMISOS Y LICENCIAS....39
3.11.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN U OTRO TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA....39
3.11.2 LICENCIA O PERMISOS AMBIENTALES....39
3.11.3 LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN....40
3.11.4 OTROS PERMISOS REQUERIDOS....41
3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA....41

4 ASPECTOS TECNICOS....48

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 48
4.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 50
4.3 AVANCE DE LA OBRA 54
4.3.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS 54
4.3.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 54
4.4 PROGRAMACION DE LA OBRA 55
4.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 55
4.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 55
4.7 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 93

5 ASPECTOS FINANCIEROS 95
5.1 MANEJO DEL ANTICIPO 95
5.1.1 APERTURA DE CUENTA BANCARIA O ENCARGO FIDUCIARIO 95
5.1.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 96
5.1.3 CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 96
5.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 97

6 ASPECTOS AMBIENTALES 103
6.1 SEGUIMIENTO AL PMA O PAGA 103
6.2 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 103

7 CONCLUSIONES 105

8 ANEXOS 106

6264

INTRODUCCION

El día 27 de mayo de 2025, se firma el contrato de obra No. 204 de 2025, entre la **ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME** y el **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 NIT: 901.947.891-9**, representada legalmente por **CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA**, dicho contrato se dio por un lapso de tiempo de DIEZ (10) mes contado a partir de la firma del Acta de Inicio con fecha del 07 de julio del 2025, con un valor de ONCE MIL CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($11.106.664.743,04).

En el presente informe se realiza una descripción general de las diferentes actividades administrativas, financieras y técnicas realizadas en el desarrollo del contrato de obra No. 204 del 2025 en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de marzo de 2026.**

Para el presente informe mensual se recopilan los datos de las actividades administrativas, financieras y técnicas realizadas y estos son reportados de manera acumulativa respecto a los meses anteriormente ejecutados.

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

El Municipio de Tame adelantó el proceso de selección del contratista mediante el proceso de licitación pública No. LP-TA-001-2025 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Municipio de Tame, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídica, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a la empresa **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 NIT: 901.947.891-9** Representante legal **CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA** mediante Resolución No. 548 del 21/05/2025.

1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 548 del 21/05/2025, se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 204 de 2025 el día 27 de mayo de 2025) entre el señor alcalde del Municipio de Tame y la firma contratista **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 NIT: 901.947.891-9** representada por **CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA**, el cual tiene por objeto **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, con un plazo de ejecución de **DIEZ (10) meses** y un valor de **ONCE MIL CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($11.106.664.743,04).**

2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Desde el punto de vista técnico se requiere la ejecución del contrato de obra 204 del 2025, pues existe la necesidad de mejorar el estado actual de la transpirabilidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona y lograr así el tránsito evitando daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, proporcionando mejor movilidad y operación, a la vez que se mejora el paisaje rural e imagen del municipio y zona de las veredas Puerto San Salvador - San Joaquín - Puerto Gaitán del Municipio de Tame, Departamento de Arauca.

2.2 LOCALIZACION

El proyecto se localiza en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, en la vía que comunica las veredas Puerto San Salvador - San Joaquín - Puerto Gaitán del Municipio de Tame, Departamento de Arauca.



GEORREFERENCIACION DEL PROYECTO					
Descripción	Norte	Este	Longitud	Latitud	km
INICIO	2246595.309	5153306.869	W71° 36' 49.39"	N6° 13' 47.70"	k0+000
FIN	2246205.118	5156214.225	W71° 35' 14.79"	N6° 13' 34.74"	k3+900

2.3 ALCANCE

La vía a intervenir comprende la intervención de 3,9 km, con un ancho de corona de 6 mts desde la vereda Puerto San Salvador en dirección hacia la vereda San Joaquín y la vereda Puerto Gaitán, en pavimento flexible con un realce de terraplén (material de la región seleccionado y crudo tamaño máximo de 4 pulgadas espesor variable según diseño geométrico), 17 cm de espesor de sub-base granular, 11 cm de espesor de base granular y 8 cm de espesor de concreto asfaltico tipo MDC-19. Se plantea el remplazo de las 6 alcantarillas existentes en anillos de concreto que se encuentran en muy mal estado y 2 nuevas, se cambiaran por alcantarillas dobles en tubo de 36 pulgadas optimizando la capacidad hidráulica de ellas, para un total de 8 alcantarillas.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**				
	1.1	Conformación de la subrasante	M2	33.541,00	$ 1.499,00	$ 50.277.959,00
	1.2	Excavación mecánica	M3	7.951,20	$ 17.808,00	$ 141.594.969,60
Subtotal REALIZAR OBRAS PRELIMINARES						**$ 191.872.928,60**
	2	**MEJORAMIENTO DE LA VIA**				
	2,1	Material seleccionado de la región (INV-220)	M3	15.724,14	$ 207.728,00	$ 3.266.344.153,92
	2,2	Suministro e instalación de material crudo tamaño máximo 4" Incl. Transporte (m3/Km)	M3	5.278,09	$ 228.365,00	$ 1.205.331.022,85
Subtotal MEJORAMIENTO DE LA VIA						**$ 4.471.675.176,77**
	3	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				
	3.1	Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)	M3	3.916,21	$ 257.176,00	$ 1.007.155.723,78
	3.2	Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)	M3	2.593,57	$ 263.983,00	$ 684.658.389,31
	3.3	Riego de imprimación	M2	23.577,94	$ 7.877,00	$ 185.723.433,38
	3.4	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 o similar	M3	1.886,23	$ 1.787.680,00	$ 3.371.975.646,40
Subtotal ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						**$ 5.249.513.192,87**
	4	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**				
	4.1	Excavación mecánica	M3	352,51	$ 17.808,00	$ 6.277.498,08

	4.2	Acero de refuerzo de 60000 PSI	KG	21.544,72	$ 14.238,00	$ 306.753.723,36
	4.3	Concreto para soleras resistencia de 140 kg/cm2 (2,000 psi)	M2	239,80	$ 59.315,00	$ 14.223.737,00
	4.4	Suministro e instalación de tubería de 36"	ML	120,00	$ 2.359.905,00	$ 283.188.600,00
	4.5	Concreto para estructuras resistencia de 210 Kg/cm2 (3,000 psi)	M3	89,86	$ 1.218.022,00	$ 109.451.456,92
	4.6	Relleno y compactado con material de la misma excavación	M3	170,50	$ 23.486,00	$ 4.004.363,00
Subtotal CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE						**$ 723.899.378,36**
	5	**CONSTRUIR SARDINELES Y CUNETAS**				
	5.1	Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50(A-10)	ML	460,28	$ 128.678,00	$ 59.227.909,84
	5.2	Subbase para Cunetas	M3	108,88	$ 231.847,00	$ 25.243.501,36
	5.3	Cuneta en Concreto 3000 PSI en (V) Tipo A de 1.0*0.12 m. con Malla Electrosoldada	ML	460,28	$ 199.608,00	$ 91.875.570,24
Subtotal CONSTRUIR SARDINELES Y CUNETAS						**$ 176.346.981,44**
	6	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				
	6.1	Señal vertical de transito	UND	37,00	$ 647.836,00	$ 23.969.932,00
	6.2	Líneas de demarcación	ML	15.600,00	$ 5.087,00	$ 79.357.200,00
	6.3	Tachas reflectivas	UND	2.340,00	$ 18.955,00	$ 44.354.700,00
Subtotal SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						**$ 147.681.832,00**
					Subtotal OBRA FISICA	**$ 10.960.989.490,04**

CARACTERIZACION VIAL (KM)	**$ 26.851.608,00**
IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	**$ 50.221.000,00**
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**$ 68.602.645,00**

VALOR TOTAL OBRA FISICA	**$ 11.106.664.743,04**

2.4 REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO

La firma contratista de obra verifica que el proyecto viabilizado por la ALCALDIA DE TAME, cumpliera con todos los requerimientos técnicos para su funcionalidad. Para ello en la primera semana después de la respectiva firma del acta de inicio de fecha 07 de julio del 2025 se revisaron los estudios, diseños, planos, memorias de cálculo, APU y demás documentos técnicos que soportan el proyecto, dando un concepto favorable de estos.

En el desarrollo de cada una de las actividades realizadas por el contratista de obra, se llevó el seguimiento y verificación de las mismas por parte de la interventoría teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de materiales, equipos, mano de obra y procesos constructivos.

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

Tabla 01. Ficha técnica del contrato de obra No. 204 del 2025.

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO
SUPERVISOR DESIGNADO:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA - secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano - Supervisora
CONTRATO DE OBRA No:	204 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
NIT. No:	901.947.891-9
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MIL CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($11.106.664.743,04)
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 5.553.332.371,52
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SPGR – 2325 DEL 2025/02/19 CDR20250219001 DEL 2025/02/19
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SPGR – 2725 DEL 2025/06/03 RPR20250603001 DEL 2025/06/03
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	06 DE MAYO DE 2026

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA PARCIAL No.01:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA PARCIAL No.02:	13 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (SEGÚN REINICIO 1):	18 DE JUNIO DE 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL	
ADICIÓN No. 01 DE VALOR DEL CONTRATO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL:	N/A
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL + ADICIONAL:	N/A
ADICIÓN No. 01 EN PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	N/A
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
DIAS TRANSCURRIDOS:	23 DIAS JULIO DEL 2025. 19 DIAS SEPTIEMBRE DEL 2025. 31 DIAS OCTUBRE DEL 2025. 30 DIAS NOVIEMBRE DEL 2025. 31 DIAS DICIEMBRE DEL 2025. 31 DIAS ENERO DEL 2026. 28 DIAS FEBRERO DEL 2026. 31 DIAS MARZO DEL 2026.

3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Tame en el Contrato de Obra No. 204 de 2025, se suscribe con la compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A**. las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual así

3.2.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el **29/05/2025** por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, tomadas por **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** y como beneficiario el MUNICIPIO DE TAME. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Jefe Oficina Asesora Jurídica **LENNY HERNANDEZ GARCÉS**, mediante constancia firmada el **05/06/2025.**

Tabla 02. Pólizas iniciales del contrato de obra No. 204 del 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	29/05/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101036184	$ 5.553.332.371,52	27/05/2025	27/07/2026	POLIZA APROBADA LA JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 05/06/2025.
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 1.110.666.474,30	27/03/2026	27/03/2031	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 1.110.666.474,30	27/05/2025	27/07/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 555.333.237,15	27/05/2025	27/03/2029	
		RESPONSABILIDAD CIVIL		49-40-101011581	$ 711.750.000,00	27/05/2025	27/03/2026	

3.2.2 Ampliaciones a las pólizas

3.2.2.1 Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio y expedidas el **08/07/2025** por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, y aprobadas por la Jefe Oficina Asesora Jurídica **LENNY HERNANDEZ GARCÉS**, mediante constancia firmada el **09/07/2025.**

Tabla 03. Pólizas iniciales del contrato de obra No. 204 del 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha *07/07/2025.*

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1 y 2.	08/07/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101036184	$ 5.553.332.371,52	07/07/2025	06/09/2026	POLIZA APROBADA LA JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 09/07/2025.
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 1.110.666.474,30	07/05/2026	07/05/2031	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 1.110.666.474,30	07/07/2025	06/09/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 555.333.237,15	07/07/2025	07/05/2029	
		RESPONSABILIDAD CIVIL		49-40-101011581	$ 711.750.000,00	07/07/2025	07/05/2026	

3.2.3 Ampliaciones a las pólizas

3.2.3.1 Pólizas Ampliadas Según Acta de Reinicio 01.

Las pólizas fueron ampliadas según acta de Reinicio 01 y expedidas el **06/10/2025** por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, y aprobadas por la Jefe Oficina Asesora Jurídica **LENNY HERNANDEZ GARCÉS**, mediante constancia firmada el **28/10/2025.**

Tabla 04. *Pólizas iniciales del contrato de obra No. 204 del 2025, ampliadas según acta de suspensión 01 de fecha 30/07/2025, acta de prorroga 01 a la suspensión 01 de fecha 29/08/2025 y acta de reinicio 01 de fecha 11/09/2025.*

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3-4 y 4.	06/10/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101036184	$ 5.553.332.371,52	07/07/2025	18/10/2026	POLIZA APROBADA LA JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA < 28/10/2025.
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 1.110.666.474,30	07/05/2026	07/05/2031	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 1.110.666.474,30	07/07/2025	18/10/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 555.333.237,15	07/07/2025	18/06/2029	
		RESPONSABILIDAD CIVIL		49-40-101011581	$ 711.750.000,00	07/07/2025	18/06/2026	

3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

En el periodo del presente informe del contrato de obra 204 del 2025, **NO** se ha establecido ningún tipo de multa o sanción al contratista de obra.

3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 05. Actos Administrativos Contrato de Obra No. 204 de 2025.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
07/07/2025	Acta de inicio	Iniciar las actividades contractuales del contrato de obra No. 204 del 2025	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
09/07/2025	Plan de inversión del anticipo	Solicitar el anticipo del contrato de obra No. 204 del 2025	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
			EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
30/07/2025	Acta de suspensión No.01	Suspender las actividades de obra.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
29/08/2025	Prorroga 01 a la suspensión 01	Prorrogar la suspensión 01 de las actividades de obra.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
11/09/2025	Acta de reinicio 01	Reiniciar actividades de obra	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
12/12/2025	Acta Parcial 01.	Suscribir cobro según acta parcial 01 de obra.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora. **ALCALDE MUNICIPAL DE TAME** MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
13/03/2026	Acta Parcial 02.	Suscribir cobro según acta parcial 02 de obra.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora. **ALCALDE MUNICIPAL DE TAME** MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES

3.4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato

No se han generado **MODIFICACIONES Y/O ADICIONES** durante el periodo de ejecución del contrato de obra No. 204 del 2025.

3.4.2 Compensación de mayores y menores cantidades

No se han generado **COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES** durante el periodo de ejecución del contrato de obra No. 204 del 2025.

3.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito actas de comités técnicos desarrollados entre las partes:

Tabla 06. Relación de Comité Técnicos del Contrato de Obra No. 204 de 2025.

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
30/07/2025	ACTA DE COMITÉ 01	Solicitud de suspensión 01 de actividades del contrato de obra 204 del 2025.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
29/08/2025	ACTA DE COMITÉ 02	Solicitud de prorroga 01 a la suspensión 01 de actividades del contrato de obra 204 del 2025.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
11/09/2025	ACTA DE COMITÉ 03	Reactivar las actividades del contrato de obra 204 del 2025.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
10/02/2026	ACTA DE COMITÉ 04	Revisión y socialización de las actividades ejecutadas en el mes de enero del 2026 del contrato de obra 204 del 2025.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
23/02/2026	ACTA DE COMITÉ 05	Reconocimiento en campo de los puntos específicos para toma de registro fotográfico.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.
11/03/2026	ACTA DE COMITÉ 06	Revisión y socialización de las actividades ejecutadas en el mes de febrero del 2026 del contrato de obra 204 del 2025.	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA **CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025** R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA – Supervisora.

3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el Municipio de Tame:

Tabla 07. Relación de **correspondencia recibida** por el contratista del Contrato de Obra No. 204 de 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
04/07/2025	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	CONTRATISTA DE OBRA	Citación para reunión de formalización del acta de inicio.
07/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de información técnica (Plan de calidad para el contrato de obra 204 del 2025).
07/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de información técnica (cronograma y/o plan de trabajo para el contrato de obra 204 del 2025).
07/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de información según anexo – 1 NAEXO TECNICO del proceso de licitación LP-TA-001-2025 (Hojas de vida de personal y documentos maquinaria).
07/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de información técnica (análisis de precios unitarios **APUS** y desglose administración, imprevistos, utilidades **AIU** del contrato de obra 204 del 2025).
23/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Extensión de invitación a comité técnico para evaluar las causales presentadas para la suspensión del contrato de obra 204 del 2025.
31/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de entrega de informen mensual 01
10/09/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Invitación a comité técnico para reactivar actividades del contrato de obra 204 del 2025.
10/09/205	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	CONTRATISTA DE OBRA	Invitación a comité técnico para reactivar actividades del contrato de obra 204 del 2025 e invitación a socialización del proyecto ante la comunidad beneficiaria.
12/09/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de reprogramación de obra según acta de reinicio 01 y ampliación de pólizas.
01/10/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de entrega de informen mensual 02.
28/10/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Programación de visita por ENELAR ESP, para revisión de posteria y redes que afectan la construcción de la vía.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
31/10/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de entrega de informen mensual 03.
10/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Aprobación de cierre temporal de vía por trabajos en campo.
14/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Remisión de comunicado empresa ENELAR ESP.
28/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de informe mensual 04 periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025.
12/12/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Recepción de documentos según acta parcial 01 del contrato de obra 204 del 2025.
17/12/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Recepción de comunicación de empresa ENELAR ESP
31/12/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de informe mensual 05 periodo del 01 al 31 de diciembre del 2025.
31/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de informe mensual 06 periodo del 01 al 31 de enero del 2026.
09/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Invitación a comité de obra en correlación a solicitud de la supervisión del Municipio de Tame.
28/02/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de informe mensual 07 periodo del 01 al 28 de febrero del 2026.
09/03/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Invitación a comité de obra en correlación a solicitud de la supervisión del Municipio de Tame.
31/03/2026	INTERVENTORIA EXTERNA	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud de informe mensual 08 periodo del 01 al 31 de marzo del 2026.

Tabla 08. Relación de **correspondencia enviada** por el contratista del Contrato de Obra No. 204 de 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
30/05/2025	CONTRATISTA DE OBRA	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Radicado de pólizas para legalización del contrato de obra 204 del 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
09/06/2025	CONTRATISTA DE OBRA	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Radicado de certificación bancaria a nombre del CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025.
07/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega de documentos técnicos (Plan de calidad para el contrato de obra 204 del 2025).
07/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega de documentos técnicos (cronograma para el contrato de obra 204 del 2025).
07/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega de documentos técnicos según anexo – 1 NAEXO TECNICO del proceso de licitación LP-TA-001-2025 (Hojas de vida de personal y documentos maquinaria).
07/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega de documentos técnicos (análisis de precios unitarios **APUS** y desglose administración, imprevistos, utilidades **AIU** del contrato de obra 204 del 2025).
07/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega de plan de inversión del anticipo del contrato de obra 204 del 2025 para revisión y aprobación por parte de la firma interventora.
08/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado de pólizas ampliadas según acta de inicio del contrato de obra 204 del 2025.
08/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano. LENNY HERNÁNDEZ GARCES Jefe Oficina Asesora Jurídica ANDRY JULIETH FLOREZ TARAZONA Secretaría De Hacienda Municipal	Manifestación de interés del pago anticipado correspondiente a la estampilla PROCULTURA (2%) del contrato de obra 204 del 2025.
12/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado de informe preliminar de revisión de estudios, diseños y memorias de cantidades del contrato de obra 204 del 2025.
12/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado de documentos técnicos (programa adicional relacionado a "criterios ambientales y sociales" del FORMATO 14 – FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES
21/07/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Solicitud de comité técnico y revisión de soportes para la suspensión temporal del contrato de obra 204 del 2025.
27/08/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Solicitud de comité técnico y revisión de soportes para la prórroga 01 a la suspensión del contrato de obra 204 del 2025.
05/08/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega del informe mensual 01 del contrato de obra 204 del 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
15/09/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega de la reprogramación según acta de reinicio 01 de actividades de obra.
04/10/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Entrega del informe mensual 02 del contrato de obra 204 del 2025.
21/10/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Solicitud de visita preliminar a la empresa ENELAR ESP- Evaluación de redes eléctricas en tramo inicial del Contrato de Obra N° 204 de 2025.
05/11/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	del informe mensual 03 del contrato de obra 204 del 2025.
08/11/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Solicitud de programación de cierre parcial de vía por trabajos en obra.
05/12/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado del informe mensual 04 del contrato de obra 204 del 2025.
12/12/2025	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado de documentos suportes del acta parcial 01 com fecha de corte del 07 de julio de 2025 al 12 de diciembre de 2025.
05/01/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado del informe mensual 05 del contrato de obra 204 del 2025.
07/02/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado del informe mensual 06 del contrato de obra 204 del 2025.
06/03/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado del informe mensual 07 del contrato de obra 204 del 2025.
14/03/2026	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA EXTERNA	Radicado de documentos suportes del acta parcial 02 com fecha de corte del 13 de diciembre de 2025 al 13 de marzo 2026.

Anexo 01 Correspondencia enviada y recibida por la firma contratista de obra del presente mes del 01 al 31 de marzo de 2026.

3.7 BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra en conjunto con la interventoría tiene fecha de apertura el 07 de julio del 2025, las personas responsables de este documento son el ingeniero residente de obra **JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA** con **MP No. 25202-374154 NTS** y el ingeniero residente de interventoría **JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO** con **MP No. 54202-373571 NTS.**

ANEXO 02 Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe del 01 al 31 de marzo de 2026.

3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1 Socialización del proyecto

El 13/09/2025 se realizó la socialización del contrato de obra 204 del 2025 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, previa convocatoria realizada por el "CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025"

En dicha reunión participaron representantes del Municipio de Tame, representantes de la ART, representantes de la firma contratista de la obra, representantes de la Interventoría externa y representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Municipio de Tame.

ANEXO 03. Acta de Socialización del contrato obra 204 del 2025. ***("ya fue anexo en informe mensual 02")***

3.8.2 Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

Conformación de la veeduría ciudadana del contrato de obra 204 del 2025 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Tabla 09. Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 204 del 2025.

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	LEIDY TATIANA FORERO FUENTEMAYOR	1.116.794.789	3228965685	VEEDOR	VEREDA PUERTO SAN SALVADOR
2	WALTER JEFFERSON SOTO CARVAJAL	1.098.744.526	3107552430	VEEDOR	VEREDA SAN JOAQUÍN
3	JOEL ONAN CRUZ NEIVA	96.190.632	3133193036	**VEEDOR VOCERO**	VEREDA PUERTO GAITAN

La veeduría ciudadana ha sido reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Tame (PERSONAERIA MUNICIPAL), mediante Resolución No. 026 del 03 de octubre de 2025 formada por la doctora DIANA LICETH GRANADOS RINCON Personera Municipal.

ANEXO 04. Acta de conformación de veeduría del contrato de obra 204 del 2025. ***("ya fue anexo en informe mensual 02").*** *Y Se anexa Resolución No. 026 del 03 de octubre de 2025 de la personería Municipal.****("ya fue anexo en informe mensual 03").***

3.8.3 Actas y reuniones suscritas por la veeduría ciudadana

3.8.3.1 Acta de veeduría de inicio de obra

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el 13/09/2025 se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 204 del 2025, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

ANEXO 05. Formato correspondiente a la veeduría de inicio de obra 204 del 2025 debidamente diligenciado. ***("ya fue anexo en informe mensual 02")***

3.8.3.2 Reuniones con el comité veedor

Con el fin de lograr una articulación con la comunidad y sus representantes durante la ejecución del proyecto, se realizaron aclaraciones y acompañamientos al comité de veeduría ciudadana cada vez que se consideró necesario y oportuno.

A la fecha del presente informe se han llevado a cabo reuniones con los voceros de la comunidad:

1. El día 12 de diciembre del 2025 se reunieron CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA R/L Contratista de obra, EDWIN MAURICIO RINCON ROZO R/L Interventoría Externa, LEYDI TATIANA FORERO Veedor, WALTER JEFFERSON SOTO Veedor y JOEL ONAN CRUZ NEIVA Veedor Vocero; con el fin de la verificación y suscripción de acta de veeduría **según acta parcial No. 01** del contrato de obra, dando concepto favorable a las actividades parcialmente a cobrar.

2. El día 13 de marzo del 2026 se reunieron CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA R/L Contratista de obra, EDWIN MAURICIO RINCON ROZO R/L Interventoría Externa, LEYDI TATIANA FORERO Veedor, WALTER JEFFERSON SOTO Veedor y JOEL ONAN CRUZ NEIVA Veedor Vocero; con el fin de la verificación y suscripción de acta de veeduría **según acta parcial No. 02** del contrato de obra, dando concepto favorable a las actividades parcialmente a cobrar.

Durante el periodo del presente informe se mantuvo una comunicación fluida con el comité veedor, resolviendo las observaciones e inquietudes presentadas por ellos a la Interventoría externa, con lo cual fue posible el avance de los trabajos sin ningún tipo de percance con la comunidad beneficiaria del proyecto.

3.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista de obra vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las

respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

3.9.1 Personal Administrativo y operativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

El contratista utilizara mano de obra no calificada de la región con lo cual se generara empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 10. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de julio de 2025.

MES: JULIO DEL 2025												
Del 01/07/2025 AL 29/07/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL SST	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X

11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X

Tabla 11. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de septiembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DEL 2025												
Del 12/09/2025 AL 30/09/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		16	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		16	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X

16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		9	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		9	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
20	GORDILLO CHIQUINQUIRA	HUBER BAUTISTA	7.062.150	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
21	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
22	GUITIERREZ PAEZ	JOSE OCTAVIO	96.195.067	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
23	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
24	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X

Tabla 12. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de octubre de 2025.

MES: OCTUBRE DEL 2025												
Del 01/10/2025 AL 31/10/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	GORDILLO CHIQUINQUIRA	HUBER BAUTISTA	7.062.150	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05 10/2025	05	X	X	X	X
21	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05 10/2025	05	X	X	X	X
22	GUITIERREZ PAEZ	JOSE OCTAVIO	96.195.067	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05 10/2025	05	X	X	X	X
23	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
24	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
25	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		21	X	X	X	X
26	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		17	X	X	X	X
27	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		12	X	X	X	X

28	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		11	X	X	X	X

Tabla 13. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de noviembre de 2025.

MES: NOVIEMBRE DEL 2025												
Del 01/11/2025 AL 30/11/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X

17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
21	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
22	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
23	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
24	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		30	X	X	X	X
25	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
26	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		30	X	X	X	X
27	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.501,00	4/11/2025		26	X	X	X	X
28	GORDILLO CHIQUINQUIRA	JUAN EVER	96.194.386	AYUDANTE	$ 1.423.502,00	4/11/2025		26	X	X	X	X
29	GONZALEZ SARMIENTO	JUAN DAVID	1.007.436.848	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	8/11/2025		22	X	X	X	X
30	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.423.500,00	24/11/2025		7	X	X	X	X

Tabla 14. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de diciembre de 2025.

MES: DICIEMBRE DEL 2025												
Del 01/12/2025 AL 31/12/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	12/12/2025	12	X	X	X	X
21	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
22	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
23	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		30	X	X	X	X
24	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		30	X	X	X	X

25	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		30	X	X	X	X
26	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.501,00	4/11/2025		30	X	X	X	X
27	GORDILLO CHIQUINQUIRA	JUAN EVER	96.194.386	AYUDANTE	$ 1.423.502,00	4/11/2025		30	X	X	X	X
28	GONZALEZ SARMIENTO	JUAN DAVID	1.007.436.848	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	8/11/2025		30	X	X	X	X
29	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.423.500,00	24/11/2025		30	X	X	X	X
30	SANCHEZ GUACHE	LENAR GABRIEL	1.116.872.011	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/12/2025		30	X	X	X	X

Tabla 15. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de enero de 2026.

MES: ENERO DEL 2026												
Del 01/01/2026 AL 31/01/2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

13	GONZALEZ PEREZ	JUAN CAMILO	11.192.735.776	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.750.905,00	13/01/2026		18	X	X	X	X
14	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.750.905,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
16	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
17	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
19	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.750.905,00	29/09/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
21	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.750.905,00	29/09/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
22	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
23	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	15/10/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
24	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.750.905,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
25	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.750.905,00	21/10/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
26	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	4/11/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
27	GORDILLO CHIQUINQUIRA	JUAN EVER	96.194.386	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	4/11/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
28	GONZALEZ SARMIENTO	JUAN DAVID	1.007.436.848	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	8/11/2025	15/01/20026	15	X	X	X	X
29	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.750.905,00	24/11/2025		30	X	X	X	X
30	SANCHEZ GUACHE	LENAR GABRIEL	1.116.872.011	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	1/12/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X

Tabla 16. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de febrero de 2026.

MES: FEBRERO DEL 2026												
Del 01/02/2026 AL 28/02/2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
13	GONZALEZ PEREZ	JUAN CAMILO	11.192.735.776	PALETERO	$ 1.800.000,00	13/01/2026		28	X	X	X	X
14	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.750.905,00	15/09/2025		28	X	X	X	X
15	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	15/09/2025		28	X	X	X	X
16	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.750.905,00	29/09/2025		28	X	X	X	X
17	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		28	X	X	X	X

18	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		28	X	X	X	X
19	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.750.905,00	29/09/2025		28	X	X	X	X
20	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	11/10/2025		28	X	X	X	X
21	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.750.905,00	20/10/2025		28	X	X	X	X
22	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.750.905,00	24/11/2025		28	X	X	X	X

Tabla 17. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de marzo de 2026.

MES: MARZO DEL 2026												
Del 01/03/2026 AL 30/03/2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

13	GONZALEZ PEREZ	JUAN CAMILO	11.192.735.776	PALETERO	$ 1.800.000,00	13/01/2026		30	X	X	X	X
14	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.750.905,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	15/09/2025	1/03/2026	1	X	X	X	X
16	MENDEZ ORTEGA	MARIO FELIPE	1.007.678.527	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	2/03/2026		29	X	X	X	X
17	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
18	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
19	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
20	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
21	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
22	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.750.905,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
23	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.750.905,00	24/11/2025		30	X	X	X	X

ANEXO 06. Planillas de seguridad social integral y nómina firmadas por el personal del periodo del 01 al 31 de marzo del 2026.

Tabla 18. Relación de planillas de pago de seguridad social del contrato de obra No. 204 de 2025.

MES COTIZADO	EMPRESA	NIT	NUMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO	NUMERO DE TRABAJADORES
JULIO - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9490259868 9497664698	$ 1,617,600 $ 382.900	06 01
JULIO - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112293781 1113109613	$ 2.102.700 $ 202.000	06 02
SEPTIEMBRE - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	949302402 3 9497673609	$ 2,096,600 $ 305.800	18 01
SEPTIEMBRE - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112600331 1113109761	$ 2.187.400 $ 195.000	06 02
OCTUBRE - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9494391655 9497673674	$ 6,083,200 $ 472.800	22 01
OCTUBRE - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112747349 1113109826	$ 2.187.400 $ 191.100	06 02
NOVIEMBRE - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9495550068 9497673769	$7,614,700 $ 465.00	23 01
NOVIEMBRE - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1112879164 1113109877	$ 2.187.400 $ 188.300	06 02
DICIEMBRE - 2025	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9497673862 9501509056	$ 8.780.200 $ 2,245,700	24 23

DICIEMBRE - 2025	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1113109265 1113499047	$ 2.334.500 $ 471.500	06 05
ENERO - 2026	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9499415964 9500616591 9501509117	$ 9.487.600 $ 632.900 $ 2,162,800	23 23 22
ENERO - 2026	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	6003317757 1113500320	$ 2.922.900 $ 475.900	07 05
FEBRERO - 2026	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9500358806 9501509166	$ 6.823.700 $ 1,631,800	15 14
FEBRERO - 2026	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1113359342 1113498814	$ 3.088.600 $ 506.500	07 05
MARZO - 2026	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	901947891	9502775780	$ 8,501,600	16
MARZO - 2026	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS	834001423	1113558140	$ 3.591.500	07

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa nos realizó seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

Tabla 19. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- Contrato de Obra No. 204 del 2025.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES
	MES 1, 2 y 3		MES 4, 5 y 6		MES 7 y 8.		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	x		x		x		Ninguna
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	x		x		x		Ninguna
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	x		x		x		Ninguna
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	x		x		x		Ninguna
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	x		x		x		Ninguna
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	x		x		x		Ninguna

3.9.2 Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe; así mismo llevó a cabo la liquidación y pago al personal retirado de acuerdo a los requisitos de Ley.

3.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1 Dotación del personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 19. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 204 del 2025.

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Personal administrativo y operativo.
GUANTES	X		X			Personal administrativo y operativo.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Personal administrativo y operativo.
BOTAS DE CAUCHO	X		X			Personal administrativo y operativo.
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Personal administrativo y operativo.
CAMISA/PANTALON	X		X			Personal administrativo y operativo.

El contratista de obra por medio del profesional SST verificó la entrega de los elementos de protección por parte del contratista de obra.





Fotos: Entrega de elementos de protección personal.

3.10.2 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y/O DE SEÑALIZACION

En la ejecución de los trabajos, el contratista implemento la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas y preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.

Tabla 20. Señalización a instalar en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 204 de 2025.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA PELIGRO	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA
AVISOS PREVENTIVOS	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA
AVISOS INFORMATIVOS	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA
AVISOS REGLAMENTARIOS	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA
SEÑALES NOCTURNAS REFLECTANTES O LUMINOSAS	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA
COLOMBINAS	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA
BARRICADAS	X					SOBRE EL TRAMO DE VIA INTERVENIDA

El contratista de obra por medio del profesional SST verifica diariamente que dichas señales se encontrarán debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

El contratista de obra continua con la señalización en obra, dicha señalización es re ubicada en los diferentes tramos de vía en los cuales se realizan actividades de obra



SEÑALES INFORMATIVAS (indica inicio de obra frente de trabo)



BARRERAS PLASTICAS (control de velocidad en frente de viviendas)

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



SEÑALES INFORMATIVAS (indica inicio de obra frente de trabo)



SEÑALES INFORMATIVAS (inicio de obra y reducción de calzada por trabajos en la vía)

Fotos. Señalización de la obra y cumplimiento del PMT.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

3.10.3 Accidentalidad en la obra

El contratista de obra por medio del profesional SST estuvo atento al registro y atención de los accidentes laborales que se puedan presentar en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe **NO** se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. 204 del 2025.

Por otro lado, el contratista de obra por medio del profesional SST también estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo del presente informe **NO** se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del contrato No. 204 del 2025.

3.10.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "*consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.*"

El contratista cumplió con la aplicación del (SG-SST) tal como lo señala en la copia de planilla de charlas y entrega de EPP.

ANEXO 07. informe mensual 08 de seguridad y salud en el trabajo del periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.

3.11 PERMISOS Y LICENCIAS

3.11.1 Licencia de construcción u otro tipo de licencia urbanística

Este contrato de obra 204 del 2025 NO requiere licencia urbanística de construcción y NO requiere pago del delineamiento urbano.

3.11.2 Licencia o permisos ambientales

1. El día 24 de febrero de 2025 la admiración municipal de Tame realiza la debida solicitud de permisos ambientales ante el ente encargado de su revisión y aprobación CORPORINOQUIA.

2. Que después de la revisión previa por parte de CORPORINOQUIA el día 10 de marzo de 20245 esta autoridad ambiental, procede a informar realizar el costo del servicio de evaluación de la solicitud de concesión de aguas superficiales y autorización para la ocupación de cauce.

3. El municipio de Tame el día 10 de abril de 2025, allego soporte de pago correspondiente de los servicio de evaluación, por un valor de: CUARENTA Y OCHO MILLONES

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS (48.463.199) MCTE.

4. Que el día 23 de abril de 2025 por parte de CORPORINOQUIA notifican el inicio de trámite administrativo ambiental tendiente a evaluar una solicitud de concesión de aguas superficiales y autorización de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones.

5. Surtido el trámite, fueron designados profesionales de la dirección territorial CORPORINOQUIA, para realizar el proceso de evaluación de la documentación presentada, de igual forma se llevo a cabo la visita técnica el día 15 de mayo de 2025.

6. Que el día 04 de junio de 2025 mediante resolución 700.36.25.0045 se otorga una concesión de aguas superficiales y autorización de ocupación de cauce y se toman otras determinaciones, lo cual ya se puede dar inicio a la ejecución de las actividades contractuales del proyecto.

Para la ejecución del contrato de obra No. 204-2025 se requirió los siguientes tipos de licencia o permiso ambiental.

Tabla 21. Relación de licencias o permisos ambientales para las obras objeto del contrato No. 204 de 2025.

TIPO DE LICENCIA O PERMISO	RESPONSABLE DEL TRAMITE	FECHA DEL TRAMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	ENTIDAD QUE LA OTORGA
Concesión de aguas	Municipio de Tame	04/06/2025	Resolución No. 700.36.25.0045 del 04 de junio de 2025	CORPORINOQUIA
Ocupación de cause	Municipio de Tame	04/06/2025	Resolución No. 700.36.25.0045 del 04 de junio de 2025	CORPORINOQUIA

ANEXO 08. Copia de Resolución de permiso de concesión de aguas y ocupación de cause otorgado por la Autoridad Ambiental competente. *(ya fue anexo en informe mensual 01)*

3.11.3 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción

El contratista de obra presenta la documentación de los permisos y licencias de la cantera por la Agencia Nacional de Minería y con los respectivos permisos de CORPORINOQUIA vigentes a la fecha de adquisición del material tipo base, subbase, Crudo Tamaño Máximo 4", triturado y arena las cuales se usarán para la construcción del tramo vial de los 3,9 km a pavimentar.

Tabla 22. Relación de licencias o permisos ambientales de la cantera que suministrará para las obras objeto del contrato No. 204 de 2025.

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACION DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPORINOQUIA	VIGENTE	
			Minero	Ambiental		SI	NO
Material seleccionado de la región (INV-220)	*MARARABE*	*Municipio de Tame*	X	X	*Resolución No. 200-15-07-1268 del 01 de noviembre del 2024*	X	
BASE, SUBBASE, CRUDO TAM MAX 4", TRITURADO Y	*PLAYA BLANCA*	*Municipio de Tame*	X	X	*Resolución No. 700.36.24 0120 del 01 de noviembre del 2024*	X	

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACION DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPORINOQUIA	VIGENTE	
ARENA							
BASE, SUBBASE, CRUDO TAM MAX 4", TRITURADO Y ARENA	*HATO-COROZAL*	*Municipio de Hato-corozal*	X	X	*Resolución No. 500.57-15.0776 del 27 de mayo de 2015.*	X	

ANEXO 09. se presenta copia de permiso y licencias de la cantera que suministrara el material. ***(ya fue anexo en informe mensual 01).*** se presenta copia de permiso y licencias de la cantera HATO-COROZAL. ***(ya fue anexo en informe mensual 07).***

3.11.4 Otros Permisos requeridos

Este contrato de obra 204 del 2025 **NO** requiere de otros permisos requeridos.

3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

El contratista de obra mediante su profesional SST verificó que se utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista presento y utilizara durante el periodo de ejecución del contrato de obra 204 del 2025 es:

Tipo:	EXCAVADORA ORUGA
Marca:	JCB
Referencia:	JCBJS20DK71610150
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	BULDOZER
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	99J2260
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	CARRO TANQUE DE AGUA
Marca:	JAC
Referencia:	LJ11KDCD6
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	VIBROCOMPACTADOR
Marca:	INGERSOL RAND
Referencia:	196613
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

Tipo:	MOTONIVELADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	87V9822
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	COMPATADOR NEUMATICO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	T04039 D412972
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	CAMIÓN IRRIGADOR Y COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)
Marca:	MACK
Referencia:	VG6M117B7PB201013
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

Tipo:	FINISHER
Marca:	CEDARAPIDS
Referencia:	48347
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO
Marca:	INGERSOLL RAND
Referencia:	143268
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	MEZCLADORA DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	1 BULTO MOTOR 10HP
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

Tipo:	VIBRO DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	TCW5
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Por otro lado el contratista de obra mediante su profesional SST realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE MAQUINARIA EN OBRA













Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

Tabla 23. Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 204 del 2025.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES
	MES 1, 2 y 3		MES 4, 5 y 6		MES 7 Y 8		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	X		X		X		
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X		X		X		
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT Seguro contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X		X		X		

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Municipio De Tame y la firma contratista CONSORCIO PUERTO SAN SALVADRO 2025 contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de DIEZ (10) meses.

Tabla 24. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. 204 de 2025.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**				
	1.1	Conformación de la subrasante	M2	33.541,00	$ 1.499,00	$ 50.277.959,00
	1.2	Excavación mecánica	M3	7.951,20	$ 17.808,00	$ 141.594.969,60
Subtotal REALIZAR OBRAS PRELIMINARES						**$ 191.872.928,60**
	2	**MEJORAMIENTO DE LA VIA**				
	2,1	Material seleccionado de la región (INV-220)	M3	15.724,14	$ 207.728,00	$ 3.266.344.153,92
	2,2	Suministro e instalación de material crudo tamaño máximo 4" Incl. Transporte (m3/Km)	M3	5.278,09	$ 228.365,00	$ 1.205.331.022,85

Subtotal MEJORAMIENTO DE LA VIA						**$ 4.471.675.176,77**
	3	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				
	3.1	Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)	M3	3.916,21	$ 257.176,00	$ 1.007.155.723,78
	3.2	Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)	M3	2.593,57	$ 263.983,00	$ 684.658.389,31
	3.3	Riego de imprimación	M2	23.577,94	$ 7.877,00	$ 185.723.433,38
	3.4	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 o similar	M3	1.886,23	$ 1.787.680,00	$ 3.371.975.646,40
Subtotal ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						**$ 5.249.513.192,87**
	4	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**				
	4.1	Excavación mecánica	M3	352,51	$ 17.808,00	$ 6.277.498,08
	4.2	Acero de refuerzo de 60000 PSI	KG	21.544,72	$ 14.238,00	$ 306.753.723,36
	4.3	Concreto para soleras resistencia de 140 kg/cm2 (2,000 psi)	M2	239,80	$ 59.315,00	$ 14.223.737,00
	4.4	Suministro e instalación de tubería de 36"	ML	120,00	$ 2.359.905,00	$ 283.188.600,00
	4.5	Concreto para estructuras resistencia de 210 Kg/cm2 (3,000 psi)	M3	89,86	$ 1.218.022,00	$ 109.451.456,92
	4.6	Relleno y compactado con material de la misma excavación	M3	170,50	$ 23.486,00	$ 4.004.363,00
Subtotal CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE						**$ 723.899.378,36**
	5	**CONSTRUIR SARDINELES Y CUNETAS**				
	5.1	Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50(A-10)	ML	460,28	$ 128.678,00	$ 59.227.909,84
	5.2	Subbase para Cunetas	M3	108,88	$ 231.847,00	$ 25.243.501,36
	5.3	Cuneta en Concreto 3000 PSI en (V) Tipo A de 1.0*0.12 m. con Malla Electrosoldada	ML	460,28	$ 199.608,00	$ 91.875.570,24
Subtotal CONSTRUIR SARDINELES Y CUNETAS						**$ 176.346.981,44**
	6	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				
	6.1	Señal vertical de transito	UND	37,00	$ 647.836,00	$ 23.969.932,00
	6.2	Líneas de demarcación	ML	15.600,00	$ 5.087,00	$ 79.357.200,00
	6.3	Tachas reflectivas	UND	2.340,00	$ 18.955,00	$ 44.354.700,00

Subtotal SEÑALIZACION Y SEGURIDAD			**$ 147.681.832,00**
		Subtotal OBRA FISICA	**$ 10.960.989.490,04**

CARACTERIZACION VIAL (KM)	**$ 26.851.608,00**
IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	**$ 50.221.000,00**
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**$ 68.602.645,00**

VALOR TOTAL OBRA FISICA	**$ 11.106.664.743,04**

4.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo de corte del presente informe, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato.

Tabla 25. Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. 204 de 2025 (**MES 08 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026**). Se realizará la descripción de las actividades ejecutadas en los meses anteriores y actual del presente informe, esto con el fin de visualizar el avance mensual y acumulativo.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**												
1.1	Conformación de la subrasante	M2	33.541,00	$ 1.499,00	$ 50.277.959,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33541,00	$ 50.277.959,00
1.2	Excavación mecánica	M3	7.951,20	$ 17.808,00	$ 141.594.969,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7951,20	$ 141.594.969,60
2	**MEJORAMIENTO DE LA VIA**								$ -		$ -		
2,1	Material seleccionado de la región (INV-220)	M3	15.724,14	$ 207.728,00	$ 3.266.344.153,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15724,14	$ 3.266.344.153,92
2,2	Suministro e instalación de material crudo tamaño máximo 4" Incl. Transporte (m3/Km)	M3	5.278,09	$ 228.365,00	$ 1.205.331.022,85	1200,00	$ 274.038.000,00	2280,00	$ 520.672.200,00	0,00	$ -	5278,09	$ 1.205.331.022,85
3	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**												
3.1	Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)	M3	3.916,21	$ 257.176,00	$ 1.007.155.723,78	0,00	$ -	3.916,21	$ 1.007.155.723,78	0,00	$ -	3916,21	$ 1.007.155.723,78
3.2	Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)	M3	2.593,57	$ 263.983,00	$ 684.658.389,31	0,00	$ -	858,00	$ 226.497.414,00	1.735,57	$ 458.160.975,31	2593,57	$ 684.658.389,31
3.3	Riego de imprimación	M2	23.577,94	$ 7.877,00	$ 185.723.433,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 o similar	M3	1.886,23	$ 1.787.680,00	$ 3.371.975.646,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

4	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**												
4.1	Excavación mecánica	M3	352,51	$ 17.808,00	$ 6.277.498,08	8,54	$ 152.080,32	0,00	$ -	0,00	$ -	352,51	$ 6.277.498,08
4.2	Acero de refuerzo de 60000 PSI	KG	21.544,72	$ 14.238,00	$ 306.753.723,36	8079,27	$ 115.032.646,26	0,00	$ -	0,00	$ -	21544,72	$ 306.753.723,36
4.3	Concreto para soleras resistencia de 140 kg/cm2 (2,000 psi)	M2	239,80	$ 59.315,00	$ 14.223.737,00	71,92	$ 4.265.934,80	0,00	$ -	0,00	$ -	239,80	$ 14.223.737,00
4.4	Suministro e instalación de tubería de 36"	ML	120,00	$ 2.359.905,00	$ 283.188.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 283.188.600,00
4.5	Concreto para estructuras resistencia de 210 Kg/cm2 (3,000 psi)	M3	89,86	$ 1.218.022,00	$ 109.451.456,92	33,69	$ 41.035.161,18	0,00	$ -	0,00	$ -	89,86	$ 109.451.456,92
4.6	Relleno y compactado con material de la misma excavación	M3	170,50	$ 23.486,00	$ 4.004.363,00	94,90	$ 2.228.821,40	0,00	$ -	0,00	$ -	170,50	$ 4.004.363,00
5	**CONSTRUIR SARDINELES Y CUNETAS**						$ -						
5.1	Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50(A-10)	ML	460,28	$ 128.678,00	$ 59.227.909,84	0,00	$ -	0,00	$ -	250,00	$ 32.169.500,00	250,00	$ 32.169.500,00
5.2	Subbase para Cunetas	M3	108,88	$ 231.847,00	$ 25.243.501,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	Cuneta en Concreto 3000 PSI en (V) Tipo A de 1.0*0.12 m. con Malla Electrosoldada	ML	460,28	$ 199.608,00	$ 91.875.570,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**												
6.1	Señal vertical de transito	UND	37,00	$ 647.836,00	$ 23.969.932,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2	Líneas de demarcación	ML	15.600,00	$ 5.087,00	$ 79.357.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.3	Tachas reflectivas	UND	2.340,00	$ 18.955,00	$ 44.354.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

SUB TOTAL OBRA FISICA	$ 10.960.989.490,04		$ 436.752.643,96		$ 1.754.325.337,78		$ 490.330.475,31		$ 7.111.431.096,82
CARACTERIZACIÓN (KM)	$ 26.851.608,00		$ -		$ -		$ -		$ -
IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 50.221.000,00		$ 5.022.100,00		$ 5.022.100,00		$ 5.022.100,00		$ 37.039.337,52
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 68.602.645,00		$ 6.860.264,50		$ 6.860.264,50		$ 6.860.264,50		$ 50.596.294,84
VALOR TOTAL OBRA FISICA	$ 11.106.664.743,04	TOTAL EJEUCTADO MES 06	$ 448.635.008,46	TOTAL EJEUCTADO MES 07	$ 1.766.207.702,28	TOTAL EJEUCTADO MES 08	$ 502.212.839,81	TOTAL EJEUCTADO ACUMULADO	$ 7.199.066.729,19
AVANCE PORCENTAJE (%)	100,00%	PORCENTAJE EJECUTADO MES 06	4,04%	PORCENTAJE EJECUTADO MES 07	15,90%	PORCENTAJE EJECUTADO MES 08	4,52%	TOTAL EJEUCTADO ACUMULADO	64,82%

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

4.3 AVANCE DE LA OBRA

4.3.1 Avance Físico de las obras

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del informe mensual No. 08 (01 al 31 de marzo del 2026), se presenta un avance mensual de ejecución del 4,52% y un avance de obra acumulado del 64,82%, haciendo falta por ejecutar un 35,18% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.

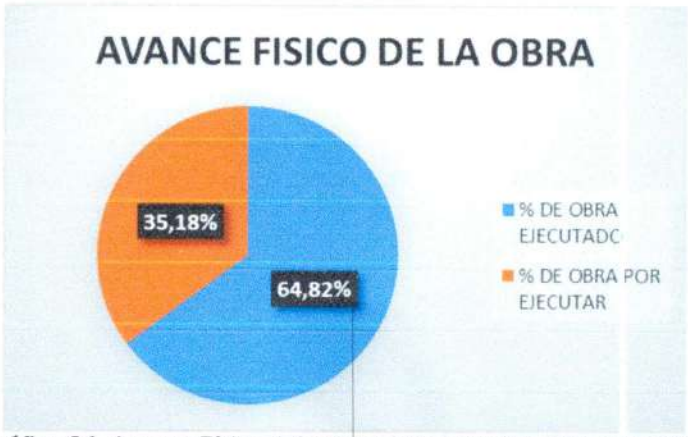


Gráfico 01. Avance Físico del contrato de obra No. 204 del 2025.

4.3.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los DIEZ (10) meses establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido 224 días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 74,67% del total del plazo contractual, restando DOS (02) COMA CINCUENTA Y TRES (53) MESES para finalizar las actividades del contrato y proceder a entregar las obras al MUNICIPIO DE TAME.

Durante el tiempo que ha transcurrido del contrato de obra No. 204 del 2025 ha sido necesario suspenderlo, dicha suspensión es soportada y aprobada mediante acta de suspensión 01 de fecha 30 de julio.

El día 29 de agosto de 2025 se suscribe prorroga 01 al acta de suspensión 01, siguiendo el contrato temporalmente suspendido.

El día 11 de septiembre de 2025 se suscribe el acta de reinicio No. 01, quedando el contrato en ejecución nuevamente.

En cuanto al estado del tiempo para el periodo del presente informe se han presentado lluvias constantes en el área de influencia del proyecto, adicionalmente el rio Casanare ha presentado en varias ocasiones crecientes y desbordamientos del rio.

PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONADO	CERO (0,0) DIAS
PLAZO EJECUTADO	224 DIAS
PLAZO POR EJECUTAR	DOS (02) COMA CINCUENTA Y TRES (53) MESES
% PLAZO EJECUTADO	74,67%

4.4 PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.



Grafica 02. Avance físico programado Vs Ejecutado Acumulado del Contrato de Obra No. 204 de 2025.

NOTA 01: se presenta la programación inicial por el contratista de obra, la cual sirve de insumo para el seguimiento y control que la interventoría realiza al avance físico y financiero del contrato de obra. *(Se encuentra en archivo del contrato)*

NOTA 02: se presenta la Reprogramación según acta de reinicio 01 por el contratista de obra, la cual sirve de insumo para el seguimiento y control que la interventoría realiza al avance físico y financiero del contrato de obra. *(Se encuentra en archivo del contrato)*

4.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Dentro del tiempo de ejecución del contrato de obra No. 204 del 2025 que corresponde a partir de la firma del acta de inicio de fecha 07/07/2025, la firma contratista de obra presentara detalladamente los imprevistos para la fecha final del contrato.

4.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01/03/2026 al 31/03/2026 la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

Se hace mención que las actividades siguientes a relacionar se reportaran de manera acumulativa y progresiva con respecto a cada mes de ejecución del contrato.

ITEM 1.1 CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE

Se realiza la respectiva conformación y nivelación de la calzada existente, se realiza trabajo de nivelación y compactación de la subrasante en compañía de comisión topográfica, esta conformación es supervisada y aprobada por la interventoría externa la cual cumple con las memorias de cálculo del proyecto.

Materiales utilizados: N/A

Equipos y Maquinaria: Carrotanque de agua, Motoniveladora y Vibro compactador.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control a la conformación de calzada cumpliendo con los anchos para la construcción de la vía.

1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES			
ACTIVIDAD: *Conformación de la subrasante*		*ITEM: 1.1*	*UNIDAD: M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		*33.541,00*	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*33541,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*33541,00*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*











Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES			
ACTIVIDAD: ***Conformación de la subrasante***		***ITEM: 1.1***	***UNIDAD: M2***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***33.541,00***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*33541,00*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*











Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Fotografías CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ÍTEM 1.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA

Se realiza excavación mecánica para el trazado de la vía demarcados por topografía, esta excavación es supervisada y aprobada por la interventoría externa la cual cumple con las cotas de diseños y memorias de cálculo del proyecto.

Materiales utilizados: N/A

Equipos y Maquinaria: Retroexcavador.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control a las excavaciones mecánicas cumpliendo con los diseños de cimentación para la construcción de la vía.

1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES			
ACTIVIDAD: *Excavación mecánica*		***ITEM: 1.2***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***7.951,20***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*7951,20*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*7951,20*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*

Nota: *Se realiza corte según carteras diseño geométrico y se realiza corte a nivel carreteable en diferentes puntos críticos de la vía por factores de material vegetal y empozamientos de aguas lluvias (suelo saturado).*







Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



Fotografías CORTE A NIVEL CARRETEABLE (EXCAVACIÓN MECANICA)

ITEM 2.1 MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (INV-220)

Se realiza la instalación de material seleccionado de la región (INV-220) para la construcción del terraplén según diseños geométrico del tramo vial a construir, esta actividad se ejecuta mediante movimiento de material al sitio de la obra, extendido, nivelado, humectado y compactado.

Materiales utilizados: MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN, AGUA.

Equipos y Maquinaria: Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador, bulldozer y herramienta menor.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control del material de MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN a instalado, realizando control de densidades con el fin de rectificar la compactación del material.

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

2. MEJORAMIENTO DE LA VIA			
ACTIVIDAD: ***Material seleccionado de la región (INV-220)***		***ITEM: 2.1***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***15.724,14***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*15724,14*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*








Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com













Fotografías Material seleccionado de la región (INV-220)

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ITEM 2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL CRUDO TAMAÑO MÁXIMO 4" INCL. TRANSPORTE (M3/KM)

Se realiza la instalación de material CRUDO TAMAÑO MÁXIMO 4" para la construcción de la corona del terraplén según diseños geométrico del tramo vial a construir, esta actividad se ejecuta mediante movimiento de material al sitio de la obra, extendido, nivelado, humectado y compactado.

Materiales utilizados: CRUDO TAMAÑO MÁXIMO 4", AGUA.

Equipos y Maquinaria: Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador, excavadora y herramienta menor.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control del material de CRUDO TAMAÑO MÁXIMO 4" a instalado, realizando control de densidades con el fin de rectificar la compactación del material.


CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

1. MEJORAMIENTO DE LA VIA			
ACTIVIDAD: *Suministro e instalación de material crudo tamaño máximo 4" Incl. Transporte (m3/Km)*		*ITEM: 2.2*	*UNIDAD: M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		*5.278,09*	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*5.278,09*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*





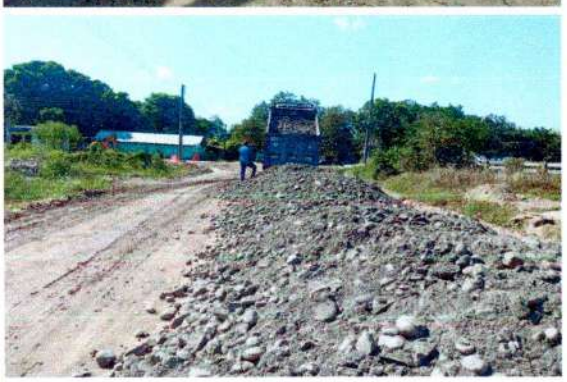


Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



Fotografías Material seleccionado de la región (INV-220)

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ITEM 3,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR INCL. TRANSPORTE (M3/KM)

Se realiza la instalación de material SUBBASE GRANULAR 2" para la construcción de la estructura del pavimento del tramo vial a construir, esta actividad se ejecuta mediante movimiento de material al sitio de la obra, extendido, nivelado, humectado y compactado con un espesor de 0.11 cm.

Materiales utilizados: MATERIAL DE CANTERA SUBBASE GRANULAR 2", AGUA.

Equipos y Maquinaria: Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador y herramienta menor.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control del material de SUBBASE GRANULAR 2" instalado, realizando control de densidades con el fin de rectificar la compactación del material.

3 MEJORAMIENTO DE LA VIA			
ACTIVIDAD: ***Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)***		***ITEM: 3,1***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***3.916,21***	
CANTIDAD EJECUTADA:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*3.916,21*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Fotografías Material subbase 2" granular

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ITEM 3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR INCL. TRANSPORTE (M3/KM)

Se realiza la instalación de material BASE GRANULAR 1 ½" para la construcción de la estructura del pavimento del tramo vial a construir, esta actividad se ejecuta mediante movimiento de material al sitio de la obra, extendido, nivelado, humectado y compactado con un espesor de 0.11 cm.

Materiales utilizados: MATERIAL DE CANTERA BASE GRANULAR 1 ½", AGUA.

Equipos y Maquinaria: Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador y herramienta menor.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control del material de BASE GRANULAR CLASE 1 ½" instalado, realizando control de densidades con el fin de rectificar la compactación del material.

3 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			
ACTIVIDAD: ***Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)***		***ITEM: 3,2***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***2.593,57***	
CANTIDAD EJECUTADA:	*1735,57*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*2593,57*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Fotografías Material **base granular clase 1 ½"**

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ITEM 4.1 EXCAVACION MECANICA

Se realiza excavación mecánica para las alcantarillas a construir, dicha excavación es controlada por comisión topografía, esta excavación es supervisada y aprobada por la interventoría externa la cual cumple con las cotas de diseños y memorias de cálculo del proyecto.

Materiales utilizados: N/A

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora.

Personal: Ayudante de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría con su equipo topográfico realizo seguimiento y control a las excavaciones mecánicas cumpliendo con los diseños de cimentación para la construcción de la vía.

4. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: *Excavación mecánica*		***ITEM: 4.1***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***352,51***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*352,51*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



Fotografías EXCAVACIÓN MECANICA

ITEM 4.2 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA

Se realiza suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para alcantarillas según detalle estructurales y planos del proyecto.

Materiales utilizados: Acero de refuerzo de 60000 PSI y Alambre.

Equipos y Maquinaria: Cillaza manual y herramienta menor.

Personal: Ayudante de obra y oficial.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría realizo seguimiento y control al corte e instalación del acero de obras de drenaje, estas fueron verificadas según despieces y detalles de cartilla de acero del proyecto.

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

4 CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: *Acero de refuerzo de 60000 PSI*		***ITEM: 4.2***	***UNIDAD: KG***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***21.544,72***	
CANTIDAD EJECUTADA MES PARCIA 01:		*10772,36*	
CANTIDAD EJECUTADA MES PARCIAL 02:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*21.544,72*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*






Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

4 CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: *Acero de refuerzo de 60000 PSI*	*ITEM: 4.2*		*UNIDAD: KG*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*21.544,72*		
CANTIDAD EJECUTADA MES PARCIA 01:	*10772,36*		
CANTIDAD EJECUTADA MES PARCIAL 02:	*10772,36*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*21.544,72*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

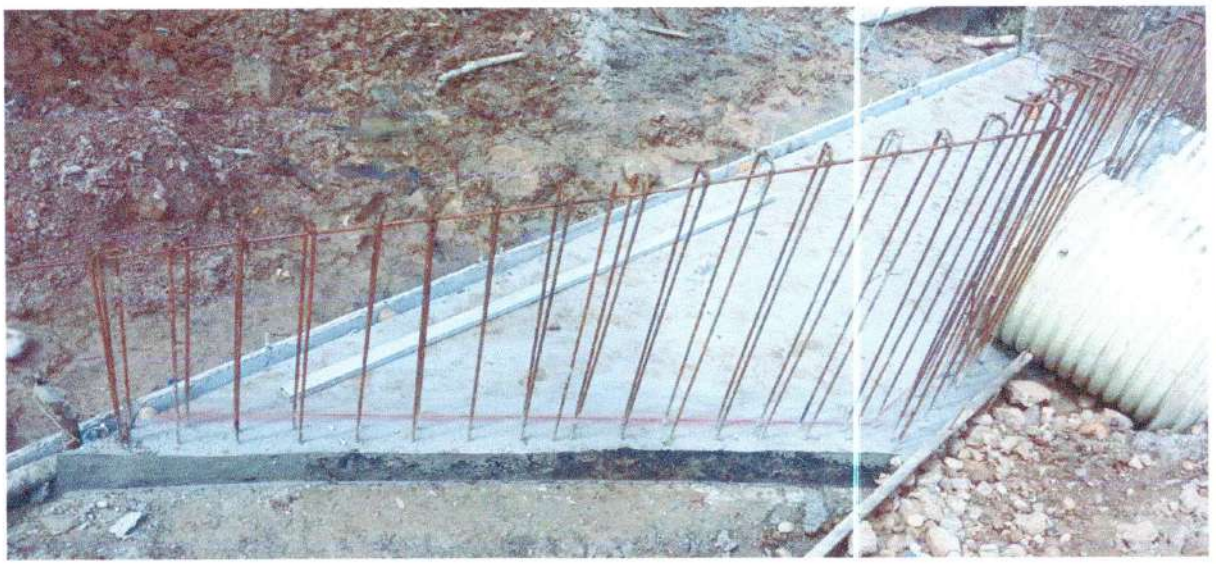



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com











Fotografías Acero de refuerzo de 60000 PSI

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ÍTEM 4.3 CONCRETO PARA SOLERAS RESISTENCIA DE 140 KG/CM2 (2,000 PSI)

Se realiza mezclado y vaciado de concreto pobre para soleras de nivelación de bases de tubería y áreas de placas de encole y descole, este concreto sirve de limpieza y nivelación.

Materiales utilizados: Concreto 140 Kg/cm3 (2,000 psi)

Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.

Personal: Ayudantes de obra, oficial de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría realizo seguimiento a la dosificación, espesores y áreas del concreto de solado instalado, verificando cumplimento y dando concepto aceptable.

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

4. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: *Concreto para soleras resistencia de 140 kg/cm2 (2,000 psi)*		*ITEM: 4.3*	*UNIDAD: M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		*239,80*	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*239,80*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*







Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Fotografías CONCRETO PARA SOLERAS RESISTENCIA DE 140 KG/CM2 (2,000 PSI)

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ÍTEM 4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36"

Se realiza el suministro, transporte y manipulación de tubería de 36" para obras de drenaje tipo alcantarilla según especificaciones técnicas del proyecto; estas tuberías son trasportadas e instaladas con maquinaria tipo excavadora una vez nivelado e instalado el concreto pobre de nivel.

Materiales utilizados: TUBERIA CORRUGADA DE 36", LUBRICANTE PARA TUBERIA X 4 KG y LIMPIADOR PVC

Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.

Personal: Ayudantes de obra, oficial de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría realizo seguimiento a la instalación de tubería de 36", se realizo control a las pendientes y separaciones entre tubos, de igualmente se hizo control topográfico para evidenciar cotas de diseños y cotas de desplante de la tubería.

4. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: ***Suministro e instalación de tubería de 36"***		***ITEM: 4.4***	***UNIDAD: ML***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***120,00***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*120,00*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*







Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



Fotografías SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36"

ÍTEM 4.5 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS RESISTENCIA DE 210 KG/CM2 (3,000 PSI)

Se realiza mezclado y vaciado de concreto pobre para dentellón, placas fondos, aletas y bordillos de encole y descole de alcantarillas, este concreto es dosificado según especificaciones técnicas de la actividad.

Materiales utilizados: FORMALETA DE MADERA 3 USOS, Concreto 210 Kg/cm3 (3,000 psi), Puntilla 1 1/2" - 3" y Alambre negro.

Equipos y Maquinaria: Vibrador de concreto y Herramienta menor.

Personal: Ayudantes de obra, oficial de obra.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría realizo seguimiento a la dosificación, espesores y áreas del concreto instalado, verificando cumplimento y dando concepto aceptable.

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

4. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: ***Concreto para estructuras resistencia de 210 Kg/cm2 (3,000 psi)***		***ITEM: 4.5***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***89,86***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*89,86*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com







Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Fotografías CONCRETO PARA ESTRUCTURAS RESISTENCIA DE 210 KG/CM2 (3,000 PSI)

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ÍTEM 4.5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN

Se realiza utilización de material de la misma excavación precisamente analizado y clasificado para la respectiva actividad de relleno sobre área en que se realizó la actividad de excavación mecánica para instalación de tuberías de 36", dicho material es instalado y compactado por capas no mayores a 40cm.

Materiales utilizados: N/A

Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.

Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría realizo seguimiento a al material reutilizado para dicho relleno.

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

4. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: ***Relleno y compactado con material de la misma excavación***		***ITEM: 4.6***	***UNIDAD: M3***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***170,50***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*0,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*170,50*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100,00%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0,00%*











Fotografías RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

ÍTEM 5.1 SARDINEL PREF. CCTO. 3500 PSI PERFOR.0.80*0.20*0.50(A-10)

Se realiza el trazado del alineamiento del sardinel según planos, se marcan ejes, niveles y cotas con estacas, hilo y pintura, seguidamente se verifica pendiente longitudinal y transversal.
Se realiza excavación manual según condiciones del terreno; Dimensiones típicas: Ancho: mínimo 0.30 m.

Seguidamente se realiza la instalación de mortero de nivel para pega de sardinel, seguidamente se rellenan con mortero de cemento (relación 1:3), Se asegura buena adherencia entre piezas finalmente se realiza Limpieza de excedentes.

Materiales utilizados: Mortero 1:3, SARDINEL PREF.CCTO.3500 PSI PERFOR.0.80*0.20*0.50(A-10)

Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.

Personal: Ayudantes de obra y Oficial

Actividades de control y verificación de la Interventoría: La interventoría realizo seguimiento a la instalación de sardineles.

4. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE			
ACTIVIDAD: ***Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50(A-10)***		***ITEM: 5.1***	***UNIDAD: ML***
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		***460,28***	
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL:	*250,00*	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	*250,00*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*54,31%*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*45,69%*





Fotografías Sardinel Pref. Ccto. 3500 PSI Perfor.0.80*0.20*0.50(A-10)

4.7 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Al corte del presente informe del contrato de obra No. 204 de 2025 se realizaron todos los estándares de calidad de los materiales ingresados a obra.

ACOPIO TEMPORAL DE TUBERIA PARA ALCANTARILLAS.





"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

VERIFICACIÓN DE MATERIAL ALMACENADOS EN BODEGA.












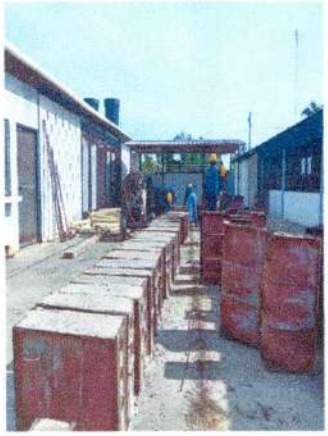



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



5 ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 MANEJO DEL ANTICIPO

De acuerdo a la minuta del contrato de obra No. 204-2025, define el valor del anticipo como el 50% del valor contractual $ 5.553.332371,52 en el cual se maneja mediante contrato fiduciario y cuenta para desembolso anticipo, FIDUBOGOTA S.A. –C.C.A- . FIDUGOB y su forma de pago será hasta el 90% del valor del contrato mediante la presentación de actas parciales de acuerdo con las cantidades aceptadas por la interventoría y a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Tame.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.106.664.743,04
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	% 50
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 5.553.332.371,52
FECHA DE ORDEN DE PAGO:	17/07/2025

5.1.1 Apertura de cuenta bancaria o encargo fiduciario

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA S.A
FIDUCIA No. /CUENTA BANCARIA No.:	137563409
FECHA DE APERTURA:	20 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DE LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO:	FIDUBOGOTA S.A PAC PUERTO SAN SALVA 2025
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 5.553.332.371,52
FECHA DE CONSIGNACION DEL ANTICIPO:	17/07/2025
VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO:	$ 4.942.465.810,26

5.1.1.1 Estado de la cuenta bancaria o encargo fiduciario

A la fecha de hoy el encargo fiduciario se cerrado y liquidado.

ANEXO 10. se presenta copia de contrato de fiducia mercantil y certificación de la cuenta bancaria FIDUBOGOTA S.A PAC PUERTO SAN SALVA 2025. ***(Ya fue anexo en informe mensual 01)***

ANEXO 11. se presenta Informe final fiduciario de FIDUBOGOTA S.A PAC PUERTO SAN SALVA 2025. ***(Ya fue anexo en informe mensual 04)***

5.1.2 Plan de inversión del anticipo

Para el día 07 de julio del 2025 la firma contratista de obra CONSORCIO PUERTO SAN SALVADRO 2025 representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA presenta ante la interventoría el plan de inversión del anticipo de la obra por valor de $ 5.553.332.371,52.

El día 08 de julio del 2025 la firma Interventora CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 representado legalmente por EDWIN MAURICIO RINCON ROZO, aprueba el plan de inversión de inversión del anticipo de obra y radica la solciitud de giro ante la Alcaldia Municipal de Arauca.

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO 204 DEL 2025.			
No.	**Descripción**	**Valor ($)**	**Porcentaje**
1	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	1.888.133.006,32	34,00%
2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	999.599.826,87	18,00%
3	PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR	2.110.266.301,18	38,00%
4	PAGO DE SALARIOS PERSONAL	166.599.971,14	3,00%
5	DESCUENTO DE LEY	277.666.618,58	5,00%
6	ESTAMPILLA PROJUSTICIA	111.066.647,43	2,00%
	TOTAL	**5.553.332.371,52**	**100,00%**

ANEXO 12. Se presenta copia del Plan de Inversión del Anticipo del contrato de obra 204 del 2025 aprobado por la interventoría. ***(Ya fue anexo en informe mensual 01)***

5.1.3 Control de la inversión del anticipo

A la fecha del presente informe el contrato de obra No. 204 de 2025 los desembolsos por concepto del plan de inversión del anticipo del contrato de obra 204 del 2025 fueron.

A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente balance del anticipo:

VALOR DEL ANTICIPO	$ 5.553.332.371,52	
DEDUCCIONES DEL ANTICIPO		$ 610.866.561,26
DESEMBOLSOS DEL ANTICIPO		$ 4.942.465.810,26
SALDO DEL ANTICIPO	**$ 5.553.332.371,52**	**$ 5.553.332.371,52**

Los retiros realizados del anticipo fueron aprobados por la interventoría externa, dichos retiros fueron solicitados ante la FIDUCIARIA de la siguiente manera:

ITEM	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	BENEFICIARIO Y No. DE CUENTA	VALOR CAUSACIÓN	SALDO RESTANTE ANTICIPO
ORDEN DE OPERACIÓN 01	18/07/2025	SE AFECTA ITEM No.1 POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES POR VALOR DE $ 1.779.287.691,69 - SE AFECTA ITEM No.2 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE $ 988.493.162,05 - SE AFECTA ITEM No.3 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR POR VALOR DE $ 1.729.863.033,60 - SE AFECTA ITEM No.4 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS PERSONAL POR VALOR DE $ 197.698.632,41	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 – CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA No. 137562815	$4.695.342.519,75	$247.123.290,51
ORDEN DE OPERACIÓN 02	18/07/2025	SE AFECTA ITEM No.3 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR POR VALOR DE $ 247.123.290,51	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 – CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA No. 137562815	$247.123.290,51	$0,00

5.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Tabla 26. Control Financiero del contrato de obra No. 204 del 2025.

CONCEPTO	FECHA DEL ACTA	VALOR ACTA	% DE AVANCE DEL ACTA	% DE AVANCE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR A PAGAR	No. DE CDP DEL DIA/MES/AÑO	No. DE REGISTRO DEL DIA/MES/AÑO	FUENTE (S) DE FINANCIACION
ANTICIPO (__%)	09/07/2025	$5.553.332.371,52	50,00 %	50,00 %	N/A	5.553.332.371,52	19/02/2025 - # 2325 19/02/2025 - CDR20250219001	03/06/2025 - #2725 03/06/2025 - RPR20250603001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR
ACTA No. 1	12/12/2025	$4.009.868.790,23	36.10 %	36.10 %	2.004.934.395.12	2.004.934.395.11	19/02/2025 - # 2325 19/02/2025 - CDR20250219001	03/06/2025 - #2725 03/06/2025 - RPR20250603001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR
ACTA No. 2	13/03/2026	$ 3.150.129.001,51	28.36%	64,47%	1.575.064.500,76	1.575.064.500,75	19/02/2025 - # 2325 19/02/2025 - CDR20250219001	03/06/2025 - #2725 03/06/2025 - RPR20250603001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR
TOTALES					3.579.998.895,88	7.128.396.872,27			

Tabla 27. Relación de gastos del anticipo del contrato de obra No. 204 del 2025.

1. TRANSPORTE DE MATERIALES				
FECHA	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR
30/07/2025	FVE-1	DECOP INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 333.199.942,29
30/07/2025	MEGA-124	SUMINISTROS MEGA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ZESE	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 45.000.000,00
22/07/2025	FVE-2010	CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 500.000.000,00
22/07/2025	FV-1002	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 500.000.000,00
9/10/2025	DSE1	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 8.000.000,00
9/10/2025	DSE2	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 25.000.000,00
10/10/2025	DSE7	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 6.000.000,00
23/10/2025	DSE13	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 13.000.000,00
31/10/2025	DSE14	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 12.000.000,00
13/11/2025	DSE20	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 12.000.000,00
14/11/2025	DSE21	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 10.000.000,00
16/12/2025	DSE26	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 10.000.000,00
29/12/2025	DSE32	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 11.000.000,00
30/12/2025	FVE BARR-1	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 13.000.000,00
30/12/2025	FVE BARR-2	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 10.000.000,00
9/01/2026	FVE-2015	CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 250.000.000,00
15/01/2026	DSE38	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 11.000.000,00
17/01/2026	DSE39	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 10.000.000,00
30/01/2026	FVE BARR-6	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 5.940.000,00
2/03/2026	CFEC-140	CARMEN TERESA MOLINA DE MEDINA	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 35.000.000,00
2/03/2026	FEVC-222	COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES CUNA DE LA LIBERTAD	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 70.000.000,00
				$ 1.890.139.942,29
2. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
FECHA	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/09/2025	FEVE-40278	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 150.580.000,00
2/10/2025	FEVE40470	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 37.700.000,00
3/10/2025	FEVE-40624	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 4.915.900,00
13/10/2025	FEVE-40601	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 53.800,00
28/10/2025	HC-113	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.316.140,00
28/10/2025	HC-116	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.316.140,00
30/10/2025	HC-118	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 399.840,00
4/11/2025	FEVE-40815	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 242.100,00

10/11/2025	FEVE-40919	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	156.500,00
19/11/2025	FEVE-41120	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	42.600,00
25/11/2025	FEVE-41238	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	1.020.000,00
27/11/2025	FEVE-41290	JOSE GUNDIZALVO CALVO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	36.860,00
4/12/2025	H-C140	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	1.106.000,00
16/12/2025	DSE024	ISNELDA MILENI RODRIGUEZ FLOREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	250.000,00
16/12/2025	DSE025	ISNELDA MILENI RODRIGUEZ FLOREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	1.050.000,00
29/10/2025	FEVC-210	COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES CUNA DE LA LIBERTAD	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	110.000.000,00
30/12/2025	HC-154	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	61.225.500,00
16/01/2026	FVE-1443	CONAGREGADOS SANTA HELENA S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	1.582.700,00
23/01/2026	DSE041	ISNELDA MILENI RODRIGUEZ FLOREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	450.000,00
18/02/2026	HC-166	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	213.581.200,00
23/02/2026	HC-171	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	242.569.600,00
2/03/2026	HC-178	AGREGADOS PETREOS DEL ARIPORO S.A.S	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$	180.677.700,00
				$	**1.010.272.580,00**

3. ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

FECHA	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR	
25/07/2025	FV-1005	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, VIBROCOMPACTADOR, PAJARITA, ,BOCATO, CAMIONETAS, MEZCLADORA, VIBRO PARA CONCRETO)	$	600.000.000,00
1/12/2025	FV-1010	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, VIBROCOMPACTADOR, PAJARITA, ,BOCATO, CAMIONETAS, MEZCLADORA, VIBRO PARA CONCRETO)	$	400.000.000,00
31/12/2025	FV-1011	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, VIBROCOMPACTADOR, PAJARITA, ,BOCATO, CAMIONETAS, MEZCLADORA, VIBRO PARA CONCRETO)	$	380.000.000,00
30/01/2026	FV-1013	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, VIBROCOMPACTADOR, PAJARITA, ,BOCATO, CAMIONETAS, MEZCLADORA, VIBRO PARA CONCRETO)	$	400.000.000,00

28/02/2026	FV-1014	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, VIBROCOMPACTADOR, PAJARITA, ,BOCATO, CAMIONETAS, MEZCLADORA, VIBRO PARA CONCRETO)	$	335.000.000,00
TOTAL				**$**	**2.115.000.000,00**

4.PAGO DE MANO DE OBRA

FECHA	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR	
29/07/2025	Nomina administrativa mes de julio del 2025	Nomina mes de julio del 2025 MEDINA & MADERO	PAGO NOMINA TRABAJADORES JULIO DEL 2025	$	8.536.144,00
13/08/2025	Pago seguridad social mes julio 2025	Pago seguridad social mes de julio MEDINA & MADERO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO MEDINA & MADERO	$	2.102.700,00
29/07/2025	Nomina operativa mes de julio del 2025	Nomina mes de julio del 2025 CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO NOMINA TRABAJADORES JULIO DEL 2025	$	8.536.144,00
13/08/2025	Pago seguridad social mes julio 2025	Pago seguridad social mes de julio CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	$	1.617.600,00
30/09/2025	Nomina administrativa mes de septiembre del 2025	Nomina mes de septiembre del 2025 MEDINA & MADERO	PAGO NOMINA TRABAJADORES SEPTIEMBRE DEL 2025	$	7.051.598,00
7/10/2025	Pago seguridad social mes septiembre 2025	Pago seguridad social mes de septiembre MEDINA & MADERO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE MEDINA & MADERO	$	2.187.400,00
30/09/2025	Nomina operativa mes de septiembre del 2025	Nomina mes de septiembre del 2025 CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO NOMINA TRABAJADORES SEPTIEMBRE DEL 2025	$	11.134.101,00
7/10/2025	Pago seguridad social mes septiembre 2025	Pago seguridad social mes de septiembre CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	$	2.096.600,00
30/10/2025	Nomina administrativa mes de octubre del 2025	Nomina mes de octubre del 2025 MEDINA & MADERO	PAGO NOMINA TRABAJADORES OCTUBRE DEL 2025	$	11.134.101,00
5/11/2025	Pago seguridad social mes octubre 2025	Pago seguridad social mes de octubre MEDINA & MADERO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE MEDINA & MADERO	$	2.187.400,00
30/10/2025	Nomina operativa mes de octubre del 2025	Nomina mes de octubre del 2025 CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO NOMINA TRABAJADORES OCTUBRE DEL 2025	$	32.536.318,00
6/11/2025	Pago seguridad social mes octubre 2025	Pago seguridad social mes de octubre CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	$	6.083.200,00

30/11/2025	Nomina administrativa mes de noviembre del 2025	Nomina mes de noviembre del 2025 MEDINA & MADERO	PAGO NOMINA TRABAJADORES NOVIEMBRE DEL 2025	$	11.134.101,00
28/11/2025	Pago seguridad social mes noviembre 2025	Pago seguridad social mes de noviembre MEDINA & MADERO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE MEDINA & MADERO	$	2.187.400,00
30/11/2025	Nomina operativa mes de noviembre del 2025	Nomina mes de noviembre del 2025 CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO NOMINA TRABAJADORES NOVIEMBRE DEL 2025	$	40.268.333,00
28/11/2025	Pago seguridad social mes noviembre 2025	Pago seguridad social mes de noviembre CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	$	7.614.700,00
8/01/2026	Pago seguridad social mes diciembre 2025	Pago seguridad social mes de diciembre CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	$	8.728.200,00
7/01/2026	Pago seguridad social mes diciembre 2025	Pago seguridad social mes de noviembre MEDINA & MADERO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE MEDINA & MADERO	$	2.334.500,00
				$	**167.470.540,00**

5. DEDUCCIONES

FECHA	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR	
15/07/2025	ORDEN DE PAGO OGR20250715002	ALCALDIA DE TAME	SGR CONTRIBUCIONES 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRA	$	277.666.619,00
15/07/2025	ORDEN DE PAGO OGR20250715002	ALCALDIA DE TAME	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$	111.066.647,42
				$	**388.733.266,42**
TOTAL GASTOS SOPORTADOS A FECHA DE ACTA PARCIAL No. 02				$	**5.571.616.328,71**

VALOR ANTICIPO RECIBIDO	$	**5.553.332.371,52**
VALOR PENDIENE POR SOPORTAR Y/O AMORTIZAR	$	-

SOPORTE DE PAGO ACTA PARCIAL 01

El día 22 de diciembre de 2025 se realiza **ORDEN DE PAGO No. OGR20251222001** a la firma contratista de obra CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 correspondiente al **acta parcial 01** del contrato 204 del 2025.

VALOR DE LA ORDEN DE PAGO: 4.438.924.751,01
VALOR DE DESCUENTOS: 509.253.336,78

6364

VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 2.004.934.395,12

El día 25 de diciembre de 2025 se emite **COMPROBANTE DE EGRESO No. PGR20251225001** conforme a la obligación **No. OGR20251222001** a la firma contratista de obra CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 correspondiente al acta parcial 01 del contrato 204 del 2025.

VALOR DEL COMPROBANTE DE EGRESO: 1.495.681.058,33

SOPORTE DE PAGO ACTA PARCIAL 02

El día 19 de marzo del 2026 se realiza **ORDEN DE PAGO No. OGR20260319001** a la firma contratista de obra CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 correspondiente al acta parcial 02 del contrato 204 del 2025.

VALOR DE LA ORDEN DE PAGO: 3.150.129.001.51
VALOR DE DESCUENTOS: 400.066.383,13
VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 1.575.064.500,76

El día 27 de marzo de 2026 se emite **COMPROBANTE DE EGRESO No. PGR20260327001** conforme a la obligación **No. OGR20260319001** a la firma contratista de obra CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 correspondiente al acta parcial 02 del contrato 204 del 2025.

VALOR DEL COMPROBANTE DE EGRESO: 1.174.998.117,62

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO AL PMA O PAGA

El documento PAGA que hace parte integral del proyecto, se relaciona de acuerdo al documento ambiental entregado por el MUNICIPIO DE TAME al contratista y a la interventoría externa, para la ejecución del contrato de obra No. 204 del 2025, cuyo objeto corresponde a: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN- PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

6.2 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y PAGA, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:

Tabla 28. Presupuesto de implementación programa de adaptación de la guía ambiental - paga del contrato de obra No. 204 del 2025.

FICHA DE MANEJO	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
DAGA-1.1-01	Profesional ingeniero ambiental residente (10 UND meses)	UND	10	$ 3.300.000,00	$ 33.000.000,00
DAGA-1.2-02	Tablero acrilico de 1,5 x 2m para ayuda didactica	UND	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
PAC-2.1-04	Carpa de alta densidad para protección de materiales, evitando corrosión.	m2	50	$ 12.000,00	$ 600.000,00
	Polisombra de señalización para cerramiento de materiales	Rollo	3	$ 233.800,00	$ 701.400,00
PAC-2.3-06	Señalización de frentes de obra (reglamentarias, obligatorias, informativas, productos químicos).	UND	50	$ 20.000,00	$ 1.000.000,00
	Cinta adhesiva doble faz UND (5m x 19mm)	UND	10	$ 7.200,00	$ 72.000,00
	Cinta de peligro para demarcación	UND	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
PAC-2.5-08	Suministro e instalación de caneca metalica de 55 galones para la clasificación de materiales reciclables y no reciclables	UND	2	$ 260.000,00	$ 520.000,00
PGH-3.1-10	Manguera de riego (1", Cal 40 x 100 m)	Und	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
PAC-2.2-05	Camilla de emergencia	Und	1	$ 192.000,00	$ 192.000,00
	Extintores 30 lb	Und	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
	Botiquin tipo A	Und	1	$	$

				170.000,00	170.000,00
	Alquiler de baños portatiles	Und	10	$ 1.108.960,00	$ 11.089.600,00
PMIT– 5.3– 20	Kit para control de derrame de combustible	Und	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
PGS– 6.1– 21	Tablas para apoyo	Und	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
	Buzón	Und	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
PGS– 6.2– 22	Emisión de cuñas radiales	Und	10	$ 40.000,00	$ 400.000,00
PDL– 6.1– 21	Folletos	Und	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
TOTAL					**$ 50.221.000,00**

El contratista cumplió con la aplicación de las diferentes fichas ambientales durante el presente informe comprendido del 01 al 31 de marzo de 2026.

ANEXO 13. Informe mensual Ambiental 07 del contrato de obra 204 del 2025 en el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026.

7 CONCLUSIONES

En el presente informe se plasmó las actividades ejecutadas por la firma contratista CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA y los medios utilizados, tanto en insumos como en mano de obra y maquinaria.

Se hace entrega del presente documento ante la firma Interventora CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 representado por EDWIN MAURICIO RINCON ROZO, como soporte para presentar ***informe mensual No. 08 en el periodo comprendido del 01/03/2026 al 31/03/2026****, dado que a la fecha se ha ejecutado un avance físico de las obras del 64,82% y un avance financiero total de $7.199.066.729,19.*

El valor del anticipo aprobado por la entidad es de 5.553.332.371,52 el cual fue aprobado por la interventoría por medio del plan de inversión del anticipo de fecha del 09 de Julio del 2025.

El anticipo del contrato de obra 204 del 2025 fue cancelado mediante la orden de pago No. OGR20250715002 del 15 de julio del 2025 y comprobante de egreso PGR20250717002 del 17 de julio del 2025.

La firma contratista de obra ha realizado el control y seguimiento a la implementación de las fichas técnicas del estudio de Plan de adaptación a la guía ambiental PAGA del contrato de obra 204 del 2025, dichos soportes son reportados en el informe mensual ambiental 05 del presente corte de avance de obra.

La firma contratista de obra presento ***ACTA PARCIAL No. 01 comprendido del 07/07/2025 – 29/07/2025 y del 12/09/2025 - 12/12/2025****, ejecuto un avance financiero total de $ 4.009.868.790,23 de los cuales se amortizo por concepto de anticipo la suma de $ 2.004.934.395,12 quedando un saldo por cobrar del acta parcial No. 01 de $ 2.004.934.395,11.*

La firma contratista de obra en el ***ACTA PARCIAL No. 01 comprendido del 07/07/2025 – 29/07/2025 y del 12/09/2025 - 12/12/2025*** *presento un avance físico de las obras del 36,10% quedando por ejecutar un 63,90% para finalizar las actividades de obra.*

La firma contratista de obra en el ***ACTA PARCIAL No. 02 comprendida del (13/12/2025 – 13/03/2026)****, ejecuto un avance financiero total de $ 3.150.129.001,51 de los cuales se amortizo por concepto de anticipo la suma de $ 1.575.064.500,76 quedando un saldo por cobrar en la presente acta parcial No. 02 de $ 1.575.064.500,75*

La firma contratista de obra en el ***ACTA PARCIAL No. 02 comprendido del (13/12/2025 – 13/03/2026)*** *presenta un avance físico de las obras del 28,36% con un acumulado ejecutado del 64,47% quedando por ejecutar un 35,53% para finalizar las actividades de obra.*

En general, se consideran atendidas oportunamente las inquietudes presentadas por la comunidad, la interventoría y la Administración, lo cual queda evidenciado en los diferentes comunicados, actas y registros fotográficos.

Como conclusión final, y teniendo en cuenta el presente informe esta firma contratista de obra presenta la información administrativa y financiera del contrato de obra No. 204 del 2025 de acuerdo a la minuta contractual.

8 ANEXOS

Anexo 01 Correspondencia enviada y recibida por la firma contratista de obra del presente mes del 01 al 31 de marzo de 2026.

ANEXO 02 Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe del 01 al 31 de marzo de 2026.

ANEXO 03. Acta de Socialización del contrato obra 204 del 2025. ***("ya fue anexo en informe mensual 02")***

ANEXO 04. Acta de conformación de veeduría del contrato de obra 204 del 2025. ***("ya fue anexo en informe mensual 02").*** *Resolución No. 026 del 03 de octubre de 2025 de la personería Municipal. .* ***("ya fue anexo en informe mensual 02")***

ANEXO 05. Formato correspondiente a la veeduría de inicio de obra 204 del 2025 debidamente diligenciado. ***("ya fue anexo en informe mensual 02")***

ANEXO 06. Planillas de seguridad social integral y nómina firmadas por el personal del periodo del 01 al 31 de amrzo del 2026.

ANEXO 07. informe mensual 08 de seguridad y salud en el trabajo del periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.

ANEXO 08. Copia de Resolución de permiso de concesión de aguas y ocupación de cause otorgado por la Autoridad Ambiental competente. ***(ya fue anexo en informe mensual 01)***

ANEXO 09. se presenta copia de permiso y licencias de la cantera que suministrara el material. ***(ya fue anexo en informe mensual 01)*** se presenta copia de permiso y licencias de la cantera HATO-COROZAL. ***(ya fue anexo en informe mensual 07)***

ANEXO 10. se presenta copia de contrato de fiducia mercantil y certificación de la cuenta bancaria FIDUBOGOTA S.A PAC PUERTO SAN SALVA 2025. ***(Ya fue anexo en informe mensual 01)***

ANEXO 11. se presenta Informe final fiduciário de FIDUBOGOTA S.A PAC PUERTO SAN SALVA 2025. ***(Ya fue anexo en informe mensual 04)***

ANEXO 12. Se presenta copia del Plan de Inversión del Anticipo del contrato de obra 204 del 2025 aprobado por la interventoría. ***(Ya fue anexo en informe mensual 01)***

ANEXO 13. Informe mensual Ambiental 08 del contrato de obra 204 del 2025 en el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026.

Aprobación del Informe:	
Elaboró: JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA M.P. 25202-374154 NTS RESIDENTE DE OBRA	Revisó: CARLOS CESAR MEDINA MOLINA M.P. 25202-198336 CND DIRECTOR DE OBRA
Aprobó: CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA R/L CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	

Anexo 01 Correspondencia enviada y recibida por la firma contratista de obra del presente mes del 01 al 31 de marzo de 2026.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

6370

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Tame, 14 de marzo del 2026

Recibido
Mauricio Rincón
14-03-2026
9:45am.

Señores:
CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Municipio de Tame

Ref: Radicado de documentos acta parcial 02 – Contrato de Obra N.° 204 de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar la entrega de la documentación pertinente del acta parcial 02 para el periodo comprendido entre (13/12/2025 al 13/03/2026), del Contrato de Obra N.° 204 de 2025, cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que comunica las veredas Puerto San Salvador – San Joaquín – Puerto Gaitán del municipio de Tame, departamento de Arauca."

Lo anterior se remite con el fin de que se realice la verificación correspondiente y se proceda con el radicado ante la administración municipal, conforme a los lineamientos contractuales establecidos.

Sin otro particular,

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
CC. 68.302.258

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com

6371

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Recibido
Mauricio Rincón
06-03-2026
9:30 am

Tame, 06 de marzo del 2025

Señores:
CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Municipio de Tame

Ref: Radicado de Informe Mensual No. 07 – Contrato de Obra N.° 204 de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar la entrega del Informe Mensual No. 06, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, del Contrato de Obra N.° 204 de 2025, cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que comunica las veredas Puerto San Salvador – San Joaquín – Puerto Gaitán del municipio de Tame, departamento de Arauca."

Lo anterior se remite con el fin de que se realice la verificación correspondiente y se proceda con la emisión del informe a la administración municipal, conforme a los lineamientos contractuales establecidos.

Anexo:

- INFORME MENSUAL 7DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.

Sin otro particular,

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
CC. 68.302.258

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Americas
Telefono: 3114815501
Email: cpuertosansalvador@gmail.com

6372

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

Tame, 31 de marzo de 2026.

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGI SICULABA
Municipio de Tame

REFERENCIA: Contrato de obra 204 del 2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Cordial saludo,

En mi calidad de interventoría externa del contrato de la referencia, respetuosamente solicitamos se nos remita el Informe Mensual No. 08, correspondiente al corte comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, con el fin de dar continuidad al proceso de seguimiento y control contractual.

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos al envío del documento.

Recibido: Alejandro Medina
31-03-2026
10:30am

Atentamente;

Mauricio Rincón

R.L CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
ING. EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C 1.116.863.571

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

6373

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

Tame, 09 de marzo de 2026.

Señores:
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
Municipio de Tame

REFERENCIA: Contrato de obra 204 del 2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Cordial saludo,

En mi calidad de interventoría externa del contrato de la referencia, respetuosamente extendemos invitación para la asistencia a un comité técnico solicitado por la supervisión del municipio de Tame, en dicho comité se deberá entregar y socializar el avance físico y financiero a corte del 28 de febrero del 2026 esto con el fin de percibir el avance programado vs el ejecutado del contrato.

Fecha comité: 11 de marzo del 2026.
Hora comité: 2:00 PM
Lugar comité: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Agradecemos su atención prestada.

Recibido: Alejandro Medina
09-03-2026
3:45 pm

Atentamente;

R.L CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
ING. EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C 1.116.863.571

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

ANEXO 02 Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe del 01 al 31 de marzo de 2026.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 01 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1					
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA DÍA DOMINICAL

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP. 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6376

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 02 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para astalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalacion y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K1+800 al k2+000.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K1+800 al k2+000.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de vía para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6377

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 03 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibra concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocata)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+000 al k2+200.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K2+000 al k2+200.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de vía para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 04 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para estarito y vibro neumatico,				
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1	camion irrigador, finisher y vibro		HORAS LLUVIA:		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1	compactador)				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+200 al k2+400.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K2+200 al k2+400.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de vía para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehículos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6379

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 05 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibra concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarito)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+400 al k2+600.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K2+400 al k2+600.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de vía para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en compo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6380

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 06 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST -- AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion imgador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+600 al k2+800.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K2+600 al k2+800.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de via para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6381

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 07 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+800 al k3+000.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K2+800 al k3+000.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de via para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Jeonaido Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 08 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estación topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST -- AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1					
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA DÍA DOMINICAL

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6383

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 09 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estación topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteros	2	Retrocargador (Pajonta)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalacion y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa K3+000 al k3+200.

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del K3+000 al k3+200.
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de via para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALBERTO MEDINA BARRERA
MP 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6384

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 10 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteras	2	Retrocargador (Pajanta)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)		HORAS LLUVIA:		
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1					
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K3+200 al k3+400.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K3+200 al k3+400.**
Se culmina con lo instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de via para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JONATHAN ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6385

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA				ESTADO DEL TIEMPO:		
CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD	ESTADO	MAÑANA	TARDE
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1	SOLEADO SECO	X	X
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1			
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1	NUBLADO SECO		
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1			
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1	LLUVIAS PASAJERAS		
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1			
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4	LLUVIA INTERMITENTE		
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1			
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1	LLUVIA FUERTE		
Paleteros	2	Retrocargador (Pajarita)	1			
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para ostatro (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)				
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1			HORAS LLUVIA:		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1					

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K3+400 al k3+600.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K3+400 al k3+600.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico c material subbase instalada.
Se realiza estacado de hombros y ejes de vía para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el trama vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transtan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE [illegible] MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 12 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniera Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K3+600 al k3+800.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K3+600 al k3+800.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacado de hombros y ejes de vía para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP. 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 13 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza suministro, descargue, extendido, instalación y compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K3+800 al k3+900.**

Se realiza nivelación de material BASE GRANULAR del **K3+800 al k3+900.**
Se culmina con la instalación de material BASE GRANULAR
Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado.
Se realiza estacada de hombros y ejes de via para instalación de material a nivel de BASE GRANULAR.
Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.
Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular
Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.
Se realiza reunión con la comunidad veedora del sector con el fin de suscribir y socializar las actividades que se cobraran en el acta parcial No. 02 del periodo (13/12/2025 al (130/03/2026)
Se suscribe la respectiva acta parcial 02 del periodo (13/12/2025 al 13/03/2026).

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata.
JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 14 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico,	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1	camion irrigador, finisher y vibro	
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1	compactador)	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K0+000 a K0+400.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K0+000 a K0+400.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico,	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1	camion irrigador, finisher y vibro	
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1	compactador)	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA DÍA DOMINICAL

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CANTERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 16 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K0+400 a K0+800.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K0+400 a K0+800.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K3+900 al K3+600.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Jesus Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6391

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 17 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro – Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K0+800 a K1+200.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K0+800 a K1+200.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K3+600 al K3+300.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6392

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 18 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro – Oficial -- Ayudante	0 – 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K1+200 a K1+600.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K1+200 a K1+600.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K3+300 al K3+000.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 19 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibracompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFFSIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K1+600 a K2+000.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K1+600 a K2+000.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K3+000 al K2+700.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6394

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 20 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+000 a K2+400.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K2+000 a K2+400.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K2+700 al K2+400.**

Se realiza riego de todo el trama vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6395

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 21 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+400 a K2+800.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K2+400 a K2+800.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K2+400 al K2+100.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6396

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MÁQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFFSIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadeniero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA DÍA DOMINICAL

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6397

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 23 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibracompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para astarro (Vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro – Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K2+800 a K3+200.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K2+800 a K3+200.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K2+100 al K1+800.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6398

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 24 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K3+200 a K3+600.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K3+200 a K3+600.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K1+800 al K1+500.**

Se realiza riego de todo el trama vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6399

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico,	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1	camion irrigador, finisher y vibro	
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1	compactador)	

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza re-compactación de material de BASE GRANULAR estructura de pavimento en la abcisa **K3+600 a K3+900.**

Se realiza chequeos topografico a material subbase instalado **K3+600 a K3+900.**

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K1+500 al K1+200.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para contralar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata

JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6400

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: JUEVES 26 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST – AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K1+500 al K1+200.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6401

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: VIERNES 27 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreta	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (Vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:		
ESTADO	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K1+200 al K0+900.**

Se realiza riego de todo el trama vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6402

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: SABADO 28 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K0+900 al K0+600.**

Se realiza riega de todo el tramo vial con carro tanque para contralar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: DOMINGO 29 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 – 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo – cadenero	1 – 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion imgador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 – 1		
Maestro – Oficial – Ayudante	0 – 0 – 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA DÍA DOMINICAL

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

6404

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: LUNES 30 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURIA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K0+600 al K0+300.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para controlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehículos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARREÑO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

INFORME DIARIO DE TRABAJO

(BITACORA DE OBRA)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 204 DEL 2025.	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025.**
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025 R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025 R/L EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO

FECHA: MARTES 31 DE MARZO DEL 2026

SITIO DE TRABAJO: MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VEREDA PUERTO SAN SALVADOR

PERSONAL - EQUIPOS - MAQUINARIA

CARGO (1)	No.	MAQUINARIA (2)	CANTIDAD
Director de Obra	1	Estacion topografica y/o nivel	1
Ingeniero Civil - Residente de Obra	1	Retro excavadora	1
Ing. Ambiental	1	Buldozer	1
PROFESIONAL SST -- AUXILIAR SST	1 -- 1	Carro tanque	1
Ingeniero Civil Apoyo Residente de Obra	1	Vibrocompactador	1
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Motoniveladora	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	Mezcladora concreto	4
PROFESIONAL EN CONTADURÍA	1	Vibro concreto	1
ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	1	Mini cargador (Bocato)	1
Paleteras	2	Retrocargador (Pajarita)	1
Topografo -- cadenero	1 -- 2	Maquinaria para asfalto (vibro neumatico, camion irrigador, finisher y vibro compactador)	
Operadores De Maquinaria - Conductor	3 -- 1		
Maestro -- Oficial -- Ayudante	0 -- 0 -- 1		

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTADO	MAÑANA	TARDE
SOLEADO SECO	X	X
NUBLADO SECO		
LLUVIAS PASAJERAS		
LLUVIA INTERMITENTE		
LLUVIA FUERTE		
HORAS LLUVIA:		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA

Se realiza conformación, adecuación y compactación de talud de la via del **K0+300 al K0+000.**

Se realiza riego de todo el tramo vial con carro tanque para contrlar focos de polvo por trafico vehicular.

Se realiza verificación de cotas de diseño en correlación de cotas implantadas en campo.

Se realiza actividades de regulación de transito de vehiculos que transitan en la zona.

INCONVENIENTES QUE INTERFIEREN LO PROGRAMADO

MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA
M.P. 25202-374154 NTS
RESIDENTE DE OBRA

Leonardo Zapata
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO
MP 54202-373571 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO 06. Planillas de seguridad social integral y nómina firmadas por el personal del periodo del 01 al 31 de marzo del 2026.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947891	9	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANSALVADOR	CARRERA 9 # 20 - 12	ARAUCA-ARAUCA	3114815501	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	9502775780	9502775780	E	2026/04/23	2026/04/10	BANCO DE BOGOTA	0	$8,501,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANSALVADOR (16 Afiliados)						$27,812,671	$4,450,900			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,823,700		$0	$0
Centro de Trabajo: SANSALVADOR2025 (15 Afiliados)						$26,061,766	$4,170,700			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,814,500		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (15 Afiliados)						$26,061,766	$4,170,700			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,814,500		$0	$0
1	CC	1120869476	ACHURY CRISTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1116504316	ALMANZA RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
4	CC	1118555596	CONTRERAS BELKIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1121836072	FONSECA PABEL	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF67	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
6	CC	96195513	MELO ROBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1007678527	MENDEZ MARIO	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC24	29	$1,692,542	$67,800	CCF67	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
8	CC	1128388541	MENDIETA ERIKA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	74347917	MORA VICTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	52420745	NARANJO ALBA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1005052542	NIÑO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1116785943	RAMIREZ CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1090469003	RINCON JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1116854941	RUIZ DANNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1026284946	SALGADO GLORIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SANSALVADOR2025. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
16	CC	1116778461	RIVAS FREDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(16)						$27,812,671	$4,450,900			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,823,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,450,900	$0	$0	$4,450,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,049,900	$0	$0	$3,049,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,823,700	$0	$0	$1,823,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,823,700	$0	$0	$1,823,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$142,600	$0	$0	$142,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$350,500	$0	$0	$350,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$482,500	$0	$0	$482,500
TOTAL				16	$8,501,600	$0	$0	$8,501,600

8 de 8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834001423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 9 N 20-12 BARRIO LAS AMERICAS	TELÉFONO:	8853133
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CORRECION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1113558140	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999014800

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA												TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.600	$ 0	$ 1.128.600
SUBTOTALES:		4	$ 1.128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 1.977.000**	**$ 0**	**$ 1.977.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 280.400
SUBTOTALES:		4		$ 0		$ 0		$ 0					**$ 494.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 625.500	$ 625.500	$ 0	$ 0	$ 625.500
SUBTOTALES:									**$ 625.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	7	$ 494.500	$ 0	$ 494.500
SUBTOTALES:			**$ 494.500**	**$ 0**	**$ 494.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834001423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 9 N 20-12 BARRIO LAS AMERICAS	TELÉFONO:	8853133
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CORRECION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1113558140	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			909014800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 96194854	MEDINA MOLINA CARLOS CESAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF67-COMFIAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.591.500

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025
NIT 901.947.891-9
CTO DE OBRA 204 DE 2025



PERIODO DE PAGO:	MARZO 2026
01 AL 31	
Salario mínimo	1,750,905
Auxilio de transporte	249,095
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI

Item	Nombre del empleado	Devengado										Deducciones			Neto pagado	Firma del empleado
		Documento de Identidad	Salario básico	Días liquidad	Salario devengado	Auxilio de transporte	Cesantias	Int. Cesantias	Prima SS	Vacaciones	Total devengado	Salud	Pensión	Total Deducciones		
1	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1,090,469,003	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
2	ALBA LUCIA NARANJO CORREDOR	52,420,745	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
3	ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	1,128,388,541	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	ERIKA MENDIETA
4	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1,026,284,946	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
5	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1,116,778,461	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
6	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1,121,836,072	3,300,000	30	3,300,000	-	274,890	32,987	274,890	137,610	4,020,377	132,000	132,000	264,000	3,756,377	PABEL FONSECA
7	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1,116,854,941	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
8	ELIBARDO BENAVIDEZ MURCIA	91,247,775	1,750,905	1	58,364	249,095	25,611	3,073	25,611	2,434	364,188	2,335	2,335	4,669	359,519	Elibardo Benavides
9	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74,347,917	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	VICTOR MORA
10	RICARDO ALMANZA ROJAS	1,116,504,316	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
11	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1,120,869,476	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
12	BELKIS ALICIA CONTRERAS	1,118,555,596	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	Belkis Contreras
13	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96,195,513	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	ROBERTO MELO
14	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1,116,785,943	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	Carlos Guillermo
15	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1,005,052,542	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	Jose niño
16	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1,007,678,527	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	Mario Mendez
Totales			29,563,575		27,871,034	3,736,425	2,632,901	315,948	2,632,901	1,162,222	38,351,431	1,114,841	1,114,841	2,229,683	36,121,749	

Neto pagado: $36,121,749

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Comprobante de Pago Nº:	

Observaciones:

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
FREDY ARLEY RIVAS- CONTADOR PUBLICO	CLAUDIA MEDINA MOLINA - RL CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	ANDRES FELIPE RIVERA ROMERO- REVISOR FISCAL

CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S.
NIT. 834001423-2
CTO DE OBRA 204 DE 2025



PERIODO DE PAGO:	MARZO 2026
01 AL 31	
Salario mínimo	1,750,905
Auxilio de transporte	249,095
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI

Item	Nombre del empleado	Devengado										Deducciones			Neto pagado	Firma del empleado
		Documento de Identidad	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Auxilio de transporte	Cesantias	Int. Cesantias	Prima SS	Vacaciones	Total devengado	Salud	Pensión	Total Deducciones		
1	CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA	68,302,258	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
2	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96,194,854	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
3	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARERA	1,090,486,148	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
4	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1,116,788,745	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	YENNY RODRIGUEZ
5	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96,191,205	1,750,905	30	1,750,905	249,095	166,600	19,992	166,600	73,013	2,426,205	70,036	70,036	140,072	2,286,132	
6	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52,528,857	1,800,000	30	1,800,000	249,095	170,690	20,483	170,690	75,060	2,486,017	72,000	72,000	144,000	2,342,017	LUISA TORRES
7	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1,192,735,776	1,800,000	30	1,800,000	249,095	170,690	20,483	170,690	75,060	2,486,017	72,000	72,000	144,000	2,342,017	Juan Gonzalez
Totales			**12,354,525**		**12,354,525**	**1,743,665**	**1,174,379**	**140,926**	**1,174,379**	**515,184**	**17,103,058**	**494,181**	**494,181**	**988,362**	**16,114,696**	

Neto pagado: $16,114,696

DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

Comprobante de Pago Nº:	

Observaciones:

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
FREDY ARLEY RIVAS CONTADOR PUBLICO	CLAUDIA MEDINA MOLINA - REL CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	ANDRES FELIPE RIVERA ROMERO- REVISOR FISCAL

6112

ANEXO 07. informe mensual 08 de seguridad y salud en el trabajo del periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

6414

INFORME MES 08 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

T.G ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas en el periodo del **01 al 31 de marzo del 2026** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de salud y seguridad ocupacional (Siso-Ambiental). Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra.

El PAGA basado en la legislación ambiental vigente, permite establecer metodologías y estrategias claras que apunten al crecimiento de la empresa en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, se adoptó medidas que protejan la integridad de la población, cumplimiento con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

ÁREA SOCIO - AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA..**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.

- ✓ Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

- ✓ Vigilar el debido cumplimiento por parte de la empresa contratista Diseño Absoluto del programa de Salud Ocupacional y a la reducción de incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentados en la ejecución del proyecto de **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**

- ✓ Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**

6417

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. CAPACITACIONES

Mantener incentivado al personal del Proyecto de **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** Ha sido la estrategia para que éste se empodere más de su trabajo y contribuya con el cumplimiento de las metas del **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** de manera productiva, a través de la disposición de su conocimiento, talento, habilidades y entusiasmo. Actividades relacionadas con la formación, capacitación, salud ocupacional, adecuación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna, entre otros;

Permitiera que el clima laboral sea de una manera adecuada, aunque deben emprenderse aún ejercicios innovadores que permitan que este ambiente también mejore en la dimensión de las relaciones frente al otro. La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de salud Ocupacional.

Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Salud Ocupacional, calidad y satisfacción.

2. MEDIDAS DE CONTROL


Según la matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos los siguientes son los riesgos significativos a los que estuvieron expuestos nuestros trabajadores al ejecutar las actividades descritas y las medidas de intervención tomadas para controlarlos:

- ✓ **Riesgo Vial:** Se realiza instalación de señalización preventiva al inicio, fin de la obra y diferentes frentes de trabajo, al interior se realiza instalación de señalización. Adicionalmente se realiza control de las vías por medio de paleteros cuya función es orientar y mitigar algún tipo de accidente dentro y fuera de la vía de acceso de la obra.

Registro fotográfico Señalización



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

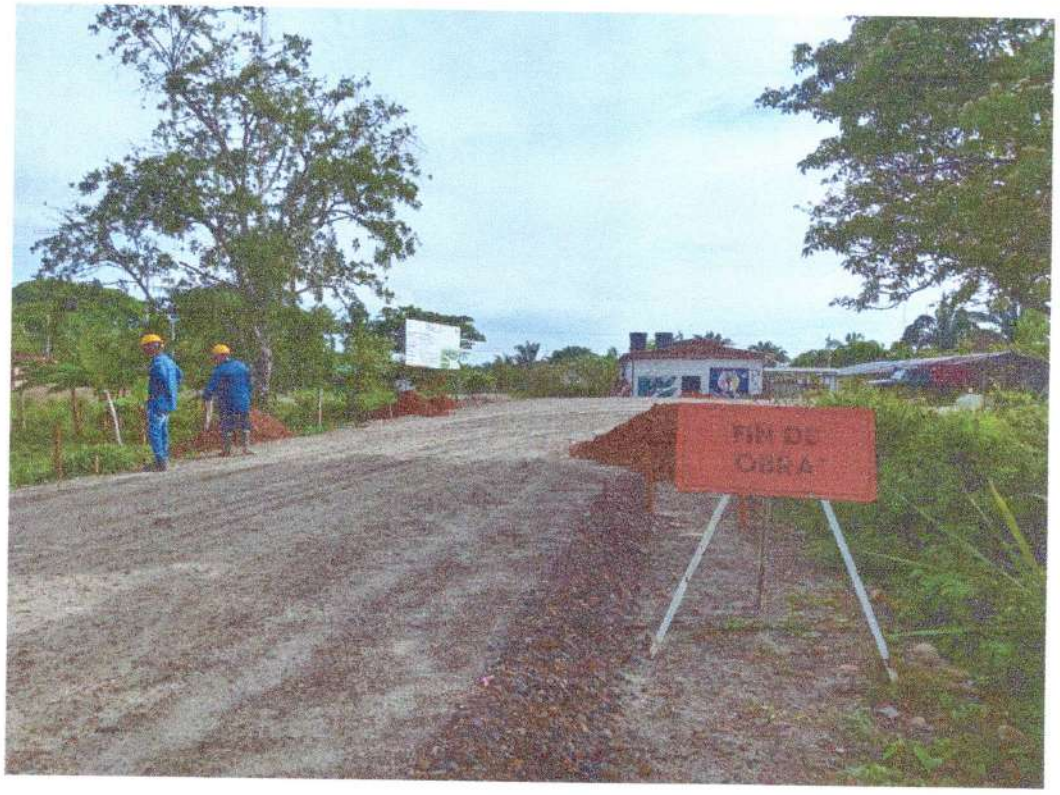



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

- ✓ **Riesgo mecánico por proyección de materiales:** durante operación de maquinara el personal estuvo ubicado a 3.5 mts del radio de operación de las maquinas, se ejecutan inspecciones pre operaciones de maquinaria, uso de elementos de protección personal tales como guantes, casco, botas de seguridad, gafas de seguridad.

Registro fotográfico uso de EPP





- ✓ **Riesgo Biomecánico por esfuerzo** (Sobreesfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos) se ejecuta programa de pausas activas y se cuenta con procedimiento estándar de levantamiento de cargas.

Registro fotográfico pausas activas.






Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



- ✓ **Riesgo físico por radiaciones no ionizantes:** se controla con pausas activas o descansos e hidratación constante.

Registro fotográfico Punto de Hidratación

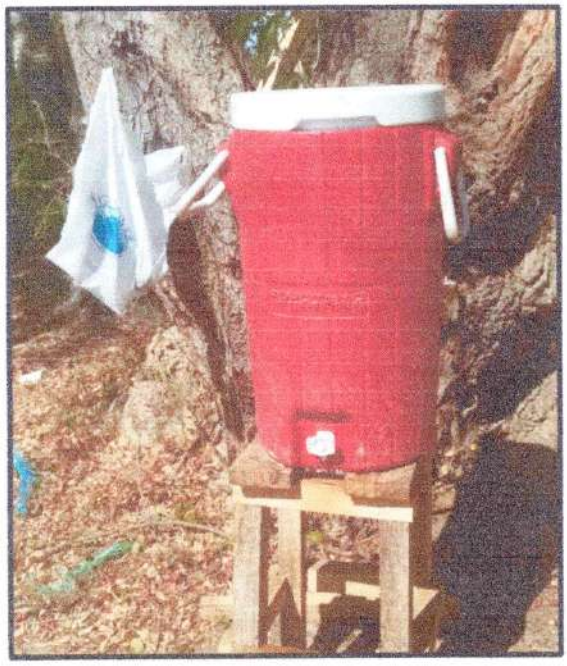



3. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

En la obra se encuentran operando 1 retroexcavadora en llantas, 1 mezcladora, 1 motobomba, vibro de concreto, etc.... el contratista de obra en conjunto con la firma de interventoría ha realizado evaluación periódica del registro de la maquinaria y equipos, se ha verificado la documentación tanto de la maquinaria como de los operarios. Se le solicitó al contratista presentar certificado de mantenimiento de equipos en centros debidamente autorizados. Se le recomendó al contratista que el transporte de la retroexcavadora en cama baja, o cualquiera de la maquinaria pesada que ellos utilizaron en el desarrollo de las obras, debe ser transportado en cama baja. Según lo establecido en la resolución 12335 de 2012 y la normativa Ley 769 de 2002 "Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, construcción y conservación de obras, que por sus características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público".

Registro fotográfico Manejo de Maquinaria y Equipo

La maquinaria y equipo que el contratista presento y utilizara durante el periodo de ejecución del contrato de obra 204 del 2025 es:

Tipo:	EXCAVADORA ORUGA
Marca:	JCB
Referencia:	JCBJS20DK71610150
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	BULDOZER
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	99J2260
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	CARRO TANQUE DE AGUA
Marca:	JAC
Referencia:	LJ11KDCD6
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	VIBROCOMPACTADOR
Marca:	INGERSOL RAND
Referencia:	196613
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	MOTONIVELADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	87V9822
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	COMPATADOR NEUMATICO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	T04039 D412972
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	CAMIÓN IRRIGADOR Y COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)
Marca:	MACK
Referencia:	VG6M117B7PB201 013
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	FINISHER
Marca:	CEDARAPIDS
Referencia:	48347
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO
Marca:	INGERSOLL RAND
Referencia:	143268
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	MEZCLADORA DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	1 BULTO MOTOR 10HP
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



Tipo:	VIBRO DE CONCRETO
Marca:	TOYAMA
Referencia:	TCW5
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	*NO PRESENTA*
Idoneidad de maquina:	*IDÓNEA*



REGISTRO FOTOGRAFICO DE MAQUINARIA EN OBRA









Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com







Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com



4. GESTIÓN SOCIAL

Es importante que la comunidad que se verá beneficiada con la obra de construcción de obra de protección, esté informada acerca de cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso constructivo, además de los elementos de señalización instalados, se elaboró una valla donde está la información del nombre del contrato, el monto y el ente contratante.

Registro fotográfico Valla Informativa



Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR-SAN JOAQUIN-PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

4.1 Socialización del proyecto

El 13/09/2025 se realizó la socialización del contrato de obra 204 del 2025 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR - SAN JOAQUÍN - PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, previa convocatoria realizada por el "CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025".

En dicha reunión participaron representantes de la Municipio de Tame, representantes de la ART, representantes de la firma contratista de la obra, representantes de la Interventoría externa y representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Municipio de Tame.

Registro fotográfico socialización del proyecto a la comunidad









ACOMPAÑAMIENTO DE VEEDORES A LA OBRA.

La firma contratista de obra en conjunto con la firma interventora ha contado con el acompañamiento de la comunidad en representación de sus veedores, estos han estado en control de recorrido y verificación de actividades de obra.





5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal se utilizaron como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa **CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025** el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un busca de un busca de un buen resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

Registro fotográfico Entrega de EPP





VERIFICACIÓN DE USO DE EPP EN OBRA

La firma contratista de obra ha realizado la entrega de dotación a todo el personal que ha ingresado en obra, de igualmente han realizado control y verificación de la misma del debido uso.





Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

6. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

La supervisión y seguimiento del contrato verificó la respectiva certificación del pago de la seguridad social, pensión del contratista y riesgos profesionales de las personas que laboran.

Al contratista da cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, es por esto que actualmente envían la documentación requerida y permanece en el archivo de la oficina. Esta documentación es revisada por la profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo por parte de la firma contratista de obra, para garantizar el estricto cumplimiento de este requerimiento contractual.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

El contratista utilizara mano de obra no calificada de la región con lo cual se generara empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de julio de 2025.

MES: JULIO DEL 2025												
Del 01/07/2025 AL 29/07/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X

4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL SST	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	7/07/2025	29/07/2025	23	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de septiembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DEL 2025												
Del 12/09/2025 AL 30/09/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X

7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		19	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		16	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		16	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		9	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		9	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
20	GORDILLO CHIQUINQUIRA	HUBER BAUTISTA	7.062.150	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
21	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
22	GUITIERREZ PAEZ	JOSE OCTAVIO	96.195.067	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
23	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X
24	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		2	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de octubre de 2025.

MES: OCTUBRE DEL 2025												
Del 01/10/2025 AL 31/10/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X

16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	GORDILLO CHIQUINQUIRA	HUBER BAUTISTA	7.062.150	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05/10/2025	05	X	X	X	X
21	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05/10/2025	05	X	X	X	X
22	GUITIERREZ PAEZ	JOSE OCTAVIO	96.195.067	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	05/10/2025	05	X	X	X	X
23	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
24	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
25	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		21	X	X	X	X
26	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		17	X	X	X	X
27	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		12	X	X	X	X
28	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		11	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de noviembre de 2025.

MES: NOVIEMBRE DEL 2025												
Del 01/11/2025 AL 30/11/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
21	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X

22	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
23	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
24	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		30	X	X	X	X
25	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
26	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		30	X	X	X	X
27	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.501,00	4/11/2025		26	X	X	X	X
28	GORDILLO CHIQUINQUIRA	JUAN EVER	96.194.386	AYUDANTE	$ 1.423.502,00	4/11/2025		26	X	X	X	X
29	GONZALEZ SARMIENTO	JUAN DAVID	1.007.436.848	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	8/11/2025		22	X	X	X	X
30	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.423.500,00	24/11/2025		7	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de diciembre de 2025.

MES: DICIEMBRE DEL 2025												
Del 01/12/2025 AL 31/12/2025												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
14	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.423.500,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
16	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
17	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
19	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	BOVELO GONZALO	ARISTOBULO	96.194.845	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	12/12/2025	12	X	X	X	X
21	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.423.500,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
22	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
23	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	15/10/2025		30	X	X	X	X
24	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
25	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.423.500,00	21/10/2025		30	X	X	X	X

26	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.423.501,00	4/11/2025		30	X	X	X	X
27	GORDILLO CHIQUINQUIRA	JUAN EVER	96.194.386	AYUDANTE	$ 1.423.502,00	4/11/2025		30	X	X	X	X
28	GONZALEZ SARMIENTO	JUAN DAVID	1.007.436.848	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	8/11/2025		30	X	X	X	X
29	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.423.500,00	24/11/2025		30	X	X	X	X
30	SANCHEZ GUACHE	LENAR GABRIEL	1.116.872.011	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/12/2025		30	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de enero de 2026.

MES: ENERO DEL 2026												
Del 01/01/2026 AL 31/01/2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	GONZALEZ PEREZ	JUAN CAMILO	11.192.735.776	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.750.905,00	13/01/2026		18	X	X	X	X
14	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.750.905,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
16	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
17	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
18	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
19	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
20	GIRALDO SARMIENTO	JESUS IVAN	17.546.035	MAESTRO DE OBRA	$ 1.750.905,00	29/09/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
21	LAYA MORENO	PEDRO JOSE	17.589.020	OFICIAL	$ 1.750.905,00	29/09/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
22	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
23	GONZALEZ GUTIERREZ	CAMILO JOSE	1.006.456.807	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	15/10/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
24	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.750.905,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
25	RODRIGUEZ CASTELLANOS	JOSE OBANDO	1.075.292	OFICIAL	$ 1.750.905,00	21/10/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
26	RODRIGUEZ SANABRIA	RENE ALEXANDER	74.862.000	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	4/11/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
27	GORDILLO CHIQUINQUIRA	JUAN EVER	96.194.386	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	4/11/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X
28	GONZALEZ SARMIENTO	JUAN DAVID	1.007.436.848	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	8/11/2025	15/01/20026	15	X	X	X	X
29	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.750.905,00	24/11/2025		30	X	X	X	X

30	SANCHEZ GUACHE	LENAR GABRIEL	1.116.872.011	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	1/12/2025	15/01/2026	15	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de febrero de 2026.

MES: FEBRERO DEL 2026												
Del 01/02/2026 AL 28/02/2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		28	X	X	X	X
13	GONZALEZ PEREZ	JUAN CAMILO	11.192.735.776	PALETERO	$ 1.800.000,00	13/01/2026		28	X	X	X	X

14	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.750.905,00	15/09/2025		28	X	X	X	X
15	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	15/09/2025		28	X	X	X	X
16	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.750.905,00	29/09/2025		28	X	X	X	X
17	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		28	X	X	X	X
18	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		28	X	X	X	X
19	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.750.905,00	29/09/2025		28	X	X	X	X
20	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	11/10/2025		28	X	X	X	X
21	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.750.905,00	20/10/2025		28	X	X	X	X
22	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.750.905,00	24/11/2025		28	X	X	X	X

Tabla. Personal administrativo y operativo del contrato de obra No. 204 de 2025 en el mes de marzo de 2026.

MES: MARZO DEL 2026												
Del 01/03/2026 AL 30/03/2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	CCF
1	MEDINA MOLINA	CLAUDIA PATRICIA	68.302.258	REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
2	MEDINA MOLINA	CARLOS CESAR	96.194.854	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
3	RINCON MEDRANO	JUAN DIEGO	1.090.469.003	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
4	NARANJO CORREDOR	ALBA LUCÍA	52.420.745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
5	MENDIETA CASTRO	ERIKA ELVIRA	1.128.388.541	PROFESIONAL ESPECIALISTA SST	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
6	MEDINA BARRERA	JORGE ALEJANDRO	1.090.486.148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X

7	SALGADO URIBE	GLORIA ALEXANDRA	1.026.284.946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
8	RIVAS QUENZA	FREDY ARLEY	1.116.778.461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
9	FONSECA VILLADA	PABEL ALEJANDRO	1.121.836.072	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.300.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
10	RODRIGUEZ TUPANTEVE	YENNY MILENA	1.116.788.745	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
11	MONTEALEGRE MADERO	DAGOBERTO	96.191.205	ADM. DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
12	TORRES NIÑO	LUISA FERNANDA	52.528.857	PALETERA	$ 1.800.000,00	12/09/2025		30	X	X	X	X
13	GONZALEZ PEREZ	JUAN CAMILO	11.192.735.776	PALETERO	$ 1.800.000,00	13/01/2026		30	X	X	X	X
14	RUIZ CABARICO	DANNY JAVIER	1.116.854.941	TOPOGRAFO	$ 1.750.905,00	15/09/2025		30	X	X	X	X
15	BENAVIDEZ MURCIA	ELIBARDO	91.247.775	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	15/09/2025	1/03/2026	1	X	X	X	X
16	MENDEZ ORTEGA	MARIO FELIPE	1.007.678.527	CADENERO 01	$ 1.750.905,00	2/03/2026		29	X	X	X	X
17	MORA RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL	74.347.917	CADENERO 02	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
18	ALMANZA ROJAS	RICARDO	1.116.504.316	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
19	ACHURY MAHECHA	CRISTIAN DAVID	1.120.869.476	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.750.905,00	22/09/2025		30	X	X	X	X
20	CONTRERAS MARTINEZ	BELKIS ALICIA	1.118.555.596	AUXILIAR SST	$ 1.750.905,00	29/09/2025		30	X	X	X	X
21	MELO PINEDA	ROBERTO JOSE	96.195.513	AYUDANTE	$ 1.750.905,00	11/10/2025		30	X	X	X	X
22	RAMIREZ RONDON	CARLOS GUILLERMO	1.116.785.943	CONDUCTOR	$ 1.750.905,00	20/10/2025		30	X	X	X	X
23	NIÑO RINCON	JOSE GREGORIO	1.005.052.542	OPERADOR	$ 1.750.905,00	24/11/2025		30	X	X	X	X

ANEXO 01. Planillas de seguridad social integral del periodo del 01 al 31 de marzo del 2026 y afiliación personal ingresado.

7. CHARLAS PREOPERACIONALES

En cuanto a educación en seguridad y salud en el trabajo se realizan inducciones al ingreso de personal, capacitaciones semanales de acuerdo a la Matriz de identificación de necesidades de capacitación por cargos y charlas pre operacionales diarias mediante análisis de trabajo seguro de cada actividad ejecutada.







Anexo 02: Reporte de lista de asistencia a charlas SST y charlas ambientales.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

8. EQUIPOS ANTE EMERGENCIAS

Equipos de respuesta ante emergencia, se realiza inspección mensual y se revisa que estén en buen estado.

Registro fotográfico equipos de Emergencia y señales SST.









8.1. CAPACITACIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA

La firma contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y de la Resolución 0312 de 2019, que define los estándares mínimos del SG-SST, a través de su profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó una jornada de capacitación y la implementación de los equipos de respuesta ante emergencias en la obra.

Dicha actividad estuvo dirigida al personal operativo y profesional vinculado al proyecto, con el propósito de fortalecer la preparación, prevención y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, dando cumplimiento a los estándares mínimos relacionados con capacitación, preparación y respuesta ante emergencias. La jornada contó con la verificación y seguimiento por parte de la interventoría externa.










Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

9. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Durante los periodos que estuvo en ejecución la obra, no se presentaron accidentes laborales, se manejó un plan de capacitaciones adecuado para la prevención y mitigación de cualquier clase de suceso en las labores diaria.

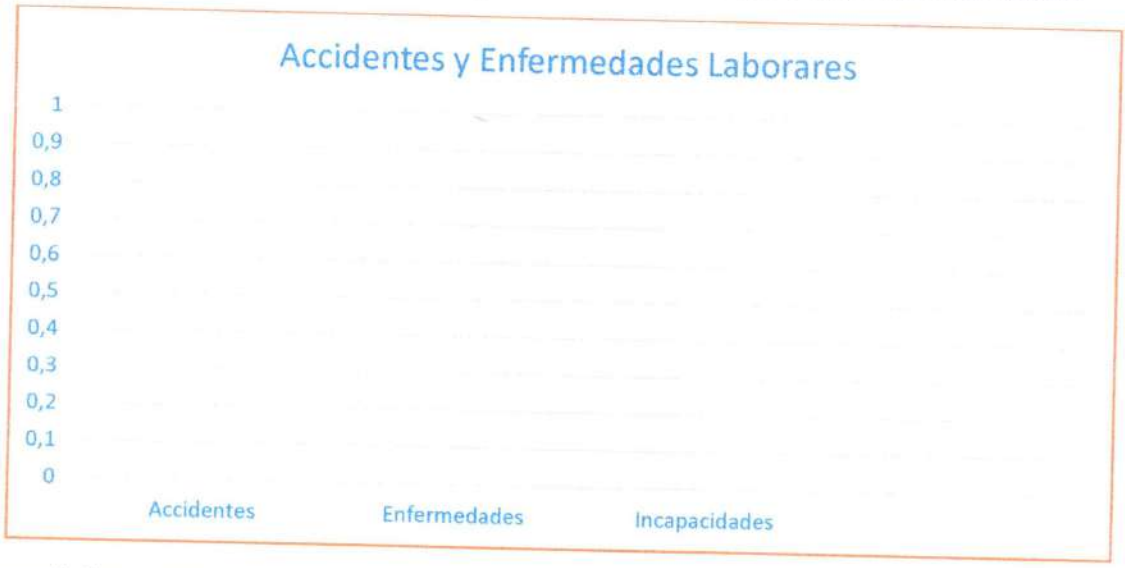

Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las empresas, más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. Se ha evidenciado que realizar capacitaciones en emergencias, autocuidado, higiene postural; la evaluación de riesgos de los lugares de trabajo, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, factores psicosociales, etc., disminuyen la accidentalidad y el ausentismo laboral lo cual redunda en tiempo productivo para la empresa.

Es necesario conocer dónde está el riesgo, lo cual se logra conociendo las condiciones laborales y ambientales en que se encuentran los trabajadores de la empresa a través de un Análisis de trabajo seguro; y la manera de hacer que estos sean mínimos, mejorando las condiciones de trabajo, aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina preventiva, formación y ergonomía, es decir, a través del programa de prevención.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el último semestre de vigencia 2019, se genera las siguientes recomendaciones, las cuales quedan a consideración del Grupo de Talento Humano, así:

- Se recomienda continuar con charlas de Seguridad y salud en el Trabajo, con la legislación vigente para aplicación y cumplimiento del SG-SST
- Se recomienda continuar con las pausas activas antes de empezar actividades laborales.
- Se recomienda continuar con la señalización de los diferentes puntos y tramos de la vía.

CONCLUSIONES

- Se evidencia que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa cuenta con una Política acorde al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, asimismo se resaltan las acciones de mejoramiento continuo implementadas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el compromiso con la adopción del PAGA basado en la legislación ambiental vigente Por otra parte se identifica que dicho Sistema vela por la seguridad de los trabajadores de la empresa y cuenta con mecanismos de prevención y mitigación de los posibles riesgos laborales que pudiesen presentarse al interior de la empresa

- Así mismo, se sugiere continuar con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordé con la nueva normatividad emitida por el Ministerio de Trabajo con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar a sus servidores, visitantes y contratistas a través de accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad.

ANEXOS

ANEXO 01. Planillas de seguridad social integral del periodo del 01 al 31 de marzo del 2026 y afiliación personal ingresado.

ANEXO 02: Reporte de lista de asistencia a charlas SST y charlas ambientales.

Elaborado por;

ERIKA MENDIATA

ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO
PROFESIONAL SST
CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

6460

ANEXO 01. Planillas de seguridad social integral del periodo del 01 al 31 de marzo de 2026 y afiliación personal ingresado.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:cpuertosansalvador@gmail.com
Medinaymadero01@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947891	9	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANSALVADOR	CARRERA 9 # 20 - 12	ARAUCA-ARAUCA	3114815501	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	9502775780	9502775780	E	2026/04/23	2026/04/10	BANCO DE BOGOTA	0	$8,501,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANSALVADOR (16 Afiliados)						$27,812,671	$4,450,900			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,823,700		$0	$0
Centro de Trabajo: SANSALVADOR2025 (15 Afiliados)						$26,061,766	$4,170,700			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,814,500		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (15 Afiliados)						$26,061,766	$4,170,700			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,043,400			$26,061,766	$1,814,500		$0	$0
1	CC	1120869476	ACHURY CRISTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1116504316	ALMANZA RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	91247775	BENAVIDES ELIBARDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
4	CC	1118555596	CONTRERAS BELKIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1121836072	FONSECA PABEL	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF67	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
6	CC	96195513	MELO ROBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1007678527	MENDEZ MARIO	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC24	29	$1,692,542	$67,800	CCF67	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
8	CC	1128388541	MENDIETA ERIKA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	74347917	MORA VICTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	52420745	NARANJO ALBA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1005052542	NIÑO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1116785943	RAMIREZ CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1090469003	RINCON JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1116854941	RUIZ DANNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1026284946	SALGADO GLORIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SANSALVADOR2025. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
16	CC	1116778461	RIVAS FREDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$27,812,671	$4,450,900			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,113,500			$27,812,671	$1,823,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,450,900	$0	$0	$4,450,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,049,900	$0	$0	$3,049,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,823,700	$0	$0	$1,823,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,823,700	$0	$0	$1,823,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,113,500	$0	$0	$1,113,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$142,600	$0	$0	$142,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$350,500	$0	$0	$350,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$482,500	$0	$0	$482,500
TOTAL				16	$8,501,600	$0	$0	$8,501,600

6962

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834001423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 9 N 20-12 BARRIO LAS AMERICAS	TELÉFONO:	8853133
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CORRECION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**1113558140**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			909014600

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.600	$ 0	$ 1.128.600
SUBTOTALES:										**$ 1.977.000**	**$ 0**	**$ 1.977.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 280.400
SUBTOTALES:													**$ 494.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 625.500	$ 625.500	$ 0	$ 0	$ 625.500
SUBTOTALES:									**$ 625.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	7	$ 494.500	$ 0	$ 494.500
SUBTOTALES:			**$ 494.500**	**$ 0**	**$ 494.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIORIO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VTP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090486148	MEDINA BARRERA JORGE ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 1.750.905	CCF67-COMFIAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116788745	RODRIGUEZ TUPANTEVE VENNY MILENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													01-3					230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 0	$ 1.750.905	CCF67-COMFIAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1192735776	GONZALEZ PEREZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	1	$ 125.300	$ 1.800.000	CCF67-COMFIAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 52528857	TORRES NIÑO LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000		$ 125.300	$ 1.800.000	CCF67-COMFIAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 88302258	MEDINA MOLINA CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	$ 1.750.905	CCF67-COMFIAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 96191205	MONTEALEGRE MADERO DAGOBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$ 1.750.905	CCF67-COMFIAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6463

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	834001423
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA Y MADERO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 9 N 20-12 BARRIO LAS AMERICAS	TELÉFONO:	8853133
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CORRECION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1113558140	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	909014800

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | |

6465

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.678.527**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Abril del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

6466

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que **MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA** identificado con **CC** No. **100767852**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901947891 CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	**Fecha de inicio de cobertura:** 02/03/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1007678527
NOMBRES	MARIO FELIPE
APELLIDOS	MENDEZ ORTEGA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ARAUCA
MUNICIPIO	TAME

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	COOSALUD EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	22/04/2025	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/06/2026 16:21:27	**Estación de origen:**	2a09:bac5:6d70:aa::11:1cb

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

6068

CERTIFICACIÓN No. 5241609 de 2026-03-07

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1007678527, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estadoes A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

Pedro A Parada

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalización

6469

ANEXO 02: Reporte de lista de asistencia a charlas SST y charlas ambientales.

Carrera 9 no. 20-12 Barrio Américas
Teléfono: 3114815501
Email:*cpuertosansalvador@gmail.com*
Medinaymadero01@hotmail.com

6470

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR	FIRMA	EMPRESA
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	E.E.F.A MENDIETA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA Resbalones, Tropiezos y Caídas

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NUMERO DE PARTICIPANTES
03/03/2026	U. San Salvador	7:00	7 25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUX. CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

6471

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR	FIRMA	EMPRESA
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	Erika Mendieta	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA Resbalones, Tropiezos y Caídos

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES
03/03/2026	V San Salvador	7:00	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	Juan González
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Día 2-7

6472

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIC AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR	FIRMA	EMPRESA
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	ERIKA MENDIETA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Levantamiento Manual de Cargas

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NUMERO DE PARTICIPANTES
13/03/2026	U. San Salvador	7:00	7:15	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUX. CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

6473

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR	FIRMA	EMPRESA
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	ERIKA MENDIETA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Levantamiento Manual de Cargas.

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NUMERO DE PARTICIPANTES
13/03/2026	V. San Salvador	7:00	7:15	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	JuanGonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

D.S. 2.2

6474

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	Erika Mendieta	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Uso adecuado de extintor

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
19/03/2026	V/ San Salvador	7:15	7:30	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	Pabel Fonseca
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUXILIAR CONTABLE	Yenny Rodriguez
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	Luisa Torres
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	Danny Ruiz
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	Mario Mendez
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

Pag 1-2

6475

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	Erika Mendieta	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Uso adecuado de extintor

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
19/03/2026	U/ San Salvador	7:15	7:30	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	Juan Gonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	EGIFA MENDIETA	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Uso de elementos de Protección Personal

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
31/03/2026	V/ San Salvador	7:10	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUXILIAR CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	Mario Mendez
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

6477

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS _____
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	ERIKA MENDIETA.	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Uso de elementos de protección personal.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
31/03/2026	U/San Salvador	7:10	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	Juan Gonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

6478

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO

FIRMA: EF.FA MENDIETA

EMPRESA: CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Resbalones, Tropiezos y Caídas

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NUMERO DE PARTICIPANTES
03/03/2026	U. San Salvador	7:00	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUX. CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

6479

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR	FIRMA	EMPRESA
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	Erika Mendieta	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA Resbalones, Tropiezos y Caídas

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES
03/03/2026	V San Salvador	7:00	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	Juan González
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Día 2-7

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.

CODIGO: SST-FO-05
VERSIÓN: 4.0
FECHA: JULIO DE 2025
PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS
☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO
FIRMA: ERIKA MENDIETA
EMPRESA: CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Levantamiento Manual de Cargas

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NUMERO DE PARTICIPANTES
13/03/2026	U. San Salvador	7:00	7:15	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUX. CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

6481

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: JULIO DE 2025 PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION ☐ OTROS

☒ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO — FIRMA: ERIFA MENDIETA — EMPRESA: CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Levantamiento Manual de Cargas.

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA FINAL	NUMERO DE PARTICIPANTES
13/03/2026	V. San Salvador	7:00	7:15	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	JuanGonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

D.. 7.7

6482

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	Erika Mendieta	CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Uso adecuado de extintor

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
19/03/2026	V/ San Salvador	7:15	7:30	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUXILIAR CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	Mario Mendez
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	ERIKA MENDIETA	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA: Uso adecuado de extintor

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
19/03/2026	U/ San Salvador	7:15	7:30	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	Juan Gonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

6484

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	EEIFA MENDIETA	**CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025**

TEMA: Uso de elementos de Protección Personal

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
31/03/2026	V/ San Salvador	7:10	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CC	CARGO	FIRMA
1	CARLOS CESAR MEDINA MOLINA	96194854	DIRECTOR DE OBRA	
2	JUAN DIEGO RINCON MEDRANO	1090469003	ESPECIALISTA EN VIAS	
3	ALBA LUCÍA NARANJO CORREDOR	52420745	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
4	JORGE ALEJANDRO MEDINA BARRERA	1090486148	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
5	GLORIA ALEXANDRA SALGADO URIBE	1026284946	PROFESIONAL DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA	
6	FREDY ARLEY RIVAS QUENZA	1116778461	PROFESIONAL EN CONTADURÍA	
7	PABEL ALEJANDRO FONSECA VILLADA	1121836072	PROFESIONAL AMBIENTAL	PABEL FONSECA
8	YENNY MILENA RODRIGUEZ TUPANTEVE	1116788745	AUXILIAR CONTABLE	YENNY RODRIGUEZ
9	DAGOBERTO MONTEALEGRE MADERO	96191205	ADM. DE MAQUINARIA	
10	LUISA FERNANDA TORRES NIÑO	52528857	PALETERA	LUISA TORRES
11	DANNY JAVIER RUIZ CABARICO	1116854941	TOPOGRAFO	DANNY RUIZ
12	MARIO FELIPE MENDEZ ORTEGA	1007678527	CADENERO 1	Mario Mendez
13	RICARDO ALMANZA ROJAS	1116504316	OPERADOR DE MAQUINARIA	Ricardo almanza
14	CRISTIAN DAVID ACHURY MAHECHA	1120869476	OPERADOR DE MAQUINARIA	Cristian achury
15	VICTOR MANUEL MORA RODRIGUEZ	74347917	CADENERO 2	

6485

CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES, CHARLAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN OBRA.	CODIGO: SST-FO-05
		VERSIÓN: 4.0
		FECHA: JULIO DE 2025
		PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE INDUCCION / REINDUCCION	☐ OTROS _____
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: ERIKA ELVIRA MENDIETA CASTRO	FIRMA: ERIKA MENDIETA.	EMPRESA: CONSORCIO PUERTO SAN SALVADOR 2025

TEMA: Uso de elementos de Protección Personal.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
31/03/2026	V/ San Salvador	7:10	7:25	20

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CC	CARGO	FIRMA
1	BELKIS ALICIA CONTRERAS MARTINEZ	1118555596	AUXILIAR SST	Belkis Contreras
2	ROBERTO JOSE MELO PINEDA	96195513	AYUDANTE	Roberto Melo
3	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RONDON	1116785943	CONDUCTOR	Carlos Guillermo R
4	JOSE GREGORIO NIÑO RINCON	1005052542	OPERADOR	JOSE NIÑO
5	JUAN CAMILO GONZALEZ PEREZ	1192735776	PALETERO	Juan Gonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Pag 2-2
