GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

GOBERNACIÓN DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
0291
04 JUN 2026
Recibido: Dr 20

Valledupar, 3 de Junio 2026

PARA: Jorge Armando Maestre, secretario de infraestructura

DE: Jorge Mario Blanco Pérez, Profesional Especializado-Supervisor

ASUNTO: Entrega de documentos CONTRATO DE OBRA No 2024040001 CUYO OBJETO ES EL **CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

Por medio de la presente, me permito remitir documento referente al informe mensual de supervisión #14 y #15 del periodo comprendido del **01 Febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026**

La documentación abarca la siguiente información:
1. Informe Mensual **#2**

JORGE MARIO BLANCO PEREZ
Profesional Especializado
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: Carolina Monsalvo Baute

INFORME N° : 15	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: Marzo 2026	**DESDE: 01 / 03 / 2026 HASTA 31 / 03 / 2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2024002200075**
Nombre del proyecto	**CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**
Valor total del proyecto	**$46.952.217.242,38**
Valor del proyecto antes de Interventoría	**$44.663.876.131,22**
Valor de la Interventoría	**$2.288.341.111,56**
Fuente de financiación	**SGPR-RECURSOS PROPIOS**
Objetivo general del proyecto	**Mejorar la intercomunicación terrestre de diferentes centros poblados en diferentes sectores del Departamento del Cesar**
Producto (s) por entregar con el proyecto	**El proyecto contempla la construcción de un total de 10 puentes vehiculares repartidos en 4 tramos viales que sirven de conexión a diferentes centros poblados del Departamento del Cesar.**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACION DE OBRA PUBLICA
No. de proceso de selección	LOP-SIN-0001-2024
No. de contrato	2024 04 0001
Objeto	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO CONEXIONES ELEVADAS
NIT	901.880.443-2
Representante legal	FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
Valor inicial del contrato	$31.938.798.947,00
Valor anticipo del contrato	$9.581.639.684,10
Valor adicional 01 del contrato	$15.013.418.295,38
Valor adicional 02 del contrato	
Valor actualizado del contrato	$46.952.217.242,38

Fecha de inicio	09 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de reinicio No. 001	
Fecha de suspensión No. 002	
Fecha de reinicio No. 002	
Fecha de terminación inicial	08 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación actualizada	08 DE ABRIL 2026
Plazo inicial del contrato	
Prorroga 1	4 MESES
Prorroga 2	
Plazo del actualizado del contrato	16 MESES
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	JORGE MARIO BLANCO PEREZ
	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO SUPERVISION ENLACES 0003
NIT	901891689-4
Representante legal	MERY YEN CAROLINA OSPINO
Cedula representante legal	1044908415
Supervisor técnico	JORGE MARIO BALNCO PEREZ
	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor financiero	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

ACTUALIZACION DE GARANTIAS – Actualización de póliza Adición 1 -OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO		**VIGENCIA DE GARANTIAS**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1058972	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 14.085.665.172,90	26/06/2025	11/04/2026
	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	$ 14.085.665.172,90	26/06/2025	11/04/2026
	PAGO DE SALARIOS	$ 2.347.610.862,15	26/06/2025	9/12/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 14.085.665.172,90	9/12/2025	9/12/2030

ACTUALIZACION DE GARANTIAS – Actualización de póliza Adición 1 - RCE – OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO		**VIGENCIA DE GARANTIAS**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1013895	AMPARO BÁSICO, PREDIOS Y LABORES	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	PATRONAL	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	GASTOS MÉDICOS	$ 1.596.939.947,00	9/12/2025	9/12/2025

ACTUALIZACIONDE GARANTIAS – ACTA DE INICIO- INTERVENTORIA

Casa aseguradora		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
75-44-101141307	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$228.834.111,16	9/12/2024	8/04/2026
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$915.336.444,62	9/12/2024	8/04/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$686.502.333,47	9/12/2025	9/12/2030
	PAGO DE SALRIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$228.834.111,16	9/12/2025	9/12/2028

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP REGALIAS					
# CDP	1624	VALOR	$32.690.587.313,82	FECHA	03/09/2024
# CDP	18425	VALOR	$14.261.629.928,55	FECHA	07/02/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	20024	VALOR	$36.618.789.191,55	FECHA	06/11/2024
N° RP	17725	VALOR	$22.357.159.263,00	FECHA	07/02/2025

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	1724	VALOR	$2.228.341.111,97	FECHA	3/09/2024

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	21324	VALOR	$2.228.341.111,56	FECHA	2/12/2024

6. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO


OBRA


Acta 1	$ 8.107.005.596,00	17,27%	$ 2.432.101.378,80	$ 5.674.903.917,00	1,92	43	13/03/2025
Acta 2	$ 4.370.560.680,10	9,31%	$ 1.311.168.204,03	$ 3.059.392.476,00	6,792	172,00	28/05/2025
Acta 3	$ 11.532.304.934,00	24,56%	$ 3.459.691.480,20	$ 8.072.613.453,00	9905	238	9/07/2025
Acta 4	$ 7.984.911.894,73	17,01%	$ 2.395.473.568,42	$ 5.589.438.326,31	16371	975	25/09/2025
Acta 5	$ 5.309.556.627,21	11,31%	$ 1.592.866.988,16	$ 3.716.689.639,05	23578	1641	15/12/2025
Total	$ 37.304.339.732,04		$ 9.598.434.631,45	$ 26.113.037.811,36			

INTERVENTORIA

	Interventoría				No orden de pago	Comprobante de egreso	
	Valor ($) Acta Pago	Porcentaje(%) Acta de Pago	Valor Amortizado	Valor ($) por cobrar		N°	Fecha
Anticipo	$ 915.336.444,62	40%		$ 1.373.004.666,94			
Anticipo adición	$ 1.345.607.130,18	40%					
Acta 1	$ 580.848.209,97	17,27	$ 232.339.283,99	$ 348.508.925,98	6492	179	21/05/2025
Acta 2	$ 313.140.569,29	9,31	$ 125.256.227,71	$ 187.884.341,58	8402	221	20/06/2025
Acta 3	$ 342.215.054,80	10,17	$ 136.886.021,92	$ 205.329.032,88	10794	610	22/07/2025
Acta 4	$ 400.763.578,54	11,91	$ 160.305.431,42	$ 240.458.147,12	16581	1003	1/10/2025
Acta 5	$ 1.035.802.331,03	30,79	$ 260.549.479,58	$ 775.252.851,45	23920	1739	18/12/2025
Total	$ 2.672.769.743,63		$ 915.336.444,62	$ 1.757.433.299,01			

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS

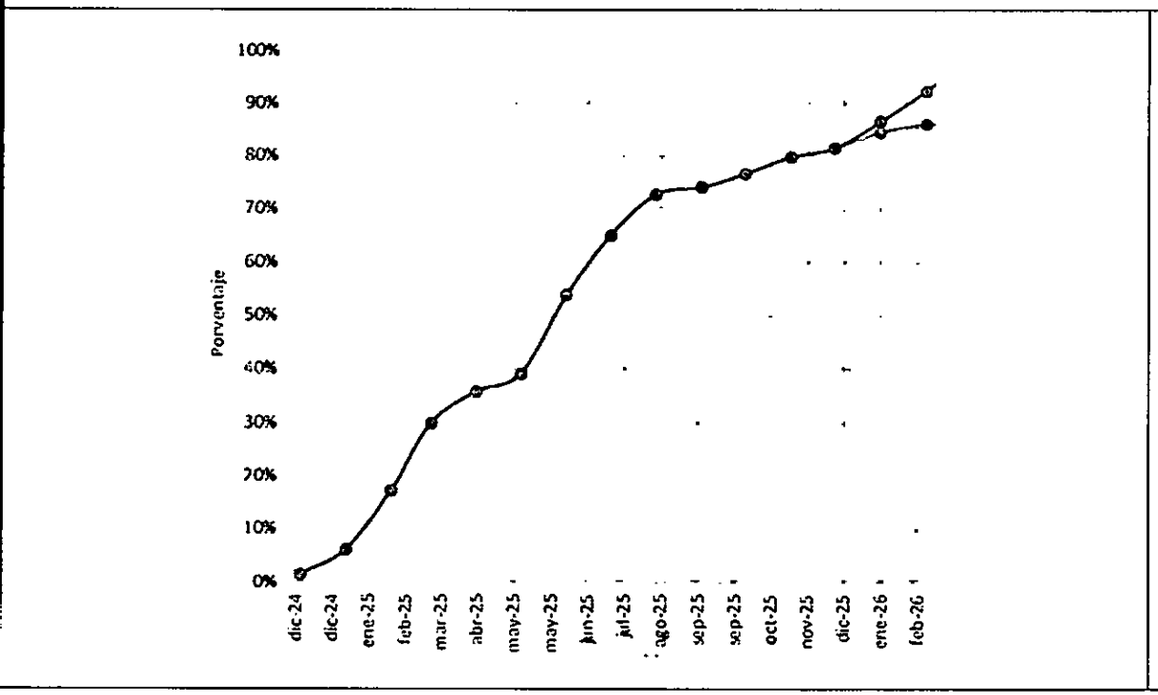

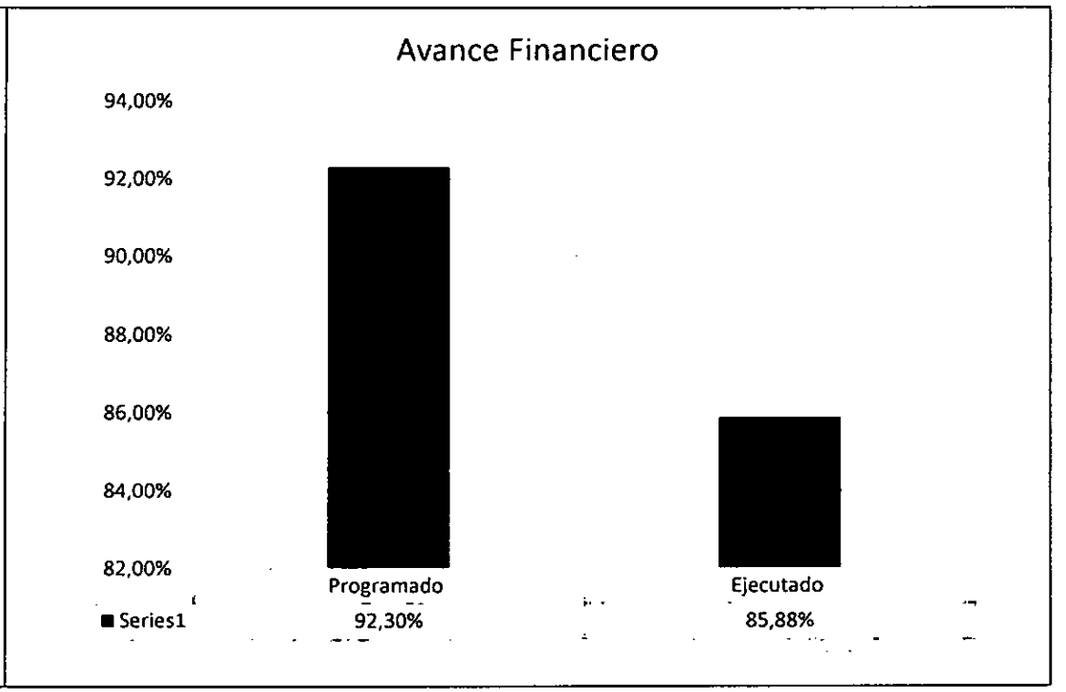


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES





Ubicación: Puente Morrison-Pitalimon, Fuente interventoría



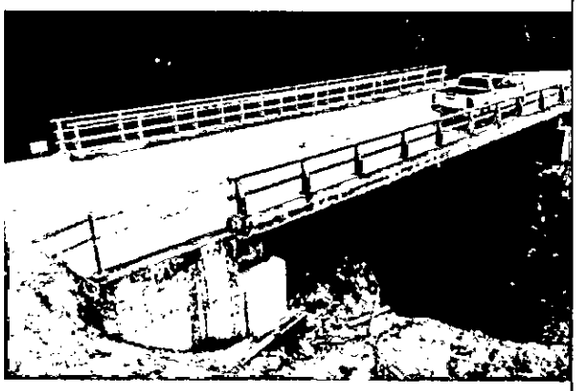

Ubicación: Tamalameque – Pelaya, Fuente interventoría

9. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES

Las actividades que se realizaron en el presente mes se encuentran relacionadas a fabricación de estructura metálica en acero A36 para elementos complementarios y de conexión, instalación de masterdeck calibre 20 para las losas del tablero metálico e instalación de apoyos elastoméricos reforzados en almohadillas en almohadillas de 300 mm × 300 mm × 74 mm realizados en el puente Tamalameque - Pelaya

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Por medio de los avances evidenciados en obra se puedo determinar que en el mes de febrero se presentó un avance ejecutado del 85,88 % con diferencia al avance programado que se encuentra en 92,30 % considerando un atraso de 6,42 % en el contrato de obra.

- **Se recomienda al contratista y a la interventoría externa tener estricto control en la programación debido a que se evidencian altos porcentajes de atrasos.**

- **Se solicita a la interventoría y al contratista tomar las medidas de plan de contingencia en los puentes de Morrison – Pitalimon por bajos porcentajes de ejecución.**
- **Garantizar el cumplimiento en la entrega de los informes semanales y mensuales por parte de la interventoría externa.**
- **Se requiere al contratista e interventoría utilizar los materiales, con calidades y ensayos que corresponde acorde a la especificaciones**

Supervisor

Jorge Mario Pérez Blanco
Profesional Especialista

Elaboró:	Miller González Zuleta - Profesional Universitario, Secretaria de Infraestructura
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	
