CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4502-2025

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES - SOTOMAYOR."

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Desde el 28 de octubre de 2025 hasta el 22 de diciembre del 2025

San Juan de Pasto, 2 junio de 2026

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2.1 FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA

FECHA DE PRESENTACION:	6/2/2026	CON CORTE :	12/22/2025

DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA:				
CONVENIO MACRO No:	N.A			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	4502-2025			
CDP DEPARTAMENTO No.:	2025010409	FECHA:	1/23/2025	$ 250,000,000.00
REGISTRO No:	2025091436	FECHA:	9/24/2025	$ 250,000,000.00
CDP MUNICIPIO No:	2025000846	FECHA:	9/10/2025	$1,000,000.00
OBJETO DEL CONVENIO :	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES - SOTOMAYOR."			
MUNICIPIO :	LOS ANDES - SOTOMAYOR			
SUPERVISOR	ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE			
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	ING. MARIO FERNANDO ZUTTA AREVALO			
META FISICA	Mantenimiento de la vía con una longitud de 1791,64 ML			
VALOR DEL CONVENIO:	$ 250,793,944.81			
VALOR ADICIONAL	N-A			
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 250,793,944.81			
APORTES DEPARTAMENTO:	$ 250,000,000.00			
APORTES MUNICIPIO	$ 793,944.81			
FECHA DE INICIACION:	10/28/2025			

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO :	TRES (03) MESES			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/28/2026			
FECHA DE TERMINACION FINAL:	12/22/2025			
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	N-A			
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No 1	N-A			
MODIFICATORIO No. 1:	N-A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MOD No 1:	N-A			
PORCENTAJE ANTICIPO	40%			
GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Póliza No.:	775-47-994000002811			
% AVANCE FISICO	100.00%		% EJECUTADO:	100.00%
% AVANCE FINANCIERO	40.00%		% EJECUTADO	40.00%
META FISICA A LA FECHA	100.00%			

ASPECTOS FINANCIEROS: El Mantenimiento vial que se ejecuta en el Municipio de Los Andes DEPARTAMENTO DE NARIÑO, se ejecuta bajo los lineamientos del convenio Interadministrativo No GN4502-2025 suscrito el 24 de septiembre de 2025, el cual se denomina: Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES -SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES - SOTOMAYOR", por un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($250.793.944,81) M/CTE El valor total de este proyecto son los recursos propios aportados por el Departamento sumado al aporte de recursos por parte del Municipio de Los Andes Nariño, Después de concluido el proceso de selección del contratista para la ejecución del proyecto. Se efectuó inicialmente el desembolso del 40% del anticipo y los pagos se efectuaron mediante la presentación de actas parciales y final de avance de obra debidamente avaladas por el Municipio y firmadas y revisadas por las partes.

EJECUCION

El convenio derivado se ejecutó y finalizo antes de finalizar el plazo estipulado. El Convenio finalizó el 22 de diciembre del 2025.

Se realiza una descripción general de cada uno de los capítulos y actividades importantes del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS CON EL CONTRATO CS – 002 - 2025

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES

Objetivo: Mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía mediante la conformación de calzada y suministro de material de recebo en suelo existente.

Materiales:
Recebo

Método de Ejecución:
- Conformación de calzada.
- Suministro de material de recebo.

Control de Calidad:

- Verificación de la preparación y estructuración de la superficie, para la extensión y nivelación del material de recebo sobre la vía con la motoniveladora.
- Inspección del transporte y la instalación del granular

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el presente informe:

INFORMACIÓN FINANCIERA

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4502-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE LOS ANDES.

DESCRIPCIÓN	VALOR
APORTE DEL DEPARTAMENTO	$250.000.000,00
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 793.944,81
VALOR DEL CONVENIO	$250.793.944,81

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. CS – 002 – 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS ANDES Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LOMA.

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$252.793.944,81
APORTE DEL DEPARTAMENTO	$250.000.000,00
VALOR ANTICIPO	$100.000.000.00
VALOR EJECUTADO	$250.793.944,81
SALDO PENDIENTE	$150.793.944,81

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

CONCLUSIONES

• El contratista cumplió a cabalidad con todos los compromisos contractuales, además el rendimiento de las actividades fue el más óptimo.

• Las labores de ejecución se completaron el 22 de diciembre de 2025, conforme al cronograma actualizado.

• La ejecución del convenio se realizó en su totalidad, la ejecución es del 100%.

• El contratista ha cumplido con las normas de seguridad y salud en el trabajo, además de la dotación de elementos de protección personal a los trabajadores en sitio.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con este informe final y los demás documentos entregados por el Municipio que soporta la ejecución del Mantenimiento vial, se procederá a iniciar con el trámite del respectivo pago del acta final del convenio, para posteriormente proceder con la liquidación del convenio en mención. El avance final del convenio es del 100,00%.

Proyecto: Ing. Mario Fernando Zutta Arévalo
Contratista - SIMD
Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

Aprobó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Limpieza de vía

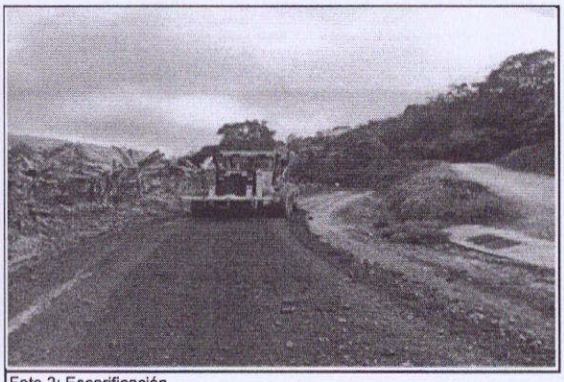


Foto 2: Escarificación

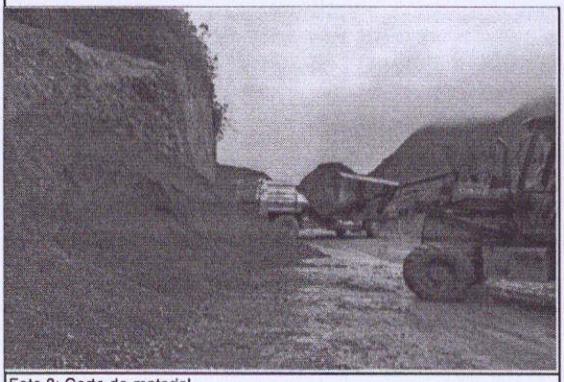


Foto 3: Corte de material



Foto 4: Transporte de material

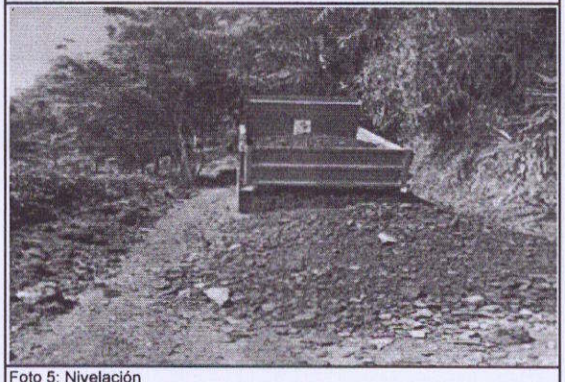


Foto 5: Nivelación

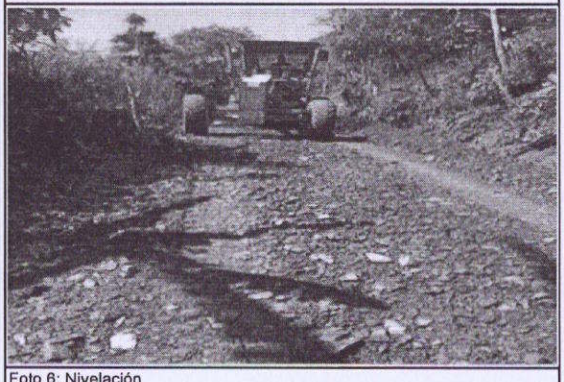


Foto 6: Nivelación

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6.1. INFORME FINANCIERO CONVENIO

CONTRATO OBRA No.:	GN4502-2025
VALOR CONVENIO	$ 250,793,944.81
PAGO ANTICIPO	$ 100,000,000.00
PAGO FINAL	$ 150,000,000.00
VALOR EJECUTADO	$ 250,793,944.81
TOTAL APORTE GOBERNACION	$ 250,000,000.00
TOTAL APORTE MUNICIPIO	$ 793,944.81
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO 40%	4/14/2026	$ 100,000,000.00			$ 100,000,000.00	$ 100,000,000.00	$ 0.00	2026004191	4/22/2026
Acta Final		$ 150,000,000.00	$ 250,000,000.00	$ 100,000,000.00				SIN PAGAR	
TOTAL		**$ 250,000,000.00**	**$ 250,000,000.00**	**$ 100,000,000.00**	**$ 100,000,000.00**		**$ -**		

AVANCE FISICO	100.00%
AVANCE FINANCIERO	40.00%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7.1 CONTROL POLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No 4502-2025

GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza No.:	775-47-994000002811

ANEXO 0	**FECHA APROBACION**	10/27/2025	**FECHA EXPEDICION**	10/10/2025	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	**$ 25,079,394.48**	10%	**9/24/2025**	**6/24/2026**	CONTRATO	21
Buen manejo del anticipo	**$ 100,000,000.00**	40%	**9/24/2025**	**6/24/2026**	CONTRATO	21
ANEXO 1			**FECHA APROBACION**	12/24/2025	**FECHA EXPEDICION**	10/31/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	**$ 25,079,394.48**	10%	**10/28/2025**	**7/28/2026**	CONTRATO	55
Buen manejo del anticipo	**$ 100,000,000.00**	40%	**10/28/2025**	**7/28/2026**	CONTRATO	55

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (AVANCE)

CONVENIO No.: GN4502 - 2025

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	UND	CANT	VR UNITARIO	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	% ejecutado
		1. MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES							
	1.1	Conformación de Calzada	UND	1.00	$ 15,409,806.06	$ 15,409,806.06	$ 15,409,806.06	$ -	100.00%
	1.2	Afirmado	UND	1.00	$ 176,035,953.33	$ 176,035,953.33	$ 176,035,953.33	$ -	100.00%
						-			
		COSTO DIRECTO				$ 191,445,759.39	$ 191,445,759.39	$ -	100.00%
		COSTOS INDIRECTOS				$ 59,348,185.42	$ 59,348,185.42	$ -	
		COSTO TOTAL				$ 250,793,944.81	$ 250,793,944.81	$ -	100.00%

