
REGISTRO FOTOGRAFICO

1. Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza y transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.







2. Colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

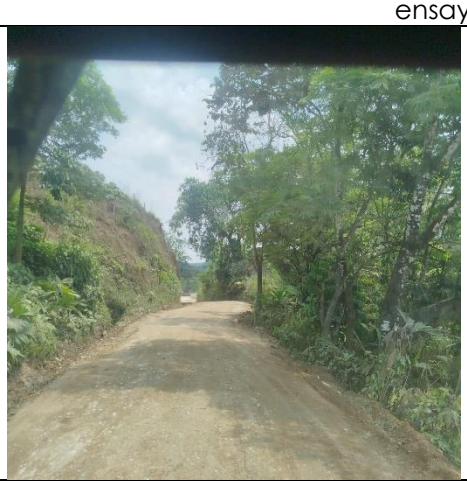



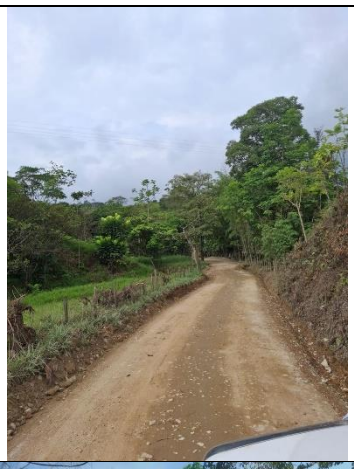






REDMI NOTE 13
31/03/2026 14:51



REDMI NOTE 13
31/03/2026 14:59

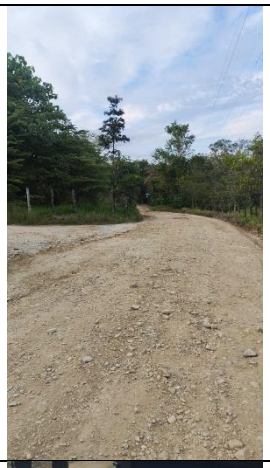







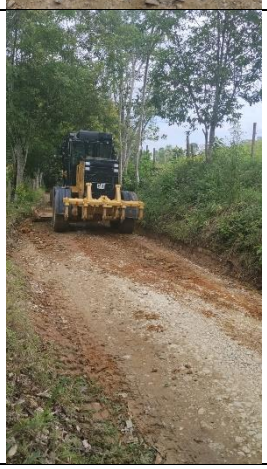

3. Transporte de material de afirmado para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Incluye 30% de expansión.













4. Rocería. Incluye cargue, transporte y disposición adecuada de material resultante.





	
5. Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	
	
