GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**8**	FECHA:	**2**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**6**	de	**JULIO**	de	**2025**	AL	**5**	de	**AGOSTO**	de	**2025**

CONVENIO No:	**2579**	DE	**2024**	BPIN No.	**2024004150149**

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACIÓN:

IZA - BOYACA

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

IZA	**BOYACA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ Teléfono: **310 2550952** Dirección **CALLE 3 No. 3 - 86 IZA**	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 75,000,000.00	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 75,000,000.00**

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CIAD-003-2025	29/04/2025	
Aviso de Convocatoria o Invitación	29/04/2025	
Estudios Previos	Abril del 2025	
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación	29/04/2025	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
ALCALDIA DE IZA		**$205.675.459**	
OBJETO:			
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA - BOYACÁ			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Empresa de Renovación e infraestructura de Sogamoso - ERI S.A.S		**JUAN MANUEL PEREZ FONSECA**	
Teléfono: 3103155996	Dirección: CRA 15 No. 10-08	Teléfono: 3103155996	Dirección: CRA 15 No. 10-08

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0.00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	19	9	2024	29	4	2025			
PLAZO INICIAL	3 MESES			1 MES					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	18	12	2024	29	5	2025			
ADICIONES EN PLAZO	6 MESES			2 MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	18	9	2025	28	7	2025			

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**84.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**84.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90.0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**100.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**100.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0.0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0.0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el periodo correspondiente al Informe No. 08 se realizo la evaluación correspondiente a las actividades ejecutadas para instalar la mezcla asfaltica en caliente, en donde se llevó a cabo una revisión detallada del comportamiento de la mezcla asfáltica en caliente previamente instalada en el tramo intervenido correspondiente a la calle 4 entre carreras 4 y 5 del municipio de Iza.
Las inspecciones técnicas incluyeron la verificación de parámetros de uniformidad superficial, compactación, textura, adherencia y adecuación del espesor colocado, con base en los criterios establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.
Como resultado de estas actividades, se constató que la mezcla asfáltica presenta un desempeño óptimo, evidenciando excelente estado de conservación y cumplimiento de los estándares de calidad previstos. No se observaron deformaciones, fisuras, desprendimientos ni manifestaciones que indiquen fallas prematuras del material. Asimismo, la superficie mantiene una adecuada regularidad y las propiedades mecánicas evaluadas corresponden a los resultados esperados.
Adicionalmente, en este periodo se procedió a la elaboración y suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción de la obra, en la cual se dejó constancia de que los trabajos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos de calidad establecidos.

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	19	9	2024	
Acta de suspension	6	12	2024	
Acta de reiniciacion	6	3	2025	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	4	2025	
Prorroga 01	29	5	2025	
Informe de actividades	28	7	2025	
Informe de supervisor	28	7	2025	
Acta de recibo a satisfaccion	28	7	2025	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	51-44-101029949 51-40-101010086	ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB.	dd mm aa 16/05/2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	16	5	2025	20	10	2025	$19.968.491,20
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	16	5	2025	20	6	2028	$9.984.245,60
Estabilidad y calidad de obra.	20	6	2025	20	6	2030	$19.968.491,20
Predios, labores y predios	16	5	2025	20	6	2025	$ 248.700
Daño emergente y lucro cesante	16	5	2025	20	6	2025	284.700,00
Perjuicios extrapatrimoniales	16	5	2025	20	6	2025	$284.700,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd mm aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prórroga N°. 01 al convenio Interadministrativo No. 2579 DE 2024	0	6 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	9 MESES
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prorroga No. 01	0	2 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	3 MESES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	391-820271	BANCO:	Banco de occidente	SUCURSAL:		
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE IZA CONVENIO 2579 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO VIAL URBANO					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.		90%	26	9	2024	$67.500.000
Desembolso No 2.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						**$67.500.000**
CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo						
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo						
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Etapa de evaluacion y revision tecnica posterior a la instalacion de Mezcla asfaltica MDC-19 en caliente	Km0 a Km0+113,5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité seguimiento de obra	13	6	2025	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	19	9	2024	18	10	2024	
Informe de Supervisión No. 2	19	10	2024	18	11	2024	
Informe de Supervisión No. 3	19	11	2024	6	12	2024	
Informe de Supervisión No. 4	6	3	2025	5	4	2025	
Informe de Supervisión No. 5	6	4	2025	5	5	2025	
Informe de Supervisión No. 6	6	5	2025	5	6	2025	
Informe de supervision No. 7	6	6	2025	5	7	2025	
Informe de supervision No. 8	6	7	2025	5	8	2025	

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de informes de interventoria presentadas al municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	SI	9 - 80
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	NO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	81-82
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	YA SE RADICO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	YA SE RADICO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	YA SE RADICO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	NO	

Generales		
Registro fotográfico	YA SE RADICO	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS

NOMBRE:	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ

Gobernación de Boyacá Contratación
MARIO ALEXANDER QUINTERO
FECHA 12/06/2026

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME EJECUTIVO FINAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CIAD-003-2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ."

SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE IZA CON NIT. 891.856.077-3.

EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
ERI S.A.S

PERIODO DE EJECUCIÓN: 29 DE ABRIL DE 2025 AL 28 DE JUNIO DEL 2025

IZA – BOYACÀ

JUNIO 2025

INFORME PARCIAL DE ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO

VERSIÓN	CONTENIDO	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
1	INFORME ADMINISTRACION DELEGADA	Julian Ramiro Urrutia	Felipe Andres Pedraza	Juan Manuel Perez
		PROFESIONAL DE APOYO	DIRECCION DE OPERACIONES	GERENTE

Jhonatan Alfonso Fuquen Perez
Dirección Administrativa y Financiera

Felipe Andres Pedraza Acevedo
Dirección de Operaciones

Juan Manuel Perez Fonseca
Gerente

Sogamoso, 2025

CONTRACTAULAES ADMINISTRACIÒN DELEGADA CONTRATO No. CIAD-003-2025 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA)

CONTRATO No.:	CIAD-003-2025
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ
VALOR	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($ 205.675.459,00).**
VALOR ADMINISTRACIÒN DELEGADA	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($ 5.990.547,00)**
PLAZO:	UN **(01)** MES
CONTRATISTA:	EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S.
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
MUNICIPIO:	IZA

PROCESO DE CONTRATACIÒN.

En el proceso precontractual se realiza el diseño y estructuración de los estudios previos y estudio del sector con respecto a las obligaciones contractuales descritas en el contrato **CIAD-003-2025** suscrito con el municipio de Iza.

Para el proceso de contratación del proceso **CD16** se realizó por el método de Contratación directa luego de realizar una invitación a los proveedores integrados a la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso S.A.S mediante el proceso de registro estipulado en la RESOLUCION 05 del (12 DE diciembre del 2024).

Al proceso de contratación **202523** se presentó la empresa **JOHN EMERSON ROSAS MESA** Propuesta que fue revisada y evaluada por el equipo de evaluación compuesto por la Dirección de Operaciones y la Dirección administrativa y financiera y la Asesora Jurídica Externa de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso S.A.S. Proceso que fue aprobado y posteriormente se le da la recomendación al Gerente de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso S.A.S para continuar con el proceso.

Posterior a esto el señor Gerente de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso S.A.S Procede a realizar el contrato **No. 2025-023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ."*** Adjudicado al proveedor **JOHN EMERSON ROSAS MESA**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 74.081.029,** quien para efectos del presente se le llamara contratista.

El proceso de ejecución del contrato **2025-023** se inició y para esto se efectuó acta de inicio el **20 DE MAYO DE 2025** con un plazo de ejecución de **(01)** un mes, con el contratista.

CONTRACTAULAES ADMINISTRACIÒN DELEGADA CONTRATO No. 2025-23 (CONTRATO DE OBRA)

CONTRATO No.:	2025-023
OBJETO:	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/C **($199.684.912).**
PLAZO:	UN **(1)** MES
CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA No. 74.081.029
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO *(DIRECCIÒN DE OPERACIONES ERI S.A.S)*
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
MUNICIPIO:	IZA

INTRODUCCIÓN

El presente **INFORME EJECUTIVO FINAL** de la administración delegada sobre el contrato de obra celebrado entre JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.602.118, actuando en calidad de representante legal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCUTRA DE SOGAMOSO ERI - S.A.S, Empresa Industrial y Comercial del Estado – EICE, creada mediante Decreto No 327 del 23 de septiembre de 2024 y nombrado como Gerente mediante decreto municipal 402 del 22 de octubre de 2024 y posesionado mediante acta del 25 de octubre de 2024, quien para los efectos del presente se denomina LA EMPRESA Ó ERI SAS, por una parte y por la otra, **JOHN EMERSON ROSAS MESA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 74.081.029**, quien para los efectos del presente se llamará EL CONTRATISTA y que tiene como objetivo documentar y analizar el seguimiento, control y evaluación realizados sobre el contrato: ***"REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ. "***

La supervisión se ha llevado a cabo con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales, la calidad de los trabajos ejecutados y la verificación de los aspectos técnicos legales y ambientales. Este proceso incluye la supervisión de los avances de obra, el control de los anticipos realizados y el control de calidad de cada uno de los ítems contratados.

El presente documento detalla los resultados obtenidos durante el periodo del **20 DE MAYO DE 2025 AL 19 DE JUNIO DEL 2025** , donde se incluye el análisis de las actividades ejecutadas, observaciones realizadas y las recomendaciones con el fin de optimizar la ejecución del proyecto. El informe está estructurado en secciones que abarcan el alcance del contrato, la metodología empleada para el control y seguimiento, los avances técnicos y administrativos, las dificultades encontradas y las acciones correctivas propuestas.

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN..... 8
2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO..... 9
3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 5
3.2 Polizas de contrato
3.3 Trabajos ejecutados
3.4 Estado financiero
4. CONDICIÓN DEL CLIMA 8
6. PERSONAL EN OBRA 11
6.1 Profesionales del proyecto
6.2 Cuadrillas en obra
7. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA..... 13
8. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL 13
9. CONCLUSIONES..... 19
10 ANEXOS 20
10.1 Acta de mayores y menores cantidades
10.2 Sabana de cantidades
10.3 Memorias de cantidades
10.4 Registro fotografico
10.5 Polizas
10.6 Actas de vecindad
10.7 Autorizacion de descarga y disposición de material de excavacion
10.8 Certificados de calidad
10.9 Ensayos de laboratorio
10.10 Permisos ambientales
10.11 Afiliaciones a seguridad social
10.12 Parafiscales
10.13 Informe SSGT

1. INTRODUCCIÓN

La presente documentación corresponde al Informe de Obra, el cual contiene el estado actual del proyecto y el resumen ejecutivo de las actividades en el desarrollo del contrato de obra N° 2025-023 celebrado entre la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI - S.A.S**, Empresa Industrial y Comercial del Estado – EICE, creada mediante Decreto No 327 del 23 de septiembre de 2024 y nombrado como Gerente mediante decreto municipal 402 del 22 de octubre de 2024 y posesionado mediante acta del 25 de octubre de 2024, quien para los efectos del presente se denomina LA EMPRESA Ó ERI SAS, por una parte y por la otra, JOHN EMERSON ROJAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 74.081.029, actuando como CONTRATISTA, de objeto **REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.**

Este documento corresponde al Informe de Obra correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 20 de mayo de 2025 al 19 de junio de 2025.

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el perímetro urbano del municipio de Iza, esta área se caracteriza por un entorno con un tránsito alto de vehículos de todo tipo teniendo en cuenta que es una vía departamental ya que conecta a los municipio de Aquitania, Tota, Cuítiva e Iza con la capital de la provincia de Sugamuxi la cuidad de Sogamoso, el tramo intervenido está comprendido entre las Carrea 4 frente a la alcaldía municipal Carrera 5, ubicada en el parque principal del municipio, teniendo una gran importancia debido al comercio del sector.



Imagen 1: Localización del proyecto Fuente: Google Earth

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA No: 2025-023	
CONTRATISTA DE OBRA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA C.C 74.081.029 expedida en Sogamoso
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO Director de operaciones
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/C ($199.684.912).

3.2 POLIZAS DE CONTRATO

AMPARO	NÚMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	51-44-101029949	$ 19.968.491.20	16-05-2025 a 20-10-2025	SEGUROS DEL ESTADO
Salarios y prestaciones sociales	51-44-101029949	$ 9.984.245.60	16-05-2025 a 20-06-2028	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad de la obra	51-44-101029949	$ 19.968.491.20	16-05-2025 a 20-06-2030	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
RC- Predios labores y operaciones	51-40-101010086	284.700.000.00	16-05-2025 a 20-06-2025	SEGUROS DEL ESTADO
RC – Daño emergente y lucro cesante	51-40-101010086	284.700.000.00	16-05-2025 a 20-06-2025	SEGUROS DEL ESTADO
RC – perjuicios extrapatrimoniales	51-40-101010086	284.700.000.00	16-05-2025 a 20-06-2025	SEGUROS DEL ESTADO

3.3 TRABAJOS EJECUTADOS

PORCENTAJE DE EJECUCION FINACIERA ES DE.99.06% PERO SE EJECUTO LA OBRA AL 100%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a							
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KM	0,0255	$ 3.708.675,30	$ 94.571,00	0,028	$ 3.708.676	$ 103.843,00
1,02	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	40,55	$ 38.612,00	$ 1.565.524,00	54,71	$ 38.612	$ 2.112.463,00
1,03	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=35%	M2	135,15	$ 7.709,54	$ 1.041.944,00	182,38	$ 7.710	$ 1.406.066,00
1,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	28,05	$ 120.637,00	$ 3.383.868,00	41,68	$ 120.637	$ 5.028.150,00
1,05	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	135,15	$ 4.374,32	$ 591.189,00	130,38	$ 4.374	$ 570.324,00
1,06	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M3	17,03	$ 693.193,00	$ 11.804.314,00	16,43	$ 693.193	$ 11.389.161,00
1,07	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	13,52	$ 250.267,00	$ 3.382.359,00	13,040	$ 250.267	$ 3.263.482,00
	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4							
1,08	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KM	0,0880	$ 3.708.675,30	$ 326.363,00	0,090	$ 3.708.676	$ 333.781,00
1,09	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	241,56	$ 38.612,00	$ 9.327.115,00	236,37381	$ 38.612	$ 9.126.866,00
1,10	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=35%	M2	805,20	$ 7.709,54	$ 6.207.722,00	783,01	$ 7.710	$ 6.036.647,00
1,11	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	161,04	$ 120.637,00	$ 19.427.382,00	158,09	$ 120.637	$ 19.071.503,00
1,12	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	805,20	$ 4.374,32	$ 3.522.202,00	783,01	$ 4.374	$ 3.425.136,00
1,13	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M3	91,17	$ 693.193,00	$ 63.195.685,00	91,17	$ 693.193	$ 63.198.406,00
1,14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	72,3540	$ 250.267,00	$ 18.107.826,00	72,35	$ 250.267	$ 18.106.817,00
1,15	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	10,2841	$ 943.460,00	$ 9.702.637,00	7,49	$ 943.460	$ 7.066.515,00
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 151.680.702,00		**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 150.239.160,00
				A	$ 30.336.140,00		**A**	$ 30.047.832,00
				I	$ 7.584.035,00		**I**	$ 7.511.958,00
				U	$ 7.584.035,00		**U**	$ 7.511.958,00
				TOTAL	$ 197.184.912,00		**TOTAL**	$ 195.310.908,00
				P.M.T	$ 2.500.000,00		**P.M.T**	$ 2.500.000,00
				ADMINISTRACION E.R.I	$ 5.990.547,00		**ADMINISTRACION E.R.I**	$ 5.990.547,00
				TOTAL GENERAL	$ 205.675.459,00		**TOTAL GENERAL**	$ 203.801.455,00
							SALDO SIN EJECUTAR	$ 1.874.004,00

3.4 ESTADO FINANCIERO

Marco de la ejecución del contrato de obra N° 2025-023 de acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA. - **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/C** ($199.684.912). Mediante pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el noventa y cinco (95%) del valor del Contrato. El cinco por ciento (5%) restante se pagará contra la liquidación del Contrato.
A la fecha se ha ejecutado financieramente el contrato de obra N° 2025-023 de la siguiente manera:

VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
$ 199.684.912	$ 199.684.912	$ 197.810.908.00	$ 1.874.004.00
100%	100%	99.06%	0.94%

Del valor total del contrato $ 199.684.912 se ejecutó al 19 de junio de 2025 por $197.810.908,00, habiendo finalizado la obra y quedando un valor no ejecutado por valor de $ 1.874.004,00.

4. CONDICIÓN DEL CLIMA.

Durante el período en mención, las condiciones climatológicas fueron favorables, lo que permitió la ejecución efectiva de las actividades programadas, alcanzando un avance del 90.06%. A continuación, se adjunta documentación fotográfica que evidencia el desarrollo del proyecto y las condiciones meteorológicas prevalecientes durante su ejecución. Contribuir al desarrollo económico local, incentivando la actividad comercial y empresarial en horarios extendidos.



Imagen 5: Evidencia Fotográfica condiciones iniciales – Fuente: Residente de Obra



Imagen 6: Evidencia Fotográfica condiciones iniciales – Fuente: Residente de Obra



Imagen 7: Evidencia Fotográfica condiciones iniciales – Fuente: Residente de Obra

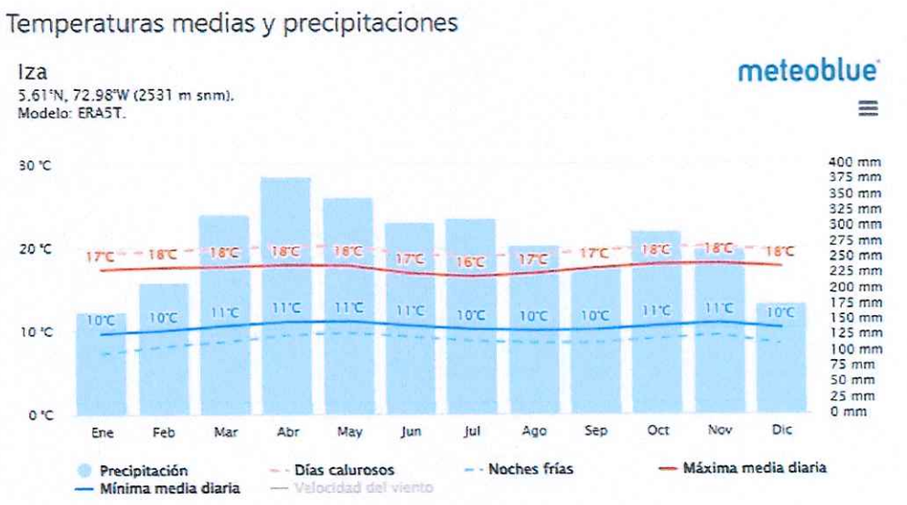


Imagen 22: Evidencia estado del clima mes mayo– Fuente: meteoblue

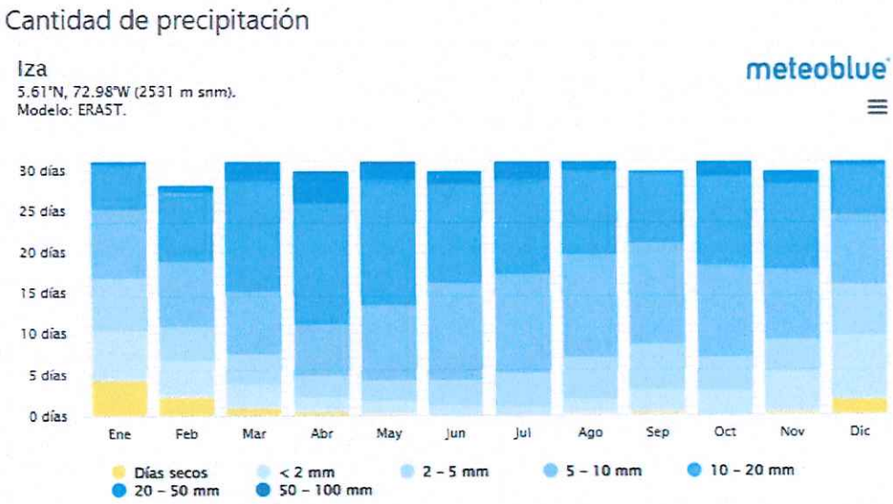


Imagen 23: Evidencia estado del clima mes mayo – Fuente: meteoblue

6. PERSONAL EN OBRA

6.1 PROFESIONALES DEL PROYECTO

	(% Dedicación)
DIRECTOR DE OBRA: Ing. JOHN ROSAS MESA	**30**
RESIDENTE DE OBRA: Ing. KAREN CELY PEÑA	**100**

6.2 CUADRILLAS EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARL
JOHN EMERSON ROSAS MESA	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA

8. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL

Este capítulo se complementa en el informe presentado anexo a este **INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

9. CONCLUSIONES

• Se cuenta con un avance en obra del 99.06% alcanzando una ejecución total del objetivo principal de la obra.

• Se cubrió con capa asfáltica de 10cm de espesor con lo que se logró el principal del proyecto que es proporcionar una superficie de rodadura segura, duradera y cómoda para el tráfico vehicular y peatonal. Además, el asfalto contribuye a la eficiencia del transporte, la economía de la región y la calidad de vida de las personas.

• Dentro de las actividades del proyecto se instaló base para carreteras cuyo objetivo es proporcionar una capa resistente que distribuya las cargas del tráfico vehicular y otras cargas sobre una superficie mayor, protegiendo así la subrasante y evitando deformaciones en la carretera. También ayuda en el drenaje y puede mejorar la estabilidad general del pavimento.

REVISÓ:

Proyectó: Felipe Andres Pedraza
Dirección de Operaciones ERI S.A.S

Revisó: Juan Manuel Perez Fonseca
Gerente ERI S.A.S

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	PRELIMINARES (VIAS)	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
3,01	PRELIMINARES (VIAS)	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.01.04		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICOES	KM

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
PINTURA Y ESTACAS	GBL	$ 33.192,00	1,00	$ 33.192,00
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 33.192,00

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$3.330.678	5,00%	$ 166.533,90
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y ELEMENTOS)	HR	$7.428	24,0000	$ 178.272,00
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 344.805,90

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CADENERO 1	JR	$ 160.454,00	4,00	$ 641.816,00
CADENERO 2	JR	$ 139.502,00	4,00	$ 558.008,00
CADENERO 3	JR	$ 139.502,00	4,00	$ 558.008,00
TOPOGRAFO	JR	$ 258.326,00	5,00	$ 1.291.630,00
TROCHERO	JR	$ 70.304,00	4,00	$ 281.216,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 3.330.678,00

COSTO DIRECTO	$ 3.708.675,90

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 3.708.675,90

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 3.708.675,90

OBSERVACIONES:	
	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S Realizó Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
3,06	PAVIMENTO FLEXIBLE	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.06.01		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	$ 1.850,00	1,20	$ 2.220,00
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm	UND	$ 213.662,00	0,02	$ 4.273,24
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 6.493,24

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$9.556	3,30%	$ 315,32
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	HR	$170.683	0,0400	$ 6.827,32
CORTADORA PARA REPARCHEO	HR	$13.339	0,80	$ 10.671,20
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	HR	$95.000	0,05	$ 4.750,00
		SUBTOTAL EQUIPO		$ 22.563,84

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AUXILIAR DE OBRA (A)	JR	$ 95.545,00	0,10	$ 9.554,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 9.554,50

COSTO DIRECTO		$ 38.612
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 38.612

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 38.612,00

OBSERVACIONES:	
	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ESP S.A.S
	Realizó
	Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
1	PRELIMINARES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
1,01	PRELIMINARES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
1.01.06		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
AGUA	LT	$ 3,47	0,35	$ 1,21
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 1,21

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	HR	$170.683	0,01	$ 1.194,78
CARROTANQUE AGUA	HR	$81.667	0,02	$ 1.306,67
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	$100.000	0,01	$ 700,00
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 3.201,45

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	0,24	$ 2.866,32
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	0,08	$ 1.640,56
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 4.506,88

COSTO DIRECTO	$ 7.709,54

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 7.709,54

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 7.709,54

OBSERVACIONES:	
	Realizó EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPITULO	
3	AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPITULO	
3.04	AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.04.06		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR	M3

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías)	M3	$ 64.657,00	1,30	$ 84.054,10
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 84.054,10

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	HR	$170.683	0,07	$ 11.947,81
CARROTANQUE AGUA	HR	$81.667	0,05	$ 4.083,35
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	$100.000	0,07	$ 7.000,00
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 23.031,16

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AUXILIAR DE OBRA (A)	JR	$ 95.545,00	0,05	$ 4.777,25
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 4.777,25

4. TRASPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
TRANSPORTE M3/KM	M3-KM	$ 1.350,00	6,50	$ 8.775,00
			SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 8.775,00
			COSTO DIRECTO	$ 120.638

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 120.637,00

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 120.637,00

OBSERVACIONES:

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S

Realizó

Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PO-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
3,06	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.06.09		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
EMULSION CRL-1H	LT	$ 3.342,00	1,00	$ 3.342,00
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 3.342,00

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
COMPRESOR	HR	$58.391	0,00	$ 175,17
IRRIGADOR	HR	$100.000	0,00	$ 300,00
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)	%	$546,23	2%	$ 10,92
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 486,09

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AUXILIAR DE OBRA (A)	JR	$ 95.545,00	0,00	$ 382,18
OFICIAL OBRA (A)	JR	$ 164.047,00	0,00	$ 164,05
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 546,23

4. TRASPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
			SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 0,00
			COSTO DIRECTO	$ 4.374,32

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 4.374,32

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 4.374,32

OBSERVACIONES:

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
ERI S.A.S

Realizó

Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M2

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MEZCLA ASFÁLTICA MDC-25 SUELTA EN PLANTA	M3	$ 693.193,00	1,00	$ 693.193,00
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 693.193,00

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 0,00

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 0,00

4. TRASPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
			SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 0,00
			COSTO DIRECTO	$ 693.193,00

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 693.193,00

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 693.193,00

OBSERVACIONES:

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
ERI S.A.S

Realizó

Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
3,06	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.06.03		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M2

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp.	HR	$120.000,00	0,10	$ 12.000,00
TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 H.P	HR	$227.098,00	0,10	$ 22.709,80
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	$100.000,00	0,10	$ 10.000,00
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$147.113,09	5,03%	$ 7.399,79
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 52.109,58

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AUXILIAR DE OBRA (A)(4)	JR	$ 382.180,00	0,36	$ 137.270,27
OFICIAL OBRA (A)	JR	$ 164.047,00	0,06	$ 9.842,82
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 147.113,09

4. TRASPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	M3-KM	$ 2.383,00	21,42	$ 51.043,86
			SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 51.043,86
			COSTO DIRECTO	$ 250.267

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 250.267

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 250.267,00

OBSERVACIONES:

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S

Realizó

Aprobó

Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
3,06	PAVIMENTACION FLEXIBLE	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.06.03		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M2

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MEZCLA ASFÁLTICA MDC-25 SUELTA EN PLANTA	M3	$ 665.805,00	1,26	$ 838.914,30
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 838.914,30

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp.	HR	$120.000,00	0,10	$ 12.000,00
TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 H.P	HR	$227.098,00	0,10	$ 22.709,80
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	$100.000,00	0,10	$ 10.000,00
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	$42.676,60	5,03%	$ 2.146,63
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 46.856,43

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AUXILIAR DE OBRA (A)	JR	$ 95.545,00	0,35	$ 33.440,75
OFICIAL OBRA (A)	JR	$ 164.047,00	0,06	$ 9.235,85
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 42.676,60

4. TRASPORTE

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	M3-KM	$ 2.383,00	6,30	$ 15.012,90
			SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 15.012,90
			COSTO DIRECTO	$ 943.460,00

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 943.460,00

ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 943.460,00

OBSERVACIONES:	
	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S Realizó Aprobó

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMSOSO S.A.S
NIT. 901881213-1

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 8

COPIA CONTROLADA

FECHA:	19 de junio de 2025			**INFORME No.:**	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	20250023	**No. CONTRATO:**	2025-023	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA PUBLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO			**CARGO:**	Director de Operaciones
				No. DE TELÉFONO:	
CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA			**C.C. O NIT:**	74.081.029
E-MAIL:	ingohnrosas@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3103120770
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	20-may-2025	**DESDE:**		**DESDE:**	20-may-2025
TERMINA:	19-jun-2025	**HASTA:**		**HASTA:**	19-jun-2025

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Iza ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Garantizar la calidad de las obras entregadas	Informe final	Se entrego certificados de calidad de materiales y pólizas de estabilidad de la obra
2	Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratante con respecto al uso y/o calidad de la obra.	Informe final	Se resolvieron dudas que surgieron en obra
3	Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor	Informe final	Se acato directrices emitidas por el supervisor
4	Actuar siempre dentro de las normas técnicas y que regulan el ejercicio comercial.	Informe final	se actuó dentro de las normas técnicas
5	Afiliar a los trabajadores que emplee en la ejecución del contrato al sistema de seguridad social.	Informe final	Se afilio a trabajadores de la obra en su totalidad y durante el periodo de ejecución de sus labores
6	Garantizar que la mezcla asfáltica suministrada para las labores a realizar cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS (se compromete a instalar el material recibido bajo los lineamientos establecidos en el manual de mantenimiento de carreteras de INVIAS , esto de acuerdo a la actividad requerida en campo; siendo responsable de su instalación, en las actividades de parche en calzada, y bermas pavimentadas, parcheo temporal en calzada y bermas o pavimentadas y bacheo de pavimento asfaltico	Informe final	Se entrego certificados de calidad de materiales y se realizó control de calidad de la instalación de los mismos mediante ensayos de laboratorios anexos.
7	Garantizar que las vias objeto de intervención cumplan con los requisitos de vías urbanas cuya construcción sea mayor a cinco (05) años, vías urbanas que cuenten con todas las redes de servicios públicos instalados y en buen estado acorde a lo establecido en la RAS 2000, vías urbanas de uso público, vías urbanas con nomenclatura establecida en el EOT, vías urbanas que no se encuentren bajo supervisión por partes de entidades como la Contraloría , procuraduría o fiscalía, vías urbanas que se encuentren dentro de la intervención próximas por parte de la Alcaldía municipal de Iza	Informe final	Se evidencio que antes de la ejecución del presente contrato, se hubieran adelantado trabajos de renovación de redes de acueducto.
8	El contratista es responsable por la vinculación de personal. El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada una de las actividades a desarrollar	Informe final	Se contrato personal calificado de acuerdo a la oferta presentada para la adjudicación del contrato.

9	El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Municipio de "IZA" y la ciudadanía, antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, tales como: cascos, tapabocas, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la supervisión velar porque se cumpla esta disposición.	Informe final	Se entrego dotación tal como se evidencia en el informe SG-SST
10	Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, el supervisor y de terceras personas	Informe final	Se implemento el PMT como se evidencia el informe SG-SST
11	El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, la empresa no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole	Informe final	Se contrato el personal directamente por el contratista
12	El contratista deberá informar al Interventor o supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecucion del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato	Informe final	Durante la ejecucion del contrato no se presentaron accidentes ni incidentes
13	Dentro del alcance del trabajo a realizar se debe cumplir con los componentes detallados en el cuadro de presupuesto	Informe final	Se cumplió con los componentes de acuerdo al presupuesto del proyecto y sus modificaciones
14	El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento de su equipo de trabajo	Informe final	Se brindo transporte a los aperadores que no residen el en lugar de la obra
15	Hacer entrega de los productos al funcionario designado por la empresa	Informe final	Se entrego la obra y los respectivos informes al supervisor del contrato,
16	Atender los requerimientos y solicitudes que formule el supervisor del contrato.	Informe final	Se atendieron las solicitudes presentadas verbalmente por la supervisión.

Otras Observaciones:	

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5j8355hpqjoW2gOUBwh5-AvSQyL2E0/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	☐	4. Certificación de Parafiscales	☐
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	☐	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	☐	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	☐

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	100,00%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
MAYO JOHN ROSAS	*77224737*	$ 656.000,00	$ 512.500,00	$ 285.400,00	$ **1.453.900**
JUNIO JOHN ROSAS	*77770152*	$ 656.000,00	$ 512.500,00	$ 285.400,00	$ **1.453.900**
MAYO KAREN CELY	*7974912990*	$ 227.800,00	$ 178.000,00	$ 99.100,00	$ **504.900**
JUNIO KAREN CELY	*7974916757*	$ 229.800,00	$ 179.600,00	$ 100.000,00	$ **509.400**
MAYO TRABAJADORES	*78515155*	$ 455.600,00	$ 114.000,00	$ 198.200,00	$ **767.800**
JUNIO TRABAJADORES	*78515155*	$ 1.405.400,00	$ 351.500,00	$ 612.000,00	$ **2.368.900**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
24501030116	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.	$ 197.811.895,00
		$ -
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
50	2025000007	$ 197.811.895,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 199.684.912,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.684.912,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-) Valor a pagar		$ 197.810.908,00
(-) Valor sin ejecutar		$ 1.874.004,00
SUMAS IGUALES	$ 199.684.912,00	$ 199.684.912,00

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 197.810.908,00	Valor en letras:	CINTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

Para constancia suscribimos:

FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOHN EMERSON ROSAS MESA
CONTRATISTA

JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA
Vo.Bo. GERENTE ERI S.A.S

NIT: 891.855.130-1

SABANA DE CANTIDADES ERI S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL 1			POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a													
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KM	0,0255	$ 3.708.675,90	$ 94.571,00	0,028	$ 3.708.676	$ 103.843,00	0,028	$ 3.708.675,90	$ 103.843,00	0	$ 3.708.675,90	$ -
1,02	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	40,55	$ 38.612,00	$ 1.565.524,00	54,71	$ 38.612	$ 2.112.463,00	54,71	$ 38.612,00	$ 2.112.463,00	0	$ 38.612,00	$ -
1,03	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	135,15	$ 7.709,54	$ 1.041.944,00	182,38	$ 7.710	$ 1.406.066,00	182,38	$ 7.709,54	$ 1.406.066,00	0	$ 7.709,54	$ -
1,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	28,05	$ 120.637,00	$ 3.383.668,00	41,68	$ 120.637	$ 5.028.150,00	41,68	$ 120.637,00	$ 5.028.150,00	0	$ 120.637,00	$ -
1,05	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	135,15	$ 4.374,32	$ 591.189,00	130,38	$ 4.374	$ 570.324,00	130,38	$ 4.374,32	$ 570.324,00	0	$ 4.374,32	$ -
1,06	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M3	17,03	$ 693.193,00	$ 11.804.314,00	16,43	$ 693.193	$ 11.389.161,00	16,43	$ 693.193,00	$ 11.389.161,00	0	$ 693.193,00	$ -
1,07	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	M3	13,52	$ 250.267,00	$ 3.382.359,00	13,040	$ 250.267	$ 3.263.482,00	13,04	$ 250.267,00	$ 3.263.482,00	0	$ 250.267,00	$ -
	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4													
1,08	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KM	0,0880	$ 3.708.675,90	$ 326.363,00	0,090	$ 3.708.676	$ 333.781,00	0,090	$ 3.708.675,90	$ 333.781,00	0	$ 3.708.675,90	$ -
1,09	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	241,56	$ 38.612,00	$ 9.327.115,00	236,37381	$ 38.612	$ 9.126.866,00	236,37381	$ 38.612,00	$ 9.126.866,00	0	$ 38.612,00	$ -
1,10	CONFORMACION COMPACTACION SUBRASANTE CBR=95%	M2	805,20	$ 7.709,54	$ 6.207.722,00	783,01	$ 7.710	$ 6.036.647,00	783,01	$ 7.709,54	$ 6.036.647,00	0	$ 7.709,54	$ -
1,11	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	161,04	$ 120.637,00	$ 19.427.382,00	158,09	$ 120.637	$ 19.071.503,00	158,09	$ 120.637,00	$ 19.071.503,00	0	$ 120.637,00	$ -
1,12	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	805,20	$ 4.374,32	$ 3.522.202,00	783,01	$ 4.374	$ 3.425.136,00	783,01	$ 4.374,32	$ 3.425.136,00	0	$ 4.374,32	$ -
1,13	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M3	91,17	$ 693.193,00	$ 63.195.686,00	91,17	$ 693.193	$ 63.198.406,00	91,17	$ 693.193,00	$ 63.198.406,00	0	$ 693.193,00	$ -
1,14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	72,3540	$ 250.267,00	$ 18.107.826,00	72,35	$ 250.267	$ 18.106.817,00	72,35	$ 250.267,00	$ 18.106.817,00	0	$ 250.267,00	$ -
1,15	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	10,2841	$ 943.460,00	$ 9.702.637,00	7,49	$ 943.460	$ 7.066.515,00	7,49	$ 943.460,00	$ 7.066.515,00	0	$ 943.460,00	$ -

COSTO DIRECTO GRUPO	$ 151.660.702,00	COSTO DIRECTO GRUPO	$ 150.239.160,00	COSTO DIRECTO GRUPO	$ 150.239.160,00
A	$ 30.336.140,00	A	$ 30.047.832,00	A	$ 30.047.832,00
I	$ 7.584.035,00	I	$ 7.511.958,00	I	$ 7.511.958,00
U	$ 7.584.035,00	U	$ 7.511.958,00	U	$ 7.511.958,00
TOTAL	$ 197.184.912,00	TOTAL	$ 195.310.908,00	TOTAL	$ 195.310.908,00
P.M.T	$ 2.500.000,00	P.M.T	$ 2.500.000,00	P.M.T	$ 2.500.000,00
ADMINISTRACION E.R.I	$ 5.990.547,00	ADMINISTRACION E.R.I	$ 5.990.547,00	ADMINISTRACION E.R.I	$ 5.990.547,00
TOTAL GENERAL	$ 205.675.459,00	TOTAL GENERAL	$ 203.801.455,00	TOTAL GENERAL	$ 203.801.455,00
		SALDO SIN EJECUTAR	$ 1.874.004,00	Porcentaje de Avance	99,09%
				NOTA	Los porcentajes se actualizaron de acuerdo al nuevo valor total general del contrato una vez realizada la modificacion de cantidades

COSTO DIRECTO GRUPO	$ -
A	$ -
I	$ -
U	$ -
TOTAL	$ -
P.M.T	$ -
TOTAL GENERAL	$ -
Porcentaje Restante	0,00%

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S ERI S.A.S
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO		FECHA	
MGI-01-07-F-22	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS	2018/09	VERSION 2

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO DE: INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA **No.** CIAD-003-2025
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA - BOYACÁ
CONTRATISTA : EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO
SUPERVISOR Yarley Gerardo Pedraza Díaz

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a											
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	KM	0,0255	$ 3.708.675,90	$ 94.571,00	,0025		9.271,69	-	0,028	103.843,00
2	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	40,55	$ 38.612,00	$ 1.565.524,00	14,17		546.938,98	-	54,71	2.112.463,00
3	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	135,15	$ 7.709,54	$ 1.041.944,00	47,23		364.121,57	-	182,38	1.406.066,00
4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	28,05	$ 120.637,00	$ 3.383.868,00	13,63			-	41,68	5.028.150,00
5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	135,15	$ 4.374,32	$ 591.189,00		4,775		20.887,38	130,38	570.324,00
6	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M3	17,03	$ 693.193,00	$ 11.804.314,00		0,599		415.153,29	16,43	11.389.161,00
7	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	13,52	$ 250.267,00	$ 3.382.359,00		0,475	-	118.876,83	13,04	3.263.482,00
Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4											
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	KM	0,0880	$ 3.708.675,90	$ 326.363,00	0,0020		7.417,35	-	0,09	333.781,00
2	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	241,56	$ 38.612,00	$ 9.327.115,00		5,17	-	199.624,04	236,37381	9.126.866,00
3	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	805,20	$ 7.709,54	$ 6.207.722,00		22,19	-	171.074,69	783,01	6.036.647,00
4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	161,04	$ 120.637,00	$ 19.427.382,00		2,95	-	355.879,15	158,09	19.071.503,00
5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	805,20	$ 4.374,32	$ 3.522.202,00		22,19	-	97.066,16	783,01	3.425.136,00

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	VERSION
MGI-01-07-F-22		2018/09	2

6	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	M3	91,17	$ 693.193,00	$ 63.195.693,00			-	-	91,17	63.198.406,00
7	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	72,3540	$ 250.267,00	$ 18.107.819,00			-	-	72,35	18.106.817,00
8	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	10,2841	$ 943.460,00	$ 9.702.637,00		2,79	-	2.636.121,59	7,49	7.066.515,00
COSTOS DIRECTOS					$ 151.680.702,00			927.749,60	4.014.683,12		150.239.160,00
COSTOS INDIRECTOS					$ 45.504.210,00			278.324,88	1.204.404,94		45.071.748,00
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 30.336.140,00			185.549,92	802.936,62		30.047.832,00
	IMPREVISTOS	5%			$ 7.584.035,00			46.387,48	200.734,16		7.511.958,00
	UTILIDAD	5%			$ 7.584.035,00			46.387,48	200.734,16		7.511.958,00
	PMT				$ 2.500.000,00						2.500.000,00
	ADMINISTRACION E.R.I	3%			$ 5.990.547,00						$ 5.990.547,00
COSTO TOTAL					$ 205.675.459,00			1.206.074,47	5.219.088,06		203.801.455,00
	ITEMS NO PREVISTOS				-			-	-	-	-
	1				-			-	-	-	-
	2				-			-	-	-	-
	3				-			-	-		-
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-		-
COSTOS INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-		-
	ADMINISTRACIÓN				-			-	-		-
	IMPREVISTOS				-			-	-		-
	UTILIDAD				-			-	-		-
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-		-
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				151.680.702,00			927.749,60	4.014.683,12		150.239.160,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				45.504.210,00			278.324,88	1.204.404,94		45.071.748,00
	ADMINISTRACIÓN	20%			30.336.140,00			185.549,92	802.936,62		30.047.832,00
	IMPREVISTOS	5%			7.584.035,00			46.387,48	200.734,16		7.511.958,00
	UTILIDAD	5%			7.584.035,00			46.387,48	200.734,16		7.511.958,00
	PMT				2.500.000,00						$ 2.500.000,00
	ADMINISTRACION ERI				5.990.547,00						$ 5.990.547,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				205.675.459,00			1.206.074,47	5.219.088,06		203.801.455,00

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS	FECHA	VERSION 2
MGI-01-07-F-22		2018/09	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			PLANO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ITEM NO PREVISTO
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1					0,00	

INSERTE AQUÍ LOS PLANOS O ESQUEMAS

OBSERVACIONES

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS

2/06/2025
FECHA DE ELABORACIÓN

Ir

EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Yarley Gerardo Pedraza Díaz.

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
En caso de requerir especificacion tecnica del item no previsto se debe utilizar el formato MGI-01-07-F-22A

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNID.	km	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a	



LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
UBICACION	TIPO	Ancho	Largo (km)	Espesor		
Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a			0,028			0,028

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,02	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a





LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
UBICACION	TIPO	Ancho (m)	Largo (m)	Profundidad (m)		
Punta concreto rigido		0,85	3,50	0,30	1,000	0,893
Entrada hasta esquina		5,20	24,50	0,30	1,000	38,220
Excavacion adicional por fallos y humedad		5,20	10,00	0,30	1,000	15,600

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,03	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	UNID.	M2	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a





LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
UBICACION	TIPO	Ancho (m)	Largo (m)	Profundidad (m)		
Punta concreto rigido		0,85	3,50		1,000	2,975
Entrada hasta esquina		5,20	24,50		1,000	127,400
Excavacion adicional por fallos y humedad		5,20	10,00		1,000	52,000

Subtotal	182,380
Vienen	0,00
TOTAL	182,38

OBSERVACION:

EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S
CONTRATISTA

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAS
SECRETARIO DE PLANEACION - SURPEVISOR

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a





LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
UBICACION	TIPO	Ancho	Largo (km)	Espesor		
Punta concreto rigido		0,85	3,50	0,20	1,000	0,595
Entrada hasta esquina		5,20	24,50	0,20	1,000	25,480
Excavacion adicional por fallos y humedad		5,20	10,00	0,30	1,000	15,600

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,05	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	UNID.	M2	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a



LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo (km)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
Punta concreto rigido		0,85	3,50		1,000	2,975
Entrada hasta esquina		5,20	24,50		1,000	127,400

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,06	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a





LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
UBICACION	TIPO	Ancho	Largo (m)	Espesor		
Punta concreto rigido		0,85	3,50	0,10	1,260	0,375
Entrada hasta esquina		5,20	24,50	0,10	1,260	16,052

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,07	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 1, calle 4 entre carreras 5 y 4a



LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
UBICACION	TIPO	Ancho (m)	Largo (m)	Profundidad (m)		
Acometidas Sumideros						
Punta concreto rigido		0,85	3,50	0,10	1,000	0,298
Entrada hasta esquina		5,20	24,50	0,10	1,000	12,740

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,08	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNID.	KM	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4



LOCALIZACION		Dimensiones			Nº Elem.	Medida Total
		Ancho	Largo (m)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
Conexiones Sumideros						
CALLE 4			0,09		1	0,09

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,09	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4





LOCALIZACION		Dimensiones				Medida Total
		Ancho	Largo (m)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
		4,80	2,10	0,30		3,02
		9,20	12,80	0,30		35,33
		8,60	67,25	0,30		173,49
		8,35	9,20	0,30		23,05
	fallos	1,65	3,00	0,30		1,49

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,10	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	UNID.	M2	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4






LOCALIZACION		Dimensiones				
		Ancho	Largo (m)	Espesor		Medida Total
UBICACION	TIPO					
		4,80	2,10			10,08
		9,20	12,80			117,76
		8,60	67,25			578,35
		8,35	9,20			76,82

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,11	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4

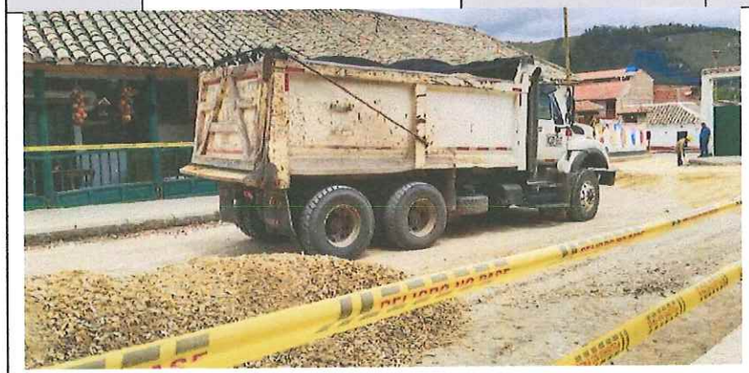



LOCALIZACION		Dimensiones				Medida Total
		Ancho	Largo (m)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
		4,80	2,10	0,20		2,02
		9,20	12,80	0,20		23,55
		8,60	67,25	0,20		115,67
		8,35	9,20	0,20		15,36
		1,65	3,00	0,30		1,49

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,12	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	UNID.	M2	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4





LOCALIZACION		Dimensiones				Medida Total
		Ancho	Largo (m)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
		4,80	2,10			10,08
		9,20	12,80			117,76
		8,60	67,25			578,35
		8,35	9,20			76,82

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,13	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4	





LOCALIZACION		Dimensiones				Medida Total
		Ancho	Largo (m)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
		4,80	2,10	0,10	1,26	1,27
		9,20	12,80	0,10	1,26	14,84
		8,60	67,25	0,10	1,26	72,87
		8,35	9,20	0,10	1,26	9,68
	FALTA	6,46	9,20	0,10	1	-7,49

MEMORIAS DE CALCULO

D	19	M	JUN	A	2025

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,14	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	UNID.	M3	UBICACIÓN	Tramo 2, calle 4 entre cra 4a y cra 4	





LOCALIZACION		Dimensiones				Medida Total
		Ancho	Largo (m)	Espesor		
UBICACION	TIPO					
		4,80	2,10	0,10	1,00	1,01
		9,20	12,80	0,10	1,00	11,78
		8,60	67,25	0,10	1,00	57,84
		8,35	9,20	0,10	1,00	7,68
	FALTA	6,47	9,20	0,10	1,00	-5,95

INFORME OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO

% AVANCE: 99,06% FECHA INICIO: 20/05/2025 FECHA FINAL 19/06/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	1
Observaciones Particulares:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO



Foto No:	2
Observaciones Particulares:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	3
Observaciones Particulares:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO



Foto No:	4
Observaciones Particulares:	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	5
Observaciones Particulares:	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES



Foto No:	6
Observaciones Particulares:	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES



Foto No:	7

Observaciones Particulares:
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES



Foto No:	8

Observaciones Particulares:
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	9

Observaciones Particulares:
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES



Foto No:	10

Observaciones Particulares:
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto No:	9

Observaciones Particulares:
APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES




Foto No:	10

Observaciones Particulares:
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

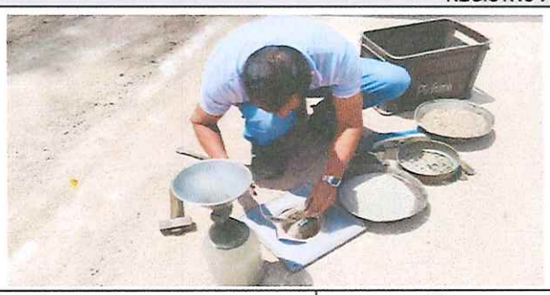REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	11	Foto No:	12
Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%		Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	13	Foto No:	14
Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%		Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	15	Foto No:	16
Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%		Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	

REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	17	Foto No:	18
Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%		Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	

REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	19	Foto No:	20
Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%		Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	

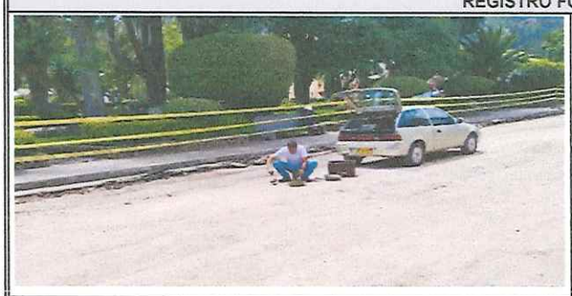REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	21	Foto No:	22
Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%		Observaciones Particulares: CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	23

Observaciones Particulares:

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO



Foto No:	24

Observaciones Particulares:

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	25

Observaciones Particulares:

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO



Foto No:	26

Observaciones Particulares:

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

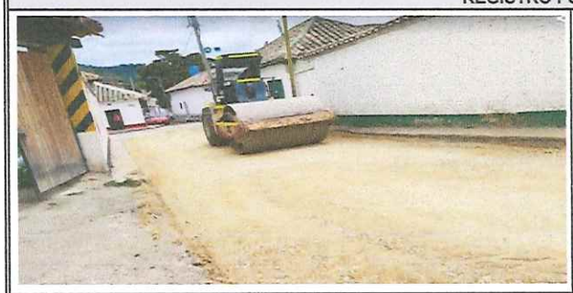


Foto No:	27

Observaciones Particulares:

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO



Foto No:	28

Observaciones Particulares:

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	29

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO



Foto No:	30

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	31

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO



Foto No:	32

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO

REGISTRO FOTOGRAFICO





Foto No:	33

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO



Foto No:	34

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO

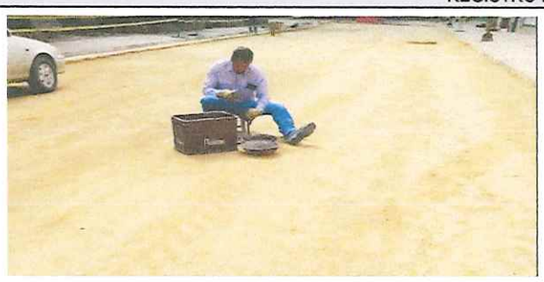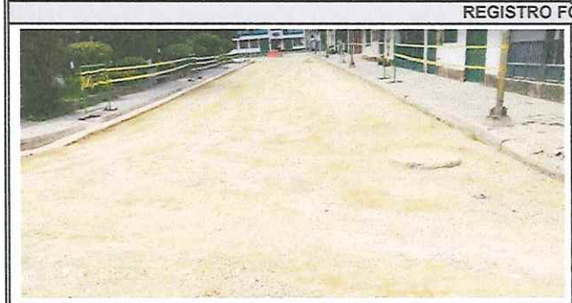REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	35	Foto No:	36
Observaciones Particulares: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO		Observaciones Particulares: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	37	Foto No:	38
Observaciones Particulares: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO		Observaciones Particulares: SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	39	Foto No:	40
Observaciones Particulares: IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H		Observaciones Particulares: IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

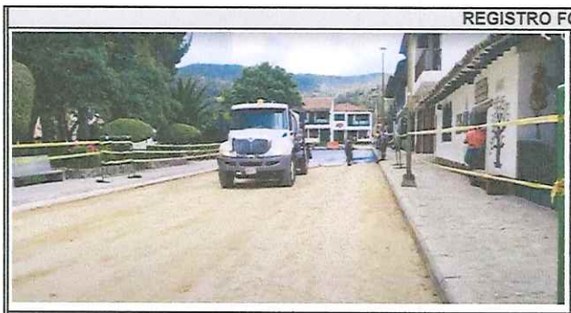


Foto No:	41

Observaciones Particulares:
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H



Foto No:	42

Observaciones Particulares:
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	43

Observaciones Particulares:
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H



Foto No:	44

Observaciones Particulares:
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	45

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE



Foto No:	46

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No:	47

Observaciones Particulares:
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SUELTA EN CALIENTE



Foto No:	48

Observaciones Particulares:
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	49

Observaciones Particulares:
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)



Foto No:	50

Observaciones Particulares:
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No:	51

Observaciones Particulares:
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)



Foto No:	52


Observaciones Particulares:
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	53	Foto No:	54
Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)		Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	55	Foto No:	56
Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)		Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	57	Foto No:	58
Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)		Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	59	Foto No:	60
Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)		Observaciones Particulares: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	61	Foto No:	62
Observaciones Particulares: CORTE DE PAVIMENTO Y CONCRETO		Observaciones Particulares: CORTE DE PAVIMENTO Y CONCRETO	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	63	Foto No:	64
Observaciones Particulares: EXCAVACION Y REMPLZO DE MATERIAL POR RUPTURA DE TUBOS Y ABALNDAMIENTO DE LA SUBRASANTE		Observaciones Particulares: EXCAVACION Y REMPLZO DE MATERIAL POR RUPTURA DE TUBOS Y ABALNDAMIENTO DE LA SUBRASANTE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	65	Foto No:	66
Observaciones Particulares: EXCAVACION Y REMPLZO DE MATERIAL POR RUPTURA DE TUBOS Y ABALNDAMIENTO DE LA SUBRASANTE		Observaciones Particulares: EXCAVACION Y REMPLZO DE MATERIAL POR RUPTURA DE TUBOS Y ABALNDAMIENTO DE LA SUBRASANTE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	67	Foto No:	68
Observaciones Particulares: CORTE DE PAVIMENTO Y CONCRETO		Observaciones Particulares: CORTE DE PAVIMENTO Y CONCRETO	

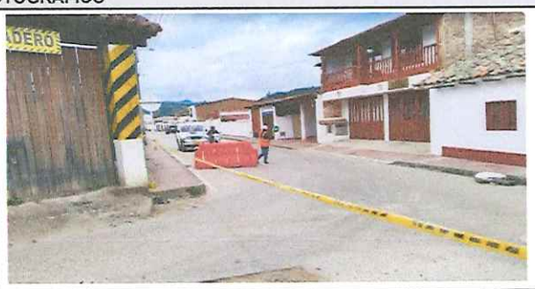REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	69	Foto No:	70
Observaciones Particulares: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		Observaciones Particulares: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Foto No:	71	Foto No:	72
Observaciones Particulares: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		Observaciones Particulares: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Foto No:	73	Foto No:	74
Observaciones Particulares: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		Observaciones Particulares: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME SUPERVISION No. 001
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
No. CIAD – 003 – 2025

1. **INFORMACION CONTRATO**

FECHA	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
PERIODO:	DEL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL 2025 AL VENTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025.
CONTRATISTA	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS
C.C. / NIT.	901.881.213-1
REP. LEGAL	JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA
	C.C N° 1.049.602.188 EXPEDIDA EN SOGAMOSO
OBJETO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA COSNTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ"
RECUERSOS PARA ADMINISTRAR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($199.684.912,00).
VALOR ADMINISTRACIÓN DELEGHADA:	QUINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.990.547,00).
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INCIAL	UN (01) MES
PRORROGA	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO	2.3.2.02.02.005.27 Denominado, construcción y servicios de la construcción – departamento de Boyacá Convenio No. 2579 de 2024 $75.000.000, Rubro 2.3.2.02.02.005.06.24.2402.2402041 denominado Construcción y servicios de la construcción – vías terciarias alcaldía $ 115.076.584, rubro 2.3.2.02.02.005.05.24.2402.2402021 denominado Construcción y servicios de construcción vías secundarias alcaldía $15.568.875
DISPONIBILIDAD	2025000137 DEL 29 DE ABRIL DE 2025
REGISTRO	2025000172 DEL 05 DE JUNIO DE 2025
VALOR ADICIONADO	N/A
TERMINO DE LA ADICION	N/A
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO	N/A
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	9485449196 – 9486867289 – 9487857396 -9489875867
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ

Powered by CamScanner

2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO

ITEM	CONCEPTO	VALORES
A	VALOR INICIAL	$ 205.675.459,00
B	VALOR ADICIONADO	$ 0.00
C	VALOR TOTAL (A+B)	$ 205.675.459,00
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0.00
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 205.675.459,00
G	VALOR EJECUTADO (E+F)	$ 203.801.455,00
H	SALDO POR EJECUTAR (C-G)	$ 1.874.004,00

3. COMPONENTE TECNICO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tramo 1, Calle 4 entre cra. 5 y 4ª			
Localización y replanteo Topográfico.	✓		Se realizó la localización y el replanteo correspondiente para verificar y ajustar cotas, pendientes, espesores y profundidades, con el fin de garantizar que la estructura de la vía cumpliera con los parámetros del diseño.
Apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes.	✓		Una vez verificadas las condiciones topográficas, se procedió a la excavación mecánica de caja, enfocada en alcanzar la profundidad requerida para el mejoramiento del terreno.
Conformación compactación subrasante CBR=95%	✓		Se ejecutó la conformación, nivelación y compactación de la subrasante, asegurando su uniformidad y capacidad estructural para recibir las capas superiores.
Suministro, entendida y compactación de material seleccionado para base granular (Incluye acarreo libre de 5 km) (**)	✓		Se instaló la base granular, garantizando espesores adecuados y compactación según especificaciones técnicas. Esta actividad fue supervisada verificando densidades y uniformidades en toda la sección intervenida.
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	✓		Una vez alcanzadas las condiciones de humedad y limpieza requeridas, se realizó la imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1H, con el fin de asegurar una adecuada adherencia entre la base granular y la mezcla asfáltica.
Suministro mezcla asfáltica suelta en caliente	✓		Se realiza el suministro de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas

Powered by CamScanner

			óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material.
Construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye barrido y compactación (incluye acarreo libre de 5 km) Norma Invias (**).	✓		Se realiza extendida de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material y la consolidación de su compactación.
Tramo 2, Calle 4 entre cra. 4a y 4	✓		
Localización y replanteo Topográfico.	✓		Se realizó la localización y el replanteo correspondiente para verificar y ajustar cotas, pendientes, espesores y profundidades, con el fin de garantizar que la estructura de la vía cumpliera con los parámetros del diseño.
Apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes.	✓		Una vez verificadas las condiciones topográficas, se procedió a la excavación mecánica de caja, enfocada en alcanzar la profundidad requerida para el mejoramiento del terreno.
Conformación compactación subrasante CBR=95%	✓		Se ejecutó la conformación, nivelación y compactación de la subrasante, asegurando su uniformidad y capacidad estructural para recibir las capas superiores.
Suministro, entendida y compactación de material seleccionado para base granular (Incluye acarreo libre de 5 km) (**)	✓		Se instaló la base granular, garantizando espesores adecuados y compactación según especificaciones técnicas. Esta actividad fue supervisada verificando densidades y uniformidades en toda la sección intervenida.
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	✓		Una vez alcanzadas las condiciones de humedad y limpieza requeridas, se realizó la imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1H, con el fin de asegurar una adecuada adherencia entre la base granular y la mezcla asfáltica.
Suministro mezcla asfáltica suelta en caliente	✓		Se realiza el suministro de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material.
Construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye barrido y compactación (incluye acarreo libre de 5 km) Norma Invias (**).	✓		Se realiza extendida de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material y la consolidación de su compactación.



Powered by CamScanner




Construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye suministro, *barrido y compactación* (incluye acarreo libre de 5 km) Norma Invias (**).			Se realiza extendida de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas *óptimas, lo cual permitió un adecuado* manejo del material y la consolidación de su compactación.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Powered by CamScanner

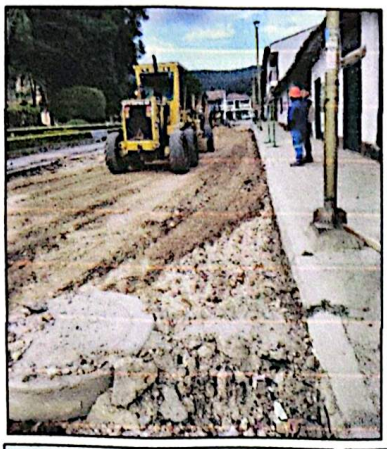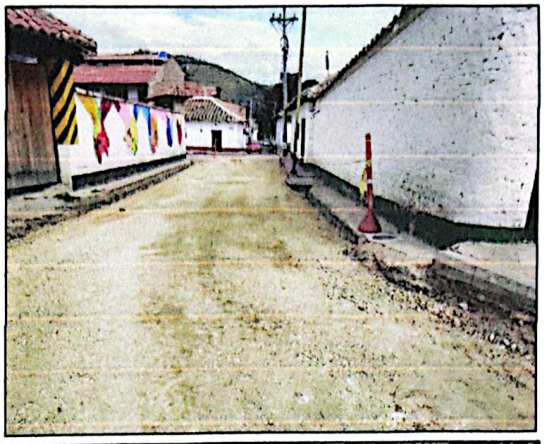


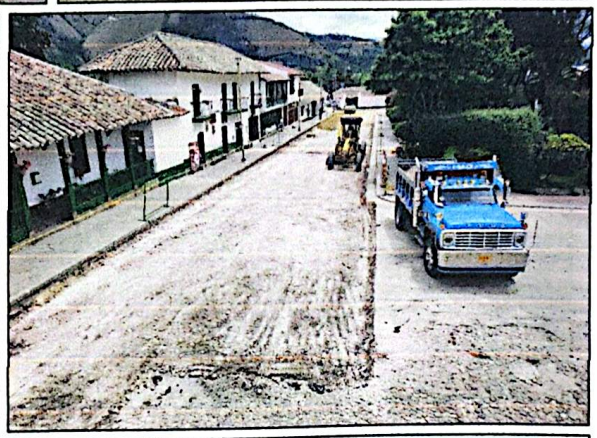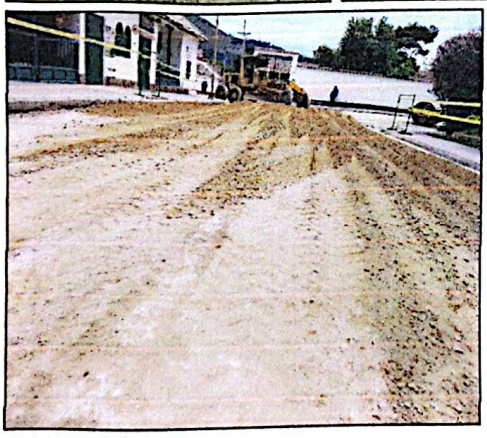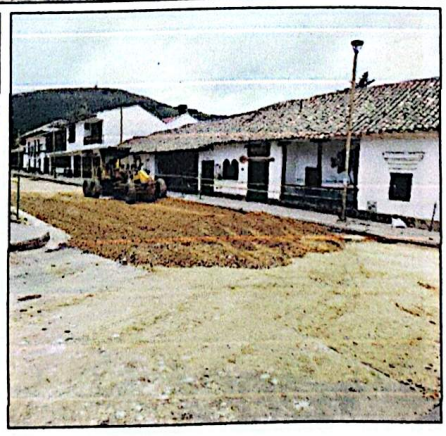
Powered by CamScanner

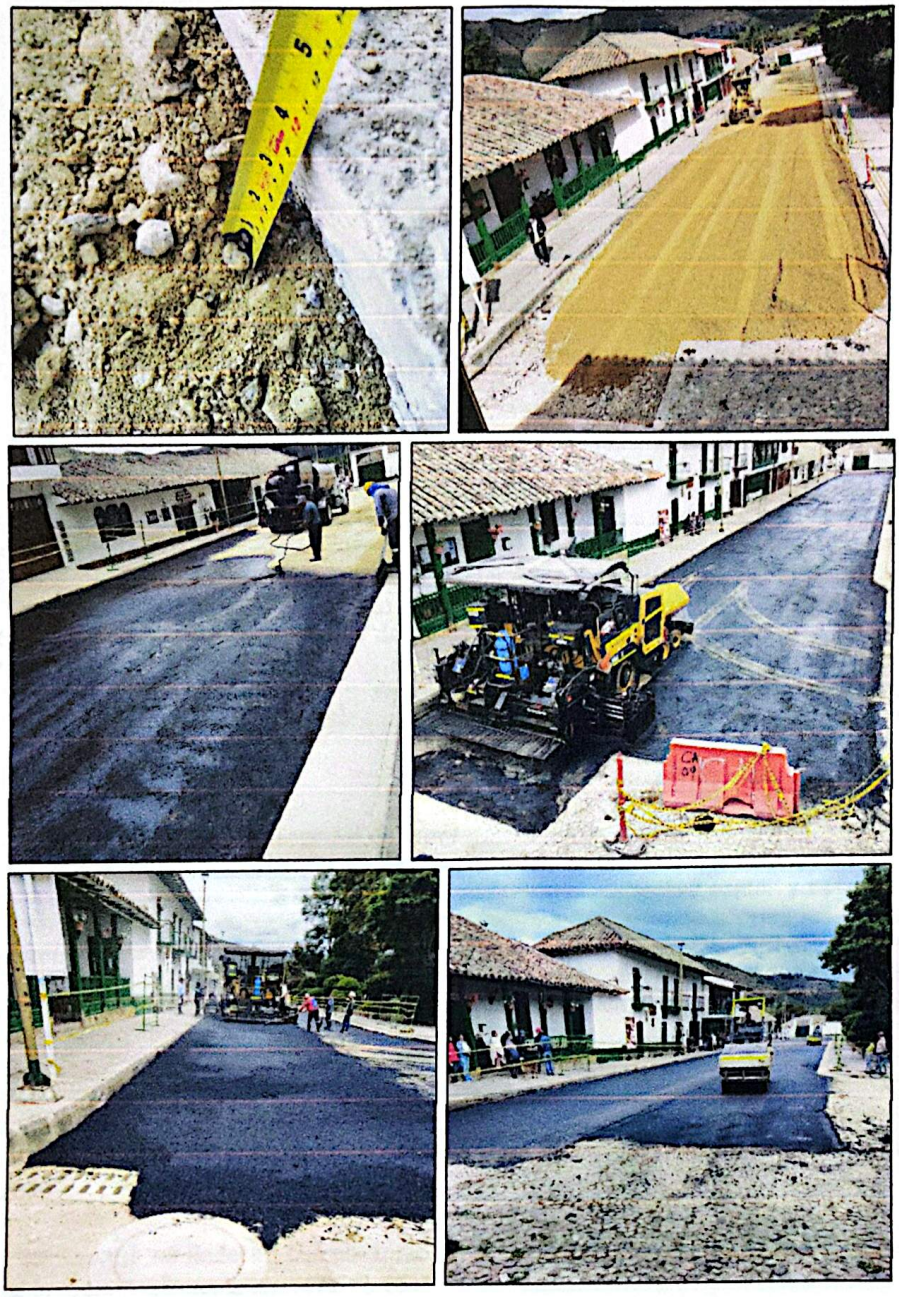

Powered by CamScanner



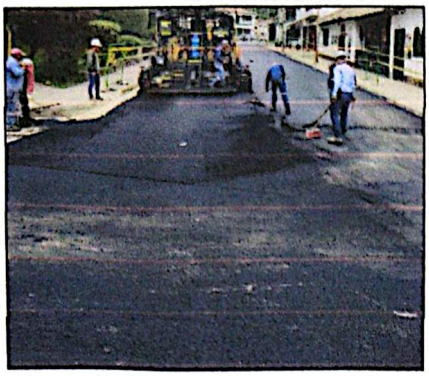

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS –ERI SAS**, ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública y se ha contribuido con el acatamiento de los, planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley de Régimen Municipal y el programa de gobierno.
Además de ello, con el presente informe Informarse se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionaos con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

6. COMPONENTE JURÍDICO

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Iza Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que el contratista **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS –ERI SAS,** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.

El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011.

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
Supervisor

Powered by CamScanner

PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029949	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	07	2025	16	05	2025	00:00	20	06	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ROSAS MESA, JOHN EMERSON	CC: 74.081.029

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 12 11 58 IN 16	SOGAMOSO, BOYACA	3103120770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS NIT 901881213-1 Y MUNICIPIO DE IZA NIT 891.856.077-3	NIT: 901.881.213-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 1 5 - 08	SOGAMOSO, BOYACA	3144908931

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N. 2025-023 CUYO OBJETO ES:REALIZAR CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/05/2025	20/10/2025	$19,968,491.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/05/2025	20/06/2028	$9,984,245.60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/06/2025	19/06/2030	$19,968,491.20	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******49,921,228.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029949

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-44-101029949**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**07**	**2025**	**16**	**05**	**2025**	**00:00**	**20**	**06**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ROSAS MESA, JOHN EMERSON	**CC: 74.081.029**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 12 11 58 IN 16	SOGAMOSO, BOYACA	3103120770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS NIT 901881213-1 Y MUNICIPIO DE IZA NIT 891.856.077-3	**NIT: 901.881.213-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 15 NRO. 1 5 - 08	SOGAMOSO, BOYACA	3144908931

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******49,921,228.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101029949	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	07	2025	16	05	2025	00:00	20	06	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ROSAS MESA, JOHN EMERSON		**CC: 74.081.029**
DIRECCIÓN: KR 12 11 58 IN 16	**CIUDAD:** SOGAMOSO, BOYACA	**TELÉFONO:**	3103120770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS NIT 901881213-1 Y MUNICIPIO DE IZA NIT 891.856.077-3		**NIT: 901.881.213-1**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 1 5 - 08	**CIUDAD:** SOGAMOSO, BOYACA	**TELÉFONO:**	3144908931

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101029949

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
No. CIAD – 003 - 2025

FECHA:	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
PERIODO:	DEL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL AL VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS
NIT:	901.881.213-1
REP. LEGAL	JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA
C.C. N°	1.049.602.118 EXPEDIDA EN SOGAMOSO
OBJETO:	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ"
RECUERSOS PARA ADMINISTRAR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($199.684.912,00).
VALOR ADMINISTRACIÓN DELEGADA:	QUINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.990.547,00).
ADICION:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
TERMINO DEL CONTRATO:	*UN (01) MES*
PRORROGA:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2025
DISPONIBILIDAD:	2025000114
REGISTRO:	*2025000134*
VALOR ADICIONADO	N/A
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
RUBROS:	2.3.2.02.02.005.27 Denominado, construcción y servicios de la construcción – departamento de Boyacá Convenio No. 2579 de 2024 $75.000.000, Rubro 2.3.2.02.02.005.06.24.2402.2402041 denominado Construcción y servicios de la construcción – vías terciarias alcaldía $ 115.076.584, rubro 2.3.2.02.02.005.05.24.2402.2402021 denominado Construcción y servicios de construcción vías *secundarias alcaldía $15.568.875.*
NUMERO DE PLANILLA:	9485449196 – 9486867289 – 9487857396 - 9489875867
SUPERVISOR:	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ

Powered by CamScanner

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

GARANTIAS	51-44-101029949 / 51-44-1010086
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CUANDO CORRESPONDA	CUMPLE

En el Municipio de Iza, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2025, se reunieron el señor alcalde EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ, en calidad de supervisor designado por la alcaldía Municipal por YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ Secretario de Planeación y la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS con NIT 901.881.213-1, Representante Legal el señor JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.602.188 expedida en Sogamoso Boyacá en calidad de contratista, con el objeto de suscribir acta de recibo final.

PRIMERO: *El suscrito supervisor certifica que el* CONTRATISTA *cumplió a satisfacción* el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Municipio por todo concepto, igualmente, durante la ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al sistema general en seguridad social en Salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con las normas legales vigentes.

SEGUNDO: Se ha cumplido con el objeto del contrato, dando como terminado el contrato cuyo es **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA COSNTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ"**, por un valor ejecutado por el contratista por la suma de Doscientos tres millones ochocientos un mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($ 203.801.455,00). El valor no ejecutado, corresponde a un millón ochocientos setenta y cuatro mil cuatro pesos ($1.874.004,00).

TERCERO: Se hace necesario adjuntar informe final de la ejecución del contrato, a la presente acta, en el cual se presenta la evidencia del cumplimiento de la totalidad el objeto contractual.

CUARTO: Los abajo firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma.

QUINTO: Una vez leída y aprobada en su totalidad, es firmada por quienes en ella intervinieron, remitiendo el original al archivo.

Para constancia, se firma a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
Alcalde Municipal

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS
NIT: 901.881.213-1
R/L JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA
C.C. N° 1.049.602.188 EXPEDIDA EN SOGAMOSO

YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ
Secretaria de Planeación
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
REVISÓ	YARLEY GERARDO PEDRAZA DÍAZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
APROBÓ	EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ	ALCALDE MUNICIPAL

Powered by CamScanner
