
DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023dellano@gmail.com
NIT: 901731378-3

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 320.11.047 DEL DOCE (12) DE AGOSTO DE 2025

INFORME PAGO PARCIAL No. 1
09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

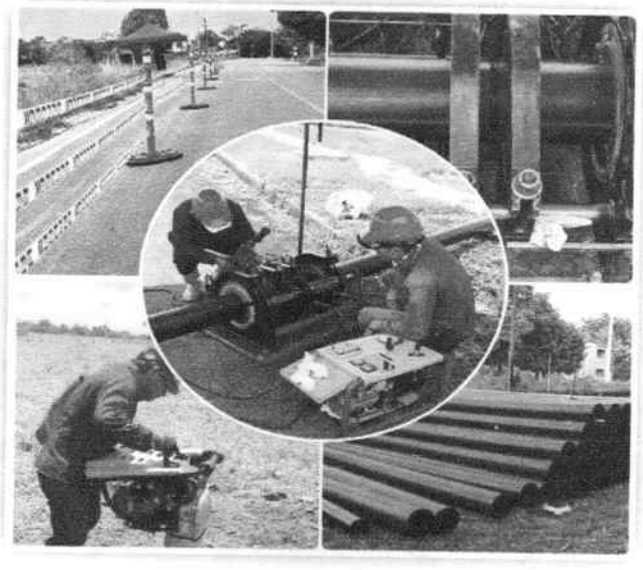

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE."

VILLANUEVA CASANARE
2025

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023dellIano@gmail.com
NIT: 901731378-3

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 320.11.047 DE 12 DE AGOSTO DE 2025
R/L YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA

UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025
CONTRATO DE OBRA No 320.11.050 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
R/L JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA "ESPAVI S.A E.S.P"
OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA
SUPERVISOR DESIGNADO

NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO No. 320.11.047 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025		
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"		
INFORME PAGO PARCIAL No 1		
APROBACIÓN		
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	FIRMA	
	NOMBRE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CARLOS ANDRÉS BELTRÁN LADINO
RESPONSABLE DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	FIRMA	
	NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
RESPONSABLE DE APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	FIRMA	
	NOMBRE	R/L INTERVENTORÍA YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA

REVISIÓN Y APROBACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 11
2. OBJETIVOS 12
2.1 OBJETIVO GENERAL 12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
3 ANTECEDENTES 13
4 GENERALIDADES 13
4.1. ALCANCE DEL PROYECTO 13
4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 14
4.3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA No. 320.11.050-2025 18
4.4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320.11.047-2025 19
5 INFORMACIÓN TÉCNICA 20
5.1. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 320.11.050-2025 OBJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA 21
5.2. AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No 320.11.050-2025 26
6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 27
6.1 ACTAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL CONTRATO. 27
7 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 27
7.1 ANALIZAR, ESTUDIAR Y APROBAR EL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES, ACCESOS, CAMPAMENTOS, VALLAS, CERRAMIENTOS, ETC. 27
7.2 CORRESPONDE AL INTERVENTOR, ANTES DE SUSCRIBIR ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, REVISAR Y APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PROGRAMA SISO, PLAN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO CON INDICADORES DE FLUJO DE INVERSIÓN Y REVISAR DISEÑOS Y REALIZARÁ AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS MISMOS 29
7.2.1. Seguimiento al Plan de Manejo de Transito 30
7.2.2. Controles de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 31
7.3 VELAR POR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO, CON MIRAS A QUE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA OBRA SEA ADECUADA Y LOS RIESGOS SEAN MÍNIMOS. ESTE CRITERIO SE HARÁ EXTENSIVO AL EXTERIOR DE LAS OBRAS, PARA BUSCAR LA SEGURIDAD DEL TRANSEÚNTE Y DE LAS CONSTRUCCIONES ADYACENTES 33
7.4 COORDINAR LAS RELACIONES ENTRE LOS CONTRATISTAS, LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN 37
7.5 MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS Y DESARROLLO DE LOS CONTRATOS, INFORMANDO SOBRE LAS DETERMINACIONES TOMADAS Y ENVIADO COPIA DE LAS COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LOS CONTRATISTAS, QUE CONSIDERE PERTINENTES 37

7.6 EJERCER CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATISTAS Y PERMANECER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS MIENTRAS DURE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 38
7.7 DISPONER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PERSONAL, EQUIPOS E IMPLEMENTOS, INSTALACIONES Y DEMÁS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA 38
7.8 EXIGIR A LOS CONTRATISTAS LA PERMANENCIA EN LA OBRA DEL INGENIERO RESIDENTE. 39
7.9 CONTROLAR EL PERSONAL A CARGO DE LOS CONTRATISTAS, EXIGIR EL EMPLEO DE PERSONAL CAPACITADO Y SOLICITAR LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES 39
7.10 PRÁCTICAS DE INSPECCIONES COMPLETAS Y DIARIAS A LAS OBRAS Y REALIZAR REUNIONES SEMANALES (COMITÉ DE OBRA) CON EL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN 41
7.11 SOMETER A LA APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DURANTE LOS PRIMEROS SIETE (7) DÍAS DE CADA MES, LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CONTROL DE LOS PROGRAMAS, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, EL ESTADO DE LOS CONTRATOS Y DEMÁS ASPECTOS INHERENTES A LOS MISMOS. 42
7.12 CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES Y ÓRDENES QUE LE IMPARTA LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN Y RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 43
7.13 REALIZAR INFORMES MENSUALES DE AVANCES DE OBRA EN COORDINACIÓN CON LA INTERVENTORÍA 43
7.14 CONSIGNAR EN ACTAS TODOS LOS CONVENIOS, ACUERDOS O PACTOS QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE LOS TRABAJOS 43
7.15 PRESTAR EFECTIVA COLABORACIÓN A LAS COMISIONES EVALUADORAS O DE INSPECCIÓN ENVIADAS POR LA INTERVENTORÍA Y SUMINISTRARLES LA INFORMACIÓN QUE SOLICITEN 44
8 FUNCIONES TÉCNICAS 45
8.1 EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO Y EN LAS LEYES, DECRETOS Y NORMAS QUE LE APLIQUEN 45
LA INTERVENTORÍA REALIZA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA Y VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y REQUERIMIENTO EXIGIDOS POR LAS DIFERENTES REGLAMENTACIONES QUE APLICAN 45
8.2 IMPARTIR DE MANERA OPORTUNA Y CLARA LAS INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 45
LA INTERVENTORÍA EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA OBSERVACIÓN AL PROCESO CONSTRUCTIVO O DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA DE OBRA DEL PRESENTE DÍA Y SE INDICARÁ ACEPTACIÓN O RESPUESTA EN LA MISMA Y POSTERIOR FIRMA POR PARTE DE LOS RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORÍA COMO GARANTES 45
8.3 EXIGIR LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA, RECOMENDAR LO QUE ESTIME Y

CONTRIBUYA A LA MEJOR EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y EN GENERAL ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE PROPENDAN POR LA ÓPTIMA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO.....45
8.4 DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE TODAS SUS ACTUACIONES. LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE IMPARTA SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO SIEMPRE CUANDO ESTÉN EN CONCORDANCIA CON LA LEY Y LO PACTADO 45
8.5 EXIGIR AL CONTRATISTA ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO MANTENER VIGENTES LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES INDICADAS EN EL CONTRATO 45
8.6 SUSCRIBIR LAS DIFERENTES ACTAS.....46
8.7 RESOLVER LAS CONSULTAS QUE PRESENTE EL CONTRATISTA Y HACERLAS OBSERVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE. SI DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRESENTAN DUDAS O DIFERENCIAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA, DEBERÁN SER ACLARADAS CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO 46
8.8 SUPERVISAR, ORIENTAR. PROGRAMAR Y CONTROLAR AL PERSONAL AUXILIAR QUE SE LE ASIGNE PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE INTERVENTORÍA 46
- ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.....47
8.9 REALIZAR LOS INFORMES NECESARIOS DE ACUERDO A LA CLASE DE INTERVENTORÍA Y LA NATURALEZA DEL CONTRATO OBJETO DE LA MISMA. INFORMAR A LA ENTIDAD SOBRE LA MATERIALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EXORBITANTES PACTADAS O INCORPORADAS AL CONTRATO POR MINISTERIO DE LA LEY, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD.....49
8.10 DAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA E INFORMAR A LOS ORGANISMOS DE CONTROL LAS IRREGULARIDADES QUE PUEDAN DAR LUGAR A INVESTIGACIONES POR PARLE DE ESTOS DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.....49
8.11 REQUERIR AL CONTRATISTA SOBRE LOS HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO E INFORMAR SOBRE LOS MISMOS A LA ENTIDAD.....49
8.12 ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA POR EL CONTRATISTA PARA ADELANTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y EXIGENCIA AL MISMO PARA QUE DISPONGA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS EN EL SITIO DE LA OBRA PARA LA FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA Y ASÍ EVITAR RETRASOS EN LA PROGRAMACIÓN.....49
8.13 PREVIAMENTE A LA INICIACIÓN DEL PROYECTO, LA INTERVENTORÍA DEBERÁ ESTAR ENTERADA COMPLETA Y DETALLADAMENTE DE ÉSTE, DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LAS PROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y DE LAS DEMÁS NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 69
8.14 REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y SUGERENCIA DE MODIFICACIONES, EN CASO DE SER NECESARIAS.....69
8.15 CONTROLAR EL OPORTUNO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Y RECHAZAR LOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O SE ENCUENTREN DEFECTUOSOS 70
8.16 EVALUAR Y APROBAR LAS FUENTES DE MATERIALES Y COLABORAR EN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES Y DE LAS SERVIDUMBRES QUE LOS CONTRATISTAS REQUIERAN 71
8.17 INSPECCIONAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, LOS ENSAYOS, LAS PRUEBAS DE INSTALACIÓN Y DE LA OBRA EJECUTADA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, RECHAZANDO LOS MATERIALES O LA OBRA QUE NO CUMPLA CON LAS CALIDADES EXIGIDAS..... 71
8.18 APROBAR O RECHAZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLANTAS E INSTALACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE SUMINISTREN PARA LAS OBRAS. DAR RECOMENDACIONES E IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE EL ORDEN EN QUE SE DEBEN ACOMETERLOS TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OBRA Y DE LAS NORMAS DE DISEÑO Y SEGURIDAD APROPIADAS EN CADA CASO. 71
8.19 EXIGIR, REVISAR Y CONTROLAR LOS PROGRAMAS DETALLADOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DE SUMINISTROS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, RECOMENDAR A LA INTERVENTORÍA SU ACEPTACIÓN Y LLEVAR EL CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO E INFORMAR SOBRE SU AVANCE REAL, PARA LOGRAR QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS..... 72
8.20 SUPERVISAR LA LOCALIZACIÓN EN EL TERRENO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE, DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS DEFINITIVOS Y SUMINISTRAR AL CONTRATISTA LOS PUNTOS DE NIVEL Y TRÁNSITO AL INICIO DEL PROYECTO Y CUANDO SE REQUIERA 72
8.21 VERIFICAR QUE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS, RESPECTO A LAS OBRAS Y ACCIONES FORMULADAS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERE EL PROYECTO, SE DESARROLLEN DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DETERMINADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 72
8.22 ESTUDIAR LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y CONSULTAS DE LOS CONTRATISTAS SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, RESOLVER OPORTUNAMENTE AQUELLAS QUE FUEREN DE SU COMPETENCIA Y DAR TRASLADO DE LAS QUE NO LE COMPETEN POR TRATARSE DE CAMBIOS SUSTANCIALES A LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES..... 73
8.23 EFECTUAR OPORTUNAMENTE UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS CANTIDADES DE OBRA, A FIN DE COMPARARLAS CON LAS QUE ESTÁN INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS Y EN CASO DE DISCREPANCIA ACLARAR A LA INTERVENTORÍA Y A LOS CONTRATISTAS LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS..... 73
8.24 REGISTRAR CON EL CONTRATISTA O EL REPRESENTANTE DE AQUEL EN LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRAS LAS ACCIONES REALIZADAS: LOS INVENTARIOS PERIÓDICOS DE MATERIALES, EQUIPO Y PERSONAL: LAS ACTAS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS DE OBRAS QUE SE REALICEN: LAS NOVEDADES QUE SE PRESENTEN: LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR CONSULTORES EXTERNOS A LA OBRA Y DEMÁS OBSERVACIONES QUE A SU JUICIO SEAN NECESARIAS HACER 74

8.25 ORDENAR LO NECESARIO PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE LLEVE A CABO SIN OCASIONAR PERJUICIOS A TERCEROS 74
9 FUNCIONES GENERALES FINANCIERAS Y CONTABLES 74
9.1 GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO, INCLUYENDO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD O EL REGISTRO PRESUPUESTAL 74
9.2 VERIFICAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS CANTIDADES Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 77
8.3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso..... 90
9.4 DAR VISTO BUENO O RECHAZAR LAS CUENTAS QUE PRESENTE EL CONTRATISTA PARA ADELANTAR EL TRÁMITE DEL PAGO CORRESPONDIENTE. (COBROS PARCIALES) 94
9.5 VIGILAR QUE LA INTERVENTORÍA SIEMPRE ESTE AMPARADO POR UNA PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CON CADA CONTRATO, LA CUAL SE MANTENDRÁN VIGENTE DURANTE SU VIDA Y LIQUIDACIÓN Y SE AJUSTARÁ A LOS LÍMITES, EXISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LOS RIESGOS AMPARADOS 96
9.6 REVISARLAS ACTAS DE REAJUSTE DE PRECIOS, ELABORADA POR EL CONTRATISTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS, PRESENTÁNDOLOS A LA INTERVENTORÍA PARA SU APROBACIÓN 96
9.7 PRESENTAR DURANTE LOS PRIMEROS TRES (3) DÍAS DE CADA MES PARA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA, LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE SU TRABAJO Y RELACIONAR LOS COSTOS DE PERSONAL Y GASTOS REEMBOLSABLES PRESUPUESTADOS POR EL PERIODO SIGUIENTE (ESTO EN CASO DE QUE HAYA CAMBIO DE PROGRAMACIÓN). ESTOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE PERSONAL Y GASTOS REMBOLSABLES DE LA INTERVENTORÍA 97
9.8 ELABORAR LA CONTABILIDAD DEL PROYECTO 97
9.9 PRESENTAR UN INFORME FINAL A LA INTERVENTORÍA, EL CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO UN BALANCE DETALLADO DE COSTOS DEL PROYECTO, CONTABILIDAD Y RECUENTO FOTOGRÁFICO DEL MISMO 97
10 FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL. 98
10.1 VERIFICAR QUE CONTRATISTA DE OBRA CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PARA EL PROYECTO 98
11 CONCLUSIONES 99
12 ANEXOS 100

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa Ubicación Municipio Del Proyecto- Fuente propia 15
Ilustración 2 Vista en planta ampliación acueducto 17
Ilustración 3: Organigrama del proyecto 48
Ilustración 4: Programado vs Ejecutado- fuente propia 89

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1 Localización del Proyecto, Fuente: Google Eart "Satélite" 15
Imagen 2 Instalaciones de Oficinas y Bodega 28
Imagen 3 Valla informativa – Contrato de obra N°320.11.050-2025 29
Imagen 4 Señalización seguimiento PMT 31
Imagen 5 Entrega de EPP, Jornadas de capacitaciones y supervisión de los elementos de emergencia y primeros auxilios 33
Imagen 6 Socialización del proyecto
Imagen 7: Control de equipos en la obra 71
Imagen 8: Control en la recolección y disposición final de los residuos originados en la obra. 73
Imagen 7: CDP Contrato de Obra No 320.11.050-2025 75
Imagen 8: RP Contrato de Obra No 320.11.050-2025 75
Imagen 9: CDP Contrato de interventoría No 320.11.047-2025 76
Imagen 10: RP Contrato de interventoría No 320.11.047-2025 76

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Alcance del Proyecto 21
Tabla 2 Presupuesto general aprobado 22
Tabla 3 Avance de Obra. 26
Tabla 4:Relación de personal administrativo y de obra de UT. ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 y prestación de servicios 34
Tabla 5: Personal de obra que ingresa 35
Tabla 6: Personal de obra afiliado a la seguridad social 35
Tabla 7 Correspondencia enviada y recibida. 37
Tabla 8 Personal de obra, Pagos de planillas de SST 39
Tabla 9 Personal de interventoría, Pagos de planillas de SST 41
Tabla 10: Presupuesto de interventoría 320.11.047-2025 42

Tabla 11 Personal contrato de interventoría 48
Tabla 12 Relación de Equipos 70
Tabla 13 Cantidades de avance en obra 09/10/2025 al 31/10/2025 77
Tabla 14 Póliza Garantía de Cumplimiento Inicial Cto. de Obra 320.11.050 de 2025, Según Contrato, anexo 0 92
Tabla 15 Póliza Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual Inicial Cto. de Obra 320.11.050 de 2025, Según Contrato, anexo 0. 92
Tabla 16 Póliza Garantía de Cumplimiento Cto de Obra 320.11.050 de 2025, según acta de inicio (con fecha de aprobación 20 de octubre de 2025) 92
Tabla 17 Póliza Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual Cto de Obra 320.11.050 de 2025, según acta de inicio, anexo 2 (con fecha de aprobación 20 de octubre de 2025) 92
Tabla 20 Condiciones Garantía de Cumplimiento Cto. de interventoría 320.11.047 de 2025 - Fuente: Contrato de interventoría 320.11.047 de 2025 93
Tabla 21 Condiciones Garantía de Cumplimiento Cto. de interventoría 320.11.047 de 2025, Según Contrato, anexo 0; 94
Tabla 22 Condiciones Garantía de Cumplimiento Cto. de interventoría 320.11.047 de 2025, Según acta de inicio, anexo 2 94

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe de interventoría se expone de manera detallada el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 09 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

La Empresa de Servicios Públicos de Villanueva – ESPAVI S.A. E.S.P., mediante el proceso de selección por invitación, adjudicó a la UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 el Contrato de Obra Pública No. 320.11.050 del 12 de septiembre de 2025, cuyo objeto corresponde a la "Ampliación del Acueducto Urbano para el Sector de La Colmena Incorporado al Perímetro Urbano desde la Calle 24 al Km 1+091, en el Municipio de Villanueva, Casanare".

De manera complementaria, la **CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO S.A.S**. fue seleccionada mediante el Contrato de Consultoría No. 320.11.047 del 12 de agosto de 2025, con el objeto de realizar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE**".

El propósito general de ambos contratos es fortalecer y ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua potable del municipio, asegurando una cobertura continua y eficiente para los sectores en expansión urbana.

Cada informe mensual de interventoría tiene como finalidad presentar el avance físico y financiero de la obra, describiendo las actividades desarrolladas, las cantidades ejecutadas, los valores asociados, las modificaciones o novedades surgidas, así como el estado de pólizas. Además, se incluyen los registros fotográficos, resultados de los ensayos de laboratorio efectuados conforme a la normativa vigente y las principales observaciones consignadas en la bitácora de obra durante el periodo evaluado.

Cabe destacar que el contrato de obra inició formalmente el 09 de octubre de 2025, fecha en la cual se dio inicio a las labores de replanteo, excavación manual, e instalación de tubería de polietileno de 6" y 10".
A continuación, se presenta el Informe Mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de octubre al 31 de diciembre de 2025, elaborado por la Unión Temporal Acueducto Villanueva 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL.

Evaluar el avance físico y financiero de las obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de abastecimiento de agua potable, en el tramo comprendido entre la Calle 24 con Carrera 12 al Km 1+091, correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre, verificando el cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas, cronograma y presupuesto establecidos. Asimismo, se realiza el seguimiento a los aspectos administrativos, financieros y de control de calidad, con el fin de garantizar una ejecución eficiente, transparente y conforme a los lineamientos contractuales y normativos vigentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar actividades de revisión de planos y verificación de referencias topográficas para garantizar el inicio de las actividades del contratista de obra.
- Verificar la programación ajustada al tiempo solicitado para su control y seguimiento.
- Verificar la correcta afiliación a las diferentes entidades establecidas en el contrato del personal contratado en el proyecto que se encuentra en ejecución.
- Verificar la vigencia de las pólizas de garantías contratadas que se encuentren dentro de la vigencia y plazos establecidos.
- Realizar un seguimiento exhaustivo a cada una de las actividades que se vienen ejecutando en la obra en lo concerniente a las especificaciones técnicas y los alcances contractuales.

3 ANTECEDENTES

La Empresa de Servicios Públicos de Villanueva – ESPAVI S.A. E.S.P., en su compromiso por fortalecer y ampliar la infraestructura de servicios públicos esenciales del municipio, gestionó los recursos necesarios para la ejecución del proyecto **"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE"**. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de mejorar la cobertura, continuidad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando el suministro hacia los nuevos sectores de expansión urbana, especialmente al área comprendida entre la Calle 24 con Carrera 12 – Torres Las Vegas y la entrada al sector La Colmena.

Previo al inicio de las obras, se llevaron a cabo los estudios técnicos, topográficos e hidráulicos necesarios para definir la ruta de conducción y las condiciones del terreno. Dichos estudios incluyeron análisis de suelos, determinación de pendientes, verificación de interferencias con redes existentes y diseño estructural para la instalación de una cercha metálica que permitirá el paso aéreo de la tubería sobre el puente existente, asegurando la funcionalidad y durabilidad del sistema.

La ejecución del proyecto contribuirá significativamente al fortalecimiento del sistema de acueducto urbano, optimizando la capacidad hidráulica y mejorando la prestación del servicio para los actuales y futuros usuarios del sector La Colmena, promoviendo a su vez un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

El contrato de obra pública No. 320.11.050 del 12 de septiembre de 2025, resultado del proceso de invitación privada, fue adjudicado por ESPAVI S.A. E.S.P. a la **UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025**, bajo la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica de la Constructora R&Y del Llano S.A.S., conforme al Contrato de Consultoría No. 320.11.047 del 12 de agosto de 2025.

4 GENERALIDADES.

4.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del contrato de consultoría No 320.11.047 del 2025 es ejercer control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra No 320.11.050 del 2025.

Interventoría supervisara, exigirá, acompañara y controlara de forma eficaz y de manera permanente todas las fases del proyecto obra contratado, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídico y hará cumplir las especificaciones técnicas, los plazos de ejecución, las actividades administrativas, leales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales establecidas en el contrato.

4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Villanueva está ubicado en la parte sur del Departamento de Casanare, sobre la parte baja del piedemonte, a las orillas de los caños Aguaclara y Perales o Arietes, a 4° 57" de latitud Norte y 73° 94" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. El casco urbano del municipio se encuentra localizado sobre los 300 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 25.7 °C, siendo los meses de enero a marzo los más calurosos; la temporada de lluvias se presenta a partir del mes de abril prolongándose hasta octubre, de acuerdo con la estación del IDEAM Huerta La Granja. Estas características indican un clima cálido y húmedo o de bosque húmedo tropical (bhT) para el Municipio de Villanueva.

El municipio limita al NORTE con el municipio de Sabanalarga, al SUR y OCCIDENTE con el departamento del Meta, siendo los ríos Upía y Meta sus límites naturales y al ORIENTE con los municipios de Monterrey y Tauramena, donde el río Túa es su límite natural. El municipio ocupa una extensión territorial de 852 kilómetros cuadrados.

El proyecta iniciara en la calle 24 con carrera 12 (Torres las Vegas) y finalizara a la entrada de La colmena km1+091 en el municipio de Villanueva (Casanare). Se proyecta la ampliación de la infraestructura de abastecimiento de agua potable del municipio de Villanueva Casanare.

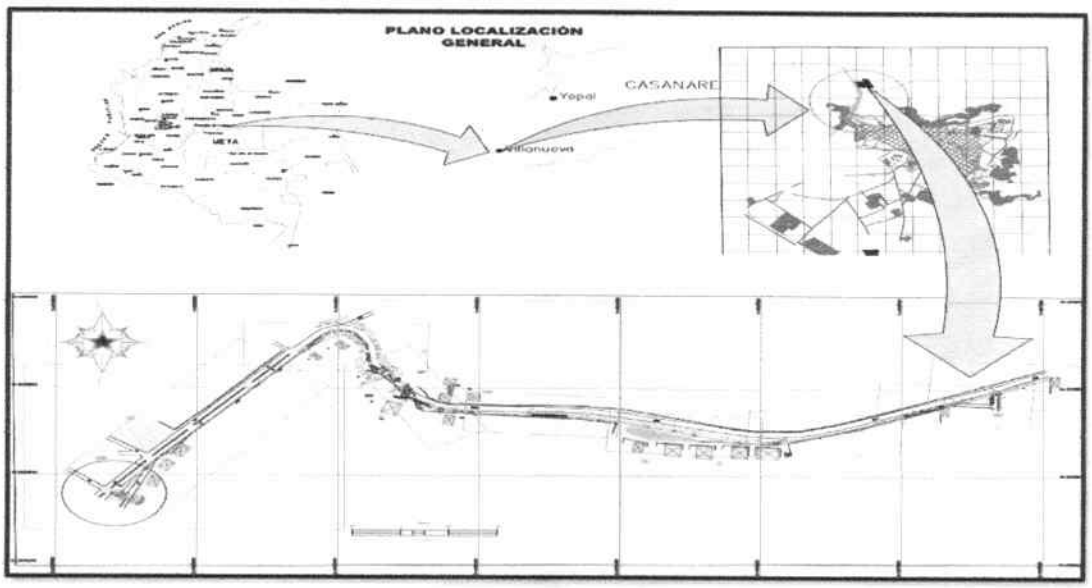


Ilustración 1: Mapa Ubicación Municipio Del Proyecto- Fuente propia

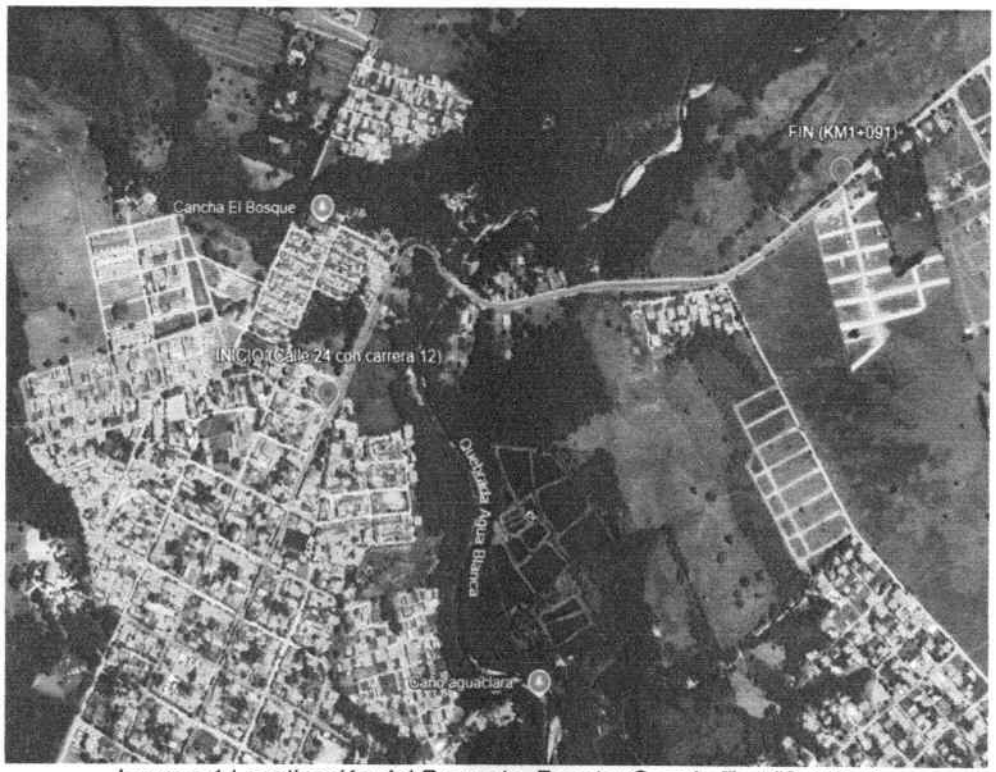


Imagen 1 Localización del Proyecto, Fuente: Google Eart "Satélite"

- **Extensión**

La extensión total del municipio de Villanueva es de 825 Km2 distribuidos de la siguiente manera:
Urbano: 37,56 Km2
Rural: 8212,44 Km2

- **Población Área Urbana – Rural**


Según datos estadísticos del DANE, el último censo realizado en el año 2018 registró una población aproximada de 35.305 habitantes en el municipio de Villanueva, de los cuales 26.322 residen en la zona urbana y 8.983 en el área rural. Adicionalmente, de acuerdo con el censo catastral efectuado por el Consorcio Master Plan, se estimó una población conformada por 14.481 adultos y 6.076 niños, resultado obtenido a partir del levantamiento censal aplicado al 80% de la población urbana.

- **Geomorfología**

Villanueva está situado en una zona de transición y comprende áreas de piedemonte, planicie y altillanura, con una variada morfología que genera diversidad de formas topográficas bien marcadas como lomas, terrazas, sabanas y valles, también presenta como resultado de la confluencia de diversos factores entre ellos tectónismo intenso, erosión marcada, escorrentía y litología.

- **Finalidad Del Proyecto**

La finalidad del proyecto "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA, INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 HASTA EL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", es fortalecer la infraestructura de los servicios públicos esenciales del municipio, respondiendo a la necesidad de mejorar la cobertura, continuidad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando así el suministro hacia los nuevos sectores de expansión urbana.

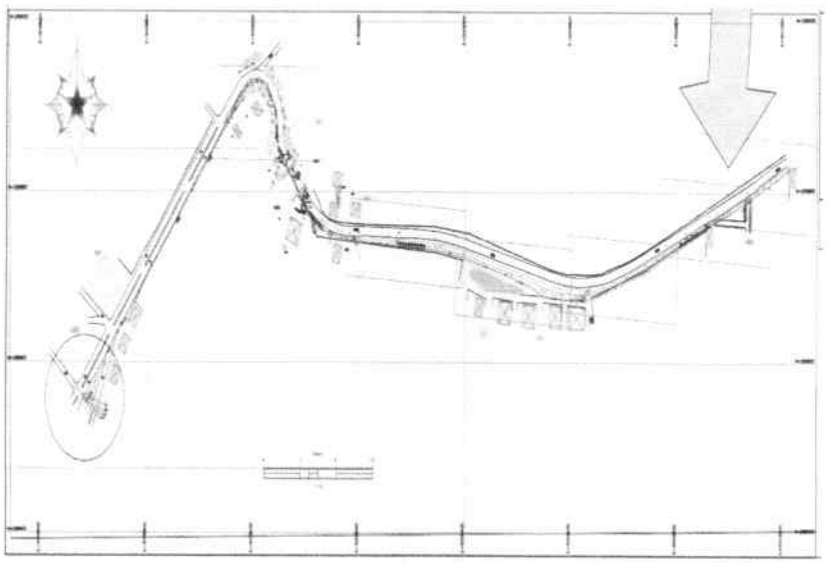

Fuente: Plano

Ilustración 2 Vista en planta ampliación acueducto

4.3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA No. 320.11.050-2025

No DE CONTRATO	320.11.050-2025
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA **ESPAVI SA ESP**
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025
NIT	901.987.065-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	OCHO (08) DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRES PESOS M/CTE ($ 1.089.053.003).
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS R/L YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA
SUPERVISOR	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA

4.4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320.11.047-2025.

No DE CONTRATO	320.11.047-2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI SA ESP
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS
NIT	901.731.378-3
REPRESENTANTE LEGAL	YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DOCE (12) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS ($205.771.121,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
SUPERVISOR	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA

5 INFORMACIÓN TÉCNICA.

El contrato de obra No 320.11.050-2025 objeto de vigilancia y control a través de la presente interventoría cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Con la ejecución de dicho contrato, objeto y vigilancia y control del contrato de interventoría No 320.11.047-2025, se busca ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua potable para dar cumplimiento al objeto "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"

De acuerdo con las especificaciones técnicas aplicables al tipo de infraestructura, el presente proyecto se rige por los lineamientos y buenas prácticas de ingeniería para la construcción de redes de acueducto, garantizando la calidad, funcionalidad y durabilidad de las obras ejecutadas.

El sistema de acueducto constituye un elemento esencial para la calidad de vida y el bienestar de la población, al asegurar el acceso continuo y seguro al recurso hídrico. La infraestructura hidráulica no solo representa un componente fundamental de salud pública, sino que también incide directamente en el desarrollo económico, urbano y social del territorio, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de habitabilidad y al ordenamiento sostenible del municipio.

El cumplimiento de estas especificaciones garantiza la adecuada conducción y distribución del agua potable hacia los nuevos sectores incorporados al perímetro urbano, optimizando la eficiencia hidráulica y reduciendo las pérdidas del sistema. Además, permite garantizar que las obras ejecutadas cumplan con los criterios de calidad, funcionalidad y sostenibilidad exigidos por la normatividad vigente.

La Empresa de Servicios Públicos de Villanueva – ESPAVI S.A. E.S.P, como entidad contratante, adjudicó mediante proceso de invitación privada el Contrato de Obra Pública No. 320.11.050 del 12 de septiembre de 2025 a la Unión Temporal Acueducto Villanueva 2025, encargada de la ejecución del proyecto.

De igual forma, la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica fue adjudicada a la Constructora R&Y del Llano S.A.S., conforme al Contrato de Consultoría No. 320.11.047 del 12 de agosto de 2025, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y la correcta administración de los recursos asignados.

El proyecto denominado "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", tiene como objetivo optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable del municipio mediante la ampliación de la red de distribución y la mejora de su capacidad hidráulica, para ello es necesario el desarrollo de las siguientes actividades como (capítulos):

Tabla 1 Alcance del Proyecto

N°	DESCRIPCIÓN
1	OBRAS PRELIMINARES
2	EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES
3	TUBERÍA Y VÁLVULAS
4	PASO ELEVADO TIPO CERCHA
5	CAJA EN CONCRETO ACEROS Y OTROS

Fuente propia

5.1. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 320.11.050-2025 OBJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA.

Los trabajos del contrato de obra No 320.11.050-2025 están distribuidas contractualmente de la manera como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 2 Presupuesto general aprobado

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	1,435.87	$ 6,436.00	$ 9,241,259.00
Subtotal					**$ 9,241,259.00**
2	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**				
2.1	Excavación manual en conglomerado	m³	1,433.81	$ 100,509.00	$ 144,110,809.00
2.2	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	543.05	$ 42,791.00	$ 23,237,653.00
2.3	Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	4.07	$ 260,763.00	$ 1,061,305.00
2.4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	410.36	$ 124,347.00	$ 51,027,035.00
2.5	Relleno de excavación (con material local) compactado	m³	669.88	$ 42,007.00	$ 28,139,649.00
2.6	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)	m³	7.53	$ 753,904.00	$ 5,676,897.00
2.7	Corte en concreto	m	85.20	$ 32,479.00	$ 2,767,211.00
2.8	Concreto lanzado y/o proyectado de 3000 Psi de 8 cm, incluye malla electrosoldada, para estabilización de taludes.	m²	48.60	$ 190,546.00	$ 9,260,536.00
2.9	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	4.40	$ 836,389.00	$ 3,680,112.00
2.10	Cárcamo en concreto 3000 Psi para protección de tubería de HD - PE superficial	m³	23.77	$ 1,185,206.00	$ 28,172,347.00
Subtotal					**$ 297,133,554.00**

3	TUBERÍA Y VÁLVULAS				
3.1	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	m	1,094.86	$ 301,345.00	$ 329,930,587.00
3.2	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de 160 mm	m	342.01	$ 130,735.00	$ 44,712,677.00
3.3	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instalación	m	209.00	$ 21,411.00	$ 4,474,899.00
3.4	Tubería presión PVC RDE 21 3". Suministro e instal.	m	9.50	$ 83,842.00	$ 796,499.00
3.5	Curva de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	und	16.00	$ 2,153,859.00	$ 34,461,744.00
3.6	Codo presión PVC 45° ø 3. Suministro e instal.	und	18.00	$ 78,051.00	$ 1,404,918.00
3.7	Reducción de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10" a Ø=160 mm = 6"	und	1.00	$ 1,414,210.00	$ 1,414,210.00
3.8	Tee en H.D. 10" x 10" J.H. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 5,153,508.00	$ 5,153,508.00
3.9	Tee de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 10 250 mm Ø=10".	und	2.00	$ 3,982,015.00	$ 7,964,030.00
3.10	Unión mecánica rápida RDE 21 10". Suministro e instal.	und	2.00	$ 874,403.00	$ 1,748,806.00
3.11	Macromedidor de flujo ultrasónico Ø=10" E.B.x E.B. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 27,261,507.00	$ 27,261,507.00
3.12	Estación macromedidora Ø=10" con accesorios. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 41,738,269.00	$ 41,738,269.00
3.13	Válvula de mariposa en HD Ø 3" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 909,398.00	$ 909,398.00
3.14	Válvula de mariposa en HD Ø 4" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca	und	1.00	$ 1,234,768.00	$ 1,234,768.00
3.15	Válvula de ventosa 10". Cámara doble acción múltiple. Suministro e instal.	und	1.00	$ 7,123,527.00	$ 7,123,527.00
3.16	Válvula de ventosa 6" . Cámara doble acción múltiple E.B. Suministro e instal.	und	1.00	$ 6,072,038.00	$ 6,072,038.00
3.17	Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=10" E.B. Suministro e instal.	und	2.00	$ 6,297,930.00	$ 12,595,860.00
3.18	Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=6" J.H. Suministro e instal.	und	1.00	$ 1,917,447.00	$ 1,917,447.00
3.19	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". Suministro e Instal.	und	2.00	$ 159,888.00	$ 319,776.00
3.20	Portaflanche de polietileno PE 100 - PN-16 de Ø=250 mm = 10".	und	14.00	$ 1,122,194.00	$ 15,710,716.00
3.21	Portaflanche de polietileno PE 100 - PN-16 de Ø=160 mm = 6"	und	4.00	$ 292,915.00	$ 1,171,660.00
3.22	Brida Slip On Ø=10" en A.C. 150 Psi	und	14.00	$ 1,051,927.00	$ 14,726,978.00

3.23	Brida Slip On Ø=6" en A.C. 150 Psi	und	4.00	$ 389,752.00	$ 1,559,008.00
3.24	Hidrante tipo trafico Ø=4" en extremo liso 3 salidas; dos de 2 1/2" y una de 4 1/2", barril seco. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 7,075,673.00	$ 7,075,673.00
3.25	Tubería PVC alcantarillado 14". Suministro e instal.	m	90.08	$ 286,653.00	$ 25,821,702.00
Subtotal					**$ 597,300,205.00**
4	**PASO ELEVADO TIPO CERCHA**				
4.1	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje).	kg	2,151.65	$ 26,446.00	$ 56,902,536.00
4.2	Perno de anclaje en acero negro roscado ASTM A-193 de 5/8" x 8", incluye tuercas y arandelas, epoxico. Suministro e instal.	und	20.00	$ 116,423.00	$ 2,328,460.00
4.3	Tubería AC 10" con costura x 6 metros	Tub	47.72	$ 298,689.00	$ 14,253,439.00
Subtotal					**$ 73,484,435.00**
5	**CAJA EN CONCRETO, ACEROS Y OTROS**				
5.1	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	6.00	$ 1,974,090.00	$ 11,844,540.00
5.2	Caja en concreto reforzado 3000 Psi para estación macromedidora Ø=10" (3.00 x 1.2 x 1.40 libres), incluye tapa basculante.	und	1.00	$ 9,993,236.00	$ 9,993,236.00
5.3	Caja de inspección 60 x 60 incluye tapa en concreto y acero de refuerzo	und	9.00	$ 859,382.00	$ 7,734,438.00
5.4	Prueba hidráulica para tubería Ø 6" - 10 "	m	1,436.87	$ 4,834.00	$ 6,945,830.00
5.5	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1,037.61	$ 9,811.00	$ 10,179,992.00
5.6	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	6.00	$ 671,316.00	$ 4,027,896.00
5.7	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø m 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	m	208.30	$ 5,713.00	$ 1,190,018.00
Subtotal					**$ 51,915,950.00**

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 1,029,075,403.00**
	PRESUPUESTO PLAN MANEJO TRANSITO CONTRATO DE OBRA				$ 36,211,227.00

PRESUPUESTO PMA				$ 23,766,373.00
COSTO TOTAL OBRA				**$ 1,089,053,003.00**
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA				$ 205,771,121.00
PRESUPUESTO APOYO A LA SUPERVISIÓN				$ 40,560,000.00
VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 1,335,384,124.00**

Nota 1: Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor del (A.I.U.), y su discriminación deben estar en porcentaje (%). Y corresponde al desglose aprobado por el Municipio

Nota 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al número entero del peso

Nota 3: Los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, impuestos y tasas municipales, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta suscripción legalización, ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación publica, la entidad ha determinado como criterio único para establecer el valor de los bienes y/o servicios en el promedio de los valores cotizados.

Nota 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0128 del 16 de Agosto de 2024 " Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare", y ajuste a insumos base de datos Villanueva

.

Nota 5: Los precios fueron tomados de la base de precios de la gobernación de Casanare, según resolución No. 0128 del 16 de agosto del 2024 y adoptado por el municipio mediante resolución No. 327 de 21 de mayo de 2024 el cual adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia de obra pública y consultoría para el municipio de Villanueva Casanare" se realiza actualización de la base de precios en cuanto a SMLV de 2025 y agregados según estudio de mercado 24/05/2024 "por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia de obra pública y consultoría para el municipio de Villanueva Casanare", la

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	**27.5%**
IMPREVISTO	**I=**	**2.0%**
UTILIDAD	**U=**	**5.0%**
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**34.5%**

cual fue modificada parcialmente por la resolución No. 192 - 3 de abril de 2025" **Nota 6:** Fecha elaboración del presente presupuesto 03 de junio del 2025	

5.2. AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No 320.11.050-2025.

En la siguiente tabla No 3 se representa la ejecución de obra realizada al corte 31 de diciembre del año 2025.

Tabla 3 Avance de Obra.

Inversión contratada	$ 1.089.053.003,00
Anticipo	$ 00,00
Programado, meses de Octubre – noviembre - diciembre	$ 838.528.526,00
% Porcentaje programado meses octubre - noviembre - diciembre	77%
Ejecutado, meses de Octubre - noviembre - diciembre	$ 838.528.526,00
% Porcentaje ejecutado meses de octubre - Noviembre – diciembre	77%

Fuente: propia

La inversión consignada en la tabla No 3, corresponde a las cantidades ejecutadas por parte del contratista en desarrollo del contrato de obra No 320.11.050-2025 ejecución que ha contado con la vigilancia y control permanente de parte de esta interventoría, según contrato de interventoría No 320.11.047-2025.

6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

6.1 ACTAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Ejecución: Para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra 320.11.050 - 2025 la interventoría realizo el análisis de los documentos que hacen parte integral del contrato objeto de seguimiento y control, después de avalar dichos documentos según al informe pre-constructivo se procede a suscribir el acta de inicio el día 09 de octubre del 2025 a corte mensual del 31 de diciembre del 2025.

Durante el primer periodo la interventoría elaboro el informe pre-constructivo, en este se realizó las revisiones de los diseños y verificaciones de campo tales como:

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS DISEÑOS.

REVISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Revisión de las características técnicas del proyecto, de acuerdo con lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, estudio de tránsito, estudios topográficos, fuentes de materiales, y diseño hidráulico.

De acuerdo con las obligaciones contractuales pactadas para el contrato de interventoría No 320.11.047-2025, **CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS,** Interventoría contratada, durante el periodo comprendido entre el 09 de octubre al 31 de diciembre de 2025, corte en el que se presenta el informe pago parcial No 1, ha realizado las siguientes actividades.

7 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

7.1 Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.

Durante el presente periodo esta interventoría ha venido haciendo seguimiento a la funcionalidad de las oficinas y la bodega.

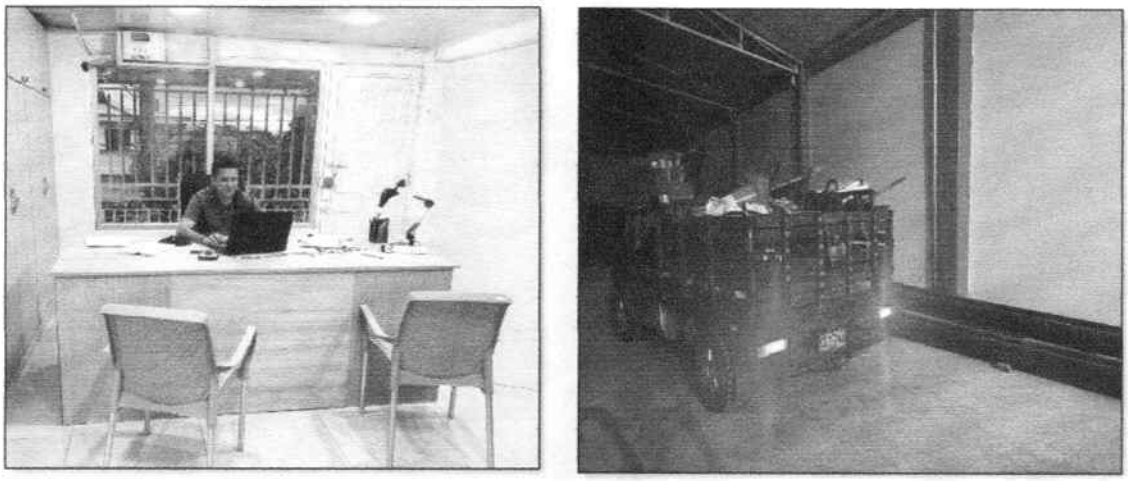


Imagen 2 Instalaciones de Oficinas y Bodega

La interventoría verificó la instalación de la valla informativa del proyecto, constatando que esta cumple con los requisitos mínimos exigidos en cuanto a contenido, dimensiones y visibilidad. En su diseño se incluye la información esencial del contrato, como el nombre del proyecto, número de contrato, entidad contratante, contratista, interventoría, plazo de ejecución y monto, brindando así a la comunidad una visión clara y transparente sobre la obra que se está ejecutando.

Asimismo, la valla fue ubicada en un punto estratégico de alta visibilidad, permitiendo que tanto los habitantes del sector como los transeúntes identifiquen fácilmente el alcance y los responsables del proyecto. La interventoría continuará realizando el seguimiento correspondiente para garantizar su adecuado mantenimiento y permanencia durante todo el periodo de ejecución de la obra.



Imagen 3 Valla informativa – Contrato de obra N°320.11.050-2025

7.2 Corresponde al interventor, antes de suscribir acta de iniciación de obra, revisar y aprobar los siguientes documentos: Programa SISO, Plan de Metodología de trabajo con indicadores de flujo de inversión y Revisar diseños y realizará ajustes complementarios a los mismos.

Ejecución: Durante el periodo de 09 de octubre al 31 de diciembre de 2025 esta interventoría procedió a la revisión y aprobación de la documentación técnica presentada por el contratista. Tras realizar los ajustes necesarios, se autorizó el inicio de las actividades constructivas, dando cumplimiento así a lo establecido en el cronograma del proyecto. La interventoría continuara realizando verificaciones de cumplimiento de los aspectos ambientales, ejecución de ensayos de calidad de obra, seguimiento de los lineamientos de seguridad industrial y salud ocupacional, la interventoría ha solicitado se lleve estricto cumplimiento a las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambientales en el desarrollo de sus actividades para el cumplimiento del objeto contractual "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

se evidencia que el contratista realiza capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios, entrega de elementos de protección personal, así mismo mediante el seguimiento y control de los formatos pre operacionales se constata del buen estado de los equipos en obra.

7.2.1. Seguimiento al Plan de Manejo de Transito

La interventoría ha realizado un seguimiento permanente a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte del contratista, reconociendo la importancia de este componente para garantizar la seguridad vial, la integridad del personal de obra y la protección de los peatones y conductores que transitan por las zonas de intervención.

Durante el desarrollo de las actividades en campo, se ha verificado que las medidas de control y señalización se apliquen conforme a las disposiciones establecidas en el plan aprobado, asegurando una adecuada gestión de la movilidad en el área de influencia del proyecto. Se ha constatado el uso de señalización preventiva, restrictiva e informativa, incluyendo la instalación de señales verticales, conos, delineadores tubulares unidos por cinta peligro en los sectores con excavaciones abiertas o frentes activos de trabajo, con el fin de alertar a los transeúntes y minimizar el riesgo de accidentes.

Asimismo, la interventoría ha supervisado que los elementos de señalización se mantengan en condiciones óptimas de visibilidad, especialmente en jornadas nocturnas o en condiciones climáticas adversas. De igual forma, se ha verificado la instalación de la valla informativa del proyecto en un punto visible y accesible para la comunidad, con el propósito de brindar transparencia y socialización del objeto de la obra.

En conclusión, el contratista ha venido implementando el Plan de Manejo de Tránsito de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos establecidos, bajo la constante supervisión de la interventoría, garantizando la seguridad de los usuarios viales y el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.








Imagen 4 Señalización seguimiento PMT

7.2.2. Controles de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

En la búsqueda de mejorar las condiciones laborales y garantizar la seguridad de todo el personal que ejerce, dentro de la obra, esta interventoría ha realizado el control, prevención y promoción de la seguridad, a través de un trabajo interactivo entre los trabajadores y el contratista de obra.

El equipo de interventoría se encuentra debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social, conforme a la normativa vigente. Para el periodo objeto de reporte, se adjuntan las planillas y soportes de pago que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones. De igual manera, el personal dispone de los elementos de protección personal exigidos para el desempeño de las actividades de supervisión y control en campo, garantizando la aplicación de las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el desarrollo seguro de las labores asociadas al contrato de obra.

En relación con el personal a cargo del contratista de obra, la interventoría ha verificado la entrega de los elementos de protección personal (EPP) por parte del responsable de seguridad y salud en el trabajo, constatando además su uso adecuado durante el desarrollo de las diferentes actividades en campo. Así mismo, se ha evidenciado que el contratista ejecuta jornadas de capacitación en temas de seguridad industrial, primeros auxilios y uso correcto de los EPP. Mediante la revisión de los formatos preoperacionales, se ha comprobado el buen estado y funcionamiento de la maquinaria, herramientas y equipos empleados en la obra, garantizando condiciones seguras de trabajo y el cumplimiento de las normas establecidas.

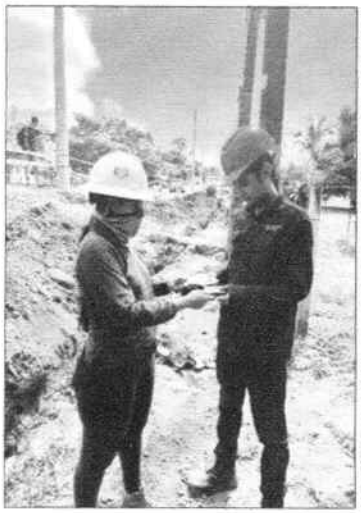









ENTREGA DE EPP
CAPACITACIONES
CAMPAÑAS



Imagen 5 Entrega de EPP, Jornadas de capacitaciones y supervisión de los elementos de emergencia y primeros auxilios

7.3 Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones adyacentes.

Ejecución: La UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 a la fecha de corte 31 de diciembre de 2025 se encuentran vigentes el personal que se relaciona en la tabla N°4, así mismo presentan el informe SST.

***Tabla 4**: Relación de personal administrativo y de obra de UT. ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 y prestación de servicios*

PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025		
NOMBRE	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Jairo Duvan Barrera Vargas	Director de Obra	01/10/2025
Fredy Orlando Vargas Gallo	Residente de Obra	01/10/2025

PERSONAL ADMINISTRATIVO PRESTACION DE SERVICIOS		
NOMBRE	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Boris Andrés Roa Pineda	Profesional Hidrosanitario	09/10/2025
Angie Daniela Vásquez Herrera	Profesional HSEQ	09/10/2025

PERSONAL DE OBRA - UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025		
NOMBRE	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Tannia Isamar Calderón Reyes	Oficio Varios (Administrativos)	01/10/2025
Jesús Alberto Tobar Martínez	Topógrafo	01/10/2025
Jeison Camilo Franco Campos	Auxiliar	01/10/2025
Omar Yesid Torres Pérez	Oficial-PEGAS	03/10/2025
Herson David Calderón Mahecha	Auxiliar	08/10/2025
Luis Eduardo Martínez Martínez	Auxiliar	08/10/2025
Jeison Moreno Poveda	Auxiliar	08/10/2025
Elkin Arley Avendaño Castillo	Auxiliar	08/10/2025
Oscar Javier Vargas Barrera	Auxiliar	08/10/2025
Juan Camilo Hernández Alfonso	Auxiliar	10/10/2025
Diomedes Augusto Guerrero Gamba	Auxiliar	15/10/2025
Kevin Andrés Reyes Castro	Auxiliar	16/10/2025
Yerson Esteban Pérez Rodríguez	Auxiliar	16/10/2025
Richard Stivenson Serna Segura	Auxiliar	17/10/2025
Marco Fidel Romero Ortiz	Auxiliar	23/10/2025
José Francisco Ramírez Torres	Auxiliar	31/10/2025
Edwin Andrés Rodríguez Tique	Auxiliar	05/11/2025
Edwin Hernando Espinoza Martínez	Auxiliar	06/11/2025
Franyerson Alvenis Álvarez Pérez	Auxiliar	25/11/2025
Diego Armando Castro Castro	Pegador	26/11/2025
Yeison Felipe Rodríguez Duarte	Auxiliar de pegas	28/11/2025
Misael Espinoza Daza	Auxiliar	03/12/2025

Fuente. Control diario de personal de obra

Esta interventoría ha verificado el ingreso del siguiente personal de obra:

Tabla 5: Personal de obra que ingresa

PERSONAL DE OBRA INGRESADO		
NOMBRE	***CARGO***	***FECHA DE INGRESO***
Tannia Isamar Calderón Reyes	Oficio Varios (Administrativos)	07/10/2025
Jesús Alberto Tobar Martínez	Topógrafo	01/10/2025
Jeison Camilo Franco Campos	Auxiliar	01/10/2025
Omar Yesid Torres Pérez	Oficial-PEGAS	01/10/2025
Herson David Calderón Mahecha	Auxiliar	03/10/2025
Luis Eduardo Martínez Martínez	Auxiliar	08/10/2025
Jeison Moreno Poveda	Auxiliar	08/10/2025
Elkin Arley Avendaño Castillo	Auxiliar	08/10/2025
Oscar Javier Vargas Barrera	Auxiliar	08/10/2025
Juan Camilo Hernández Alfonso	Auxiliar	08/10/2025
Diomedes Augusto Guerrero Gamba	Auxiliar	10/10/2025
Kevin Andrés Reyes Castro	Auxiliar	15/10/2025
Yerson Esteban Pérez Rodríguez	Auxiliar	16/10/2025
Richard Stivenson Serna Segura	Auxiliar	16/10/2025
Marco Fidel Romero Ortiz	Auxiliar	17/10/2025
José Francisco Ramírez Torres	Auxiliar	23/10/2025
Edwin Andrés Rodríguez Tique	Auxiliar	31/10/2025
Edwin Hernando Espinoza Martínez	Auxiliar	05/11/2025
Franyerson Alvenis Álvarez Pérez	Auxiliar	06/11/2025
Diego Armando Castro Castro	Pegador	25/11/2025
Yeison Felipe Rodríguez Duarte	Auxiliar de pegas	26/11/2025
Misael Espinoza Daza	Auxiliar	28/11/2025

Fuente: Propia

Durante el presente periodo el contratista de obra ha realizado las afiliaciones al sistema de seguridad social del siguiente personal:

Tabla 6: Personal de obra afiliado a la seguridad social

PERSONAL AFILIADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
NOMBRE	***CARGO***	***FECHA DE AFILIACION***
Jairo Duvan Barrera Vargas	Director de Obra	01/10/2025
Fredy Orlando Vargas Gallo	Residente de Obra	01/10/2025
Tannia Isamar Calderón Reyes	Oficio Varios	01/10/2025

	(Administrativos)	
Jesús Alberto Tobar Martínez	Topógrafo	01/10/2025
Jeison Camilo Franco Campos	Auxiliar	03/10/2025
Omar Yesid Torres Pérez	Oficial-PEGAS	08/10/2025
Herson David Calderón Mahecha	Auxiliar	08/10/2025
Luis Eduardo Martínez Martínez	Auxiliar	08/10/2025
Jeison Moreno Poveda	Auxiliar	08/10/2025
Elkin Arley Avendaño Castillo	Auxiliar	08/10/2025
Oscar Javier Vargas Barrera	Auxiliar	10/10/2025
Juan Camilo Hernández Alfonso	Auxiliar	15/10/2025
Diomedes Augusto Guerrero Gamba	Auxiliar	16/10/2025
Kevin Andrés Reyes Castro	Auxiliar	16/10/2025
Yerson Esteban Pérez Rodríguez	Auxiliar	17/10/2025
Richard Stivenson Serna Segura	Auxiliar	23/10/2025
Marco Fidel Romero Ortiz	Auxiliar	31/10/2025
José Francisco Ramírez Torres	Auxiliar	05/11/2025
Edwin Andrés Rodríguez Tique	Auxiliar	06/11/2025
Edwin Hernando Espinoza Martínez	Auxiliar	25/11/2025
Franyerson Alvenis Álvarez Pérez	Auxiliar	26/11/2025
Diego Armando Castro Castro	Pegador	28/11/2025
Yeison Felipe Rodríguez Duarte	Auxiliar de pegas	07/10/2025
Misael Espinoza Daza	Auxiliar	01/10/2025

Fuente: Propia

Durante el presente periodo se efectuó el retiro del personal vinculado al proyecto, información que se relaciona en la tabla siguiente tabla.

PERSONAL RETIRADO		
NOMBRE	***CARGO***	***FECHA DE RETIRO***
Tannia Isamar Calderón Reyes	Oficio Varios (Administrativos)	03/10/2025
Diomedes Augusto Guerrero Gamba	Auxiliar de obra	02/11/2025
Luis Eduardo Martínez Martínez	Auxiliar de obra	02/11/2025
Herson David Calderón Mahecha	Auxiliar de obra	09/11/2025
Marco Fidel Romero Ortiz	Auxiliar de obra	09/11/2025
Juan Camilo Hernández Alfonso	Auxiliar de obra	09/11/2025
Omar Yesid Torres Pérez	Oficial Pegador	16/11/2025
Richard Stivenson Serna Segura	Auxiliar de obra	24/11/2025
Edwin Andrés Rodríguez Tique	Auxiliar de obra	25/11/2025
Kevin Andrés Reyes Castro	Auxiliar de obra	25/11/2025
Edwin Hernando Espinoza Martínez	Auxiliar de obra	29/11/2025

15-dic-25	-	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OFICIO EN FISICO	DEVOLUCIÓN DE INFORME PARCIAL N°1 POR FALTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. RADICA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA					
31-oct-25	31-oct-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	CORREO ELECTRÓNICO	RESPUESTA A OBSERVACIONES PROCESO CONSTRUCTIVO-CONTRATO DE OBRA N°320.11.050-2025
06-nov-25	06-nov-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	OFICIO EN FÍSICO	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA
11-nov-25	11-nov-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	OFICIO EN FÍSICO	ENTREGA DE INFORME INTERVENTORÍA
27-nov-25	27-nov-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	OFICIO EN FÍSICO	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA E INTERVENTORÍA
01-dic-25	02-dic-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO	OFICIO EN FÍSICO	CAMBIO DE PROFESIONAL-TECNOLOGO SISO
05-dic-25	09-dic-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	OFICIO EN FÍSICO	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA E INTERVENTORÍA
12-dic-25	12-dic-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	OFICIO EN FÍSICO	ENTREGA PARCIAL N°1 OBRA
18-dic-25	18-dic-25	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA	OFICIO EN FÍSICO	ENTREGA PARCIAL N°1 DE INTERVENTORIA

Fuente: Propia

7.6 Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.

Ejecución: La interventoría CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS, en cumplimiento de las actividades, ha llevado a cabo una supervisión exhaustiva de las obras, asegurando que el contratista cumpla con todas las obligaciones establecidas en el contrato. A través de visitas periódicas al sitio, revisiones documentales, inspecciones de calidad y elaboración de informes detallados, se ha verificado que los trabajos se ejecuten conforme a los planos, especificaciones técnicas y plazos establecidos. Se han identificado y gestionado oportunamente las desviaciones encontradas, garantizando así la calidad y el éxito del proyecto.

7.7 Disponer y administrar los recursos del personal, equipos e implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría.

Ejecución: CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS interventoría encargada del control y seguimiento de las actividades contempladas en el contrato de consultoría No 320.11.047-2025 ha llevado a cabo una gestión eficiente de los recursos, desde la planificación inicial hasta el control y evaluación final. Se ha realizado un análisis detallado de las necesidades, se ha adquirido y asignado los recursos de manera óptima, y se ha implementado un sistema de seguimiento para garantizar su uso eficiente. Gracias a estas acciones, se ha logrado optimizar los procesos, cumplir con los plazos establecidos, garantizar la calidad de los trabajos y minimizar los costos. En resumen, la interventoría ha desempeñado un papel fundamental en el éxito del proyecto, asegurando que los recursos se utilicen de manera adecuada y eficiente para alcanzar los objetivos establecidos.

7.8 Exigir a los contratistas la permanencia en la obra del ingeniero residente.

A lo largo de la ejecución de la obra, se ha verificado de manera periódica la presencia del ingeniero residente en el sitio. Se han realizado las siguientes acciones para dar cumplimiento a esta actividad:

- **Inspecciones diarias:** Durante las visitas diarias a la obra, se ha constatado la presencia física del ingeniero residente en el sitio.
- **Verificación de funciones:** Se ha verificado que el ingeniero residente esté cumpliendo con las funciones establecidas en el contrato, como la supervisión de los trabajos, la resolución de dudas técnicas y la coordinación con el personal a su cargo.
- **Revisión de documentación:** Se han revisado los informes y registros elaborados por el ingeniero residente, asegurando que estén completos y actualizados.
- **Reuniones periódicas:** Se han llevado a cabo reuniones periódicas con el ingeniero residente para revisar el avance de los trabajos y resolver cualquier duda o inconveniente.

7.9 Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.

Seguimiento del personal a cargo del contratista de **obra**:

Tabla 8 Personal de obra, Pagos de planillas mes de octubre-noviembre de SST.

OCTUBRE						
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**No. DE PLANILLA**	**EPS**	**ARL**	**PENSIÓN**
Jairo Duvan Barrera Vargas	Director de obra	01/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN
Fredy Orlando Vargas Gallo	Residente de Obra	01/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Tannia Isamar Calderon Reyes	Oficios varios(Administrativos)	01/10/2025	92029855	SANITAS EPS	SURA	PORVENIR
Jesús Alberto Tobar Martínez	Topógrafo	01/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Jeison Camilo Franco Campos	Auxiliar	01/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Omar Yesid Torres Pérez	Oficial- PEGAS	03/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Herson David Calderón Mahecha	Auxiliar	08/10/2025	92029855	SANITAS	SURA	PORVENIR
Luis Eduardo Martínez Martínez	Auxiliar	08/10/2025	92029855	SANITAS	SURA	PORVENIR
Yeison Moreno Poveda	Auxiliar	08/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Elkin Arley Avendaño Castillo	Auxiliar	08/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Oscar Javier Vargas Barrera	Auxiliar	08/10/2025	92029855	SANITAS	SURA	PORVENIR
Juan Camilo Hernández Alfonso	Auxiliar	10/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

Diomedes Augusto Guerrero	Auxiliar	15/10/2025	92029855	CAPRESOCA	SURA	COLFONDOS
Kevin Reyes	Auxiliar	16/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Yerson Esteban Pérez Rodríguez	Auxiliar	16/10/2025	92029855	SANITAS	SURA	PORVENIR
Richard Stivenson Serna Segura	Auxiliar	17/10/2025	92029855	SANITAS	SURA	PORVENIR
Marco Fidel Romero Ortiz	Auxiliar	23/10/2025	92029855	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
José Francisco Ramírez Torres	Auxiliar	31/10/2025	92029855	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Edwin Andrés Rodríguez Tique	Auxiliar	05/11/2025	-	FAMISANAR	SURA	PORVENIR
Edwin Hernando Espinoza Martínez	Auxiliar	06/11/2025	-	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Franyerson Alvenis Álvarez Pérez	Auxiliar	25/11/2025	-	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Diego Armando Castro Castro	Pegador	26/11/2025	-	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Yeison Felipe Rodríguez Duarte	Auxiliar de pegas	28/11/2025	-	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

NOVIEMBRE						
NOMBRE DEL EMPLEADO	***CARGO***	***FECHA DE INGRESO***	***No. DE PLANILLA***	***EPS***	***ARL***	***PENSIÓN***
Jairo Duvan Barrera Vargas	Director de obra	01/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

Fredy Orlando Vargas Gallo	Residente de Obra	01/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Jesús Alberto Tobar Martínez	Topógrafo	01/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Jeison Camilo Franco Campos	Auxiliar	01/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Omar Yesid Torres Pérez	Oficial- PEGAS	03/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Herson David Calderón Mahecha	Auxiliar	08/10/2025	92478539	SANITAS	SURA	PORVENIR
Luis Eduardo Martínez Martínez	Auxiliar	08/10/2025	92478539	SANITAS	SURA	PORVENIR
Yeison Moreno Poveda	Auxiliar	08/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Elkin Arley Avendaño Castillo	Auxiliar	08/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Oscar Javier Vargas Barrera	Auxiliar	08/10/2025	92478539	SANITAS	SURA	PORVENIR
Juan Camilo Hernández Alfonso	Auxiliar	10/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES
Diomedes Augusto Guerrero	Auxiliar	15/10/2025	92478539	CAPRESOCA	SURA	COLFONDOS
Kevin Reyes	Auxiliar	16/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Yerson Esteban Pérez Rodríguez	Auxiliar	16/10/2025	92478539	SANITAS	SURA	PORVENIR
Richard Stivenson Serna Segura	Auxiliar	17/10/2025	92478539	SANITAS	SURA	PORVENIR
Marco Fidel Romero Ortiz	Auxiliar	23/10/2025	92478539	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
José Francisco Ramírez Torres	Auxiliar	31/10/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

Edwin Andrés Rodríguez Tique	Auxiliar	05/11/2025	92478539	FAMISANAR	SURA	PORVENIR
Edwin Hernando Espinoza Martínez	Auxiliar	06/11/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Franyerson Alvenis Álvarez Pérez	Auxiliar	25/11/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Diego Armando Castro Castro	Pegador	26/11/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Yeison Felipe Rodríguez Duarte	Auxiliar de pegas	28/11/2025	92478539	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
Misael Espinoza Daza	Auxiliar	03/12/2025	-	SANITAS	SURA	PORVENIR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OCT-NOV)

OCTUBRE						
NOMBRE DEL EMPLEADO	***CARGO***	***FECHA DE INGRESO***	***No. DE PLANILLAS***	***EPS***	***ARL***	***PENSIÓN***
Angie Daniela Vásquez Herrera	Profesional HSEQ	09/10/2025	9491907150	SANITAS	SURA	PORVENIR
Boris Andrés Roa Pineda	Profesional Hidrosanitario	09/10/2025	9496074574	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR

NOVIEMBRE						
Angie Daniela Vásquez Herrera	Profesional HSEQ	09/10/2025	9493343084	SANITAS	SURA	PORVENIR
Boris Andrés Roa Pineda	Profesional Hidrosanitario	09/10/2025	9497922433	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR

Seguimiento del personal a cargo del contratista de **interventoría**:

Tabla 9 Personal de interventoría, Pagos de planillas mes de octubre- noviembre de SST.

OCTUBRE						
NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	No. DE PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA	REPRESENTANTE LEGAL	29/09/2025	92021584	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	29/09/2025	92021584	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN
CARLOS ANDRÉS BELTRÁN LADINO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	29/09/2025	92021584	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
LAURA PINZÓN JIMÉNEZ	INGENIERA AMBIENTAL	29/09/2025	92021584	SANITAS	SURA	PORVENIR
MARIO SAGID MOSQUERA BOLAÑOS	GEOTECNISTA	29/09/2025	92021584	SANITAS	SURA	COLPENSIONES
YASSER FABIÁN MORALES LEÓN	ABOGADO	29/09/2025	92021584	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
LADY DIANA OCAMPO BARRERA	CONTADOR	29/09/2025	92021584	EPS SURA	SURA	PROTECCIÓN
PAOLA ANDREA MONROY MORA	APOYO SST	10/10/2025	92021584	SANITAS	SURA	PORVENIR
TANIA CATALINA ROMERO NIÑO	APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA	14/10/2025	92021584	NUEVA ESPS	SURA	PROTECCION
TANIA ISAMARA CALDERÓN REYES	TOPÓGRAFO	04/11/2025	92021584	SANITAS	SURA	PORVENIR

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	No. DE PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
MARIA DEL CARMEN LESMES HOLGUIN	TECNOLOGO SISO	29/09/2025	8390780020	SANITAS	SURA	PORVENIR

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

NOVIEMBRE						
NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	No. DE PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA	REPRESENTANTE LEGAL	29/09/2025	92021597	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR
CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	29/09/2025	92021597	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN
CARLOS ANDRÉS BELTRÁN LADINO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	29/09/2025	92021597	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
LAURA PINZÓN JIMÉNEZ	INGENIERA AMBIENTAL	29/09/2025	92021597	SANITAS	SURA	PORVENIR
MARIO SAGID MOSQUERA BOLAÑOS	GEOTECNISTA	29/09/2025	92021597	SANITAS	SURA	COLPENSIONES
YASSER FABIÁN MORALES LEÓN	ABOGADO	29/09/2025	92021597	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
LADY DIANA OCAMPO BARRERA	CONTADOR	29/09/2025	92021597	EPS SURA	SURA	PROTECCIÓN
PAOLA ANDREA MONROY MORA	APOYO SST	10/10/2025	92021597	SANITAS	SURA	PORVENIR
TANIA CATALINA ROMERO NIÑO	APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA	14/10/2025	92021597	NUEVA ESPS	SURA	PROTECCION
TANIA ISAMARA CALDERÓN REYES	TOPÓGRAFO	04/11/2025	92021597	SANITAS	SURA	PORVENIR

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE INGRESO	No. DE PLANILLAS	EPS	ARL	PENSIÓN
MARIA DEL CARMEN LESMES HOLGUIN	TECNOLOGO SISO	29/09/2025	92332732	SANITAS	SURA	PORVENIR

En el presente informe se anexan cuatro (4) planillas de seguridad social correspondientes al mes de octubre de 2025. Estas incluyen los aportes realizados por dos (2) trabajadores vinculados bajo la modalidad de prestación de servicios, así como dos (2) planillas adicionales: una correspondiente al personal de la interventoría y otra al personal de la obra.

7.10 Prácticas de inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones semanales (comité de obra) con el contratista, interventoría y la supervisión.

Ejecución: La interventoría CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS junto con el apoyo de la supervisión ha venido ejerciendo comités de obra técnica, con el fin de realizar la vigilancia y control en aspectos técnicos, ambientales, administrativos, financieros y contables, de manera minuciosa sobre las actividades contractuales realizadas por el contratista en la ejecución del contrato de obra No 320.11.050-2025 cuyo objeto es AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

7.11 Someter a la aprobación de interventoría y la supervisión durante los primeros siete (7) días de cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecución relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos.

Ejecución: Al inicio de la parte contractual esta interventoría realizo el análisis de todos los documentos que hacen parte integral del contrato de obra No 320.11.050-2025 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", adicionalmente durante la ejecución de los dos contratos obra e interventoría a corte 31 de diciembre del año 2025 se ha venido realizando el seguimiento y control de las especificaciones técnicas y oferta económica presentada por la UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025, de acuerdo con los ítems contractuales. Se maneja un archivo físico y magnético con información de la etapa precontractual y contractual

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023dellano@gmail.com
NIT: 901731378-3

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

Tabla 10: Presupuesto de interventoría 320.11.047-2025.

PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBJETO: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.									
1. COSTOS DE PERSONAL							**Plazo =**	**5,00**	**Meses**
CAT.	**PERSONAL**	**No**	**SUELDO MES**	**PRIMA**	**DEDICACION**	**TIEMPO (MES)**	**VR. BASICO**	**F.M.**	**VR. PARCIAL**
	PERSONAL PROFESIONAL								
4	ESPECIALISTA (ingeniero) director de interventoría -Resolución 327del 21 de mayo de 2024	1	$9.252.750,0	0,00	24,0%	1,20	$11.103.300,0	2,15	$ 23.872.095,0
7	ESPECIALISTA (ingeniero) residente de interventoría - Resolución 327del 21 de mayo de 2025	1	$4.982.250,0	0,00	100%	5,00	$24.911.250,0	2,15	$ 53.559.187,5
8	PROFESIONAL (ingeniero) ambiental - Resolución 327del 21 de mayo de 2026	1	$4.270.500,0	0,00	24,0%	1,20	$5.124.600,0	2,15	$ 11.017.890,0
5	ESPECIALISTA (ingeniero) Geotecnista - Resolución 327del 21 de mayo de 2027	1	$7.117.500,0	0,00	10,0%	0,50	$3.558.750,0	2,15	$ 7.651.312,5
8	PROFESIONAL En el área de derecho - Resolución 327del 21 de mayo de 2028	1	$4.270.500,0	0,00	20,0%	1,00	$4.270.500,0	2,15	$ 9.181.575,0
8	PROFESIONAL En el área de contaduría - Resolución 327del 21 de mayo de 2029	1	$4.270.500,0	0,00	20,0%	1,00	$4.270.500,0	2,15	$ 9.181.575,0
	PERSONAL PROFESIONAL								
	Tecnólogo SISO	1	$2.847.000,0	0,00	100%	5,00	$14.235.000,0	2,15	$ 30.605.250,0
							TOTAL, COSTOS DEL PERSONAL		**$145.068.885,0**

2. COSTOS DIRECTOS						
CONCEPTO	**UND**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**TIEMPO MES**	**VR. PARCIAL**	
TOPOGRAFICA QUE INCLUYE: Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación• Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pintura.	día	$29.518.230,0	15	0,60	**$17.710.938,00**	
Plotter e Infirme					**$17.710.938,00**	
Alquiler de plotter	Mes	$938.292,00	1,00	5,00	**$4.691.460,00**	
Otros						
Documentación y papelería						
Oficina Resolución 327 del 21 de mayo 2024	Mes	$1.089.125,0	1,00	5,00	**$5.445.625,00**	
					TOTAL, COSTOS DIRECTOS 2	**$27.848.023,0**
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS						**$172.916.908,0**
4. IVA 19%						**$32.854.213,0**
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)						**$205.771.121,0**

7.12 Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta la interventoría y la supervisión y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.

Ejecución: Se verificaron las garantías pertinentes presentadas por el contratista según pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A No. COQ-100006746 de cumplimiento y póliza de Responsabilidad civil No COQ-100001707, estas fueron aprobadas por la oficina jurídica de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA "ESPAVI SA ESP" el día 20 de octubre del 2024.
Estas pólizas de obra son permanentes y solo se agota en el cumplimiento del objeto contractual, y por ende a la liquidación de los contratos.

7.13 Realizar informes mensuales de avances de obra en coordinación con la interventoría.

Ejecución: La interventoría CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS ha verificado constantemente los rendimientos de los trabajos y las proyecciones periódicas del frente de trabajo, esta actividad se documenta en los comités de obra y en los anexos del presente informe.

Se realizó la verificación de la programación establecida en el cronograma de obra, se realizará constante seguimiento verificando si hay lugar a modificaciones según los acontecimientos importantes que ocurran durante la ejecución.

Se solita en comités de obra se realice la entrega de los informes mensuales.

7.14 Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos.

Ejecución: La interventoría Constructora R&Y del Llano S.A.S., con el apoyo de la supervisión, realizó el 14 de octubre de 2025 la socialización del proyecto con la comunidad y representantes de la Secretaría de Obras del municipio de Villanueva, en la cual se expusieron el alcance, valor del proyecto, mano de obra a emplear y se atendieron las inquietudes de los asistentes. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, a las 8:00 a. m., se llevó a cabo la socialización del cierre total de la vía en el punto de intervención ubicado en la entrada del sector La Colmena, con el fin de ejecutar la instalación de la tubería de polietileno de 10", en cumplimiento de las actividades programadas de la obra.



Imagen 6 Socialización del proyecto y Cierre Total de la entrada a la colmena

7.15 Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la interventoría y suministrarles la información que soliciten.

Ejecución: Para el corte del presente informe no se han presentados solicitudes por las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la interventoría.

8 FUNCIONES TÉCNICAS.

8.1 Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes, decretos y normas que le apliquen.

La interventoría realiza seguimiento de las actividades desarrolladas por el contratista y vela por el cumplimiento de los procesos constructivos y requerimiento exigidos por las

diferentes reglamentaciones que aplican.

8.2 Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.

La interventoría en caso de presentar alguna observación al proceso constructivo o del desarrollo de las actividades en obra se realizará la respectiva anotación en la Bitácora de Obra del presente día y se indicará aceptación o respuesta en la misma y posterior firma por parte de los residentes de obra e interventoría como garantes.

8.3 Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.

En caso de requerir información complementaria a la suministrada inicialmente por el contratista, se requerirá mediante oficios con un tiempo perentorio para la entrega de lo solicitado.

8.4 Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

Toda notificación al contratista se realiza mediante medios escritos como lo es el registro en campo de la Bitácora de Obra o la entrega de comunicaciones de manera física o digital mediante correo electrónico.

8.5 Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidación del contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y post contractuales indicadas en el contrato.

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución por tal motivo no requiere el proceso documental de liquidación, de igual manera las pólizas garantes del contrato de obra se encuentras vigentes.

8.6 Suscribir las diferentes actas

En el presente periodo no se suscribe Acta Parcial de Obra

8.7 Resolver las consultas que presente el contratista y hacerlas observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas de acuerdo con las especificaciones de los estudios, términos de referencia y la propuesta, deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto.

En el presente periodo no se presentan consultas por parte del contratista de obra y se da cumplimiento a las actividades programadas en obra según cronograma de obra.

8.8 Supervisar, orientar. programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las funciones de interventoría.

Se coordina al personal asignado según el plan de cargas del presupuesto de la interventoría para el seguimiento administrativo y en campo de las actividades del contrato de obra.

Ejecución: A lo largo de la ejecución del proyecto, se han llevado a cabo las siguientes acciones para cumplir con esta actividad:

- **Selección y contratación**: Se seleccionó al personal auxiliar considerando sus conocimientos, habilidades y experiencia en áreas relevantes para la interventoría. Se establecieron los perfiles profesionales requeridos y se realizaron entrevistas y evaluaciones para garantizar la idoneidad de los candidatos.
- **Capacitación**: Se diseñó e implementó un plan de capacitación integral para el personal auxiliar, cubriendo temas como:
- Normatividad aplicable al proyecto.
- Procedimientos y protocolos de la interventoría.
- Uso de herramientas informáticas y sistemas de gestión.
- Normas de seguridad y salud en el trabajo.
- **Asignación de responsabilidades**: Se asignaron tareas y responsabilidades específicas a cada miembro del equipo auxiliar, considerando sus capacidades y la necesidad de cubrir todas las áreas de la interventoría.
- **Supervisión y seguimiento**: Se estableció un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño del personal auxiliar a través de:
- Reuniones periódicas para revisar el avance de las tareas asignadas.

- Evaluación de los informes y documentos elaborados.
- Observación directa de las actividades realizadas en campo.
- Orientación y retroalimentación: Se brindó orientación y retroalimentación continua al personal auxiliar, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo sus habilidades.
- Evaluación del desempeño: Se realizaron evaluaciones periódicas del desempeño de cada miembro del equipo, estableciendo planes de mejora individual cuando fue necesario.

- **ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO**

En la ilustración se observa el organigrama de la estructura administrativa y operativa del Proyecto, el cual se tomará para la ejecución de las obras.
En el desarrollo del Proyecto se cuenta con una estructura de dirección encabezada por "CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS" y su equipo de trabajo que buscan dar cumplimiento al Plan de Desarrollo propuesto. Adicionalmente se encuentra en la estructura organizativa el personal del Contratista quien es el encargado de ejecutar la obra, y por otra parte la Interventoría quien supervisa que las actividades se realizaran cumpliendo las especificaciones de calidad del contrato adicionalmente se encuentra con el supervisor de obras públicas que es el secretario de obras públicas, con su respectivo apoyo a la supervisión.

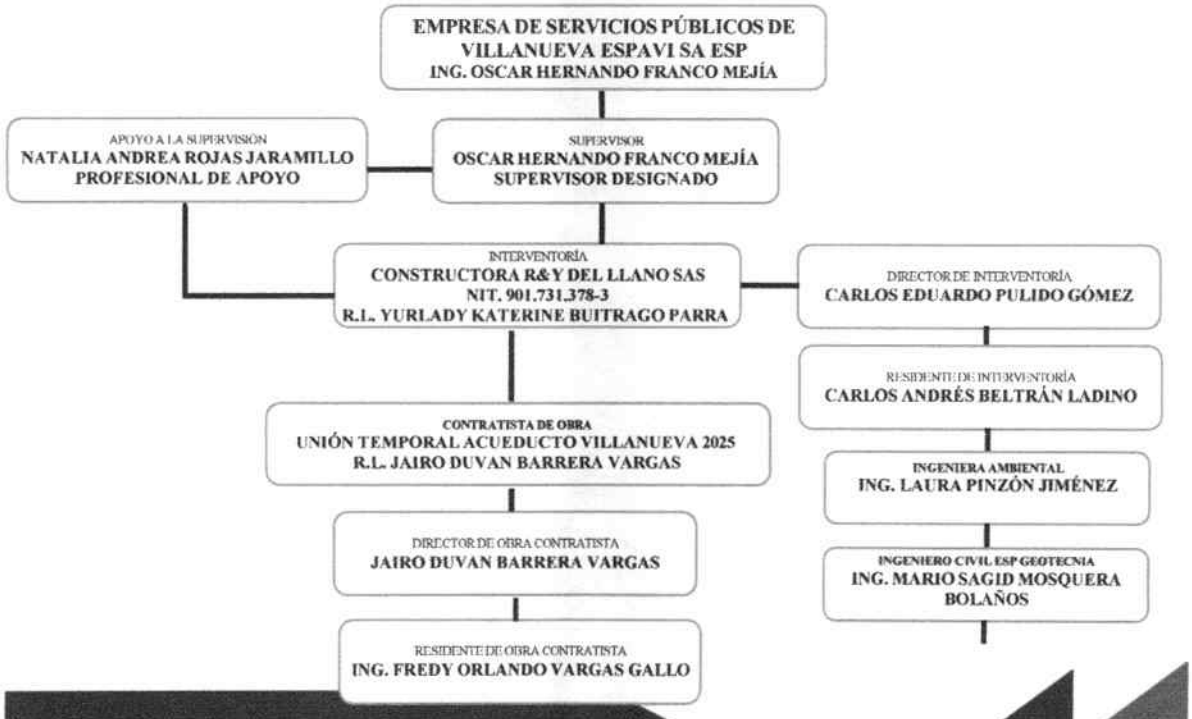




Ilustración 3: Organigrama del proyecto

Fuente: Propia

A la fecha de corte del 31 de diciembre, se encuentran vigentes los profesionales según propuesta. La interventoría verifico el pago e índices de cotización de la planilla No. 92021584 de pago del contratista de interventoría en el operador MI PLANILLA.COM.

Tabla 11 Personal contrato de interventoría

ÍTEM	CARGO	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN
01	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ	24%
02	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARLOS ANDRÉS BELTRÁN LADINO	100%
03	INGENIERO AMBIENTAL	LAURA PINZÓN JIMÉNEZ	24%
04	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	MARIO SAGID MOSQUERA BOLAÑOS	10%
05	ABOGADO	YASSER FABIÁN MORALES LEÓN	20%
06	CONTADORA	LADY DIANA OCAMPO BARRERA	20%
07	TECNÓLOGO SISO	MARÍA DEL CARMEN LESMES HOLGUÍN	100%

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)
TOPOGRAFIA	MES	1.0	0.60

Fuente. propia

8.9 Realizar los informes necesarios de acuerdo a la clase de interventoría y la naturaleza del contrato objeto de la misma. Informar a la entidad sobre la materialización de las causales de aplicación de las cláusulas exorbitantes pactadas o incorporadas al contrato por ministerio de la ley, para que proceda de conformidad.

Se presenta informes de seguimiento mensual, también se informa que a la fecha no se evidencia la materialización de alguna causal que incurra en la entrada en vigencia de alguna de las pólizas del contrato de obra.

8.10 Dar oportunamente la información requerida e informar a los organismos de control las irregularidades que puedan dar lugar a investigaciones por parle de estos de acuerdo a sus competencias.

A la fecha la ejecución del contrato se realiza bajo los lineamientos amparados por la Ley y no se presenta alguna inconformidad o irregularidad para notificar a los respectivos entes de control.

8.11 Requerir al contratista sobre los hechos que puedan constituir incumplimiento del contrato e informar sobre los mismos a la entidad.

A la fecha no se ha realizados requerimientos al contratista de obra.

8.12 Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato de obra y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.

A la fecha del presente informe el contratista NO presenta atraso en las actividades programadas.

Acciones a tomar en caso de Retraso durante el periodo.

1. **Evaluación Detallada:** esta interventoría viene realizando una evaluación exhaustiva de las causas del retraso, identificando los factores que han contribuido a la situación actual.
2. **Revisión del Plan de Organización:** Analizar si el plan de organización inicial sigue siendo válido o si es necesario realizar ajustes para adaptarlo a la nueva realidad.

3. **Evaluación de Recursos:** Verificar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades restantes y tomar medidas para subsanar cualquier deficiencia.
4. **Revisión del Cronograma:** Ajustar el cronograma de ejecución para reflejar los retrasos ocurridos y establecer nuevas fechas de entrega.
5. **Comunicación con el Contratista:** Mantener una comunicación abierta y transparente con el contratista para identificar las soluciones conjuntas y establecer un plan de acción para recuperar el tiempo perdido.

Ejecución: Esta interventoría verifica en el informe de avance N°1 entregado por el contratista de obra de la UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 el reporte de avance respecto a la programación evidenciando el avance de ejecución y reportándolo al apoyo de la supervisión.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista de obra:

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
1	OBRAS PRELIMINARES							
1.1	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	1,435.87	$ 6,436.00	$ 9,241,259.00	1435.87	$ 9,241,259.00	100%

Durante la visita de seguimiento, se verificó la ejecución de las labores de replanteo y localización del eje correspondiente a la red de acueducto, conforme a lo establecido en los planos y especificaciones del proyecto.



Estas actividades se realizaron utilizando instrumentos topográficos para comprobar las cotas, alineaciones y pendientes del trazado, garantizando su correcta ubicación en campo. De igual manera, se confirmó la identificación de los puntos de inicio, empalme y finalización del tramo, así como la delimitación de las zonas destinadas a excavación y a la instalación de accesorios como válvulas, hidrantes y la estación macro–medidora.





CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**							
2,1	Excavación manual en conglomerado	m^3	1,433.81	$ 100,509.00	$ 144,110,809.00	1,433.81	$ 144,110,809.00	100%




Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó la ejecución de las actividades de excavación manual en terreno tipo conglomerado, realizadas para habilitar la zanja requerida para la instalación de la red de tubería de polietileno PE 100 PN-10 de 10" y 6". Las excavaciones se desarrollaron conforme a las dimensiones establecidas en los diseños, con profundidades y anchos acordes a las especificaciones técnicas, garantizando el adecuado alojamiento, apoyo y posterior protección de la tubería. El material producto de la excavación fue dispuesto de manera ordenada a un costado del frente de trabajo, permitiendo su clasificación y aprovechamiento posterior en las labores de relleno, previa selección del material apto y retiro de los elementos no reutilizables. Así mismo, la interventoría realizó seguimiento permanente al control de alineación, cotas y pendientes de la zanja, verificando la correcta conformación geométrica del tramo intervenido y el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades en campo.

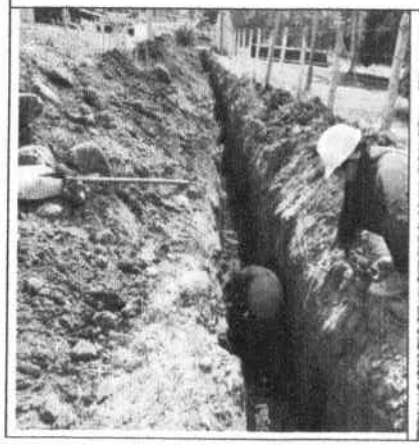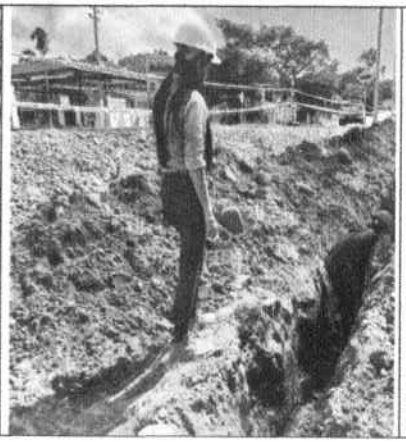

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES							
2,2	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m^3	543.05	$ 42,791.00	$23,237,653.00	543.05	$ 23,237,653.00	100%

Como parte de las funciones de interventoría, durante el periodo evaluado se verificó la continuidad de las actividades de cargue manual y manejo del material producto de las excavaciones, constatando que este correspondía principalmente a suelos tipo conglomerado con presencia de fracciones gruesas no aptas para su reutilización como relleno estructural. No obstante, se evidenció la adecuada selección y clasificación del material con mejores características, el cual fue reutilizado en las labores de relleno y compactación de zanjas, optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles y garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente, se verificó que el material sobrante no requerido en obra continúa siendo entregado, previa solicitud formal, al señor Camilo Franco Campos, para su disposición y uso en actividades de nivelación y adecuación del terreno en el predio La Bastilla, ubicado en la vereda El Aeropuerto.


CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**							
2.3	Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye retiro)	m^3	4.07	$ 260,763.00	$ 1,061,305.00	4.07	$ 1,061,305.00	100%

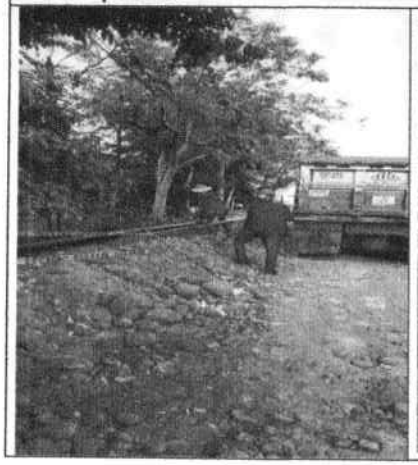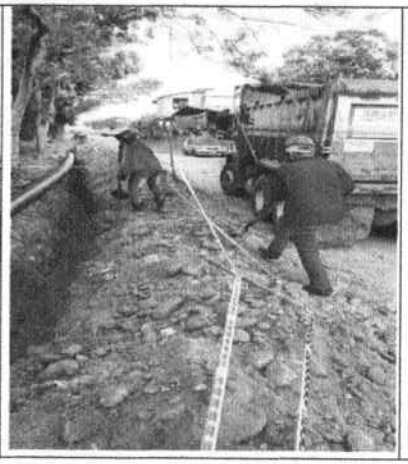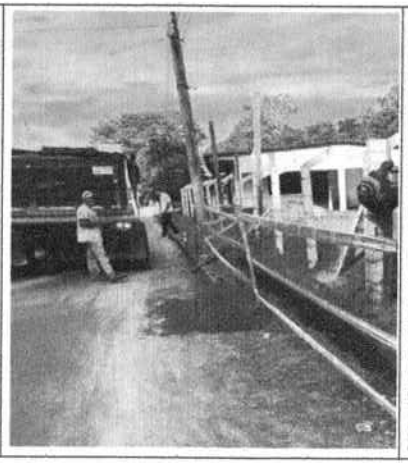Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó la ejecución de las actividades de demolición de andenes, sardineles y cunetas requeridas para habilitar las áreas necesarias para la instalación de la tubería de acueducto. Se constató que dichas intervenciones se realizaron de manera controlada, conforme al trazado, alineación y profundidades definidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. El material resultante de las demoliciones fue retirado del frente de obra y transportado para su aprovechamiento en labores de nivelación de terreno en un predio ubicado en la vereda El Aeropuerto. Asimismo, se dejó establecido que, una vez concluida la instalación de la red, el contratista deberá ejecutar la reposición y reconstrucción de los elementos intervenidos, garantizando que las áreas afectadas queden restituidas en condiciones iguales o superiores a las existentes previo a la intervención.







CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES							
2.4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m^3	410.36	$ 124,347.00	$51,027,035.00	410.36	$ 51,027,035.00	100%



Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento y verificación a las actividades asociadas al cargue manual, selección y aprovechamiento del material proveniente de las excavaciones. Se constató que el material extraído correspondió principalmente a suelos tipo conglomerado con presencia de fracciones gruesas no aptas para su utilización como relleno estructural. No obstante, el material que presentó condiciones favorables fue previamente clasificado y reutilizado en las labores de relleno y compactación de las zanjas, optimizando el uso de los recursos disponibles y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se verificó que el material sobrante no requerido en obra continúa siendo entregado, previa solicitud formal, al señor Camilo Franco Campos, para su disposición y aprovechamiento en actividades de nivelación y adecuación del terreno en el predio La Bastilla, ubicado en la vereda El Aeropuerto.



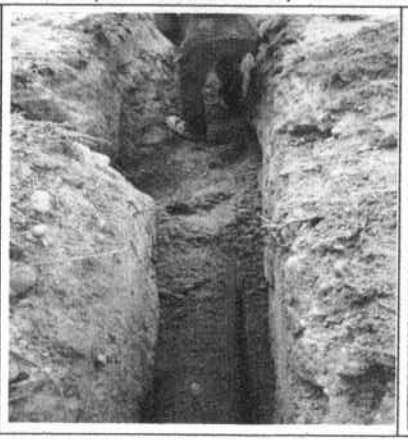


CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**							
2.5	Relleno de excavación (con material local) compactado	m^3	669.88	$ 42,007.00	$28,139,649.00	669.88	$ 28,139,649.00	100%



Como parte de las funciones de la interventoría, se verificó que, una vez concluido el atraque de la tubería mediante la aplicación de la capa de arena lavada, se ejecutara el relleno de la zanja utilizando material local previamente seleccionado, proveniente de la excavación inicial. Dicho material fue dispuesto en capas sucesivas y compactado con equipo tipo apisonador canguro, asegurando el cumplimiento de la densidad requerida, la adecuada conformación del terreno y la correcta nivelación de la superficie intervenida. Se constató que el área afectada quedó restituida en condiciones iguales o superiores a las existentes antes de la intervención, garantizando la estabilidad del tramo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

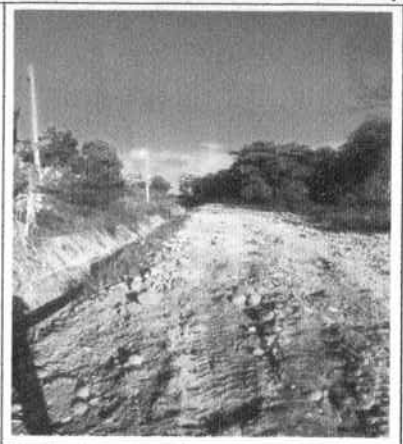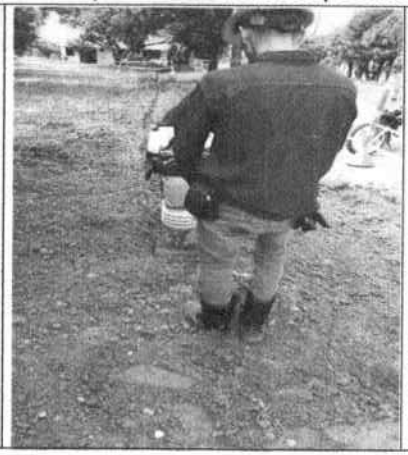
CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**							
2.7	Corte en concreto	m	85.20	$ 32,479.00	$ 2,767,211.00	85.20	$ 2,767,211.00	100%


Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó y acompañó la ejecución de cortes controlados sobre superficies de concreto mediante el uso de cortadora manual, con el fin de delimitar de manera precisa las áreas de intervención requeridas para la instalación de la tubería de acueducto. Se constató que estos cortes fueron realizados de forma uniforme, alineada y conforme a lo proyectado, lo cual permitió desarrollar las excavaciones necesarias sin afectar zonas contiguas, garantizando un trabajo limpio y preciso, así como la protección e integridad del pavimento existente.



CONDICIONES INICIALES				PAGO PARCIAL N1				
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES							
2.8	Concreto lanzado y/o proyectado de 3000 Psi de 8 cm, incluye malla electro soldada, para estabilización de taludes.	m2	48.60	$ 190,546.00	$ 9,260,536.00	48.60	$ 9,260,536.00	100%

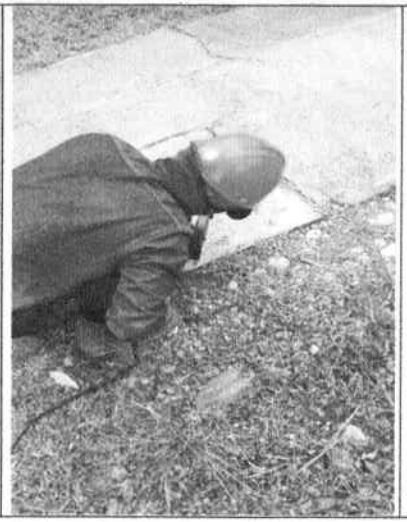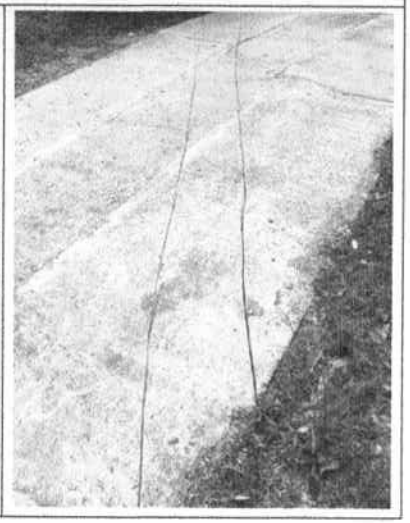
Durante este periodo, la interventoría verificó la ejecución de las actividades de estabilización del talud localizado entre las abscisas 0+654 y 0+686, sector asociado a la instalación de la tubería de 6 pulgadas. Para este fin, el contratista aplicó concreto lanzado con una resistencia estimada de 3000 PSI y un espesor aproximado de 8 cm, previa disposición y anclaje adecuado de la malla electro soldada utilizada como refuerzo. Se constató que el concreto fue proyectado de manera homogénea sobre la superficie del talud, garantizando una correcta adherencia, compactación y continuidad del recubrimiento. Estas labores se ejecutaron con el objetivo de mitigar riesgos de erosión y desplazamiento de material, contribuyendo a la estabilidad del terreno y al aseguramiento del frente intervenido.




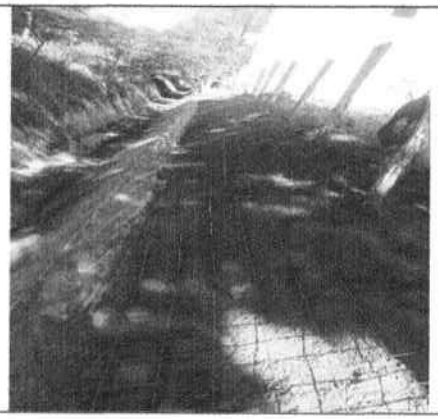

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**							
2.9	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m^3	4.40	$ 836,389.00	$ 3,680,112.00	4.40	$ 3,680,112.00	100%


Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó la ejecución de elementos en concreto asociados a la estabilidad y operación del sistema de acueducto. Se constató la conformación de un dado de apoyo en el punto de cambio de dirección horizontal de la tubería, cuya función es brindar estabilidad y soporte estructural al sistema de conducción, verificándose que su construcción se realizó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se supervisó la utilización de concreto para solado en la construcción de siete (7) cajas de registro destinadas a la instalación de los componentes hidráulicos contemplados, tales como válvulas de seccionamiento, micromedidor e hidrante, corroborando que este elemento cumple con la función de proporcionar una base estable, nivelada y con adecuada capacidad portante, garantizando la correcta fijación, funcionamiento y durabilidad de los accesorios, así como la protección de las estructuras frente a asentamientos diferenciales y condiciones de humedad del terreno, en concordancia con los lineamientos técnicos establecidos.

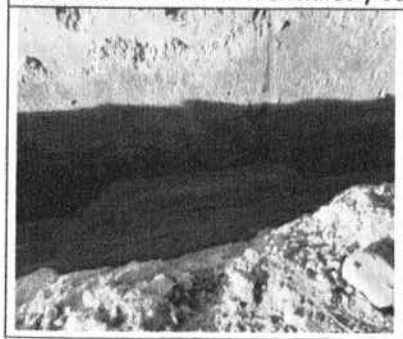


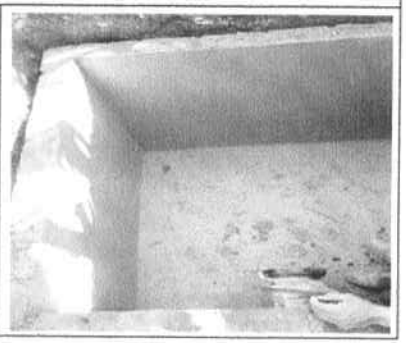
CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
2,0	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**							
2.10	Cárcamo en concreto 3000 Psi para protección de tubería de HD - PE superficial	m^3	23.77	$ 1,185,206.00	$ 28,172,347.00	23.77	$ 28,172,347.00	100%


Durante el período evaluado, la interventoría verificó la ejecución de la construcción de un cárcamo en concreto destinado a la protección de tramos de tubería superficial. La actividad comprendió la conformación del área y el vaciado del elemento estructural, constatándose que se garantizó el adecuado recubrimiento y confinamiento de la tubería. Lo anterior con el fin de proteger la conducción frente a cargas externas, impactos y agentes ambientales, asegurando su estabilidad mecánica y contribuyendo a la prolongación de la vida útil de la infraestructura instalada, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto.

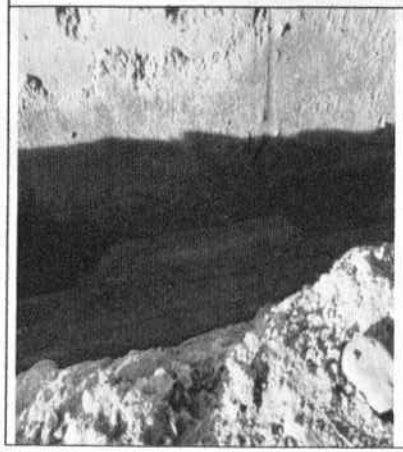

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.1	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	m	1,094.86	$ 301,345.00	$329,930,587.00	1046.86	$ 315,466,026.00	96%

La interventoría verificó la instalación de la tubería de polietileno PE 100 PN-10 de 10" (Ø=250 mm), actividad que incluyó el tendido, alineación y unión de los tramos mediante equipo de termofusión hidraulica. Este procedimiento permitió obtener uniones continuas, homogéneas y totalmente herméticas, asegurando la integridad estructural del sistema y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a resistencia mecánica e hidráulica.

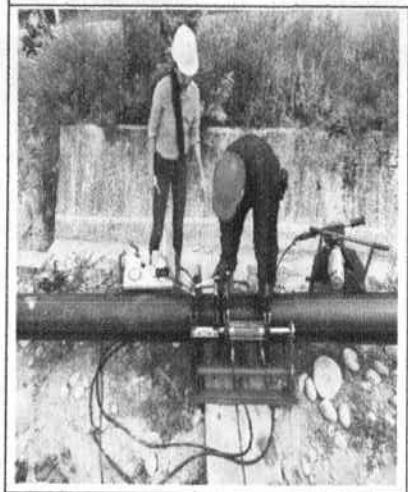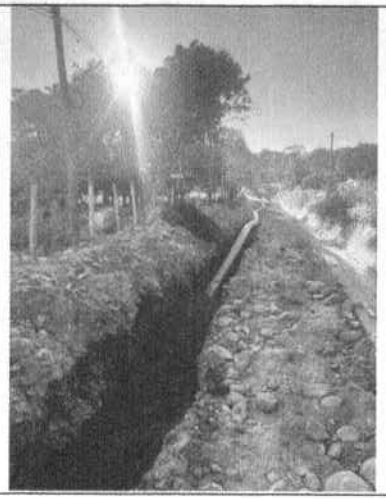

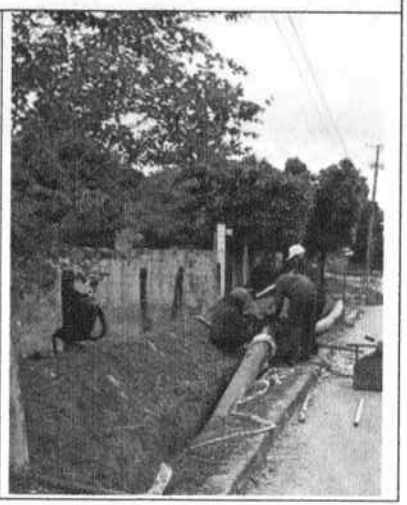CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.2	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de 160 mm	m	342.01	$ 130,735.00	$ 44,712,677.00	342.01	$ 44,712,677.35	100%

La interventoría verificó la instalación de la tubería de polietileno PE 100 PN-10 de 160 mm, actividad que incluyó el tendido, alineación y unión de los tramos mediante equipo de termofusión hidraulico. Este procedimiento permitió obtener uniones continuas, homogéneas y totalmente herméticas, asegurando la integridad estructural del sistema y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a resistencia mecánica e hidráulica.






CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.4	Tubería presión PVC RDE 21 3". Suministro e instalación	m	9.50	$ 83,842.00	$ 796,499.00	9.50	$ 796,499.00	100%


La interventoría acompaño en la actividad de la instalación de la tubería de presión de 3", utilizada como línea de desfogue o descarga asociada a una de las válvulas del sistema de acueducto. Durante la ejecución se constató que la instalación permitiera la evacuación controlada del agua en las maniobras de operación y mantenimiento, garantizando condiciones seguras de funcionamiento y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.



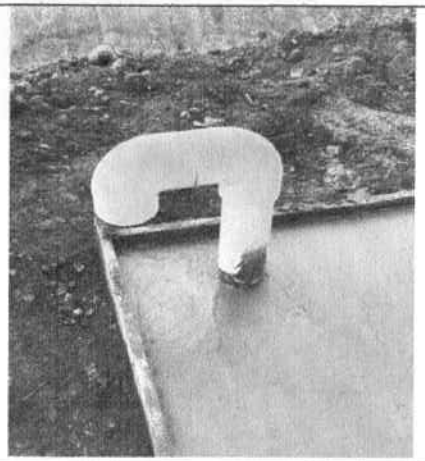


CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.5	Curva de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	und	16.00	$ 2,153,859.00	$34,461,744.00	16.00	$ 34,461,744.00	100%

Durante la instalación de la tubería de polietileno de alta densidad PE 100 PN-10 de 10" (Ø=250 mm), la interventoría constató la incorporación de accesorios tipo curva, requeridos para ajustar el trazado de la red en los puntos donde fue necesario modificar la dirección del alineamiento. Dichos elementos fueron unidos a los tramos adyacentes mediante el proceso de termofusión, asegurando una conexión continua, homogénea y completamente hermética, que garantiza la correcta conducción del flujo y la integridad del sistema.

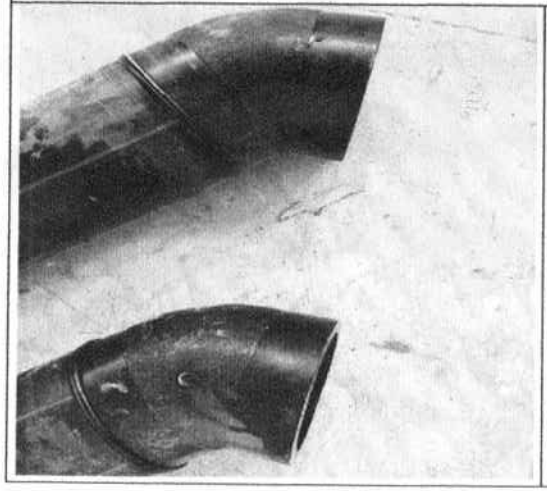





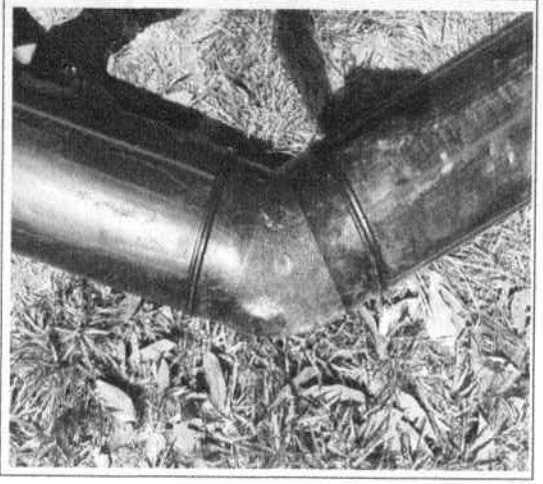


CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.6	Codo presión PVC 45° 3". Suministro e instalación	und	18.00	$ 78,051.00	$1,404,918.00	18.00	$ 1,404,918.00	100%

En el marco de las labores de seguimiento y control, se verificó la instalación del codo presión en PVC de 45° Ø 3", empleado para generar el cambio de dirección del tubo de desfogue o descarga asociado a la válvula. Se evidenció que el elemento permite una conducción adecuada y controlada del fluido hacia el punto de salida, garantizando la continuidad hidráulica del sistema, reduciendo esfuerzos sobre la tubería y asegurando el correcto funcionamiento del desfogue conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

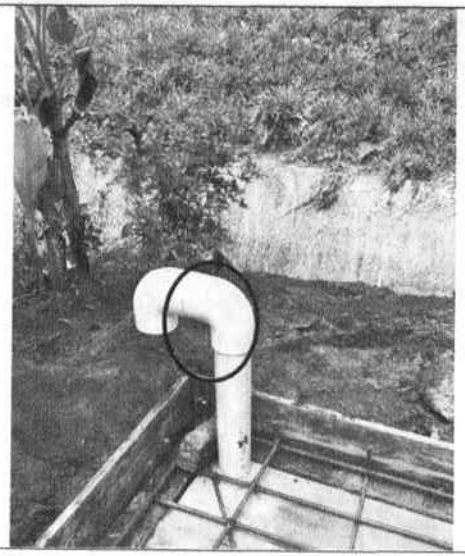

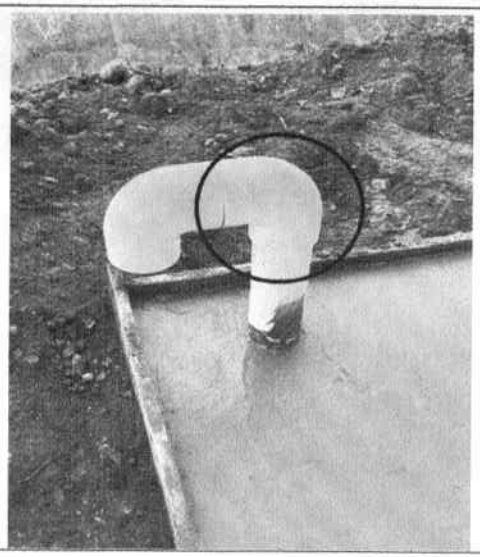

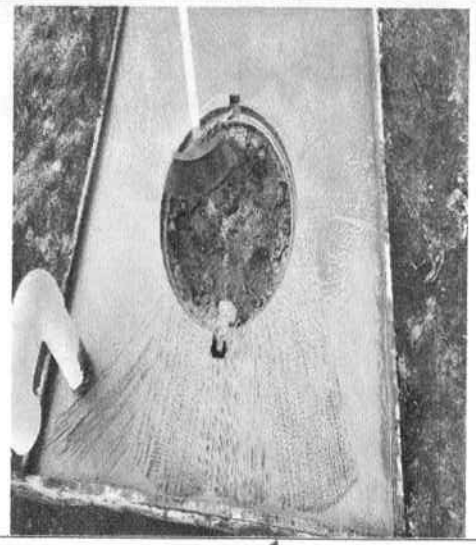

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% DE AVANCE**
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.7	Reducción de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10" a Ø=160 mm = 6"	und	1.00	$ 1,414,210.00	$ 1,414,210.00	1.00	$ 1,414,210.00	100%


Durante el desarrollo de la instalación de la red de acueducto, la interventoría verificó la incorporación de un accesorio tipo reducción en polietileno PE 100 PN-10, de Ø=250 mm (10") a Ø=160 mm (6"), con el propósito de efectuar la transición entre los distintos diámetros de tubería establecidos en los planos de diseño. Este elemento permitió la conexión entre la línea principal de 10" y el tramo secundario de 6", ejecutándose la unión mediante el proceso de termofusión, lo que garantizó una conexión uniforme, hermética y estructuralmente estable.





CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.11	Macromedidor de flujo ultrasónico Ø=10" E.B.x E.B. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 27,261,507.00	$27,261,507.00	1.00	$ 27,261,507.00	100%

Como parte de las actividades de supervisión técnica, la interventoría verificó el suministro e instalación de un macromedidor de flujo ultrasónico de 10", destinado a la medición y control de los caudales conducidos por la línea principal del sistema de acueducto. Durante la inspección se constató que el equipo fue instalado en el tramo definido en los diseños, cumpliendo con la alineación, orientación y las longitudes rectas requeridas aguas arriba y aguas abajo, de conformidad con las especificaciones técnicas para garantizar una medición precisa.

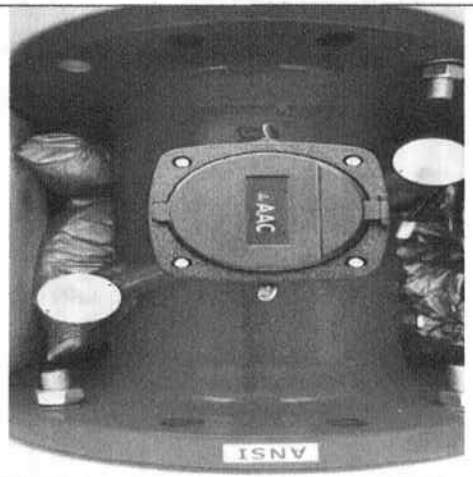






CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.13	Válvula de mariposa en HD Ø 3" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 909,398.00	$909,398.00	1.00	$ 909,398.00	100%


En desarrollo de las labores de seguimiento técnico, la interventoría corroboro el suministro e instalación de una válvula de mariposa de 3", incorporada al sistema de conducción como elemento de control y regulación del flujo. Durante la inspección se constató el montaje del elemento entre bridas, la adecuada alineación y ajuste de la tornillería, así como la correcta operación de la válvula, evidenciando su apropiada integración a la red de acueducto conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

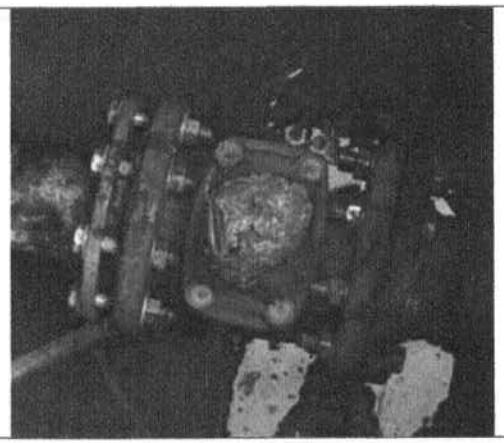



CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.17	Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=10" E.B. Suministro e instal.	und	2.00	$ 6,297,930.00	$12,595,860.00	2.00	$ 12,595,860.00	100%

La interventoría constató el suministro e instalación de válvulas de compuerta elástica de 10", incorporadas al sistema de acueducto como elementos de cierre y aislamiento hidráulico. Durante la inspección se evidenció el correcto posicionamiento de las válvulas en los tramos definidos en los diseños, su adecuado acople mecánico a la línea existente y la comprobación de su funcionamiento, garantizando un cierre hermético y una operación confiable dentro del sistema de conducción.

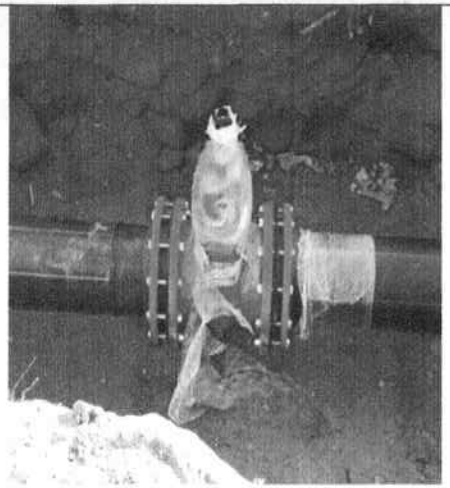








CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.19	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". Suministro e Instal.	und	2.00	$ 159,888.00	$319,776.00	2.00	$ 319,776.00	100%

La interventoría inspeccionó la instalación de portaflanche utilizados como elementos de transición entre la tubería principal y los accesorios hidráulicos con conexión bridada. Se evidenció que estos componentes permitieron una unión firme, alineada y hermética, garantizando la correcta incorporación de los equipos contemplados en el proyecto, como válvulas e hidrantes, y asegurando la continuidad estructural y operativa del sistema de conducción.

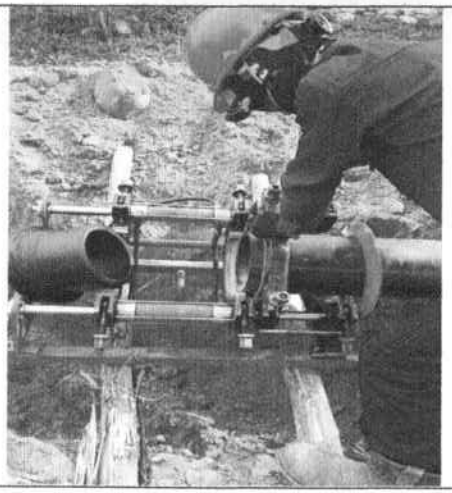

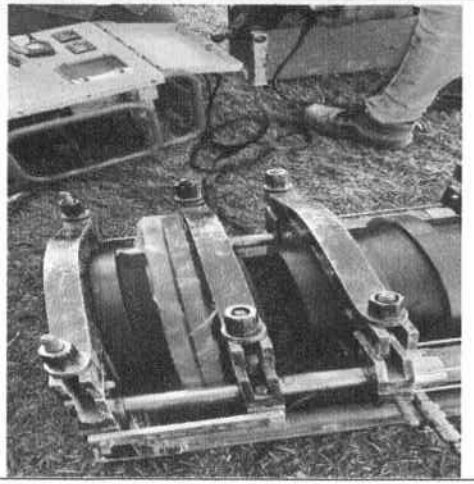

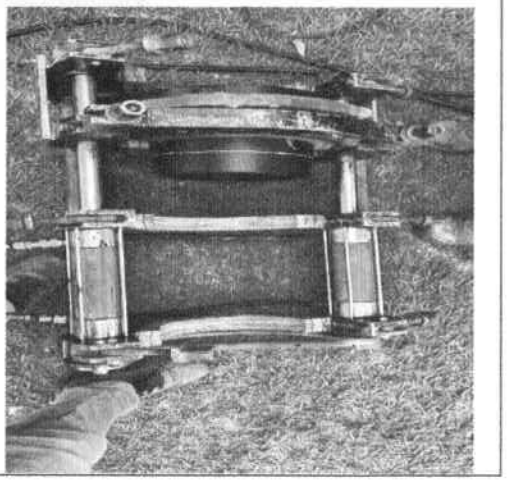

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.21	Portaflanche de polietileno PE 100 - PN-16 de Ø=160 mm = 6"	und	4.00	$ 292,915.00	$ 1,171,660.00	4.00	$ 1,171,660.00	100%

Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó la correcta instalación de los portaflanche, los cuales actúan como elementos de unión entre la tubería principal y los accesorios hidráulicos que requieren conexión mediante bridas. Se constató que estos componentes fueron instalados conforme a las especificaciones técnicas, garantizando una unión segura, alineada y estanca. Su adecuada colocación permite asegurar la correcta integración de equipos como las válvulas de seccionamiento y el hidrante, contribuyendo a la continuidad operativa y a la integridad del sistema de conducción.





CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.23	Brida Slip On Ø=6" en A.C. 150 Psi	und	4.0	$ 389,752.00	$ 1,559,008.00	4.0	$ 1,559,008.00	100%

Durante el periodo reportado, la interventoría verificó la instalación de bridas tipo, empleadas para conformar las uniones bridadas entre la tubería principal y los accesorios hidráulicos del sistema. Se constató que estos elementos fueron instalados correctamente, asegurando un acople firme, alineado y hermético, así como la estabilidad mecánica requerida en los puntos donde se requiere una conexión desmontable. De igual forma, se verificó su adecuada integración con las válvulas y demás componentes establecidos en el diseño, garantizando la continuidad funcional y operativa del sistema de acueducto.






CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.24	Hidrante tipo trafico Ø=4" en extremo liso 3 salidas; dos de 2 1/2"y una de 4 1/2", barril seco. Suministro e Instal.	und	1.0	$ 7,075,673.00	$ 7,075,673.00	1.0	$ 7,075,673.00	100%


Se verificó la instalación de un hidrante sobre la línea principal de tubería en polietileno, destinado a operar como punto de control para actividades de mantenimiento, purga del sistema y atención de emergencias por parte del personal operativo o del cuerpo de bomberos. La interventoría constató que la ubicación, anclaje y accesibilidad del hidrante cumplen con los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando su correcta integración al sistema de conducción dentro del tramo correspondiente a la ampliación del acueducto hacia el sector La Colmena.




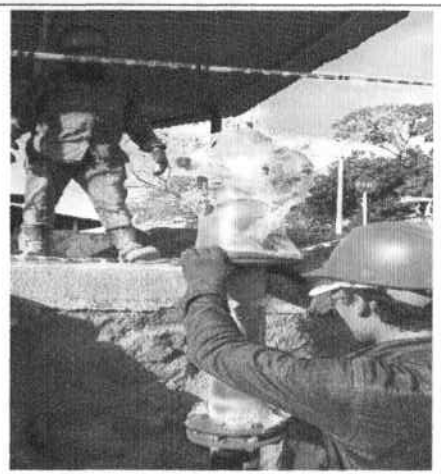

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
3,0	**TUBERÍA Y VÁLVULAS**							
3.25	Tubería PVC alcantarillado 14". Suministro e instal.	m	90.08	$ 286,653.00	$ 25,821,702.00	90.08	$ 25,821,702.00	100%


En el desarrollo de las actividades de control, la interventoría realizó seguimiento al uso de la tubería empleada como encamisado del cárcamo, destinada a brindar protección estructural y facilitar el alojamiento del elemento. Se constató que esta solución garantiza la estabilidad, correcta alineación y aislamiento frente al contacto directo con el terreno, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto.

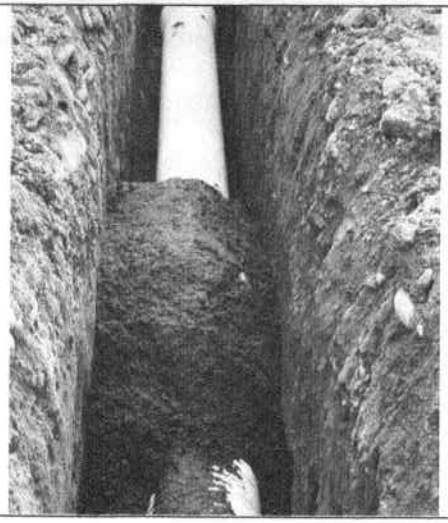


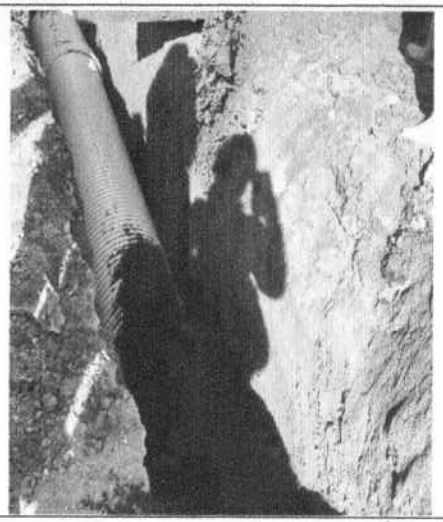

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
5,0	**CAJAS EN CONCRETO, ACEROS Y OTROS**							
5.2	Caja en concreto reforzado 3000 Psi para estación macromedidora Ø=10" (3.00 x 1.2 x 1.40 libres), incluye tapa basculante.	und	1.00	$ 9,993,236.00	$ 9,993,236.00	1.00	$ 9,993,236.00	100%

La interventoría acompañó y constató la construcción de una caja en concreto reforzado de 3.000 psi para la estación macromedidora de 10", destinada al alojamiento y protección del macromedidor y sus accesorios. Durante la inspección se evidenció la conformación estructural de la caja, la disposición del refuerzo conforme a diseño, el vaciado del concreto y la instalación de la tapa basculante, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad y protección del equipo, lo cual facilita las labores de operación, lectura y mantenimiento del sistema de medición.

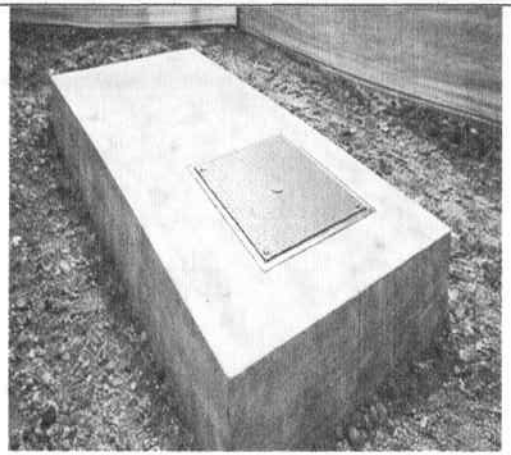

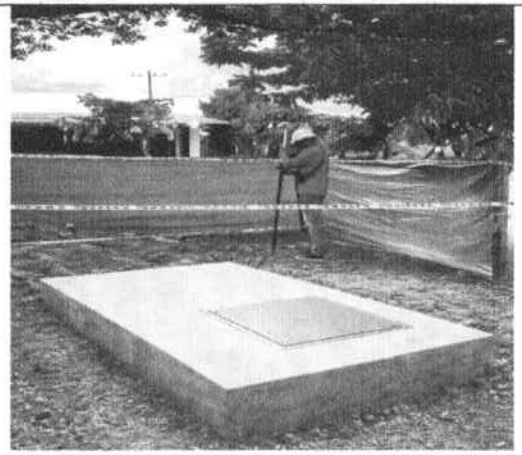

CONDICIONES INICIALES						PAGO PARCIAL N1		
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% DE AVANCE**
5,0	**CAJAS EN CONCRETO, ACEROS Y OTROS**							
5.7	Desmonte instalaciones hidráulicas pvc Ø m 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	und	208.30	$ 5,713.00	$ 1,190,018.00	208.30	$ 1,190,017.90	100%

La interventoría verificó el desmonte de la tubería hidráulica existente en PVC dentro del área de intervención, realizado con el fin de permitir la instalación de la nueva red de acueducto. Se constató que los tramos desmontados fueron retirados manualmente y trasladados fuera del frente de trabajo para su adecuada disposición, conforme a las especificaciones técnicas y a las medidas de orden y limpieza en obra.





- **SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD**

Para poder asegurar que los trabajos se están ejecutando de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato y llevar un registro ordenado de la ejecución de la obra, es necesario inspeccionar el desarrollo de cada una de las actividades donde se involucren el contratista de obra, la interventoría y el profesional de apoyo a la supervisión dejando evidencia que la actividad entregada y recibida quedo realizada a satisfacción siguiendo todos los parámetros establecidos contractualmente.

Para este periodo comprendido entre el día 09 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se ejecutaron actividades correspondientes a los **Capitulo 1**: Obras Preliminares, **Capitulo 2:** Excavación, rellenos y reposiciones, **Capitulo 3**: Tubería y válvulas y **Capitulo 5:** Cajas en concretos, aceros y otros. Cada una de las actividades desarrolladas dentro de cada capítulo se ejecutó según planos, detalles y especificaciones técnicas suministrados por el contratante. La interventoría continuara realizando verificaciones de cumplimiento de los aspectos ambientales, ejecución de ensayos de calidad de obra y seguimiento de los lineamientos de seguridad industrial y salud ocupacional.

8.13 Previamente a la iniciación del proyecto, la interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, de las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, de los contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto.

La interventoría realizó una recopilación y análisis documental requerido para contar con la información requeridas para el seguimiento técnico, administrativo, financiero del contrato de obra, el cual está a disposición del personal de la interventoría para consulta.

8.14 Revisión de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, programación de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones, en caso de ser necesarias.

A la fecha NO se presenta modificaciones de cantidades del contrato de obra.

Ejecución: la interventoría de CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS, quien hace el seguimiento y control de las actividades del contrato de obra 320.11.050-2025, una vez firmada la respectiva acta de inicio del día 09 de octubre del 2025 se realizó la revisión de las especificaciones técnicas, diseños suministrados, para cuyo objeto "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO

AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", La Interventoría hace revisión de acuerdo con lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, estudios de suelos y fuentes de materiales, estudios topográficos y diseño hidráulico. Se concluye que el proyecto tiene toda la documentación para realizar las actividades legales para adelantar dicho proyecto. La interventoría realizo las visitas de campo, verifico linderos, espacio público, disponibilidad de servicios básicos y demás componentes del proyecto. De acuerdo con lo anterior esta actividad se ejecuta al 100%.

8.15 Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.

Se realiza seguimiento de la llegada de materiales en campo validando la procedencia de los materiales de proveedores aprobados como es el caso de materias primas y la revisión de los certificados de calidad de los demás materiales de obra; para el caso de herramienta y maquinaria se realiza la validación de los chequeos y seguimiento de mantenimiento para su correcto uso.

Ejecución: Esta interventoría realizo el control a la mano de obra y a los equipos ofertados por parte de la UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 de manera permanente, con el fin de garantizar los trabajos ejecutados sean desarrollados por personal competente y con equipos idóneos garantizando la calidad de los trabajos ejecutados.

El personal se relaciona en la (Tabla 8. Relación de personal de Obra Cto 320.11.050-2025).

Tabla 12 Relación de Equipos.

N°	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD
1	Apisonador tipo canguro	13kn	1	Compactación excavación
2	Equipo de termofusión hidráulico	100 Psi	1	Unión de tubería
3	Herramienta menor civil	N/A	20	Excavación, instalación de tubería entre otras
4	Estación Total	N/A	1	Topografía
5	Nivel de precisión	N/A	1	Topografía

Fuente: Tomado y adaptado reporte de equipos del 09 de octubre al 31 de diciembre 2025- Obra UT ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025

8.16 Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.

Se realiza validación de las Canteras aprobadas para el suministro de materiales.

8.17 Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.

Ejecución: Desde el día 09 de octubre al 31 de diciembre del 2025 está interventoría ha venido realizando el control de los materiales utilizados por el contratista de obra en la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra 320.11.050-2025, así mismo se han revisado los levantamientos topográficos. Durante el presente periodo no se tomaron muestras para ensayos de resistencia a la compresión del concreto

8.18 Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometerlos trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso.

Se realiza validación de la maquinaria y equipos dispuestos en campo los cuales se revisa las condiciones óptimas para su correcto funcionamiento

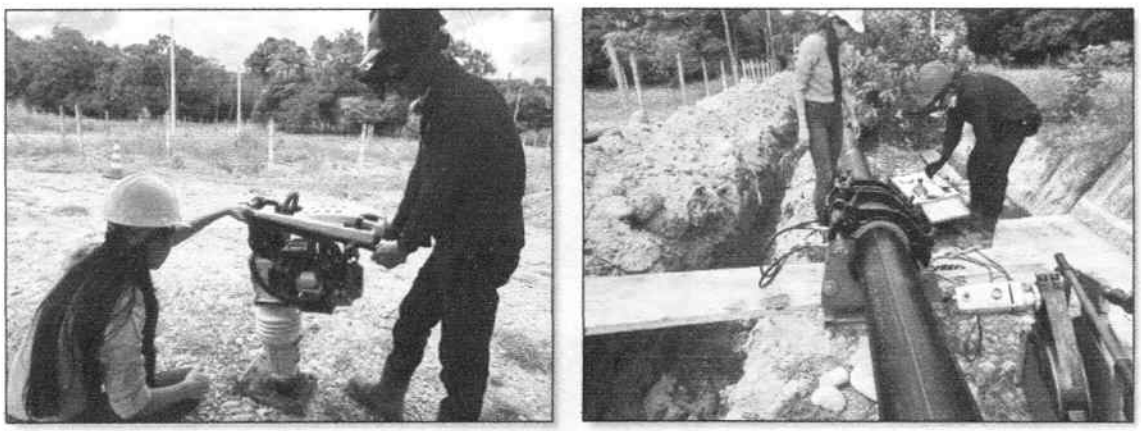


Imagen 7: Control de equipos en la obra, fuente propia

8.19 Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros presentados por el contratista, recomendar a la interventoría su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.

Se realiza seguimiento de la programación presentada por el contratista de obra y en este informe se describen los avances ejecutados para el presente periodo.

8.20 Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto y cuando se requiera.

Se realiza acompañamiento y seguimiento de las obras en ejecución mediante la comisión de topografía dispuesta por la interventoría mediante la cual se valida la implantación adecuada de las obras en campo.

8.21 Verificar que las recomendaciones efectuadas, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, se desarrollen de acuerdo a las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.

Ejecución: La inspección en campo realizada durante el presente periodo, permitió constatar que la mayoría de las actividades constructivas se están llevando a cabo de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Se verificó la correcta instalación de barreras sedimentarias, la disposición adecuada de residuos de construcción y la implementación de medidas de control de ruido.



Imagen 8: Control en la recolección y disposición final de los residuos originados en la obra. Fuente. Propia

8.22 Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones.

Se evalúa en campo y/o en mesa técnica de ser requerido las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos técnicos y en caso de no ser atendidas en estos espacios se realizará traslado a la interventoría para evaluación.

8.23 Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar a la interventoría y a los contratistas las modificaciones requeridas.

Ejecución:
Se llevaron a cabo las revisiones periódicas de las cantidades de obra, conforme a lo establecido en el cronograma del proyecto.

Elaborar y suscribir con los contratistas y en conjunto con la interventoría las actas de liquidación para el recibo final de las obras.

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución por tal motivo no requiere el proceso documental de liquidación, de igual forma se realiza la recopilación del archivo del proyecto para la liquidación del mismo.

8.24 Registrar con el contratista o el representante de aquel en la bitácora o libro de obras las acciones realizadas: los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal: las actas de los comités técnicos o administrativos de obras que se realicen: las novedades que se presenten: los conceptos técnicos emitidos por consultores externos a la obra y demás observaciones que a su juicio sean necesarias hacer.

Se realiza el registro de la bitácora en campo con los eventos y actividades realizadas diariamente en campo.

Ejecución: Esta interventoría junto con el contratista de obra adelanta desde el 09 de octubre al 31 de diciembre del 2025 el diligenciamiento del libro (bitácora) de obra, se llevará diariamente un registro de actividades programadas, un avance de estas, el estado del tiempo y personal en obra tanto técnico como operativo, al final de cada registro en la bitácora debe estar firmada por los representantes tanto de la obra como de la interventoría.

Para el soporte de esta actividad se anexa copia de la bitácora.


8.25 Ordenar lo necesario para que la ejecución del contrato se lleve a cabo sin ocasionar perjuicios a terceros.

Se valida la constante comunicación del contratista de obra con los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios involucrados con el fin de evitar cualquier inconformidad con la comunidad, de igual forma se está atento a la recepción de quejas o inconformidades por parte de la comunidad.

9 FUNCIONES GENERALES FINANCIERAS Y CONTABLES

9.1 Gestión financiera del contrato, incluyendo el certificado de disponibilidad o el registro presupuestal.

Ejecución: Respecto a esta actividad a la fecha de ejecución del proyecto denominado "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE" la oficina de presupuesto expidió los respectivos CDP y RP tanto del contrato de obra 320.11.050-2025 como el de interventoría No 320.11.047-2025.

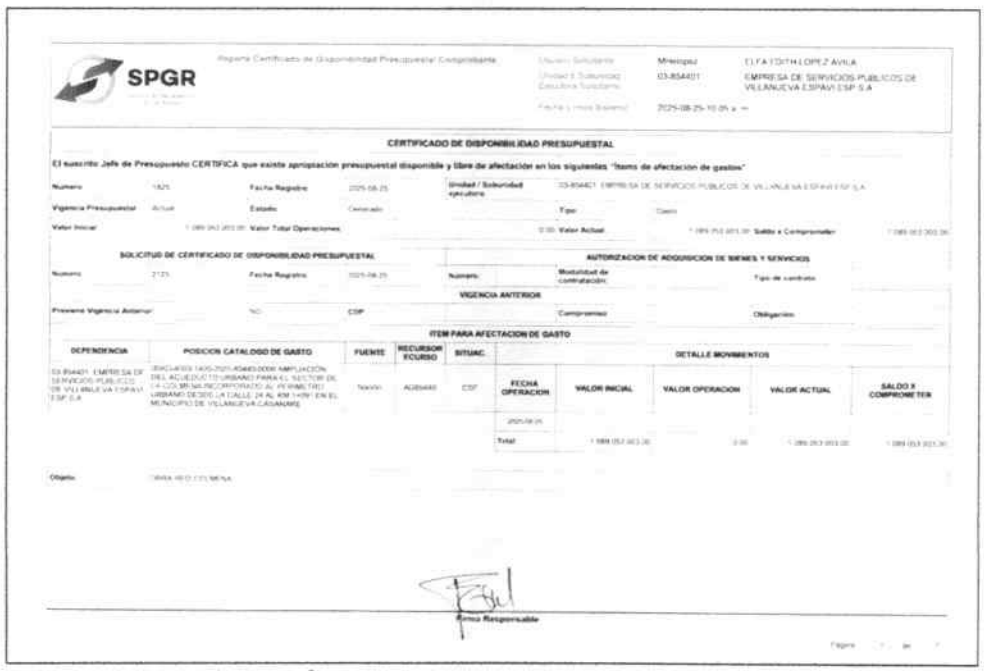
SPGR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero	1825	Fecha Registro	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora	03-854401 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado	Tipo	Gasto
Valor Inicial	$ 1.089.053.303,00	Valor Total Operaciones	$ 0,00	Valor Actual	$ 1.089.053.303,00 Saldo a Comprometer $ 1.089.053.303,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero	2125	Fecha Registro	2025-08-25

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero		Modalidad de contratación	Tipo de contrato

VIGENCIA ANTERIOR

Presenta Vigencia Anterior	NO	CDP	Compromiso	Obligación


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ FCURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-854401 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A	3-3-1-15-01-20-1405-2025-4046 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	Nacion	AGUAAS	CSF	2025-08-25	$ 1.089.053.303,00	$ 0,00	$ 1.089.053.303,00	$ 1.089.053.303,00
					Total	$ 1.089.053.303,00	$ 0,00	$ 1.089.053.303,00	$ 1.089.053.303,00

Objeto: [illegible]

Firma Responsable

Imagen 9: CDP Contrato de Obra No 320.11.050-2025

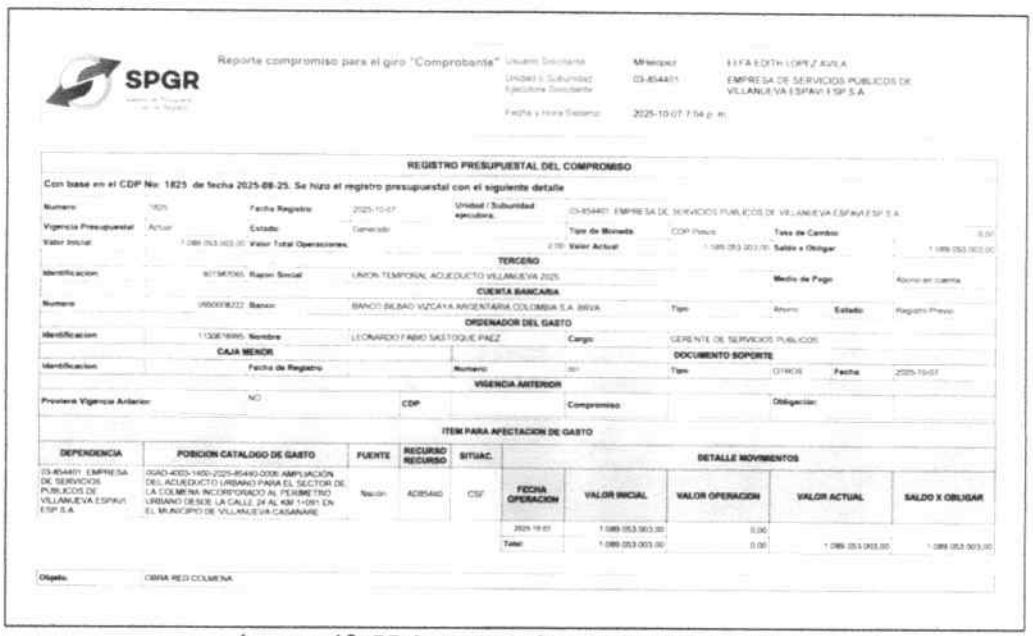

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	Mhenjaez	ELFA EDITH LOPEZ AVILA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-854401	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A	
Fecha y Hora Sistema	2025-10-07 7:54 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1825 de fecha 2025-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	1825	Fecha Registro	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora	03-854401 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado	Tipo de Moneda	COP Peso	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	1.089.053.003,00	Valor Total Operaciones		0.00 Valor Actual	1.089.053.003,00	Saldo a Obligar	1.089.053.003,00

TERCERO

Identificacion	901580065	Razon Social	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	0600008222	Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo	Ahorro	Estado	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion	1120878995	Nombre	LEONARDO FABIO SASTOQUE PAEZ	Cargo	GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

CAJA MENOR — **DOCUMENTO SOPORTE**

Identificacion		Fecha de Registro		Numero		Tipo	OTROS Fecha 2025-10-07

VIGENCIA ANTERIOR

Presenta Vigencia Anterior	NO	CDP		Compromiso	Obligacion

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-854401 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A	0(A0)-4(03)-1(00)-2(25)-8(540)-0(00) AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	Nacion	A(08)5(46)0	CSF	2025-10-07	1.089.053.003,00	0.00		
					Total	1.089.053.003,00	0.00	1.089.053.003,00	1.089.053.003,00

Objeto: OBRA RED COLMENA

Imagen 10: RP Contrato de Obra No 320.11.050-2025



SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	Mhenjaez	ELFA EDITH LOPEZ AVILA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-854401	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A	
Fecha y Hora Sistema	2025-07-25-10:42 a. m.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero	1725	Fecha Registro	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora	03-854401 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado	Tipo	Gasto		
Valor Inicial	205.771.121,00	Valor Total Operaciones		0.00 Valor Actual	205.771.121,00	Saldo a Comprometer	205.771.121,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero	2025	Fecha Registro	2025-07-25	Numero		Modalidad de contratación	Tipo de contrato

VIGENCIA ANTERIOR

Presenta Vigencia Anterior	NO	CDP		Compromiso	Obligacion

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-854401 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI ESP S.A	0(A0)-4(03)-1(00)-2(25)-8(540)-0(00) AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	Nacion	A(08)5(46)0	CSF	2025-07-25				
					Total	205.771.121,00	0.00	205.771.121,00	205.771.121,00

Objeto: INTERVENTORIA COLMENA

Firma Responsable

Página 1 de 1

Imagen 11: CDP Contrato de interventoria No 320.11.047-2025

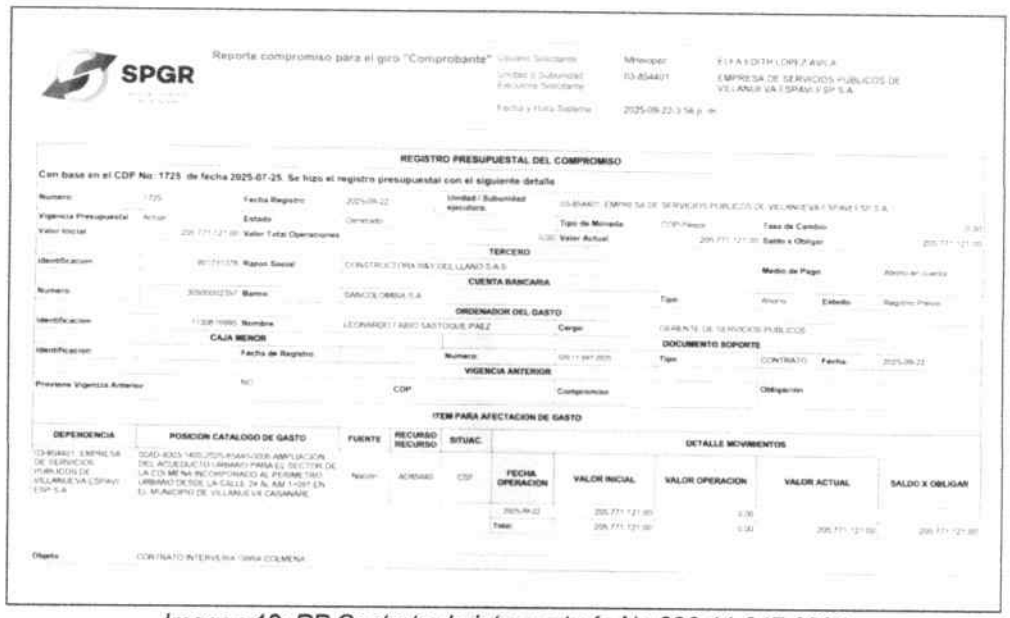

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

TERCERO

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

VIGENCIA ANTERIOR

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR

Objeto CONTRATO INTERVENTORIA OBRA COLMENA

Imagen 12: RP Contrato de interventoría No 320.11.047-2025

9.2 Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecida en el cronograma de inversión

Cantidades de avance financiero programado vs avance ejecutado:

Tabla 13 Cantidades de avance en obra 09/10/2025 al 31/10/2025

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA
ENTREGA PARCIAL N°1

CONTRATO DE OBRA No 320.11.060 -2025	OBJETO:	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	PERIODO REPORTADO	
	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 34 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.	INTERVENTORÍA:	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	DESDE:	9/10/2025
		SUPERVISIÓN:	NATALIA ROJAS	HASTA:	31/12/2025

PROPUESTA ECONOMICA						MODIFICACION Y ADICION			TOTAL CONTRATADO		MES 1 08/10/25 - 31/10/25		MES 2 01/11/25 - 30/11/25		MES 3 01/12/25 - 31/12/25		ACUMULADO EJECUTADO 09/10/25 - 31/12/25		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	% EJECUTADO
1	OBRAS PRELIMINARES																		
1,1	Replanteo y localizacion de tuberias de acueducto	m	1.435,87	$ 6.436,00	$ 9.241.259,00					$ 9.241.259,00	1435,870	$ 9.241.259,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1435,87	$ 9.241.259,00	100%
Subtotal					$ 9.241.259,00					$ 9.241.259,00		$ 9.241.259,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 9.241.259,00	
2	EXCAVACION, RELLENOS Y REPOSICIONES																		
2,1	Excavacion manual en conglomerado	m³	1.433,81	$ 100.509,00	$ 144.110.809,00					$ 144.110.809,00	690,08	$ 69.962.305,00	293,39	$ 29.468.336,00	444,34	$ 44.660.168,00	1433,81	$ 144.110.810,00	100%
2,2	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	543,05	$ 42.791,00	$ 23.237.653,00					$ 23.237.653,00	290,74	$ 12.441.055,00	128,90	$ 5.515.769,00	123,41	$ 5.280.837,00	543,05	$ 23.237.652,00	100%
2,3	Demolicion sardineles, sardineles y cunetas (incluye: Retiro)	m³	4,07	$ 260.763,00	$ 1.061.305,00					$ 1.061.305,00	2,18	$ 568.463,00	0,40	$ 104.305,00	1,49	$ 388.537,00	4,07	$ 1.061.305,00	100%
2,4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	410,36	$ 124.347,00	$ 51.027.035,00					$ 51.027.035,00	290,96	$ 36.180.003,00	105,84	$ 13.160.886,00	13,56	$ 1.686.145,00	410,36	$ 51.027.034,00	100%
2,5	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m³	668,88	$ 42.007,00	$ 28.139.649,00					$ 28.139.649,00	360,32	$ 16.396.172,00	196,88	$ 8.270.338,00	82,68	$ 3.473.139,00	669,88	$ 28.139.649,00	100%
2,6	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	7,53	$ 753.904,00	$ 5.676.897,00					$ 5.676.897,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
2,7	Corte en concreto	m	85,20	$ 32.479,00	$ 2.767.211,00					$ 2.767.211,00	43,16	$ 1.401.794,00	36,56	$ 1.187.432,00	5,48	$ 177.985,00	85,20	$ 2.767.211,00	100%
2,8	Concreto lanzado y/o proyectado de 3000 Psi de 6 cm, incluye malla electrosoldada, para estabilizacion de taludes.	m²	46,60	$ 198.546,00	$ 9.250.536,00					$ 9.250.536,00	0,00	$ 0,00	46,60	$ 9.250.536,00	0,00	$ 0,00	46,60	$ 9.250.536,00	100%
2,9	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m²	4,40	$ 836.389,00	$ 3.680.112,00					$ 3.680.112,00	0,42	$ 351.283,00	0,57	$ 476.742,00	3,41	$ 2.852.086,00	4,40	$ 3.680.111,00	100%
2,10	Carcamo en concreto 3000 Psi para proteccion de tuberia de HD - PE superficial	m²	23,77	$ 1.185.296,00	$ 28.172.347,00					$ 28.172.347,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,77	$ 28.172.347,00	23,77	$ 28.172.347,00	100%
Subtotal					$ 297.133.554,00					$ 297.133.554,00		$ 137.301.075,00		$ 67.464.335,00		$ 96.691.245,00		$ 291.456.655,00	
3	TUBERIA Y VALVULAS																		
3,1	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	m	1.094,86	$ 301.345,00	$ 329.930.587,00					$ 329.930.587,00	466,21	$ 140.490.052,00	356,00	$ 107.881.510,00	222,65	$ 67.094.464,00	1046,86	$ 316.466.026,00	96%
3,2	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de 160 mm	m	342,01	$ 130.736,00	$ 44.712.677,00					$ 44.712.677,00	342,01	$ 44.712.677,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	342,01	$ 44.712.677,00	100%
3,3	Tuberia presion PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instalacion	m	209,00	$ 21.411,00	$ 4.474.899,00					$ 4.474.899,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,4	Tuberia presion PVC RDE 21 3". Suministro e instal.	m	9,50	$ 83.842,00	$ 796.499,00					$ 796.499,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,50	$ 796.499,00	9,50	$ 796.499,00	100%
3,5	Curva de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	und	16,00	$ 2.153.859,00	$ 34.461.744,00					$ 34.461.744,00	2,00	$ 4.307.716,00	2,00	$ 4.307.716,00	12,00	$ 25.846.308,00	16,00	$ 34.461.744,00	100%
3,6	Codo presion PVC 45° ø 3. Suministro e instal.	und	18,00	$ 78.051,00	$ 1.404.918,00					$ 1.404.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.404.918,00	18,00	$ 1.404.918,00	100%
3,7	Reduccion de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10" a Ø=	und	1,00	$ 1.414.210,00	$ 1.414.210,00					$ 1.414.210,00	1,00	$ 1.414.210,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.414.210,00	100%
3,8	Tee en H.D. 10" x 10" J.H. Suministro e instal.	und	1,00	$ 5.153.508,00	$ 5.153.508,00					$ 5.153.508,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,9	Tee de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 10 250 mm Ø=10".	und	2,00	$ 3.982.015,00	$ 7.964.030,00					$ 7.964.030,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3,10	Union mecanica rapida RDE 21 10". Suministro e instal.	und	2,00	$ 874.403,00	$ 1.748.806,00					$ 1.748.806,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

3.11	Macromedidor de flujo ultrasonico Ø=10" E.B.a E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 27.261.507,00	$ 27.261.507,00					$ 27.261.507,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 27.261.507,00	1,00	$ 27.261.507,00	100%
3.12	Estacion macromedidora Ø=10" con accesorios. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 41.738.269,00	$ 41.738.269,00					$ 41.738.269,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.13	Valvula de mariposa en HD Ø 3" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 909.396,00	$ 909.396,00					$ 909.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 909.396,00	1,00	$ 909.396,00	100%
3.14	Valvula de mariposa en HD Ø 4" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca	und	1,00	$ 1.234.788,00	$ 1.234.788,00					$ 1.234.788,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.15	Valvula de ventosa 1/8". Camara doble accion multiple. Suministro e instal.	und	1,00	$ 7.123.527,00	$ 7.123.527,00					$ 7.123.527,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.16	Valvula de ventosa 6". Camara doble accion multiple E.S. Suministro e instal.	und	1,00	$ 8.072.038,00	$ 8.072.038,00					$ 8.072.038,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.17	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=10" E.B. Suministro e instal.	und	2,00	$ 6.297.930,00	$ 12.595.860,00					$ 12.595.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 12.595.860,00	2,00	$ 12.595.860,00	100%
3.18	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=6" J.H. Suministro e instal.	und	1,00	$ 1.917.447,00	$ 1.917.447,00					$ 1.917.447,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.19	Portellanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". Suministro e instal.	und	2,00	$ 159.888,00	$ 319.776,00					$ 319.776,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 319.776,00	2,00	$ 319.776,00	100%
3.20	Portellanche de polietileno PE 100 - PN-16 de Ø=250 mm = 10".	und	14,00	$ 1.122.194,00	$ 15.710.716,00					$ 15.710.716,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.21	Portellanche de polietileno PE 100 - PN-16 de Ø=160 mm = 6"	und	4,00	$ 292.915,00	$ 1.171.660,00					$ 1.171.660,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 585.830,00	2,00	$ 585.830,00	4,00	$ 1.171.660,00	100%
3.22	Brida Slip On Ø=10" en A.C. 150 Psi	und	14,00	$ 1.051.927,00	$ 14.726.978,00					$ 14.726.978,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
3.23	Brida Slip On Ø=6" en A.C. 150 Psi	und	4,00	$ 389.752,00	$ 1.559.008,00					$ 1.559.008,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 779.504,00	2,00	$ 779.504,00	4,00	$ 1.559.008,00	100%
3.24	Hidrante tipo trafico Ø=4" en extremo liso 3 salidas; dos de 2 1/2"y una de 4 1/2", barril seco. Suministro e instal.	und	1,00	$ 7.075.673,00	$ 7.075.673,00					$ 7.075.673,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.075.673,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.075.673,00	100%
3.25	Tuberia PVC alcantarillado 14". Suministro e instal.	m	90,08	$ 286.653,00	$ 25.821.702,00					$ 25.821.702,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	90,08	$ 25.821.702,00	90,08	$ 25.821.702,00	100%
Subtotal					$ 597.300.205,00					$ 597.300.205,00		$ 190.924.657,00		$ 120.630.230,00		$ 163.415.766,00		$ 474.970.658,00	
4	PASO ELEVADO TIPO CERCHA																		
4.1	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	kg	2.151,65	$ 26.446,00	$ 56.902.536,00					$ 56.902.536,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
4.2	Perno de anclaje en acero negro roscado ASTM A-193 de 5/8" x 8", incluye tuercas y arandelas, epoxico. Suministro e instal.	und	20,00	$ 116.423,00	$ 2.328.460,00					$ 2.328.460,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
4.3	Tuberia AC 10" con centura x 6 metros	Tub	47,72	$ 298.689,00	$ 14.253.439,00					$ 14.253.439,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
Subtotal					$ 73.484.435,00					$ 73.484.435,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
5	CAJA EN CONCRETO, ACEROS Y OTROS																		
5.1	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	6,00	$ 1.974.090,00	$ 11.844.540,00					$ 11.844.540,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
5.2	Caja en concreto reforzado 3000 Psi para estacion macromedidora Ø=10" (3.00 x 1.2 x 1.40 libres), incluye tapa basculante.	und	1,00	$ 9.993.236,00	$ 9.993.236,00					$ 9.993.236,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.993.236,00	1,00	$ 9.993.236,00	100%
5.3	Caja de inspeccion 60 x 60 incluye tapa en concreto y acero de refuerzo	und	9,00	$ 859.382,00	$ 7.734.438,00					$ 7.734.438,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
5.4	Prueba hidraulica para tuberia Ø 6" - 10 "	m	1.436,87	$ 4.834,00	$ 6.945.830,00					$ 6.945.830,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
5.5	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1.037,81	$ 9.811,00	$ 10.179.992,00					$ 10.179.992,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
5.6	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	6,00	$ 671.316,00	$ 4.027.896,00					$ 4.027.896,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
5.7	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø m. 1/2",3/4",1" 1 1/2" con retiro	m	208,30	$ 5.713,00	$ 1.190.018,00					$ 1.190.018,00	208,300	$ 1.190.018,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	208,30	$ 1.190.018,00	100%
Subtotal					$ 51.915.950,00					$ 51.915.950,00		$ 1.190.018,00		$ 0,00		$ 9.993.236,00		$ 11.183.254,00	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 1.029.075.403,00					$ 1.029.075.403,00		$ 338.657.009,00		$ 188.094.570,00		$ 260.100.247,00		$ 786.851.826,00	76%
	PRESUPUESTO PLAN MANEJO TRANSITO CONTRATO DE OBRA				$ 36.211.227,00					$ 36.211.227,00	33%	$ 11.871.432,00	26%	$ 9.414.919,00	27%	$ 9.813.243,00	86%	$ 31.199.593,00	86%
	PRESUPUESTO PMA				$ 23.796.373,00					$ 23.796.373,00	33%	$ 7.857.183,00	26%	$ 6.179.257,00	27%	$ 6.440.687,00	86%	$ 20.477.107,00	86%
	COSTO TOTAL OBRA				$ 1.089.083.003,00					$ 1.089.083.003,00		$ 358.485.604,00		$ 203.688.746,00		$ 276.354.177,00		$ 838.528.526,00	77%
	PORCENTAJE DE AVANCE										32,92%		18,70%		25,38%		77,00%		
	AVANCE FISICO										77%								

PROGRAMACIÓN DE OBRA VS EJECUTADO

- Se realizó la verificación de la programación establecida en el cronograma de obra, se realizará constante seguimiento verificando si hay lugar a modificaciones según los acontecimientos importantes que ocurran durante la ejecución.

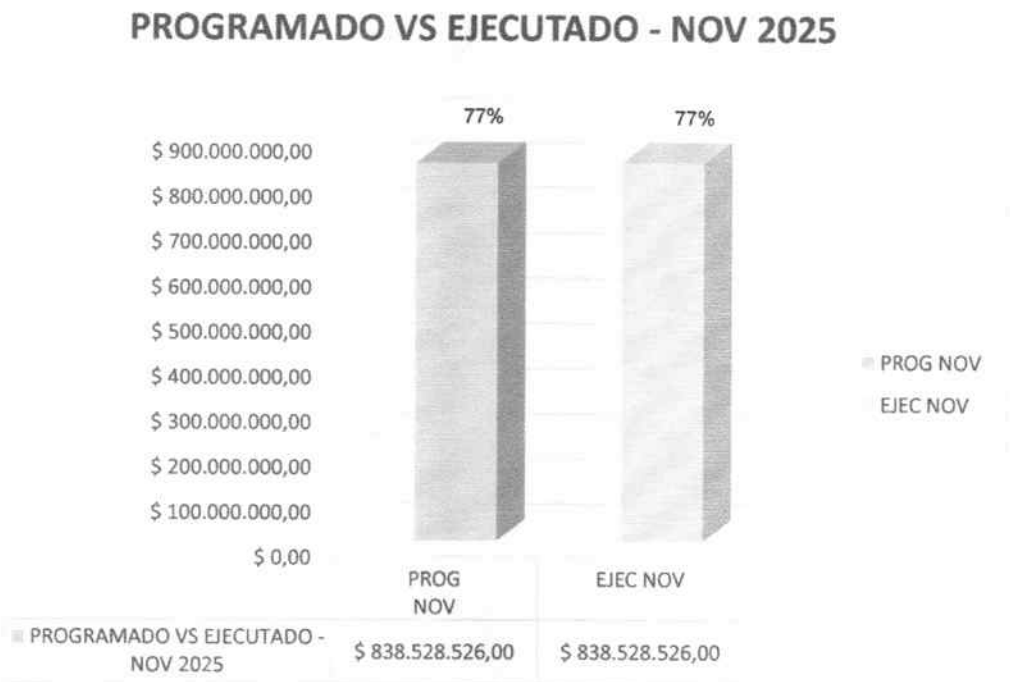


Ilustración 4: Programado vs Ejecutado- fuente propia

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control, verificó el avance físico de las actividades ejecutadas por el contratista, contrastando la información con el cronograma de obra aprobado. Como resultado de esta revisión, se evidencia que las labores desarrolladas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se ejecutaron conforme a lo programado, cumpliendo con los tiempos establecidos y los volúmenes proyectados para el periodo.

A la fecha de corte del 31 de diciembre de 2025, el contratista mantiene un avance acorde con la planeación inicial, sin presentarse retrasos significativos en el desarrollo de las actividades constructivas. Este cumplimiento refleja una adecuada gestión técnica y

administrativa por parte del contratista, permitiendo el desarrollo continuo y ordenado de las labores de obra dentro de los plazos contractuales.

8.3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso.

9.3.1. GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

Acorde al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realiza una revisión del estado general de las pólizas del contrato de obra de lo cual se puede dictar que estas se encuentran vigentes según las condiciones expuestas en el contrato de obra así:

9.3.1.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

A continuación, se relacionan los amparos establecidos según el contrato de obra 320.11.050 de 2025, legalizado entre el contratista de obra y la Interventoría:

Tabla 14: Condiciones Garantía de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual Cto. de Obra 320.11.050 de 2025 - Fuente: Contrato de Obra 320.11.050-2025

CONTRATO DE OBRA 320.11.050 - 2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**	COQ-100006746
		PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.:	COQ-100001707

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
ANEXO : 0			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	12/09/2025	12/07/2026	$108.905.300,30
PRESTACIONES SOCIALES	12/09/2025	12/01/2029	$108.905.300,30
ESTABILIDAD DE OBRA	12/01/2026	12/01/2031	$217.810.600.60
ANEXO : 1			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	12/09/2025	12/07/2026	$-108.905.300,30
PRESTACIONES SOCIALES	12/09/2025	12/01/2029	$-108.905.300,30
ESTABILIDAD DE OBRA	12/01/2026	12/01/2031	$-217.810.600.60
ANEXO : 2			

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	09/10/2025	08/08/2026	$108.905.300,30
PRESTACIONES SOCIALES	09/10/2025	08/02/2029	$108.905.300,30
ESTABILIDAD DE OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$217.810.600.60

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
ANEXO : 0			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2025	12/01/2026	$569.400.000,00
ANEXO : 1			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2025	12/01/2026	$-569.400.000,00
ANEXO : 2			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	09/10/2025	08/02/2026	$569.400.000,00

9.3.1.2. GARANTÍAS PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA

Una vez adjudicado el contrato de obra el contratista procedió con la emisión de las pólizas iniciales, se presenta un resumen en los siguientes cuadros de las pólizas iníciales:

La póliza No. COQ-100006746 de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, que amparan el Contrato de obra No. 320.11.050 de 2025, fueron expedidas por SEGUROS MUNDIAL SA, cumplen con los requisitos de valor y se encuentran aprobadas por ESPAVI SA ESP.

Póliza cumplimiento No. COQ-100006746 **ANEXO 0** y póliza de responsabilidad civil Extracontractual No. COQ-100001707 **ANEXO 0**.

PÓLIZA N° COQ-100006746 - SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	12/09/2025	12/07/2026	$108.905.300,30
PRESTACIONES SOCIALES	12/09/2025	12/01/2029	$108.905.300,30
ESTABILIDAD DE OBRA	12/01/2026	12/01/2031	$217.810.600.60

Tabla 14 Póliza Garantía de Cumplimiento Inicial Cto. de Obra 320.11.050 de 2025, Según Contrato, anexo 0

PÓLIZA N° COQ-100001707 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/09/2025	12/01/2026	$569.400.000,00

Tabla 15 Póliza Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual Inicial Cto. de Obra 320.11.050 de 2025, Según Contrato, anexo 0.

9.3.1.3. GARANTÍAS PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA, SEGÚN ACTA DE INICIO

Se presentan las pólizas de obra con fechas de vigencia, según la actualización con fecha de acta de inicio del 09 de octubre de 2025:

Póliza No. COQ-100006746 **ANEXO 2**, de garantía de cumplimiento. Según acta de inicio

PÓLIZA N° COQ-100006746 - SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09/10/2025	08/08/2026	$108.905.300,30
PRESTACIONES SOCIALES	09/10/2025	08/02/2029	$108.905.300,30
ESTABILIDAD DE OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$217.810.600.60

Tabla 16 Póliza Garantía de Cumplimiento Cto de Obra 320.11.050 de 2025, según acta de inicio (con fecha de aprobación 20 de octubre de 2025).

Póliza No. COQ-100001707 **ANEXO 2**, responsabilidad civil extracontractual. Según acta de inicio

PÓLIZA N° COQ-100001707 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	09/10/2025	08/02/2026	$569.400.000,00

Tabla 17 Póliza Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual Cto de Obra 320.11.050 de 2025, según acta de inicio, anexo 2 (con fecha de aprobación 20 de octubre de 2025).

9.3.2. GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acorde al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realiza una revisión del estado general de las pólizas del contrato de consultoría de lo cual se puede dictar que estas se encuentran vigentes según las condiciones expuestas en el contrato de interventoría así:

9.3.2.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

A continuación, se relacionan los amparos establecidos según el contrato de interventoría 320.11.047 de 2025, legalizado entre el contratista de consultoría y la Interventoría:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) Meses mas	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato y cuatro (4) meses más.	Cien por ciento (100%) del valor total del anticipo.
Calidad del Servicio ejecutadas entregadas a satisfacción	Desde el acta de recibo del contrato y 5 años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato

Tabla 18 Condiciones Garantía de Cumplimiento Cto. de interventoría 320.11.047 de 2025 - Fuente: Contrato de interventoría 320.11.047 de 2025

9.3.2.2. GARANTÍAS PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Una vez adjudicado el contrato de interventoría el contratista procedió con la emisión de las pólizas iniciales, se presenta un resumen en los siguientes cuadros de las pólizas iníciales:

La póliza No. **BY-100055419** de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, que amparan el Contrato de consultoría No. 320.11.047 de 2025, fueron expedidas por la ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL SA, cumplen con los requisitos de valor y se encuentran aprobadas.

Póliza No. **BY-100055419 ANEXO 0**.

PÓLIZA N° BY-100055419 - SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	13/08/2025	18/07/2026	$20.577.112,10

PRESTACIONES SOCIALES	13/08/2025	13/01/2029	$20.577.112,10
CALIDAD DEL SERVICIO	13/08/2025	13/07/2026	$41.154.224.20

Tabla 19 Condiciones Garantía de Cumplimiento Cto. de interventoría 320.11.047 de 2025, Según Contrato, anexo 0;

9.3.2.3. GARANTÍAS PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SEGÚN ACTA DE INICIO

Se presentan las pólizas de interventoría con fechas de vigencia, según la actualización con fecha de acta de inicio del 09 de octubre de 2025:

La póliza No. BY-100055419 de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, que amparan el Contrato de consultoría No. 320.11.047 de 2025, fueron expedidas por la ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL SA. y aprobadas por ESPAVI SA ESP.

Póliza No. **BY-100055419 ANEXO 2**

PÓLIZA N° BY-100055419 - SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	29/09/2025	03/09/2026	$20.577.112,10
PRESTACIONES SOCIALES	29/09/2025	01/03/2029	$20.577.112,10
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09/2025	29/08/2026	$41.154.224.20

Tabla 20 Condiciones Garantía de Cumplimiento Cto. de interventoría 320.11.047 de 2025, Según acta de inicio, anexo 2.

9.4 Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente. (cobros parciales)

Ejecución: A corte de 31 de diciembre de 2025 el contratista no ha presentado cobros parciales, el contratista a la fecha lleva un avance financiero el cual se relaciona a continuación.

CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.089.053.003,00
VALOR ANTICIPO	$ 000,00
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 1.089.053.003,00

A la fecha del presente informe, el contrato de obra no presenta ninguna variación en cuanto al valor del contrato. Adicionalmente no se han adelantado pagos parciales.

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas a la fecha del corte del presente informe y comparándolo con la programación actual presentada por el contratista de obra, se obtienen los siguientes resultados.

INFORME FINANCIERO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1,089,053.003	
VALOR ADICIONAL	N/A	
PAGOS PARCIALES		$ 0.00
PAGOS PARCIALES		$ 0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME PAGO PARCIAL No. 01		$ 838,528,526.00
SALDO		$ 250,524,477.00
TOTAL	**$ 1,089,053.003**	**$ 1,089,053.003**

Durante el periodo del presente informe se logró un avance de obra del 52.03% respecto a un 52,03% programado, lo cual representa un avance positivo del porcentaje de la ejecución de las actividades programadas.

Durante el presente periodo, el proyecto ha mostrado un desarrollo conforme al cronograma aprobado, evidenciándose un cumplimiento adecuado en la ejecución de las actividades programadas. El avance físico y financiero reportado coincide con los valores proyectados para el mes, lo que refleja una correcta planificación, gestión y ejecución por parte del contratista.

La disponibilidad oportuna de materiales, el adecuado suministro de recursos y la eficiente coordinación del personal técnico y operativo han permitido mantener el ritmo de trabajo previsto, sin generar retrasos en las metas establecidas. De igual forma, las condiciones climáticas favorables y la correcta articulación entre el contratista, la supervisión y la interventoría han contribuido al cumplimiento de los plazos y a la ejecución ordenada de las labores.

La interventoría resalta que, a la fecha de corte (31 de diciembre de 2025), el avance físico acumulado se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la programación

inicial, demostrando un desempeño eficiente en la gestión del proyecto y garantizando el desarrollo técnico conforme a las especificaciones contractuales.

CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 205.771.121,00
VALOR ANTICIPO	$000,00
TOTAL CONTRATO	$ 205.771.121,00

A la fecha del presente informe, el contrato de consultoría no presenta ninguna variación en cuanto al valor del contrato.

9.5 Vigilar que la Interventoría siempre este amparado por una póliza única de cumplimiento con cada contrato, la cual se mantendrán vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados.

Se verificaron las garantías pertinentes presentadas por el contratista según pólizas expedidas por SEGUROS MUNDIAL SA No. COQ-100006746 de cumplimiento y póliza de Responsabilidad civil extracontractual No COQ-100001707, estas fueron aprobadas por la oficina de jurídica de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI SA ESP el día 20 de octubre del 2025, así misma interventoría verifico las pólizas actualizadas según al acta de inicio.
Cada contrato se encuentra vigente durante su vida y en ejecución, donde aún no aplica esta actividad y solo se agota hasta liquidación del contrato, en caso de una extensión se ajustará los amparos.

9.6 Revisarlas actas de reajuste de precios, elaborada por el contratista, conforme a lo establecido en los contratos, presentándolos a la Interventoría para su aprobación.

En el presente periodo no se ha presentado actas de reajuste de precios por el contratista, el cual aún no aplica y esta actividad es permanente donde solo se agota en el cumplimiento del objeto contractual, y por ende a la liquidación de los contratos.
A corte del 31 de diciembre del 2025 NO se ha presentado una modificación del contrato.

Ejecución: Durante la ejecución del contrato de obra No 320.11.050-2025 y contrato de interventoría No 320.11.047-2025 se han revisado, aprobado y avalado las siguientes

actas

Contrato de Obra No 320.11.050-2025:

- Acta de inicio- 09 de octubre del 2025.

Contrato de Interventoría No 320.11.047-2025:

- Acta de inicio- 29 de septiembre del 2025.

9.7 Presentar durante los primeros tres (3) días de cada mes para aprobación de la interventoría, la programación mensual de su trabajo y relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados por el periodo siguiente (esto en caso de que haya cambio de programación). Estos programas y presupuestos deberán ser compatibles con la programación general de personal y gastos rembolsables de la interventoría.

La interventoría CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS ha verificado constantemente los rendimientos de los trabajos y las proyecciones periódicas en el frente de trabajo, esta actividad se documenta en los comités de obra y en los anexos del presente informe los cuales serán radicados a la interventoría.

Se realizó la verificación de la programación establecida en el cronograma de obra, se realizará constante seguimiento verificando si hay lugar a modificaciones según los acontecimientos importantes que ocurran durante la ejecución.

Se solita en comités que se realice la entrega de los informes en las fechas establecidas.

Esta actividad es permanente se culminará con la liquidación del contrato previo cumplimiento al objeto contractual.

9.8 Elaborar la contabilidad del proyecto.

Esta actividad es permanente que termina solo con la liquidación del contrato.

9.9 Presentar un informe final a la interventoría, el cual deberá contener como mínimo un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo.

Esta actividad aún no se ha ejecutado contrato se encuentra aún activo.

10 FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL.

10.1 Verificar que contratista de obra cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto.

La interventoría CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS, una vez firmada el acta de inicio 09 de octubre de 2025, del contrato de obra 320.11.050-2025 ha vigilado permanentemente que el contratista de cumplimiento a todo el marco normativo ambiental.

El contratista de la UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 ha realizado capacitaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal vinculado a la obra, esto con el fin de concientizar, prevenir y disminuir los impactos ambientales del uso de los recursos naturales, y los factores de riesgo que atenten contra la salud e integridad del equipo de trabajo.

11 CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 09 de octubre al 31 de diciembre de 2025, la interventoría verificó que las actividades desarrolladas por el contratista se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos aprobados, el cronograma vigente y las obligaciones contractuales. El avance físico-financiero reportado para este mes alcanzó el 52,03%, porcentaje que coincide con lo programado, reflejando un adecuado desempeño y cumplimiento de las metas establecidas.

Las labores realizadas entre ellas excavaciones, instalación de tubería y procesos de relleno, fueron ejecutadas bajo control técnico continuo, cumpliendo los estándares de calidad y los lineamientos exigidos por el proyecto. De igual manera, se corroboró que el personal cuenta con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social, así como con los elementos de protección personal requeridos. Las capacitaciones y controles implementados en campo han contribuido a la reducción de riesgos y al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto al Plan de Manejo de Tránsito, se verificó la correcta instalación de señalización preventiva, informativa y restrictiva en los frentes de obra, así como la adecuada ubicación de la valla informativa institucional, cumpliendo con la normativa aplicable y garantizando condiciones seguras para peatones y vehículos.

En términos generales, el proyecto mantiene un desarrollo acorde con lo previsto, sin presentar retrasos ni inconvenientes técnicos que afecten la programación. La documentación técnica, administrativa y financiera se encuentra al día, y las observaciones formuladas por la interventoría han sido atendidas oportunamente por el contratista.

CARLOS ANDRÉS BELTRÁN LADINO
Residente de Interventoría

CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
Director de Interventoría

YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA
R/L de la Interventoría

12 ANEXOS

- **Anexo 1:** Certificado de calidad de los materiales
- **Anexo 2:** Planillas de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
- **Anexo 3:** Pólizas Actualizadas
- **Anexo 4:** Bitácora
- **Anexo 5:** Correspondencia
- **Anexo 6:** Actas de Comité
- **Anexo 7:** Topografía
- **Anexo 8:** Certificado Avance de Obra
- **Anexo 9:** Informe Ambiental
- **Anexo 10:** Ensayo de Laboratorio
- **Anexo 11:** Memorias de Calculo
- **Anexo 12:** Liquidación de prestaciones sociales retirados
- **Anexo 13:** Contrato de Arrendamiento de Oficina
- **Anexo 14:** Solicitud y formato donación de material
- **Anexo 15:** Informe Seguridad y Salud en el trabajo

- **Anexo 1:** Certificado de calidad de los materiales

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
VÁLVULAS EN PVC PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Fabricado por **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S** en la **Carrera 42 No. 29A - 49, Itagüi, Antioquia, Colombia, identificada** con **número de NIT 900.941.680-0**

Manufactured by **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S** in the **Carrera 42 No. 29A - 49, Itagüi, Antioquia, Colombia**, identified with **NIT number 900.941.680-0**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Por el cual se expide los requisitos técnicos relacionados con composición química (artículo 5 de conformidad con el artículo 6) e información técnica (artículos 10 y 11), que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios utilizados en acueducto o en las instalaciones hidráulicas de la vivienda y se derogan las resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007
which issues the technical requirements related to chemical composition (article 5 in accordance with article 6) and technical information (articles 10 and 11), that the pipes, ducts and accessories used in the aqueduct or in the hydraulic installations of the home must comply and resolutions 1166 of 2006 and 1127 of 2007 are repealed.

SECTOR ICS 23.040.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero al Carbon Acero Inoxidable Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Tees, Codos, Reducciones, Cruces, Tapones, Bridas Ciegas, Bridas Roscadas, Bridas Locas, Filtros en Yee, Collares de Derivación, Niples y Pasamurros Diametros de 2" a 24"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico y sus combinaciones Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero al Carbon Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Uniones y Acoples tipo Universal, Dresser, Rapida, Mecanico con y sin restrictor, de Reparacion, de Desmontaje, Adaptadores Diametros de 2" a 24"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico y sus combinaciones Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero Inoxidable Materiales No Ferrosos Laton Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Hidrantes tipo. Barril Seco, Humedo, Poste Diametros de 3", 4" y 6"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico, Roscado Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero Inoxidable Materiales No Ferrosos Laton Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Válvulas tipo: Compuerta Elástica, Ventosa, Cheque o antiretorno Diametros de 2"a 12"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico y sus combinaciones Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Plasticos PVC Materiales No Ferrosos Laton	Valvula de bola o registro Diametro de ½"	Extremos rosca NPT hembra y macho, acople polietileno y soldar PVC.	INCODI S.A.S Autopista Medellín Bogotá, Vía aeropuerto José María Córdoba, Km 1,2 Guarne - Guarne, Antioquia, Colombia. Maquilador



CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
1	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 10"	3
2	BRIDA0008	BRIDA BRIDA CIEGA 6"	1
3	PORTAB	PORTABRIDA PORTA BRIDA PN 10 PE100 RDE11 DE 10"	17
4	CODO0010	CODO CODO 45° PE100 PN10 250mm	6
5	REDUC0001	REDUCCION REDUCCIÓN PN 10 DE 10"X 6"	1
6	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 4"	1
7	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 3"- CON VOLANTE	2
8	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 2" - CON VOLANTE	1
9	BRIDA0008	BRIDA BRIDA LOCA DE 6"	4
10	BRIDA0008	BRIDA BRIDAS LOCA DE 10"	6
11	BRIDA0008	BRIDA BRIDA LOCA DE 4"	6

La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Garantía por defectos de fabricación de cinco (5) años Vigente desde la

fecha de expedición.

La anterior se expide en Yopal el día 01 de noviembre de 2025.

Hoover José Martínez Pérez
C.C 9.655.701 Yopal
CEL 312-5864692

Periodo.....: 01/01/2023 - 05/11/2025
Orden Prod.....: OC206601001
Producto.....: TUB00117-TUB PEICO AGUA 160 RM METRICO 2K 10 PIE 17 NEGRA LINEA AZUL TRAMOS 6 METROS - 02
Fch.Produco....: 13/09/2025
Lote.....: 84-216-35
Cantidad.....: 2100 METRO

Laudo Producto: A - APROBADO SIN RESTR.CC. Data/Hora : 05/11/2025-12:58:37Validade : 05/11/2023

OPERACAO : ** -

Laboratorio : LAB01 - LABORATORIO 1
Laudo Laboratorio : - Data/Hora : / / -

Ensayo: AA12-00 - Tiempo de inducción a la oxidación (min)
Dr. Medida: min Nominal: 25,00 LIE: 20,00 LSE: >>>

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	24,47	A				

Ensayo : DD06-00 - Rotulado e identación
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	CUMPLE	A				

Ensayo: I01-00 - Diámetro exterior (mm)
Dr. Medida: mm Nominal: 160,50 LIE: 160,00 LSE: 161,00

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	160,74	A				

Ensayo: I02-00 - Ovalamiento (mm)
Dr. Medida: mm Nominal: 1,60 LIE: <<< LSE: 3,20

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	0,97	A				

Ensayo: I02-00 - Espesor de pared (mm)
Dr. Medida: mm Nominal: 10,65 LIE: 9,50 LSE: 10,80

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	10,13	A				

Ensayo: I04-00 - Variación Espesor Excentricidad %
Dr. Medida: % Nominal: 6,00 LIE: <<< LSE: 12,00

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	4,12	A				

Ensayo : I06-00 - Longitud
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	CUMPLE	A				

Ensayo : I07-00 - Apariencia
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	CUMPLE	A				

Ensayo : I08-00 - Color
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	Am.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	12:51	1	CUMPLE	A				

Ensayo : I09-00 - Atoxicidad
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	CUMPLE	A				

Ensayo: I11-01 - Flujo de masa fundida (FMF) (4) (5Kg)
Un. Medida: g Nominal: 2,00 LIE: -20,00 LSE: 20,00

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	6,75	A				

Ensayo : I13-00 - Requisitos de desempeño
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	CUMPLE	A				

Ensayo: I20-00 - Elongación en la rotura (%)
Un. Medida: % Nominal: 475,00 LIE: 350,00 LSE: >>>

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	582,33	A				

Laboratorio : LAB02 - LABORATORIO 2
Laudo Laboratorio : - Data/Hora : / / -

Ensayo: I10-00 - Reversión ó Retracción longitudinal (%)
Un. Medida: % Nominal: 1,50 LIE: <<< LSE: 3,00

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	0,82	A				

Laboratorio : LAB03 - LABORATORIO 3
Laudo Laboratorio : - Data/Hora : / / -

Ensayo : C08-00 - Esfuerzo hidrostático 100h A 20C
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	SIN FALLA	A				

Ensayo : C08-01 - Esfuerzo hidrostático 165h A 80C
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	SIN FALLA	A				

Ensayo : C08-02 - Esfuerzo hidrostático 1000h A 80C
Texto : ¿Cumple con los requisitos?

Instrumento	Ensayista	Fch. Medida	Hora Medida	An.	Medicoes	A/R	Nao Conf.	Nr. NCs	Classe	Dem.IQI
	YOLMAN OL	05/11/2025	10:51	1	SIN FALLA	A				

DIRECCIÓN: Carrera 14 N° 12-09 Centro
CEL: 322-2748183
EMAIL: 2023delllano@gmail.com
NIT: 901731378-3

Villanueva, 30 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN CALIDAD DE LOS MATERIALES

Mediante el presente, esta interventoría certifica el cumplimiento de los requisitos de calidad, para los materiales implementados en las actividades, ejecutadas durante el periodo de reporte, acorde a los requeridos en los estudios y diseños del proyecto.

A continuación, se relacionan los materiales sobre los cuales fue evaluado del cumplimiento de los requisitos de calidad y resistencia:

MATERIAL	EMPRESA	CERTIFICADO DE CALIDAD
Tubería y Accesorios	Extrucol	Certificado de Conformidad
Válvulas y accesorios	Accesorios y Válvulas Apolo SAS	Certificado de Conformidad

Ing. Carlos Eduardo Pulido Gómez
Director de Interventoría

Ing. Carlos Andrés Beltrán Ladino
Residente de Interventoría

AGUATUBOS & SOLUCIONES S.A.S.

INNOVANDO EN LA CONSTRUCCIÓN



CERTIFICADO

Certificamos que los hidrantes relacionados a continuación cumplen estándares internacionales conforme a UNE- EN 14384. Inspeccionada bajo: Pruebas Sistema de Tráfico, "Fácil Reparación" según norma EN 1074-1 y 2, ISO5208, abierto a 2,5 MPa (370PSI) y cerrado a 2,1 MPa (310PSI).
Brida de entrada perforada según EN 1092-2.
Cantidad de productos certificados:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FACTURA
HIDRANTE 2 BOCAS CODO LISO DN 80mm/3"	3	FIMV7384

Inspeccionada bajo: Pruebas Sistema de Tráfico, "Fácil Reparación" según norma EN 1074-1 y 2, ISO5208, abierto a 2,5 MPa (370PSI) y cerrado a 2,1 MPa (310PSI). Brida de entrada perforada según EN 1092-2.

ANALISIS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	METODO
PRUEBA HIDROSTATICA	ABIERTO:370 PSI CERRADO:310 PSI	ABIERTO:370 PSI CERRADO:310 PSI CONFORME	EN 1074-1 y 2 ISO5208


Uso recomendado: Máxima presión de funcionamiento: 1,6 MPa (240PSI).
Compatibilidad: Con tubería PVC IPS.

Se expide la presente certificación a los 18 días del mes 12 de 2025.

Hoover José Martínez Pérez
C.C 9.655.701 Yopal
CEL 312-5864692


AGUATUBOS & SOLUCIONES S.A.S.

INNOVANDO EN LA CONSTRUCCIÓN



LISTA DE MATERIALES:

1. Parte inferior del cuerpo	Hierro dúctil GJS 500-7
2. Anillo de asiento de la válvula	Bronce 52
3. Válvula de corte	EPDM EN681-1
4. Soporte de la válvula	Hierro fundido gris ASTM A48-94ª clase 40
5. Eje inferior	Hierro galvanizado
6. Tuerca de operación	Bronce ASTM B62
7. Vástago de operación	Acero inoxidable 303
8. Travesaño de soporte	Hierro fundido gris ASTM A48-94ª clase 40
9. Tornillo allen de sujeción	Acero inoxidable 303
10. Cabezal pentagonal macho	Hierro fundido gris ASTM A48-94ª clase 40
11. Cabezal pentagonal hembra	Hierro fundido gris ASTM A48-94ª clase 40
12. Cuerpo superior o cabezal	Hierro dúctil EN681-1
13. Eje superior	Hierro galvanizado
14. Accionamiento de operación	Acero inoxidable 303
15. Bocina	Bronce 52
16. O´ring	EPDM EN681-1
17. O´ring	EPDM EN681-1
18. Pasador elástico	Acero inoxidable A2
19. O´ring	EPDM EN681-1
20. Tornillo	Acero inoxidable
21. Arandela	Teflón
22. Tornillo cincado	Acero
23. Cobertor orificio de drenaje	Hierro
24. Sello en goma orificio drenaje	NBR
25. Arandela	Acero inoxidable
26. Tornillo	Acero inoxidable
27. Tornillo Allen	Acero inoxidable
28. Bocina de rotura	Acero inoxidable
29. Codo bridado con soporte	Hierro dúctil EN681-1
30. Tornillos de fijación codo hidrante	Acero galvanizado
31. Tuerca	Acero galvanizado

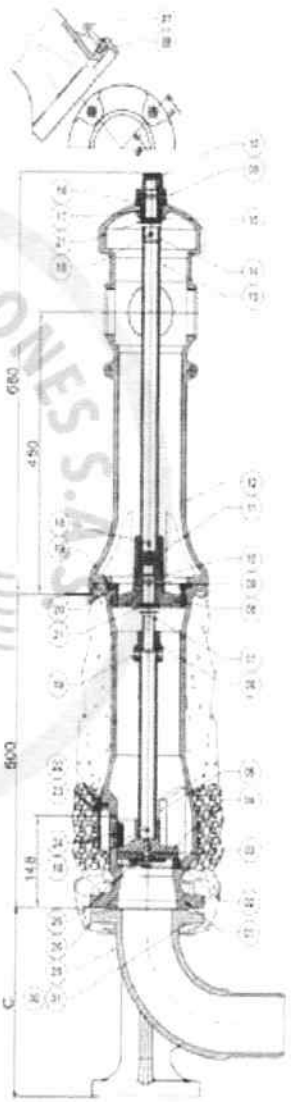

OBRADUCTOS
tuberías · válvulas · medidores

CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA

Nos permitimos expedir el certificado de calidad de los productos a **AGUATUBOS & SOLUCIONES SAS** NIT. 900.296.249-1 Correspondiente a la Factura LJ 1851:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
1	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 10"	3
2	BRIDA0008	BRIDA BRIDA CIEGA 6"	1
3	PORTAB	PORTABRIDA PORTA BRIDA PN 10 PE100 RDE11 DE 10"	17
4	CODO0010	CODO CODO 45° PE100 PN10 250mm	6
5	REDUC0001	REDUCCION REDUCCIÓN PN 10 DE 10"X 6"	1
6	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 4"	1
7	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 3"- CON VOLANTE	2
8	VALV48	VALVULA VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA E.B. HD 2" - CON VOLANTE	1
9	BRIDA0008	BRIDA BRIDA LOCA DE 6"	4
10	BRIDA0008	BRIDA BRIDAS LOCA DE 10"	6
11	BRIDA0008	BRIDA BRIDA LOCA DE 4"	6

La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Garantía por defectos de fabricación de cinco (5) años Vigente desde la

fecha de expedición.

La anterior se expide en Bogotá el día 01 de noviembre de 2025.

Luis Javier Palacio Naranjo
C.C 79.627.380 Bogotá
CEL 311-2351245

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación tipo 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIO PARA ACUEDUCTO ACERO INOXIDABLE; ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO HIERRO DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL; VÁLVULA PARA ACUEDUCTO EN HIERRO DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL; VÁLVULA PARA ACUEDUCTO EN PVC.

Comercializado por **FIMACA COLOMBIA SAS** en la **Avenida Circunvalar No. 3 - 79 Bodega 18, Barranquilla, Atlántico, Colombia,** identificada con **número de NIT 900.349.963-1**

Trader by **FIMACA COLOMBIA SAS** in the **Avenida Circunvalar No. 3 - 79 Bodega 18, Barranquilla, Atlántico, Colombia,** identified with **NIT number 900.349.963-1**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:

"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 expedida el 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Expide los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, asi como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007.

It issues the technical requirements related to chemical composition and information, which must be met by the aqueduct and sewerage pipes, ducts and accessories, those for sanitary use and those of rainwater, acquired by the people providing water and sewage services, as well as hydro-sanitary installations inside the homes and repealed resolutions 1166 of 2006 and 1127 of 2007

SECTOR ICS: 23.040.10 - 23.040.45

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER1079837
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-12-18
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-12-17
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

F-PS-0628
Versión 01

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

- Anexo 2: Planillas de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828442	MARIA DEL CARMEN LESMES HOLGUIN	CRA 12 N 5 -22	3102663414	marialesmes26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente		CASANARE	VILLANUEVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	16/12/2025	92332732	$442.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	6	200	34.900			347	34.900	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	1	34.700	34.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	442.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828442	MARIA DEL CARMEN LESMES HOLGUIN		CRA 12 N 5 -22	3102663414	mariallesmes26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			CASANARE	VILLANUEVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	16/12/2025	92332732	$442.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Tarifa	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121828442	LESMES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN	57	0			N	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828442	MARIA DEL CARMEN LESMES HOLGUIN	CRA 12 N 5 -22	3102663414	mariallesmes26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		CASANARE	VILLANUEVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	15/12/2025	90780032	$449,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	33	3,700	0	181,700	1

TOTALES PENSIÒN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227,800	0	0	0	0	33	4,800	0	232,600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34,700				34,700	33	800	35,500			347	35,500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	33	0	0	0
ICBF				
0	33	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178,000	181,700
Pensión	1	227,800	232,600
Riesgos Laborales	1	34,700	35,500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440,500	449,800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828442	MARIA DEL CARMEN LESMES HOLGUIN		CRA 12 N 5 -22	3102663414	mariaalesmes26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			CASANARE	VILLANUEVA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	15/12/2025	90780032	$449.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121828442	LESMES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN	67	3			N																	23030*	1.423.800	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	179.600	14-11	1.423.800	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80740766		ROA PINEDA BORIS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 23A No. 17-11	AGUAZUL-CASANARE	6387556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1984467458	9496074574	I	2025/11/19	2025/12/05	BANCOLOMBIA	16	$446,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdo	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80740766	ROA PINEDA BORIS ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,000	CCF69	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	No	$441,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$441,800

2025/12/05 10:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80740766		ROA PINEDA BORIS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 23A No. 17 11	AGUAZUL-CASANARE	6387556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1984467458	9496074574	I	2025/11/19	2025/12/05	BANCOLOMBIA	16	$446,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$300	$0	$28,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$28,500	$300	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,800	$0	$179,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,800	$0	$179,800
TOTAL				1	$441,800	$4,500	$0	$446,300

2025/12/05 10:30 AM

454

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80740766		ROA PINEDA BORJS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 23A No. 17-11	AGUAZUL-CASANARE	6387556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2083416243	9497922433	I	2025/12/16	2026/01/15	BANCOLOMBIA	30	$553,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
1	CC	80740766	ROA BORIS																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	0.523%	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,300	$0	$285,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$5,300	$0	$285,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$700	$0	$35,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$35,100	$700	$0	$35,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,100	$0	$223,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$4,100	$0	$223,000
TOTAL				1	$543,400	$10,300	$0	$553,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122651306		VASQUEZ HERRERA ANGIE DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2B # 34A - 23	VILLAVICENCIO-META	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1800560205	94919071S0	I	2025/11/05	2025/09/25	BANCOLOMBIA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC 1122651306	VASQUEZ ANGIE	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2025/09/24 07:32 PM

1160

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122651306		VASQUEZ HERRERA ANGIE DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 28 # 34A - 23	VILLAVICENCIO-META	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1800560205	9491907150	I	2025/11/05	2025/09/25	BANCOLOMBIA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

2025/09/24 07:32 PM

1161

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122651306		VASQUEZ HERRERA ANGIE DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 28 # 34A - 23	VILLAVICENCIO-META	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1897413033	9493343084	I	2025/12/02	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1122651306	VASQUEZ ANGIE	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**

2025/11/02 01:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122651306		VASQUEZ HERRERA ANGIE DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 28 # 34A - 23	VILLAVICENCIO-META	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1897413033	9493343084	I	2025/12/02	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

2025/11/02 01:28 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731378-3	CONSTRUCTORA R Y Y DEL LLANO SAS	VEREDA EL TRIUNFO	3132352455	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	VILLANUEVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2025-12	2025-11	E	15/01/2026	92021597	TOTAL A PAGAR	
					$5.963.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	28	1.400	0	81.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	373.800	0		0		0	28	6.500	0	380.300	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	28	1.000	0	58.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	376.300	0		0		0	28	6.600	0	382.900	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.063.200	0	0	0	0	28	18.500	0	1.081.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.256.200	0	0	0	0	28	39.200	0	2.295.400	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	28	4.000	0	231.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	540.400				540.400	28	9.400	549.800			5.404	549.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	887.100	28	15.400	902.500	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	887.100	902.600
Pensión	3	3.547.200	3.608.900
Riesgos Laborales	1	540.400	549.800
CCF	1	887.100	902.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.861.800	5.963.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731378-3	CONSTRUCTORA R Y Y DEL LLANO SAS	VEREDA EL TRIUNFO	3132352455	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	VILLANUEVA		Si

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	15/01/2026	92021597	$5.963.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Extranjero	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049797112	ROMERO NIÑO TANIA CATALINA	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	3	73.100	CCF69	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1116867954	CALDERON REYES TANNIA ISAMAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1118120275	MORALES LEON YASSER FABIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1118126032	BUITRAGO PARRA YURLADY KATERINE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS032	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	3	48.800	CCF69	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1118187949	MONROY MORA PAOLA ANDREA	1	0			S																	230301	2.847.000	455.600	0	0	0	0	EPS005	2.847.000	113.900	14-11	2.847.000	3	69.400	CCF69	2.847.000	113.900	0	0	0	0	0
6	CC	1121894608	PINZON JIMENEZ LAURA CATALINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1122135605	BELTRAN LADINO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230301	4.982.250	797.200	0	0	0	0	EPS037	4.982.250	199.300	14-11	4.982.250	3	121.400	CCF69	4.982.250	199.300	0	0	0	0	0
8	CC	52736061	OCAMPO BARRERA LADY DIANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	7182124	PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																	230201	2.221.000	355.400	0	0	0	0	EPS005	2.221.000	88.900	14-11	2.221.000	3	54.200	CCF69	2.221.000	88.900	0	0	0	0	0
10	CC	76312553	MOSQUERA BOLAÑOS MARIO SAGID	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901987065-2	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025		CR 12 13 69	3124436105	utacueductovillanueva2025@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B ~ menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	VILLANUEVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/01/2026	92478539	$7.905.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	17.100	0		0		0	20	300	0	17.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.500	0		0		0	20	2.300	0	182.800	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	39.900	0		0		0	20	500	0	40.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	663.200	0		0		0	20	8.300	0	671.500	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	20	800	0	57.800	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	51.300	0		0		0	20	700	0	52.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	720.000	0	0	0	0	20	9.000	0	729.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.230.400	0	0	0	0	20	40.400	0	3.270.800	19
231001	Colfondos	800227940-6	15.200	0	0	0	0	20	200	0	15.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	68.400	0	0	0	0	20	900	0	69.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.755.500				1.755.500	20	22.000	1.777.500			17.555	1.777.500	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.009.000	20	12.700	1.021.700	22

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901987065-2	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025		CR 12 13 69	3124436105	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	VILLANUEVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/01/2026	92478539	$7.905.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.009.000	1.021.900
Pensión	4	4.034.000	4.084.500
Riesgos Laborales	1	1.755.500	1.777.500
CCF	1	1.009.000	1.021.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.807.500	7.905.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901987065-2	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	CR 12 13 69	3124436105	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	VILLANUEVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				22	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/01/2026	92478539	$7.905.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Moras	Extranjero	Colom. exterior	Provisional	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002492279	RAMIREZ TORRES JOSE FRANCISCO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002523514	AVENDAÑO CASTILLO ELKIN ARLEY	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1006633837	RODRIGUEZ TIQUE EDWIN ANDRES	1	0			S	X	X														230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF69	996.450	39.900	0	0	0	0	0
4	CC	1006783373	HERNANDEZ ALFONSO JUAN CAMILO	1	0			S		X														23-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.600	CCF69	427.050	17.100	0	0	0	0	0
5	CC	1006823586	REYES CASTRO KEVIN ANDRES	1	0			S		X														230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPSC25	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF69	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
6	CC	1026552467	CASTRO CASTRO DIEGO ARMANDO	1	0			S	X															230301	425.000	68.000	0	0	0	0	EPS037	425.000	17.000	14-11	425.000	5	29.600	CCF69	425.000	17.000	0	0	0	0	0
7	CC	1033728592	PEREZ RODRIGUEZ YERSON ESTEBAN	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1072396215	ESPINOSA MARTINEZ EDWIN HERNANDO	1	0			S	X	X														230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS037	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF69	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
9	CC	1117459742	TOVAR MARTINEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1118188666	CALDERON MAHECHA HERSON DAVID	1	0			S		X														230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.600	CCF69	427.050	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	1118165708	MORENO POVEDA YEISON	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1118168397	RODRIGUEZ DUARTE YEISON FELIPE	1	0			S	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF69	142.350	5.700	0	0	0	0	0
13	CC	1118197993	GUERRERO GAMBA DIOMEDES AUGUSTO	1	0			S		X														231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPSC25	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF69	94.900	3.800	0	0	0	0	0
14	CC	1118199895	FRANCO CAMPOS JEISON CAMILO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1118203171	SERNA SEGURA RICHARD STIVENSON	1	0			S		X														230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF69	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
16	CC	1118556387	TORRES PEREZ OMAR YESID	1	0			S		X														230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS037	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF69	759.200	30.400	0	0	0	0	0
17	CC	1122123542	VARGAS BARRERA OSCAR JAVIER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1122140364	ROMERO ORTIZ MARCO FIDEL	1	0			S		X														230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.600	CCF69	427.050	17.100	0	0	0	0	0
19	CC	1122626738	MARTINEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO	1	0			S		X														230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF69	94.900	3.800	0	0	0	0	0
20	PT	5734424	ALVAREZ PEREZ FRANYERSON ALVENIS	1	0			S	X															230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF69	284.700	11.400	0	0	0	0	0
21	CC	79720851	VARGAS GALLO FREDY ORLANDO	1	0			S																230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	126.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF69	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
22	CC	80730484	BARRERA VARGAS JAIRO DUVAN	1	0			S																230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS037	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF69	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731378-3	CONSTRUCTORA R Y Y DEL LLANO SAS	VEREDA EL TRIUNFO	3124436105	2023delllanos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	VILLANUEVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	92021584	$5.525.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Extranjero	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049797112	ROMERO NIÑO TANIA CATALINA	1	0			S	X																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	3	41.500	CCF69	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1118887954	CALDERON REYES TANNIA ISAMAR	1	0			S	X																230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	3	31.300	CCF69	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
3	CC	1118120275	MORALES LEON YARBER FABIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1118128032	BUITRAGO PARRA YURLADY KATERINE	1	0			S	X																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	3	48.800	CCF69	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1118137949	MONROY MORA PAOLA ANDREA	1	0			S	X																230301	2.847.000	455.600	0	0	0	0	EPS005	2.847.000	113.900	14-11	2.847.000	3	69.400	CCF69	2.847.000	113.900	0	0	0	0	0
6	CC	1121894608	PINZON JIMENEZ LAURA CATALINA	1	0			S								X									230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1122135605	BELTRAN LADINO CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	4.982.250	797.200	0	0	0	0	EPS037	4.982.250	199.300	14-11	4.982.250	3	121.400	CCF69	4.982.250	199.300	0	0	0	0	0
8	CC	52736961	OCAMPO BARRERA LADY DIANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	7162124	PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																230301	2.221.000	355.400	0	0	0	0	EPS005	2.221.000	88.900	14-11	2.221.000	3	54.200	CCF69	2.221.000	88.900	0	0	0	0	0
10	CC	78312553	MOSQUERA BOLAÑOS MARIO SAGID	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PLANILLA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731378-3	CONSTRUCTORA R Y Y DEL LLANO SAS	VEREDA EL TRIUNFO	3124436105	2023delllano@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	VILLANUEVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	92021584	$5.525.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	13	700	0	80.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	368.100	0		0		0	13	3.100	0	371.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	13	500	0	57.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	324.300	0		0		0	13	2.700	0	327.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	855.200	0	0	0	0	13	7.000	0	862.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.233.400	0	0	0	0	13	18.300	0	2.251.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	13	1.900	0	229.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	505.400				505.400	13	4.200	509.600			5.054	509.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF89	Comfacasanare	844003392-8	829.400	13	6.800	836.200	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	829.400	836.400
Pensión	3	3.316.400	3.343.600
Riesgos Laborales	1	505.400	509.600
CCF	1	829.400	836.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.480.600	5.525.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901987085-2	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	CR 12 13 69	3124436105	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	VILLANUEVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	92029855	TOTAL A PAGAR	
					$6.288.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.200	0		0		0	15	200	0	15.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	193.800	0		0		0	15	1.900	0	195.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	489.700	0		0		0	15	4.700	0	494.400	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	43.700	0		0		0	15	500	0	44.200	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	62.700	0		0		0	15	600	0	63.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	720.000	0	0	0	0	15	6.800	0	726.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.217.600	0	0	0	0	15	21.000	0	2.238.600	15
231001	Colfondos	800227940-8	121.500	0	0	0	0	15	1.200	0	122.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	159.500	0	0	0	0	15	1.600	0	161.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotizsción Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	1.400.600				1.400.600	15	13.300	1.413.900			14.006	1.413.900	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	805.100	15	7.600	812.700	18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901987065-2	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	CR 12 13 69	3124436105	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	VILLANUEVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 18 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	92029855	$6.288.800

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	805.100	813.000
Pensión	4	3.218.600	3.249.200
Riesgos Laborales	1	1.400.600	1.413.900
CCF	1	805.100	812.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.229.400	6.288.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901987065-2	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	CR 12 13 69	3124436105	utacueductovillanueva2025@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	VILLANUEVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	92929855	$6.268.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Cotiza en Exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002492279	RAMIREZ TORRES JOSE FRANCISCO	1	0			S	X																230301	47.450	7.900	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF89	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1002593514	AVENDAÑO CASTILLO ELKIN ARLEY	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.760	0	0	0	0	EPS041	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	78.000	CCF89	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
3	CC	1006782373	HERNANDEZ ALFONSO JUAN CAMILO	1	0			S	X																23-14	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF89	996.450	39.900	0	0	0	0	0
4	CC	1006820586	REYES CASTRO KEVIN ANDRES	1	0			S	X																230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS025	806.650	32.300	14-11	806.650	5	56.200	CCF89	806.650	32.300	0	0	0	0	0
5	CC	1033728592	PEREZ RODRIGUEZ YERSON ESTEBAN	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF89	711.750	28.500	0	0	0	0	0
6	CC	1116667954	CALDERON REYES TANNIA ISAMAR	1	0			S	X	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF89	142.350	5.700	0	0	0	0	0
7	CC	1117459742	TOVAR MARTINEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF89	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1118166668	CALDERON MANSCHA HERSON DAVID	1	0			S	X																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	45.600	14-11	1.138.800	5	79.300	CCF89	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
9	CC	1118186708	MORENO POVEDA YEISON	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS037	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF89	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
10	CC	1118197993	GUERRERO GAMBA DIOMEDES AUGUSTO	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS025	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF89	759.200	30.400	0	0	0	0	0
11	CC	1118199695	FRANCO CAMPOS JEISON CAMILO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF89	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1118202171	SERNA SEGURA RICHARD STIVENSON	1	0			S	X																230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF89	664.300	26.600	0	0	0	0	0
13	CC	1118556387	TORRES PEREZ OMAR YESID	1	0			S	X																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.600	CCF89	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
14	CC	1122123542	VARGAS BARRERA OSCAR JAVIER	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS005	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF89	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
15	CC	1122140384	ROMERO ORTIZ MARCO FIDEL	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-11	379.600	5	26.500	CCF89	379.600	15.200	0	0	0	0	0
16	CC	1122626738	MARTINEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS005	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF89	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
17	CC	79720551	VARGAS GALLO FREDY ORLANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF89	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	80730484	BARRERA VARGAS JAIRO DUVAN	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS037	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF89	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

- **Anexo 3:** Pólizas Actualizadas

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.17 08:55:10 -05:00

Código de Seguridad: oka6OnIuoE4UnpbNNacmjw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 116 AB 20 PISOS 5 Y 6 BOGOTA
TELÉFONO (571) 6503734 FAX (571) 6503735 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSU1SR0000000027-0001

No. PÓLIZA	COQ-100001707	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680011484	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/10/2025	24:00 Horas Del	08/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 09 DE 10 DE 2025, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 09 DE 10 DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 320.11.050-2025, CUYO OBJETO ES AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091 ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.P COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.P BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA DE SERVICIOS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0,00	569.400.000,00	569.400.000,00	475.800,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA YESSELA MARTINEZ CABALLERO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	475.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	475.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	91.352,00
TOTAL A PAGAR	$	572.152,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cuidemos los suelos de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001707	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680011484	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/10/2025	24:00 Horas Del	08/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.PCOMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICA A LA CAMARA DE COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APE

Powered by CamScanner

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.17 14:15:11 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: Xe0zqQoF5kx0hrllnYrDjQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2855200 FAX 2855200 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	COQ-100001707	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011483	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE CANCELA POLIZA POR TRASLADO DE VIGENCIA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 320.11.050-2025, CUYO OBJETO ES AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091 ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.P COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.P BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.PCOMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0,00	(569.400.000,00)	-569.400.000,00	-475.800,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA YESSELA MARTINEZ CABALLERO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-475.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-475.800,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-91.352,00
TOTAL A PAGAR	$	-572.152,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001707	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011483	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATENDIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 11:01:03 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: /tSU0gdVFAQ1u4NTAkoEqA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISO 7 Y 8 BOGOTA
TELEFONO CONMUTADOR 2853720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSU58R800000027-D001

No. PÓLIZA	COQ-100001707	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	680010835	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 320.11.050-2025, CUYO OBJETO ES AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091 ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.P COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.P BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA S.A. E.S.PCOMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0,00	569.400.000,00	569.400.000,00	475.800,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA YESSELA MARTINEZ CABALLERO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	475.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	475.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	91.352,00
TOTAL A PAGAR	$	572.152,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001707	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	680010835	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APP

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.17 08:51:39 -05:00

Código de Seguridad: 4jQrRL2HKV5xAp6BAZY5dg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 113 NO. 7B - 21 PISOS 12 Y 13 BOGOTA
TELEFONO 2180300 FAX 2180320 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSU52R000000070-D001

No. PÓLIZA	COQ-100006746	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680011474	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/10/2025	24:00 Horas Del	08/02/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	6241431
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	6241431

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 09 DE 10 DE 2025, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 09 DE 10 DE 2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 320.11.050-2025, CUYO OBJETO ES AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URABANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 08/08/2026	108.905.300,30	226.015,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 08/02/2029	108.905.300,30	908.538,74
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/02/2026	24:00 Horas Del 08/02/2031	217.810.600,60	2.724.124,36
		TOTAL ASEGURADO	$ 435.621.201,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA YESSELA MARTINEZ CABALLERO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	3.858.678,89
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.858.678,89
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	734.630,99
TOTAL A PAGAR	$	4.601.109,88

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

Powered by CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006746	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680011474	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/10/2025	24:00 Horas Del	08/02/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ANF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100006746** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P** , expedida por la Compañia en **16/10/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **17** días del mes **OCTUBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.17 14:12:57 -05:00

Código de Seguridad: dFfYnG0loue2cGH+1EBnXQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 81 N 9B - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO (601)6107 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D001

No. PÓLIZA	COQ-100006746	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	6241431
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	6241431

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE CANCELA POLIZA POR TRASLADO DE VIGENCIA
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 320.11.050-2025, CUYO OBJETO ES AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URABANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2025	24:00 Horas Del 12/07/2026	-108.905.300,30	-226.015,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2025	24:00 Horas Del 12/01/2029	-108.905.300,30	-908.538,74
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/01/2026	24:00 Horas Del 12/01/2031	-217.810.600,60	-2.724.124,36
		TOTAL ASEGURADO	$ -435.621.201,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA YESSELA MARTINEZ CABALLERO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	-3.858.678,89
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-3.858.678,89
GASTOS EXP.	$	-7.800,00
IVA	$	-734.630,99
TOTAL A PAGAR	$	-4.601.109,88

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cuidemos los suelos de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006746	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	680011473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APF

seguros mundial®

Aliados

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100006746** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P** , expedida por la Compañía en **16/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **17** días del mes **OCTUBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

1179

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 11:00:11 -05:00

Código de Seguridad: iZ0yGWao6mdynmo1KJ321w==

NIT 860.037.013-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
GRAN CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 4 - BOGOTA
TELEFONO (601)5603144 FAX 2451220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D001

No. PÓLIZA	COQ-100006746	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	680010836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.987.065-2
DIRECCIÓN	CR 12 NO. 13 - 69	TELÉFONO	3124436105
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	6241431
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	6241431

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 320.11.050-2025, CUYO OBJETO ES AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URABANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2025	24:00 Horas Del 12/07/2026	108.905.300,30	226.015,79
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2025	24:00 Horas Del 12/01/2029	108.905.300,30	908.538,74
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/01/2026	24:00 Horas Del 12/01/2031	217.810.600,60	2.724.124,36
		TOTAL ASEGURADO	$ 435.621.201,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA YESSELA MARTINEZ CABALLERO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	3.858.678,89
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.858.678,89
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	734.630,99
TOTAL A PAGAR	$	4.601.109,88

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006746	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	680010836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICA A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

Aliados

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100006746** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P** , expedida por la Compañía en **16/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

RECIBO DE CAJA No. 93614143

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** AGENCIA BOYACA CASANARE 14/08/2025

VALOR TOTAL: 395,692.00

RECIBO DE: 7245204 - CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901731378

POR CONCEPTO DE:PAGO PÓLIZA 100055419 - AGENCIA BOYACA CASANARE - CUMPLIMIEN

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
BOL.DEP.EFECTIVO	250050569	0		395,692.00

OBSERVACIONES: PAGO PÓLIZA 100055419 - AGENCIA BOYACA CASANARE - CUMPLIMIEN

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

USUARIO: USRWEB

TES-08N-05/2019 **TRANSACCIÓN INTERNA:** 93614143

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.02 16:30:30 -05:00

Código de Seguridad: lLGitBQiC8/Y6ZXaXtkKAw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE [illegible] BOGOTÁ
TELÉFONO [illegible] WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	8Y-100055419	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36206470	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2025	24:00 Horas Del	01/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.731.378-3
DIRECCIÓN	CR 14 12 09	TELÉFONO	3222748183
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	3114969138
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	3114969138

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 320.11.047-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA , AMBIENTAL , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 HASTA EL KM 1+091 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2025	24:00 Horas Del 03/09/2026	20.577.112,10	57.334,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2025	24:00 Horas Del 01/03/2029	20.577.112,10	176.033,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2025	24:00 Horas Del 29/08/2026	41.154.224,20	94.147,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 82.308.448,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LISSETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	327.514,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	327.514,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	63.178,00
TOTAL A PAGAR	$	395.692,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	BY-100055419	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36201932	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/08/2025	24:00 Horas Del	13/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA ADF

seguros mundial®

Aliados

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100055419** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S. / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.** , expedida por la Compañía en **13/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **13** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.02 16:32:32 -05:00

NIT 860037013-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: uCzJRuPS50UrGCmayjPBeg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33A 6B-24 PISOS 1 Y 3 BOGOTA
TELEFONO (601)4601700 FAX (601)220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D001

No. PÓLIZA	8Y-100055419	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	36206469	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/08/2025	24:00 Horas Del	13/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.731.378-3
DIRECCIÓN	CR 14 12 09	TELÉFONO	3222748183
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	3114969138
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	3114969138

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 36201932
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.320.11.047-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA , AMBIENTAL , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 HASTA EL KM 1+091 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 18/07/2026	-20.577.112,10	-57.334,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 13/01/2029	-20.577.112,10	-176.033,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 13/07/2026	-41.154.224,20	-94.147,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -82.308.448,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LISSETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	-327.514,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-327.514,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-63.178,00
TOTAL A PAGAR	$	-395.692,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta asegurando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	BY-100055419	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	36206469	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/08/2025	24:00 Horas Del	13/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | PASA APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

Asociación Panamericana de Fianzas

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100055419** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S. / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.** , expedida por la Compañía en **02/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **02** días del mes **OCTUBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.02 16:30:30 -05:00

Código de Seguridad: 1lGitBQiC8/Y6ZXaXtkKAw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 113 No. 7B - 21 PISOS 11 Y 12 BOGOTA
TELÉFONO 2355522 FAX 2151720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

No. PÓLIZA	BY-100055419	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36206470	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2025	24:00 Horas Del	01/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.731.378-3
DIRECCIÓN	CR 14 12 09	TELÉFONO	3222748183
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	3114969138
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.	No. DOC. IDENTIDAD	900.262.261-4
DIRECCIÓN	CALLE 07 NO 13-48	TELÉFONO	3114969138

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 320.11.047-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA , AMBIENTAL , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 HASTA EL KM 1+091 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2025	24:00 Horas Del 03/09/2026	20.577.112,10	57.334,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2025	24:00 Horas Del 01/03/2029	20.577.112,10	176.033,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2025	24:00 Horas Del 29/08/2026	41.154.224,20	94.147,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 82.308.448,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LISSETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	327.514,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	327.514,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	63.178,00
TOTAL A PAGAR	$	395.692,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	BY-100055419	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36206470	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2025	24:00 Horas Del	01/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA ARF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APP

Asociación Panamericana de Alianzas Público Privadas y Asociativas

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100055419** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S. / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.** , expedida por la Compañia en **02/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañia.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **02** días del mes **OCTUBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

- **Anexo 4:** Bitácora

Bitacora de Obra.

objeto:

AMPLIACION DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO, DESDE LA CALLE 24 AL J+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Contrato N°: 320.11.050-2025.

09.10.25

Se inician laboras: 07:00 AM.
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Siso, Auxiliares de obra (7). y comisión Topografica.
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se inicio con el ITEM: 1.1. Replanteo y localizacion de la tubaña, Se. instalo. Estacas demarcadas con Su respectiva cota, Se. instalo. equipo. en el BM #1.
ITEM 2.2. Se inicio. con excavacion manual en Conglomerado.
ITEM 2.2.: Se inicio. con el Cargue del material de la excavacion.
ITEM 2,3 Se inicio con la demolicion de andenes, Sardineles en los accesos al barrio Brisas del llano.
ITEM 2,4 Relleno en Arena lavada Apisonada para atraque de la tuberia (con Trasporte) Se inicio con esta actividad.
ITEM 2,5 Relleno de excavacion con material Se inicio con esta actividad.

ITEM. 2,6 Concreto 3000 PSI (Bombeo, 5% desperdicio) Se inicio con esta actividad.
ITEM 2.7. Se inicio el corte de concreto.
ITEM 2.8. Se inicio instalando el concreto para Solado para atraque de tubería.
3.1. ITEM. Se inicio con el trasporte de la tubería 10', Alistamiento.
3.2. ITEM. Se inicio con el transporte Alineación, instalacion de la tubería de 6" PE. PN10
(3.5) Se. inicio con el ITEM, 3,5, Alineando. y contamplando. la instalacion.
ITEM. 3.7., Se inicio con la contamplacion, Alineacion para su respectiva instalacion.
ITEM. 5,7. Se inicio con el desmonte de la tubería 1 1/2" PVC, existente.
-Se Señalizo zona de trabajo, Se. Contemplo charlas, PMT en el dia de hoy ejecutado.

Se inicio con el PMA contemplando todas Sus fichas tecnicas, ejecutado al día de hoy al PMA.
-las Actividade inician Segun lo programado y lo diseñado, Se mantiene Supervisión parmanete del SISO, Comision Topografica y los profesionales de la interventoria aprueban ejes y progresivas.

Fredy [illegible]
Residente de obra.

Director obra
INTERVENTORIA

10.10.25. Se iniciaron actividades 07:00 M
Personal en obra: Director obra, Residente obra, SISO, Auxiliares de obra y comisión Topografica.
Clima: Soleado.
Actividades Realizadas: Se continuo con los item, 1.1, ITEM, 2,2, ITEM 3,3 ITEM 2,4, ITEM 2,5, ITEM 2,6, ITEM 2,7 ITEM 2,9, ITEM 3,1, ITEM 3,2, ITEM 3,5, ITEM 3,7, ITEM 5,7.
Se Señalizo Zona de trabajo, Se Contemplo. impacto. PMT.

Se inicio con el PMA contemplado
las fichas tecnicas.
Las actividades Se ejecutan
Segun lo programado.

Fredy VARGAS
Residente de obra

Dir. obra

SIN INTERVENTORIA X

11.10.25 Se inicaron actividades 7 am
Personal en obra: Sso, Auxiliares de Obra
y Comision topografia
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continuo Con los Item
1,1, item 2,2, Item 2,3, Item 2,4, Item 2,5,
Item 2,6, Item 2,7, Item 2,8, Item 2,9,
Item 3,1, Item 3,2, Item 3,5, Item 3,7
Item 5,7 Se Senalizo la Zona de trabajo
Se Contemplo impactos PMT, Se Contemplo el Uso
Correcto de los Epp.

Se inicio Con el PMA Contemplado en
las fichas tecnicas.
las actividades Se ejecutan Segun lo
Programado

Fredy VARGAS
Residente de Obra

Dir. Obra

12.10.25 No Se trabajo, Dia domingo

13.10.25 No Se trabajo, Dia festivo

14.10.25 Se iniciaron Actividades 07:00 Am
Personal en obra: Director de Obra, Residente de
Obra, SSO, Auxiliares de Obra y Comision topografica
Clima: Nublado Sin lluvia
Actividades Realizadas: Se Continuo Con excavacion
manual en Conglomerado. Se Continua con el
Cargue del material de la excavacion, Se Continua
Con la demolicion de cimientos y Sardineles de las
entradas al barrio Brisas del llano, relleno Con
arena lavada apisonada para atraque de la tuberia

Relleno de excavación con material, Concreto 3.000 PSI basico 5% disperdicio, Continua el Corte de Concreto, Se Continua lanzando el Concreto proyectado de 3.000 psi de 8 Cm en la maya electrosoldada para estabilizacion de taludes, Se Continua Con el transporte de tuberia de 10", alistamiento, Se Continua Con el transporte, alineacion e instalacion de la tuberia de 6" PN-10 160 mm Se Continua Con el Item 3.5, Alineando y Organizando Para su respectiva instalacion, Se Continua Con el desmonte de la tuberia 1 1/2 de pvc existente. Se Señalizo Zona de trabajo, Se realizaron Charlas y PMT ejecutado, Uso debido de los EPP Se Continua Con el PMA Contemplado todas sus fichas tecnicas.

- las actividades inician Segun lo Contemplado y Programado, Se mantiene Supervision permanente del S.ST, Comision Topografica y los Profesionales de la interventoria

Residente de obra

Director obra

INTERVENTORIA

15-10-25

Se inician Actividades a las 07:00 Am

Personal en obra: Director de obra, residente de la obra S.ST, Auxiliares de Obra y Comision de topografia.

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continua Con excavacion manual Conglomerado, Se realiza Cargue del material de la excavacion, Se realiza la demolicion de andenes y Sardineles, Se rellena Con arenon lavado apisonado para atraque de la tuberia, Relleno de excavacion con material, Concreto PSI basico 5% de desperdicio, Continua Con el Corte de Concreto, Se Continua lanzando el Concreto proyectado de 3.000 PSI de 8 Cm en la maya electrosoldada, Se Continua Con el transporte de tuberia de 10", Se Continua Con el transporte alineacion e instalacion de la tuberia de 6" PN-10 Se Continua Con el item 3.5, Alineacion y Organizacion Para su respectiva instalacion, Se Continua Con el desmonte de la tuberia 1 1/2 de pvc existente, Se señalizo Zona de trabajo, Se realizaron Charlas y PMT ejecutado, uso debido delas epp, Se Continua Con el PMA Contemplado todas sus fichas tecnicas

las actividades Inician Segun lo Contemplado y Programado Se mantiene Supervicion Constante del SIZO, Ing residente, Director de obra y los Profesionales de la interventoria

Fredy Ulloa
Residente de obras

Director de Obras
INTERVENTORIA CF

16-10-25 Se iniciaron Actividades 07:00 Am
Personal en obra: Residente de Obra, Auxiliares, SIZO y Comision de topografica.
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con excavacion manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Continua la demolicion de andenes y Sardineles, Se rellena Con arena lavada apisonada para atraque de la tuberia, Relleno de material de excavacion, Concreto Usado 3,600 psi basico 5% de desperdicio, Continuo el Corte del Concreto, Se Continua instalando el Concreto para atraque de la tuberia Se Continua Con el transporte de tubera de 16", Se Continua Con el transporte, alineacion e instalacion de

la tuberia de 6" PN-10, Se Continua con el Item 3.5, Almacenaje y Organizacion para la respectiva Instalación, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1 1/2 de pvc existente, Se Señalizo Zonas de trabajo Se realizaron Charlas y PMT ejecutado, Se inicio con el PMA Contemplando todas Sus fichas tecnicas, ejecutado el dia de hoy el PMA
Las actividades inician Segun lo programado y lo diseñado, Se mantiene Supervision permanente del SIZO, Comision Topografica y los profesionales de la interventoria.

Fredy Ulloa
Residente de obras

Director de obras
INTERVENTORIA CF

17-10-25 Se iniciaron Actividades a las 07:00 Am
Personal en Obra: Residente de obra, Auxiliares, SIZO, Comision Topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con excavacion manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Continua la demolicion de

Sardinales y Sardinales Sobre la Via del Barrio Brisas del Llano, Se rellena la excavacion con arena lavada aprisionada para atraque de la tuberia, Relleno de material de excavacion, Concreto lanzado 3.000 psi 210 kg/cm² Basico, 5% desperdicio. Se Continua con el Corte del Concreto, Se Continua instalando el Concreto para atraque de la tuberia, Se Continua con el transporte de tuberia de 10", Se Continua con el transporte alineacion e instalacion de la tuberia de 6" PVC-100, Se Continua con el desmonte de la tuberia de 1 1/2 de PVC existente, Se Señalizo Zona de trabajo, Se realizaron Charlas y el PMT ejecutado Se inicio con el PMA Contemplando todos Sus fichas tecnicas, las actividades inician Segun lo programado y lo diseñado, Se mantiene Supervision Permanente del S.S.O, Comision Topografica, y los Profesionales de la interventoria

Fredy Vargas
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA

18-10-25 Se inician Actividades 07:00 AM

Personal en obra: Residente de Obra, Director de obra, Auxiliares de obra, S.S.O y Comision Topografica.

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continua la excavacion manual en Conglomerado, Se Continua con el Cargue del material, Continua la demolicion de andenes y Sardinales de entrada al Barrio Brisas del Llano, Se rellena con arena lavada aprisionada Para atraque de la tuberia y relleno de material de excavación, Concreto lanzado 3.000 PSI Basico 5% desperdicio, Se Continua con el corte del Concreto para atraque de la tuberia, Se Continua con el transporte de tuberia de 10", Se Continua con el transporte alineacion e instalacion de la tuberia de 6" PVC-10, Se Continua con el desmonte de la tuberia de 1"1/2 de PVC existente, Se Señalizo Zona de trabajo, Se realizaron Charlas y el PMT ejecutado, Se inicio con el PMA Contemplando todos Sus fichas tecnicas, las actividades inician Segun lo programado y diseñado, Se mantiene Supervisión permanente del S.S.O, Comision Topografica

y los profesionales de la interventoria.

Fredy HERRERA
Residente de obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CK

19-10-25 No se trabajo, Dia domingo

20-10-25 Se inician Actividades a las 7:06 AM
Personal en obra. Director de Obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, S.20 y Comision Topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con la excavacion manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion de andenes y Sardineles de la entrada a la Via la Colmena, Se rellena Con arena lavada apisonada para atraque de la tuberia y relleno de material de excavacion, Concreto fundido 3.000 PSI 210 kg/cm2 (Basico 5% de desperdicio) Se Continua Con el Corte del Concreto, Se Continua Con el Corte del Concreto, Instalando el Concreto para atraque de la tuberia, Se Continua Con el transporte de tuberia de 10", Se

Continua Con el transporte alineacion e instalacion de la tuberia de 6" PN-10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1 1/2 de pvc existente Se Señalizo Zona de trabajo, Se realizaron Charlas y el PMT ejecutado, Se inicio Con el PMA Contemplado todas Sus fichas tecnicas, las actividades inician Segun lo programado, se mantiene Supervision permanente del S.20, Comision topografica y los profesionales de la interventoria

Fredy HERRERA
Residente de la obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CK

21-10-25 Se inician actividades 7:00 AM
Personal en obra: Director de obra, Residente de Obra Auxiliares de obra, S.20 y Comision topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua la excavacion manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Continua la demolicion de andenes y Sardineles de la via en la Colmena, Se rellena Con arena lavada apisonada Para el atraque de la tuberia y Relleno

Concreto lanzado 3.000 psi basico 5% de desperdicio, Se Continua Con el Corte de Concreto, Se Continua Con la instalacion de Concreto para atraque de la tuberia, Se Continua Con el transporte de tuberia de 10", Se Continua Con la alineacion e instalacion de tuberia de 6" PVC-10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1 1/2 existente, Se Señalizo Zona de trabajo, Se realizaron Charlas y el PMT ejecutado. Se Continua Con el PMA Contemplando todas Sus fichas tecnicas, las actividades inician Segun lo programado Se mantiene Supervision permanente del SSO y personal profesional de la interventoria y Comison Topografica.

Residente de Obra

Director de Obra

22-10-25

Se inician actividades 07:00 Am

Personal en obra: Director de Obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, S.S.O y Comision topografica.

Clima: Soleado

Actividades Realizadas. Se Continua Con la excavacion manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion de andenes y Sardineles de la via a la Colmena, Se rellena Con arena lavada compactada para el atraque de la tuberia y relleno de material de excavación, Concreto lanzado 3.000 psi basico 5% de desperdicio, Se Continua Con el corte del concreto e instalando el Concreto para atraque de la tuberia, Se Continua Con el transporte de tuberia de 10" y Con el transporte alineacion e instalacion de la tuberia de 6" PVC-10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1" 1/2 de pvc existente, Se Señalizo la Zona de trabajo Se realizaron Charlas y el PMT Se ejecuto, Se Continue Con el PMA Contemplando todas Sus fichas tecnicas, las actividades inician Segun lo programado Se mantiene

1201

Supervisión permanente del SI20, personal profesional de la interventoria y Comisión Topografica.

Fredy Arcos
Residente de obra

Director de obra
INTERVENTORIA OK

23-10-25 Se inician actividades a las 07:00 am
Personal en obra: Director de obra, Residente de Obra
Auxiliares de obra, SI20, Comisión Topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua con la excavación manual en Conglomerado, Se Continua con el Cargue del material, Se Continua con la demolición de andenes y Sardineles de la Via a la Colmena, Se rellena con arena lavada aprisionada para el atraque de la tubería y relleno de material de excavación Concreto fundido 3.000 psi, bajo 5% de desperdicio Se Continua con el Corte del Concreto e instalación de Concreto para atraque de la tubería, Se Continua Con el atraque de la tubería de 10" y con el transporte alineación e instalación de la tubería de 6" PVC-10, Se Continua con el desmonte de la

tubería de 1" 1/2 de pvc existente, Se señaliza la zona de trabajo se realizaron Charlas y el PMT se ejecuto, Se Continuo con el PMA Contemplando todos los fichas tecnicas, las actividades inician Segun lo Contemplado. Se mantiene Supervisión permanente del SI20, personal profesional, y Comisión topografica.

Fredy Arcos
Residente de obra

Director de Obra
INTERVENTORIA OK

24-10-25 Se inician actividades a las 7:00 Am
Personal en obra Director de obra, residente de obra
Auxiliares, SI20, Comisión topografica.
Clima: Soleado
Actividades realizadas: Se Continua Con la excavación manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolición de andenes y Sardineles de la Via en la Colmena, Se rellena Con arena lavada aprisionada para el atraque de la tubería, Se rellenan rellena con material de excavación Concreto para atraque de la tubería, Se Continua Con el atraque de la tubería de 10" y Con el transporte alineación y

instalacion de tuberia de 6" PN-10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1" 1/2 de PVC existente, Se Señalizo la zona de trabajo Se realizaron Charlas de PMT y se ejecuto el PMA contemplando todas sus fichas tecnicas, las actividades se realizaron Segun lo Contemplado y Se mantuvo la Supervision permanente del Personal profesional de la interventoria, S.20 y Comision topografica.

Hedy VEGAS
Residente de Obra

Director de obra.
INTERVENTORIA OK

23-10-25 Se inician actividades a las 7:00 Am
Personal en Obra: Director de obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, S.20, Comision Topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con la excavacion manual en Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion de andenes y Sardineles de la Via ala Colombia Se rellena con arena lavada aprisionada para el

arranque de la tuberia, Se Continua Con el traslado de tuberia de 10" y la alineacion e instalacion de tuberia de 6" PE 100 PN-10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1" 1/2 de pvc existente, Se Señalizo la zona de trabajo
Se realizaron Charlas Sobre el PMT y Se Contemplan todas las fichas tecnicas Del PMA las actividades Se realizaron Segun lo Contemplado y Se mantuvo Supervision permanente del profesional de la S.20, Personal profesional de la interventoria y Comision topografica.

Hedy VEGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA OK

26-10-25 No se laboro, Dia domingo

27-10-25 Se inician Actividades 7:00 Am
Personal en obra: Director de Obra, Residente de Obra
Auxiliares de Obra; S.20, Comision topografica.
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con la excavacion

manual en Conglomerado, Se Continuan Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion de andenes y Sardineles de la Via a la Colmena Se rellena Con arena lavada aprisionada para el Cargue y atraque de la tuberia Se rellena Con material de excavacion, Se Continua Con el traslado de tuberia de 10" y la alineacion e instalacion de tuberia de 6" PE 100-PN 10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1" 1/2 de pvc, Se Señalizo la zona de trabajo, se Conto bajo la Supervision Constante de la S.20, Personal Profesional de la Interventoria y Comision Topografica

Fredy LARGAS
Residente de la Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA

28-10-25 Se inician actividades a las 7:00 Am
Personal en Obra: Director de obra, Residente de Obra Auxiliares de Obra, S.20, Comision Topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con la excavacion manual del Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion de

andenes y Sardineles de la Via a la Colmena Se rellena Con arena lavada aprisionada para el atraque de la tuberia, Se rellena Con material de excavacion, Se Continua Con el traslado de tuberia de 10" la alineacion e instalacion de tuberia de 6" PE 100-PN 10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia existente en pvc, de 1 1/2 Se Señalizo la zona de trabajo, Se Conto Con la Supervision de la S.20, Personal de la interventoria y Comision topografica, Se ejecuto PMT y PMA

Fredy LARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA

29-10-25 Se inician Labores a la 7:00 Am
Personal en obra: Residente de la Obra Auxiliares de Obra, Comision topografica
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se realiza excavacion manual, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion de andenes y Sardineles de la Via a la Colmena, Se rellena Con arena

Lavandera Pisada para el atraque de la tuberia, Se rellena Con material de excavacion Se Continua Con el traslado de tuberia de 10" y la alineacion e instalacion de tuberia de 6" PE-PN-10, Se Continua Con el desmonte de tuberia 1"1/2 de PVC Existente, Se Señaliza la zona de trabajo, Se Conto Con la Supervi de la S.20, Personal interventoria y Comision topografica, Se realizaron Charlas del PMT y Se ejecuto el PMA.

Fredy HERAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CL.

30-10-25 Se iniciaron actividades a la 7:00 Am
Personal en obra: Director de Obra, Residente de Obra, Aux de obra, Comision topografica,
Clima: Nublado
Actividades Realizadas: Se Continua Con la excavacion manual del Conglomerado, Se Continua Con el Cargue del material, Se Continua Con la demolicion y de andenes y bordillos de la via en la Calle Se rellena Con arena lavada aprovisionada para

el atraque de la tuberia, Se rellena Con material de excavacion, Se Continua Con el traslado de tuberia de 10" y la alineacion e instalacion de tuberia de 6" PE-PN 10, Se Continua Con el desmonte de la tuberia de 1" 1/2 de PVC existente Se realizaron Charlas del PMT y se ejecutaron todas las Fichas tecnicas del PMA, Se Señalize la zona de trabajo y Se Conto Con la Supervicion Constante de la S.20 personal de la interventoria y Comision Topografica.

Fredy HERAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CL.

31-10-25 Se iniciaron Actividades a las 7:00 Am
Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, Comision Topografica,
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se Continua Con la excavacion manual del Conglomerado, Se Continua Con el cargue del material, Se Continua Con

la demolicion de andenes y Sardineles de la via a la Colmena, Se rellenan con arena lavada agregando para el atraque de la tuberia, Se rellena con material de excavacion Se Continua con el traslado de tuberia de 10" y la instalacion e instalacion de tuberia de 6" de PE100 - RD-10, Se Continua con el desmonte de tuberia de 1" 1/2 de pvc Existen. Se realizaron Charlas del PMT y Se ejecutaron todas las fichas contempladas en el PMA, Se Señalizo la zona de trabajo, Se conto con la Supervision permanente de la S.20, personal profesional de la interventoria y Comision topografica.

Fredy LARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA QL

la demolicion de andenes y Sardineles de la via a la Colmena, Se rellenan con arena lavada apisonada para el atraque de la tuberia, Se rellena con material de excavacion Se Continua con el traslado de tuberia de 10" y la instalacion e instalacion de tuberia de 6" de PE100 - PN-10, Se Continua con el desmonte de tuberia de 7" 1/2 de pvc Existen Se realizaron Charlas del PMT y Se ejecutaron todas la fechas contempladas en el PMA, Se Señalizo la zona de trabajo, Se conto con la Supervision permanente de la S.20, Personal profesional de la interventoria y Comision topografica.

Fredy VARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CF.

02-11-25 Se Iniciaron actividades a las 7.00 am
Personal en Obra: Director de obra, Residente de Obra, aux de obra, Comision topografica
Clima: Soleado
Actividades realizadas: Se Continua Con la excavacion

manual del Conglomerado, Se Continua Con el Cargue manual y retiro de material, Se Sigue Con la demolicion de andenes y Sardineles de la via que ba hacia la Vereda la Colmena, Se rellena Con arena lavada apisonada para atraque de tuberia, Se rellena Con material de excavacion Compactado, Se lanzan Concreto Proyectado 3.000 PSI 210 Kg/cm² (Basico 52 dependiendo) Se Continua Con el Corte de Concreto, Concreto para Losetas resistencia 140 kg/cm² - 2.000 PSI, Se Continua Con el traslado alineacion e instalacion de la tuberia de polietileno PE-100 PN-10, Se realizaron Charlas de pmt, y Se ejecuto el PMA, Se Señalizo la zona de trabajo, bajo la Supervision de la S.20 y Interventoria

Fredy VARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CF.

02-11-25 Dia no laboral

03-11-25 Dia no laboral

04-11-25 Se iniciaron actividades a las 7:00 am
Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Obras aux de Obra, Comision topografica

05-11-25

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continuo con la excavacion manual del Conglomerado, Se Sigue Con el Cargue de material de excavacion, Se Sigue con la demolicion de andenes y Sardineles de la via en la Colmena, Se rellena Con arena lavada apisonada para atraque de tuberia, Se rellena con material de excavacion Compactado, Se lanzo Concreto a 3.000 psi (Basico, desperdicio 5%), Se Continua Con el corte de Concreto, Concreto para Solado resistencia 140 kg/cm²-2.000 psi, Se Continua con el traslado e instalacion de la tuberia de 10" PE-100 PN-16 Se realizaron las Charlas del pmt y Se Contemplaron todas las fichas tecnicas del PMA Se Cerco bajo la supervision permanente de la SSO, Residente profesional de la Interventoria y Comision topografica,

Freddy VARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA

Se iniciaron actividades a las 7:00 Am

Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Ayudantes de Obra, Comision topografica

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continuo con la excavacion manual del Conglomerado, Se Continuo con el Cargue manual y retiro de material, Se Continuo con la demolicion de andenes y Sardineles de la Via en la Colmena, Se relleno de arena lavada apisonada para el atraque de la tuberia, Se rellena Con material de excavacion, Concreto lanzado 3.000 psi 210 kg/cm² (Basico, 5% desperdicio) Se Continua Con el corte del Concreto, Concreto para solado resistencia 140 kg-cm² - 2.000 psi, Se Continua Con el transporte, alineacion y instalacion de la tuberia de 10" PE-100 PN-16, Se realizaron Charlas del PMT y Se contemplaron todas las fichas tecnicas del PMA, Se señalizo la zona de trabajo y Se conto con la Supervision de la SSO, personal profesional de la interventoria y Comision topografica

Freddy VARGAS
Residente de obra

Director de Obra
INTERVENTORIA

30

05-11-25 Se iniciaron actividades a las 7:00 AM

Personal en Obra: Director, Residente, Comision topografica y Auxiliares

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continuo con la excavacion manual del Conglomerado, Cargue manual de material, Demolicion de andenes de la via la Colmena, Relleno con arena lavada apisonada para atraque de la tuberia, Relleno de excavacion compactado, Concreto lanzado 3000 psi 210 kg/cm² (basico, 5% desperdicio) Corte en Concreto, Concreto para solado, Se Continuo con la instalacion de tuberia de 10" PE-100 RN Se realizaron Charlas del PMA y se Contemplaron las Fichas tecnicas del PMT, Se señalizo la zona de trabajo y Se Conto Con la Supervision de Personal de la interventoria, Ico y Comision Topografica.

Freddy VARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA ICO

31

06-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 am

Personal en Obra: Director de Obra, Residente, Aux de Obra y Comision topografica.

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continuo con la excavacion manual del conglomerado, maniobras de excavacion, Compactado, Demolicion de andenes de la via en la Colmena, Se Rellena con arena lavada apisonada, para atraque de tuberia, Relleno con material de excavacion manual, Concreto lanzado 3000 PSI 210 kg/cm² (desperdicio 5%), Corte del Concreto, Concreto parasolado, instalacion de tuberia de 10" PE-100 RN, Se realizaron Charlas del PMT y se ejecutaron Charlas del PMA, Se Conto bajo la Supervision del personal profesional de la interventoria y Comision topografica.

Freddy VARGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA ICO

08-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 Am

Personal en obra, Director de Obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, Comisión topográfica.

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continuo con la excavación manual del Conglomerado, Carga manual del material, demolición de cunetas y Sardineles de la Vía a la Colmena, Relleno con arena lavada apisonada Para el atraque de la tubería, Relleno de excavación, Compactados, Concreto lanzado en 3.000 PSI 210 kg·Cm², (Basico 5% desperdicio) Corte en Concreto, Concreto para Solado, Se Continuo con la instalación de tubería de 10 PE-100 PN Se realizaron charlas del PMT y Se ejecutaron los fichas del PMA, Se Señalizo la zona de trabajo y Se Conto Con la Supervisión del personal Profesional del SIG y la entidad tomas y Personal de topografía.

Freddy LEGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INGENIERO CIVIL

04-11-25 Dia no laboral

10-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 a.m

personal en obra: Director de Obra, residente de Obra Auxiliares de Obra, Comisión topografica

Clima: Soleado

Actividades realizadas. Se Continuo Con la excavación manual del Conglomerado, Carga manual del Conglomerado Carga manual del material demolición de cunetas y Sardineles de la vía a la Colmena, Relleno Con arena lavada apisonada Para el atraque de la tubería, Relleno de excavación Compactado, Concreto lanzado en 3.000 PSI 210 kg·Cm² (Basico, 5% desperdicio) Corte en Concreto, Concreto para solado, instalación de tubería de 10" PE-100 PN, Se realizaron Charlas del PMT y Se ejecutaron los fichas respectivas del PMA, Se Conto Con la Supervisión permanente del Profesionales de la residencia y Comisión topografica

Freddy LEGAS
Residente de Obra

Director de Obra
INGENIERO CIVIL

11-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 Am

Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, Comision topografica,

Clima: Soleado

Actividades Realizadas: Se Continuo con la excavacion manual del Conglomerado, Carga del material de excavacion, Demolicion de andenes de la via por Colmena, Relleno con arena lavada apisonada para atraque de la tuberia, Relleno de excavacion Compactado, Concreto fundido 3.000 PSI 210 Kg/cm² basico, 5% desperdicios, Corte en Concreto, Concreto Pavimento, instalacion tuberia de 10" PE-100 PN Se realizaron Charlas del PMT y los fichas tecnicas del PMA, Se señalizo la zona de trabajo, y se Conto Con la Supervision permanente de la SSO y Personal Profesional de la interventoria y Comision topografica

Fredy Vargas
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CV

12-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 am

Personal en Obra Director de Obra, Residente de Obra, Auxiliares de Obra, Comision topografica

Clima: Soleado

Actividades realizadas: Se Continua Con la excavacion manual del Conglomerado, Carga del material de excavacion, demolicion de andenes de la via por la Colmena relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia, Relleno de material de excavacion, Concreto fundido 3.000 PSI 210 Kg-cm² basico, 5% desperdicios Corte en Concreto, Concreto para Solado, instalacion de tuberia de 10" PE-100 PN, Se Señalizo los Conos de trabajo y se Conto Con la Supervision del personal de la interventoria y Comision topografica, Se realizo el PMT y se ejecutaron los fichas tecnicas del PMA.

Fredy Vargas
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CV

1111

13-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 Am

Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra
Aux de Obras, Comision topografica.
Clima: Soleado
Actividades realizadas: Se Continuo con la excavacion manual del Conglomerado, Con el Cargue manual y retiro de material, demolicion de cordenes de la via la Colmena, Relleno de arena lavada apisonada, para atraque de la tuberia, relleno de excavacion Compactado, Concreto ps. 3.000 210 kg/cm2 (basico, 5% desperdicio) Corte en Concreto, concreto pumsolado, instalacion de tuberia de 10" PE-100 PN, Se realizaron Charlas del PMT y PMA, Se Conto con la Supervision de personal profesional de la Interventoria, SST y Comision topografica, Se Señalizo Zona de trabajo.

Fredy UREÑAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CK

14-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 Am

Personal en Obra Director de Obra, residente, SST, Auxiliares de Obra, Comision topografica,
Clima: Soleado
Actividades realizadas. Se Continua Con la excavacion manual del Conglomerado, Con el Cargue y retiro manual del material, demolicion de cordones de la via a la Colmena, Relleno de arena lavada apisonada, Para atraque de la tuberia, relleno de excavacion Compactado, Concreto 3.000 psi 210 kg-cm2 (basico 5% desperdicio) Corte en Concreto, Concreto pumsolado, instalacion de Tuberia de 10" PE-100 PN, Se realizaron Charlas del PMT y PMA, Se Conto Con la Supervision Permanente de SST, Personal profesional de la Interventoria y Comision topografica, Se Señalizo Zona de trabajo.

Fredy UREÑAS
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA CK

15-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 AM

Personal en Obra: Director, Residente, Auxiliar de Obra, S.20, Comision topografica

Clima: Soleado

Actividades realizadas: Se inicio con la excavacion manual del Conglomerado, Cargue y retiro del material de excavación, demolicion de andenes de la via la Colmena, Relleno con arena lavada apisonadapara entrega de la tuberia, Relleno de excavación Compactado, Concreto en 3000 psi 210 kg/cm basico 5% desperdicio) Corte en Concreto, Concreto para y la instalacion de tuberia de 10" PE-100 PN

Se realizaron las Charlas del PMT y las Fichas tecnicas del PMA, Se señalizo zonas de trabajo y Se Conto con la Supervicion del (PMT y PMA) Profesional de dpe interventoria y Comision topografica

Freddy Lopez
Residente de Obra

Director de Obra
INTERVENTORIA OK

16 11 25 Dia no laboral.

17 11 25 Dia No laboral (festivo.

18.11.25 Se iniciaron labores 07:00 Am.

Personal en obra Director, Residente, Auxiliar, comision topografica.

Clima Soleado

Actividades realizadas: Se continua con la excavación manual en conglomerado, Cargue y retiro de material de excavacion instalación de arena lavada apisonado, entrega de tubería, relleno de excavación compactado, se inicio con el concreto lavado para estabilizar talud. Se continua con la instalación de la tubería. PE 10" PN 10; Se realizan charlas del componente PMA. Con sus fichas tecnicas. Se ejecuta en el avance de PMT con su respectiva Señalización de la zona de trabajo. Se Cuenta con la Supervisión del PMA y PMT. por Parte de la interventoria. Junto Con su comisión topografica.

Fredy VEGAS
Residente de obra

Director obra
INTERVENTORIA

19. 11. 25 Se iniciaron labores 07:00 am.
Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, Auxiliares de obra y Comisión Topográfica.
clima: Soleado.
Actividades realizadas: Se continuo con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de excavación, instalación de tubería PE 100 PN 10 10" junto con sus respectivas uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno de excavación compactado con vibrocompactador tipo canguro, Se continuo con el concreto lanzado para estabilizar el talud, Se realizaron charlas del componente PMA junto con su ficha tecnicas, del componente PMA se ejecuto, señalización en la zona de trabajo, Se cuenta con la Supervisión de la interventoria junto

Con la comisión Topográfica y

Fredy VEGAS
Residente obra

Director Obra
INTERVENTORIA

20. 11. 25. Se iniciaron labores 07:00 AM
Personal en obra: Residente de obra Director de obra, Auxiliares de obra, Comisión Topográfica.
Clima: Soleado.
Actividades realizadas: Se continuo Con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de excavación, instalación de tubería de Polietileno PE 100 PN 10 con su respectivas termofusiones, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno de excavación Compactado con Vibrocompactador tipo Canguro, Se continuo Con la instalación del concreto lanzado para estabilizar el talud, Se realizaron charlas del componente PMA junto con sus fichas tecnicas, En el Componente PMA se ejecu-

lino la instalación de señalización para la zona intervenida o de actividades, charlas y sus diferentes componentes. Se cuenta con la supervisión de la interventoría junto con la supervisión de la comisión topográfica.

Fredy Urrego
Residente obra

Director de obra
INTERVENTORIA

20. 11. 25. Se iniciaron labores 07'00AM
Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, Auxiliares de obra, Comisión Topográfica.
clima: Soleado:
Actividades realizadas: Se continuo con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de excavación instalación de material de excavación, instalación de tubería polietileno P 100 RDE 17 junto con sus respectivas uniones de termofusión, instalación de cama apisonada, atraque de tubería, lleno compactado con vibrocompactador

tipo concreto, se continuo con la instalación del concreto lanzado para estabilizar el talud, se realizaron charlas del componente PMT junto con la ejecución de las diferentes fichas técnicas, en el componente PMT, se ejecuto con la respectiva señalización, para la zona a intervenir, charlas, Se conto con el acompañamiento de la interventoría junto con su comisión topográfica.

Fredy Urrego
Residente de obra.

Director de obra.
INTERVENTORIA

21 11 25

Se iniciaron labores 07'00AM
Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, Auxiliares de obra, Comisión Topográfica.
clima: Soleado
Actividades realizadas: Se continuo con la excavación manual en conglomerado, Cargue y retiro de material de excavación, instalación de

fabrica: polietileno P100 PN10 de
junto con sus respectivas uniones
por termofusión, instalación de arena
cernida, drenaje de tubería, relleno
compactado con compactador tipo can-
guro, se continua con la instalación del
concreto lanzado para estabilizar el
talud, se realizaron charlas, del com-
ponente PMA junto con la ejecución
de sus fichas técnicas, se ejecuta el
PMT, señalando las zonas a interve-
nir, charlas, se cuenta con el Acom-
pañamiento de la interventoría junto
con su comisión Topográfica.

Freddy WILCAS
Residente obra

Director obra
INTERVENTORIA

22. 11 25. Se trabaja labores ordinarias
Personal en obra: Residente de obra,
Director de obra, Auxiliares de obra
Comisión Topográfica.
Clima: Soleado
Actividades Realizadas: Se realizaron

con la excavación manual de conglo-
merado, cortes y retiro de material
de excavación, instalación de tubería
Polietileno PE100 PN10 RDE junto
con las uniones a termofusión, insta-
lación de arena cernida, drenaje
de tubería, relleno compactado
con vibrocompactador tipo canguro,
se continua con la instalación del
concreto lanzado, para estabilizar talud,
se realizan charlas del componente PMA,
junto con la ejecución del PMT, se-
ñalando las zonas a intervenir,
charlas, se cuenta con el Acompa-
ñamiento de de la interventoría jun-
to con su comisión Topográfica.

Freddy WILCAS
Residente obra

Director de obra
INTERVENTORIA

23. 11 25 Día no laboral.

24. 11 25 Se trabaja labores ordinarias
Personal en obra, Residente de

obra, Director de obra, Aux. Cons. 25/11/15
de obra y Comisión Topográfica
Clima: Soleado
Actividades ejecutadas: Se continúa
con la excavación manual en zanjas,
cimientos, Carga y retiro de material
de excavación, instalación de tubería
de polietileno de PE100 PN10 18" junto
con sus uniones a termofusión, instala-
ción de arena Apisonada, atraque de
fabrica, relleno compactado con vibro-
compactador tipo canguro, se continúa
con la instalación de concreto lanzado,
para estabilizar talud, se realiza chaflán
de concreto fmn junto con sus fichas
termicas. se ejecuta fmn, señalización
en la zanja a intervenir, chalas, se
cuenta con el acompañamiento de la
interventoria, junto con la comisión
topográfica de obra.

Inicia Cons
Residente obra

Director obra
INTERVENTORIA OK.

a Iniciada zanjas excavación
Personal en obra: Residente de obra,
Director de obra, planchero de obra,
Comisión topográfica.
Clima: Soleado
Actividades ejecutadas: Se continúa
Con la excavación manual en zanja-
miento, cargue y retiro de material
de excavación, instalación de tubería
de polietileno PE100 PN10 18", junto
con su respectivas uniones a termo-
fusión, instalación de arena apisona-
atraque de fabrica, relleno compacta-
do con vibrocompactador tipo canguro
ro, se continua con la instalación
de concreto lanzado para estabili-
zar el talud, se realiza chaflan de
concreto fmn junto con sus fi-
chas tecnicas, se ejecuta fmn, seña-
lización en las zanjas a intervenir
chalas, se cuenta con el acompaña-
miento de la interventoria, junto con la
comisión topográfica.

1217

20-11-25 Se iniciaron labores 7:00 AM

Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, auxiliare de obra, comision topografica.

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: Se continua con la excavacion manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de tuberia de polietileno PIGO PN10 10", junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tuberia, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro, se continua con la instalación de concreto lanzado para estabilizar el talud, se realiza charla de componente MPA juntos con sus fichas tecnicas se ejecuta PMT, senalización de las zonas a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de interventoria junto con su comision topografica.

Fredy VARGAS
Residente obra

Director obra
INTERVENTORIA

27-11-25 Se iniciaron labores 7:00 AM

Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, auxiliare de obra, comision topografica.

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: se continua con la excavacion manual en material conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de tuberia de polietileno PIGO PN 10 10", junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tuberia, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro, se continua con la instalación de concreto lanzado para estabilizar el talud, se realiza charlas de componente MPA junto con sus fichas tecnicas se ejecuta PMT, señalizado las zonas a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de interventoria, junto con la comision topografica de ellos.

Fredy VARGAS
Residente de obra

Director de obra
INTERVENTORIA

1219

28-11-25 Se iniciaron labores a las 7:00 AM

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, Auxiliares de obra comision topografica

Clima Soleado

Actividades ejecutadas: se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de tubería de polietileno PI00 PN 10 10", junto con sus uniones en termofusión, instalacion de arena apisonada, atraque de tuberia, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. se continua con la instalacion de concreto lanzado para estabilizar talud, se realiza charlas de componente MPA junto con sus fichas tecnicas se ejecuta PMT, señalización en las zonas a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de la interventoria junto con la comision topografica de ellos

Fredy LARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
INTERVENTORIA

29-11-2025 Se inician labores a las 7:00 AM

Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, Auxiliares de obra, comisión topografica

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: se continua con la excavacion Manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, intalación de tuberia de Polietileno PI00 PN 10 10", junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena aprisonada, atraque de tuberia, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro.
se realizan charlas de componente PMA junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PMT; señalización en la zona a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de interventoria junto con su comisión topografica.

Fredy LARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
INTERVENTORIA

30-11-25 Dia no Laboral.

01-12-2025 Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra comisión topográfica.

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: se continuo con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de tubería de polietileno P100 PN 10", junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. se ejecutaron varias actividades de reposición en concreto. se realiza charlas de componente HPA junto con sus fichas tecnicas se ejecuta. PHT, señalización en las tareas a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de la interventoria. junto con la comisión topografica de ellas.

Grady VARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
INTERVENTORIA OK

01-12-2025 se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra comision topografica.

Clima: Soleado.

Actividades ejecutadas: se continuo con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro del material de la excavación, instalación de tubería de Polietileno P100 PN 10", junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada con vibrocompactador tipo canguro. se utilizó concreto para solado de resistencia media para la conformación y nivelación de las cajas, se realizo charlas de componente HPA. junto con sus fichas tecnicas se ejecuta PHT, señalización en las tareas a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de la interventoria junto con la comisión topografica de ellas

Grady VARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
INTERVENTORIA OK

03-12-2025 Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra comisión topografica

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: Se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno P100 PN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro, se utiliza concreto para soporte de resistencia media para la conformación y nivelación de las cajas, se realizan charlas de HPA junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PHT, señalización en las zonas a intervenir, charlas, de conto con el acompañamiento de la interventoria junto con la comisión topografica de ellos.

Fredy VARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
Interventoria OK

04-12-2025 Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra comisión topografica.

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: Se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno P100 PN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro, se realiza instalación de cruces en Polietileno destinadas a cambios de dirección en la linea del acueducto, se realizan charlas de HPA, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PHT, señalización en las zonas a intervenir, charlas, se conto con el acompañamiento de la interventoria junto con la comisión topografica de ellos

Fredy VARGAS
Ingeniero residente

Director obra
Interventoria OK

05-12-2025 Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra comisión topografica

Clima: soleado

Actividades ejecutadas: se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno PN10 PN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena aprisionada, chaqueo de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro, se realiza instalación de cerca en polietileno destinadas a cambios de dirección se realizan charlas de HSA, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta ART, señalización en las zonas a intervenir, charlas, se cuenta con el acompañamiento de interventoria, junto con la comisión topografica de ellos.

Freddy VARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
INTERVENTORIA OK
OK

06-12-2025 Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comisión topografica

Actividades ejecutadas: Continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de arena aprisionada, chaqueo de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro, se realiza instalación de cerca en polietileno destinada a cambios de dirección, instalación de codo de presión, se realizan charlas de HSA, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta ART, señalización en las zonas a intervenir, charlas, se cuenta con el acompañamiento de interventoria junto con la comisión topografica de ellos

Freddy VARGAS
Ingeniero Residente

Director obra
INTERVENTORIA OK
OK

07-12-2025 Dia no laboral

06-12-2025

Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comisión topografica.

Clima, soleado.

Actividades ejecutadas: Se continua con la excavación manual conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno PE100 PN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. Se realiza instalación de codo de presión, se realizan charlas de MAP, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PMT, señalización en las zonas a intervenir, charlas, se cuenta con el acompañamiento de la interventoria junto con la comisión topografica de ellos.

Fredy Vargas
Ingeniero Residente

Director obra
Interventoria

06-12-2025

Se iniciaron labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comisión topografica.

Clima, soleado.

Actividades ejecutadas: Se continua con la excavación manual conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno PE100 PN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería, relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. Se ejecuta el suministro e instalación de tubería PVC Presión RDE21 de 3" para la caseta de descargo, garantizando su funcionamiento, se realizan charlas de MAP, junto con sus fichas técnicas. Se ejecuta PMT, señalización en las zonas a intervenir, se cuenta con la acompañamiento de interventoria junto con la comisión topografica de ellos.

Fredy VARGAS
Ingeniero Residente

Director Obra
Interventoria

10-12-2025 Se inician labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comisión topografica

Clima: soleado

Actividades ejecutadas: se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro manual de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno PE100 RN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. Se realizo la instalación de curva en Polietileno PE 100 RN-10 Ø250mm con el fin de permitir el cambio de dirección de trazado de la red y garantizar la correcta conducción de la tubería, se realizan charlas de HPA, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PTT, señalización a las tres a intervenir, se cuenta con el acompañamiento de la interventoria junto con la comisión topografica de ellos

Freddy Vargas
Ingeniero Residente

Director de obra
INTERVENTORIA OK

11-12-2025 Se inician labores a las 7:00am

Personal en obra: Directa de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comision topografica, y clima: soleado.

Actividades ejecutadas: Se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro de material de la excavación, instalación de la tubería en Polietileno PE100 RN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. Se realizaron cortes controlados en concreto en los nodos 12 y 13, mediante el uso de la cortadora manual con el proposito de habilitar el area a intervenir para la instalación de la tubería, se realizan charlas de HPA, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PTT, señalización a las tres a intervenir, se cuenta con el acompañamiento de la interventoria junto con la comisión topografica de ellos

Freddy Vargas
Ingeniero Residente

Director Obra
INTERVENTORIA OK

12-12-2025 Se inicianon labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comisión topografica.

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas: se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro del material de la excavación, instalación de la tubería en polietileno PI00 PN 10". junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. se realizo la instalación de Portaflanche en polietileno PE 100 RDE 17 PN 10 90mm utilizado como elemento de transición entre la tubería principal y los accesorios hidraulicos con conexiones bridadas, se realizan charlas de HPA, junto con sus fichas tecnicas, se ejecuta PTT, señalización a las vias a intervenir, se conto con el acompañamiento de interventoria junto con su equipo topografico.

Fredy VARGAS
Ingeniero Residente

Director de obra
INTERVENTORIA OK

13-12-2025 se inicianon labores a las 7:00am

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, auxiliares de obra, comisión topografica

Clima: Soleado.

Actividades ejecutadas: se continua con la excavación manual en conglomerado, cargue y retiro del material de excavación, instalación de la tubería en polietileno PI00 PN 10" junto con sus uniones en termofusión, instalación de arena apisonada, atraque de tubería relleno compactado con vibrocompactador tipo canguro. se realizo la instalación de banda tipo slip en 06" en acero de carbono, acpe 85, empleada para conformar uniones bridadas, entre la tubería principal y los accesorios hidraulicos del sistema. se realizan charlas de HPA, junto con sus fichas tecnicas, de ejecución PTT, señalización a las vias a intervenir, se conto con el acompañamiento de interventoria junto con su comision topografica.

Fredy VARGAS
Ingeniero Residente

Director de obra
INTERVENTORIA OK

14-12-2025 DIA no laboral.
