Cubingecol

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Límite de comienzo	Límite de finalización	Demora permisible	Margen de demora total
1		**PROYECTO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5"**	**136 días**	**lun 29/12/25**	**mié 29/04/26**	**0%**	**$ 1.170.709.255,00**	**lun 29/12/25**	**mié 29/04/26**	**0 días**	**0 días**
2		Acta de inicio	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25	0%	$ 0,00	lun 29/12/25	lun 29/12/25	0 días	0 días
3		Actualización de Pólizas Acta de inicio	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25	0%	$ 0,00	mar 30/12/25	mar 30/12/25	0 días	0 días
4		Análisis y evaluación estructural de la cubierta	32 días	mar 30/12/25	mar 27/01/26	0%	$ 0,00	mar 30/12/25	mar 27/01/26	0 días	0 días
5		**1. PRELIMINARES**	**38 días**	**mié 28/01/26**	**mar 3/03/26**	**0%**	**$ 30.773.566,00**	**jue 29/01/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
6		1.1 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mié 28/01/26	sáb 31/01/26	0%	$ 1.107.253,00	jue 29/01/26	sáb 31/01/26	0 días	1 día
7		1.2 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, VER ANEXO TÉCNICO	10 días	dom 1/02/26	lun 9/02/26	0%	$ 8.132.880,00	dom 1/02/26	mar 10/02/26	1 día	1 día
8		Bloque 2	4 días	dom 1/02/26	mié 4/02/26	0%	$ 3.659.796,00	dom 1/02/26	jue 5/02/26	0 días	1 día
9		Bloque 1	5 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26	0%	$ 4.473.084,00	vie 6/02/26	mar 10/02/26	0 días	1 día
10		1.3 Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento VER ANEXO TÉCNICO	29 días	mié 4/02/26	lun 2/03/26	0%	$ 12.417.355,00	vie 13/02/26	mié 11/03/26	10 días	10 días
11		Cubierta 7.1 archivo y laboratorio toxicologia	4 días	mié 4/02/26	dom 8/02/26	0%	$ 2.069.559,17	vie 13/02/26	lun 16/02/26	0 días	10 días
12		Cubierta 7.2 laboratorio Estupefacientes	4 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26	0%	$ 2.069.559,17	mar 17/02/26	sáb 21/02/26	0 días	10 días
13		Cubierta 7.3 laboratorio instrumental	4 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26	0%	$ 2.069.559,17	dom 22/02/26	mié 25/02/26	0 días	10 días
14		Cubierta 9 sistemas y baños	4 días	mar 17/02/26	sáb 21/02/26	0%	$ 2.069.559,17	jue 26/02/26	lun 2/03/26	0 días	10 días
15		Cubierta 11 Direcciones y sala de juntas	4 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26	0%	$ 2.069.559,16	mar 3/03/26	vie 6/03/26	0 días	10 días
16		Cubierta 12 Administrativa	4 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26	0%	$ 2.069.559,16	sáb 7/03/26	mié 11/03/26	0 días	10 días
17		1.4 Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso VER ANEXO TÉCNICO	5 días	mar 10/02/26	dom 15/02/26	0%	$ 1.568.988,00	mié 11/02/26	lun 16/02/26	0 días	1 día
18		1.5 Demolición de afinado pendientado de cubiertas VER ANEXO TÉCNICO	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	0%	$ 1.945.800,00	mar 17/02/26	vie 20/02/26	0 días	1 día
19		1.6 Desmonte de canales metálicas VER ANEXO TÉCNICO	35 días	mié 28/01/26	sáb 28/02/26	0%	$ 1.917.432,00	lun 16/02/26	jue 19/03/26	11 días	21 días
20		1.7 Retiro y reinstalación de puente VER ANEXO TÉCNICO	4 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	0%	$ 3.683.858,00	sáb 21/02/26	mar 24/02/26	0 días	1 día
21		***ENTREGA DE PRELIMINARES Y DESMONTES***	***0 días***	***mar 3/03/26***	***mar 3/03/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***64 días***	***64 días***
22		**2. ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**29 días**	**jue 5/02/26**	**mar 3/03/26**	**0%**	**$ 110.902.666,00**	**jue 5/02/26**	**mié 4/03/26**	**0 días**	**0 días**
23		2.1 Suministro e instalación de acero VER ANEXO TÉCNICO	29 días	jue 5/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 110.902.666,00	jue 5/02/26	mié 4/03/26	0 días	0 días
24		Cubierta 7.1 archivo y laboratorio toxicologia	4 días	jue 5/02/26	dom 8/02/26	0%	$ 18.483.777,67	jue 5/02/26	dom 8/02/26	0 días	0 días
25		Cubierta 7.2 laboratorio Estupefacientes	4 días	lun 9/02/26	vie 13/02/26	0%	$ 18.483.777,67	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	0 días	1 día
26		Cubierta 7.3 laboratorio instrumental	5 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	0%	$ 18.483.777,67	dom 15/02/26	jue 19/02/26	0 días	1 día
27		Cubierta 9 sistemas y baños	3 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	0%	$ 9.241.888,83	vie 20/02/26	lun 23/02/26	0 días	1 día
28		Cubierta 11 Direcciones y sala de juntas	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	0%	$ 18.483.777,67	mar 24/02/26	vie 27/02/26	0 días	1 día
29		Cubierta 12 Administrativa	4 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 27.725.666,49	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
30		**3. CUBIERTAS**	**30 días**	**lun 9/02/26**	**dom 8/03/26**	**0%**	**$ 147.471.113,00**	**mié 11/02/26**	**mié 29/04/26**	**2 días**	**2 días**
31		3.1 Suministro e instalación de cubierta VER ANEXO TÉCNICO	28 días	mié 11/02/26	dom 8/03/26	0%	$ 107.329.385,00	mié 11/02/26	mié 29/04/26	0 días	0 días
32		Cubierta 7.1 archivo y laboratorio toxicologia	2 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	0%	$ 15.332.769,29	mié 11/02/26	vie 13/02/26	0 días	0 días
33		Cubierta 7.2 laboratorio Estupefacientes	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	0%	$ 22.999.153,93	lun 16/03/26	jue 19/03/26	22 días	32 días
34		Cubierta 7.3 laboratorio instrumental	2 días	sáb 21/02/26	lun 23/02/26	0%	$ 15.332.769,29	mar 17/03/26	jue 19/03/26	0 días	27 días
35		***ENTREGA DE CUBIERTAS BLOQUE 2***	***0 días***	***mar 24/02/26***	***mar 24/02/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***72 días***	***72 días***
36		Cubierta 9 sistemas y baños	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	0%	$ 15.332.769,29	mar 17/03/26	jue 19/03/26	13 días	23 días
37		Cubierta 11 Direcciones y sala de juntas	3 días	dom 1/03/26	mié 4/03/26	0%	$ 22.999.153,93	lun 16/03/26	jue 19/03/26	7 días	17 días
38		Cubierta 12 Administrativa	2 días	jue 5/03/26	sáb 7/03/26	0%	$ 15.332.769,27	vie 6/03/26	dom 8/03/26	0 días	1 día
39		***ENTREGA DE CUBIERTAS BLOQUE 1***	***0 días***	***dom 8/03/26***	***dom 8/03/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***58 días***	***58 días***
40		3.2 Suministro e instalacion Kit de fijación Cubierta VER ANEXO TÉCNICO	27 días	mié 11/02/26	sáb 7/03/26	0%	$ 2.491.200,00	lun 23/02/26	jue 19/03/26	3 días	13 días
41		3.3 Suministro e instalación de Accesorios Acero pre pintado, Calibre 24 color Gris RAL 9006 Desarrollo maximo 210mm. Remate Frontal VER ANEXO TÉCNICO	27 días	lun 9/02/26	jue 5/03/26	0%	$ 4.742.712,00	lun 23/02/26	jue 19/03/26	5 días	15 días
42		3.4 Suministro e instalación de Accesorios Acero pre pintado, Calibre 24 color Gris RAL 9006 Desarrollo maximo 600mm. Remate lateral VER ANEXO TÉCNICO	27 días	lun 9/02/26	jue 5/03/26	0%	$ 13.199.568,00	lun 23/02/26	jue 19/03/26	5 días	15 días
43		3.5 Suministro e instalacion de canales en lámina galvanizada VER ANEXO TÉCNICO	27 días	lun 9/02/26	jue 5/03/26	0%	$ 9.535.887,00	lun 23/02/26	jue 19/03/26	5 días	15 días
44		3.6 Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo entre 12 y 20 cms, VER ANEXO TÉCNICO	27 días	lun 9/02/26	jue 5/03/26	0%	$ 1.309.410,00	lun 23/02/26	jue 19/03/26	5 días	15 días
45		3.7 Suministro e instalacion de flanches en lámina galvanizada cal 24 desarrollo entre 0.70 y 1.00 m. VER ANEXO TÉCNICO	27 días	lun 9/02/26	jue 5/03/26	0%	$ 1.637.883,00	lun 23/02/26	jue 19/03/26	5 días	15 días
46		3.8 Construcción de guarda escoba VER ANEXO TÉCNICO	3 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	0%	$ 7.225.068,00	dom 1/03/26	mié 4/03/26	0 días	10 días
47		**4. IMPERMEABILIZACIONES**	**16 días**	**mar 10/03/26**	**mar 24/03/26**	**0%**	**$ 18.396.930,00**	**jue 19/03/26**	**mié 29/04/26**	**10 días**	**10 días**
48		4.1 Impermeabilización de placa a intemperie, VER ANEXO TÉCNICO	15 días	mar 10/03/26	lun 23/03/26	0%	$ 15.715.026,00	jue 19/03/26	mié 1/04/26	9 días	10 días
49		4.2 Impermeabilización de cubatas, VER ANEXO TÉCNICO	15 días	mar 10/03/26	lun 23/03/26	0%	$ 2.681.904,00	jue 19/03/26	mié 1/04/26	0 días	10 días
50		***ENTREGA DE IMPERMEABILIZACIONES***	***0 días***	***mar 24/03/26***	***mar 24/03/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***40 días***	***40 días***
51		**5. CIELORRASOS**	**32 días**	**mié 11/03/26**	**mié 8/04/26**	**0%**	**$ 53.573.458,00**	**jue 12/03/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
52		5.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard VER ANEXO TÉCNICO	8 días	mar 31/03/26	mar 7/04/26	0%	$ 16.866.852,00	mié 1/04/26	mié 8/04/26	0 días	1 día
53		5.2 Suministro e instalación de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	4 días	mié 11/03/26	sáb 14/03/26	0%	$ 21.404.830,00	jue 12/03/26	dom 15/03/26	0 días	1 día
54		5.3 Suministro e instalación de estructura de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	6 días	dom 15/03/26	vie 20/03/26	0%	$ 2.145.472,00	lun 16/03/26	sáb 21/03/26	0 días	1 día
55		5.4 Reinstalación láminas de cielorraso en fibra mineral (desmontadas), VER ANEXO TÉCNICO	2 días	sáb 21/03/26	lun 23/03/26	0%	$ 863.086,00	dom 22/03/26	mar 24/03/26	0 días	1 día
56		5.5 Suministro e instalación de láminas de cielorraso en fibra mineral (nuevas), VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	0%	$ 5.103.318,00	mié 25/03/26	vie 27/03/26	0 días	1 día
57		5.6 Arreglo de cielorrasos en Dry wall. VER ANEXO TÉCNICO	5 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	0%	$ 5.235.636,00	sáb 28/03/26	mié 1/04/26	0 días	1 día
58		5.7 Suministro e instalación de tapa registro en aluminio VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	0%	$ 727.248,00	jue 2/04/26	sáb 4/04/26	0 días	1 día
59		5.8 Suministro e instalación de marco aluminio VER ANEXO TÉCNICO	2 días	sáb 4/04/26	dom 5/04/26	0%	$ 1.227.016,00	dom 5/04/26	lun 6/04/26	0 días	1 día
60		***ENTREGA DE CIELORRASOS***	***0 días***	***mié 8/04/26***	***mié 8/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***23 días***	***23 días***
61		**6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**8 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	**0%**	**$ 3.243.855,00**	**mié 25/02/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
62		6.1 Suministro e instalacion de valvula bola de 1/2 " VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 69.442,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
63		6.2 Suministro e instalacion de valvula bola de 3/4 " VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 70.748,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
64		6.3 Suministro e instalacion de valvula bola de 1" VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 87.761,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
65		6.4 Suministro e instalacion de valvula bola de 1 1/4" VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 123.174,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
66		6.5 Suministro e instalacion de valvula bola de 2" VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 181.503,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
67		6.6 Ajuste de red de agua potable o eléctrica existente. VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 1.354.553,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
68		6.7 Suministro e instalación Caja de inspección 60 x 60 cm VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26	0%	$ 1.356.674,00	mié 25/02/26	mié 4/03/26	0 días	1 día
69		***ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS***	***0 días***	***mié 4/03/26***	***mié 4/03/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***63 días***	***63 días***




Proyecto: Calendario Base Pere
Fecha: dom 25/01/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

JOHAN A. MONSALVE H.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CUBINGECOL


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Límite de comienzo	Límite de finalización	Demora permisible	Margen de demora total
70		**7. MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES**	**97 días**	**dom 1/02/26**	**mar 28/04/26**	**0%**	**$ 9.302.372,00**	**vie 27/02/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
71		7.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	dom 1/02/26	lun 2/02/26	0%	$ 3.003.454,00	vie 27/02/26	dom 1/03/26	0 días	30 días
72		7.2 Conformación de cajilla VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mar 3/02/26	jue 5/02/26	0%	$ 220.876,00	lun 2/03/26	mié 4/03/26	20 días	30 días
73		7.3 Construccion pase muro en bloque y ladrillo VER ANEXO TÉCNICO	24 días	lun 6/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 6.078.042,00	lun 6/04/26	mar 28/04/26	0 días	1 día
74		***ENTREGA DE MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES***	***0 días***	***mar 28/04/26***	***mar 28/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***1 día***	***1 día***
75		**8. BASES Y PISOS**	**16 días**	**mar 24/02/26**	**mar 10/03/26**	**0%**	**$ 11.290.589,00**	**jue 5/03/26**	**mié 29/04/26**	**10 días**	**10 días**
76		8.1 Alistado de piso y pendientado VER ANEXO TÉCNICO	15 días	mar 24/02/26	lun 9/03/26	0%	$ 9.007.812,00	jue 5/03/26	mié 18/03/26	0 días	10 días
77		8.2 Construcción de poyo en concreto de 2500 psi. VER ANEXO TÉCNICO	15 días	mar 24/02/26	lun 9/03/26	0%	$ 2.282.777,00	jue 5/03/26	mié 18/03/26	0 días	10 días
78		***ENTREGA DE BASES Y PISOS***	***0 días***	***mar 10/03/26***	***mar 10/03/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***56 días***	***56 días***
79		**9. ELEMENTOS METALICOS**	**16 días**	**jue 19/02/26**	**jue 5/03/26**	**0%**	**$ 5.919.456,00**	**sáb 4/04/26**	**mié 29/04/26**	**49 días**	**49 días**
80		9.1 Suministro e instalación de anclaje epóxico 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	2 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26	0%	$ 4.145.120,00	sáb 4/04/26	dom 5/04/26	0 días	49 días
81		9.2 Suministro e instalacion tapa en lámina alfajor VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	0%	$ 1.774.336,00	lun 6/04/26	mié 8/04/26	37 días	38 días
82		***ENTREGA DE ELEMENTOS METÁLICOS***	***0 días***	***dom 22/02/26***	***dom 22/02/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***74 días***	***74 días***
83		**10. PINTURAS**	**22 días**	**mié 8/04/26**	**mar 28/04/26**	**0%**	**$ 76.200.839,00**	**jue 9/04/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
84		10.1 Suministro e instalación de estuco acrílico, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	0%	$ 6.821.190,00	jue 9/04/26	sáb 11/04/26	0 días	1 día
85		10.2 Suministro e instalación de pintura epóxica VER ANEXO TÉCNICO	3 días	sáb 11/04/26	lun 13/04/26	0%	$ 38.958.100,00	dom 12/04/26	mar 14/04/26	0 días	1 día
86		10.3 Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 VER ANEXO TÉCNICO	4 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	0%	$ 25.678.712,00	mié 15/04/26	dom 19/04/26	0 días	1 día
87		10.4 Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) cuatro caras, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	dom 19/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 1.927.872,00	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0 días	1 día
88		10.5 Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) dos caras, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	0%	$ 516.472,00	mié 22/04/26	jue 23/04/26	0 días	1 día
89		10.6 Suministro e instalación de pintura koraza VER ANEXO TÉCNICO	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	0%	$ 585.184,00	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	0 días	1 día
90		10.7 Conformación de media caña VER ANEXO TÉCNICO	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 1.713.309,00	dom 26/04/26	mar 28/04/26	0 días	1 día
91		***ENTREGA DE PINTURAS***	***0 días***	***mar 28/04/26***	***mar 28/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***1 día***	***1 día***
92		**11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS**	**79 días**	**mar 17/02/26**	**mar 28/04/26**	**0%**	**$ 703.634.411,00**	**jue 19/02/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
93		**11.1 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**11 días**	**mié 4/03/26**	**vie 13/03/26**	**0%**	**$ 624.111,00**	**jue 5/03/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
94		11.1.1 Desconexion y retiro de tablero y cableado, VER ANEXO TÉCNICO	10 días	mié 4/03/26	jue 12/03/26	0%	$ 624.111,00	jue 5/03/26	vie 13/03/26	0 días	1 día
95		***ENTREGA DE DESMONTES ELÉCTRICOS***	***0 días***	***vie 13/03/26***	***vie 13/03/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***52 días***	***52 días***
96		**11.2 SISTEMA DE CANALIZACIONES TUBERÍAS**	**30 días**	**vie 13/03/26**	**jue 9/04/26**	**0%**	**$ 15.277.331,00**	**sáb 14/03/26**	**vie 10/04/26**	**1 día**	**1 día**
97		11.2.1 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 6+1N #6 + 1T #6 VER ANEXO TÉCNICO	30 días	vie 13/03/26	jue 9/04/26	0%	$ 3.003.025,00	sáb 14/03/26	vie 10/04/26	0 días	1 día
98		11.2.2 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F#8+ 1N#8+1T #8 VER ANEXO TÉCNICO	30 días	vie 13/03/26	jue 9/04/26	0%	$ 2.383.725,00	sáb 14/03/26	vie 10/04/26	0 días	1 día
99		11.2.3 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 1O+1T #10 VER ANEXO TÉCNICO	20 días	vie 13/03/26	mar 31/03/26	0%	$ 5.565.936,00	lun 23/03/26	vie 10/04/26	10 días	11 días
100		11.2.4 Suministro e instalación de conductores, VER ANEXO TÉCNICO	20 días	vie 13/03/26	mar 31/03/26	0%	$ 4.324.645,00	lun 23/03/26	vie 10/04/26	10 días	11 días
101		**11.3 SISTEMA DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**	**10 días**	**vie 10/04/26**	**dom 19/04/26**	**0%**	**$ 9.634.038,00**	**sáb 11/04/26**	**lun 20/04/26**	**1 día**	**1 día**
102		11.3.1 Suministro e instalación de tablero fuerza y control VER ANEXO TÉCNICO	10 días	vie 10/04/26	dom 19/04/26	0%	$ 8.520.035,00	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	0 días	1 día
103		11.3.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar VER ANEXO TÉCNICO	10 días	vie 10/04/26	dom 19/04/26	0%	$ 250.045,00	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	0 días	1 día
104		11.3.3 Suministro e instalación de interruptor bipolar VER ANEXO TÉCNICO	10 días	vie 10/04/26	dom 19/04/26	0%	$ 306.660,00	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	0 días	1 día
105		11.3.4 Suministro e instalación de interruptor tripolar VER ANEXO TÉCNICO	10 días	vie 10/04/26	dom 19/04/26	0%	$ 557.298,00	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	0 días	1 día
106		**11.4 RED NORMAL Y REGULADA**	**3 días**	**lun 20/04/26**	**mié 22/04/26**	**0%**	**$ 5.065.103,00**	**mar 21/04/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
107		11.4.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V; VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 226.437,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
108		11.4.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 1.094.364,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
109		11.4.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 320.794,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
110		11.4.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal en canaleta, grado comercial 2P+T 15A 120V; VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 116.174,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
111		11.4.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja empotrado, grado hospitalario 2P+T 15A 120V, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 345.790,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
112		11.4.6 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida especial para alimentación tablero cabinas de extracción, circuito dedicado; VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 272.746,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
113		11.4.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida especial 120V toma de seguridad NEMA L5-30 VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 326.872,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
114		11.4.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 30A 250V VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 383.492,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
115		11.4.9 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-20 VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 205.276,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
116		11.4.10 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-15 VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 354.282,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
117		11.4.11 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L5-15R, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 336.836,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
118		11.4.12 Traslado y reinstalación de cabina con su tablero de control y base VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 1.082.040,00	mar 21/04/26	mié 22/04/26	0 días	1 día
119		***ENTREGA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS***	***0 días***	***mié 22/04/26***	***mié 22/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***7 días***	***7 días***
120		**11.5 RED DISTRIBUCIÓN ILUMINACIÓN INSTALACIONES INTERNAS**	**20 días**	**vie 10/04/26**	**mar 28/04/26**	**0%**	**$ 76.505.806,00**	**sáb 11/04/26**	**mié 29/04/26**	**1 día**	**1 día**
121		11.5.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	0%	$ 207.638,00	dom 26/04/26	mar 28/04/26	4 días	4 días
122		11.5.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	0%	$ 328.866,00	dom 26/04/26	mar 28/04/26	4 días	4 días
123		11.5.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor triple; VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mié 22/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 687.056,00	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
124		11.5.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	0%	$ 370.182,00	dom 26/04/26	mar 28/04/26	4 días	4 días
125		11.5.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	0%	$ 221.726,00	dom 26/04/26	mar 28/04/26	4 días	4 días
126		11.5.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; VER ANEXO TÉCNICO	15 días	vie 10/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 20.176.900,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días
127		11.5.7 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable VER ANEXO TÉCNICO	5 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 424.684,00	jue 23/04/26	mar 28/04/26	1 día	1 día
128		11.5.8 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica VER ANEXO TÉCNICO	4 días	mié 22/04/26	dom 26/04/26	0%	$ 99.952,00	vie 24/04/26	mar 28/04/26	2 días	2 días
129		11.5.9 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, VER ANEXO TÉCNICO	19 días	vie 10/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 37.246.365,00	sáb 11/04/26	mar 28/04/26	1 día	1 día
130		11.5.10 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W VER ANEXO TÉCNICO	19 días	vie 10/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 5.672.730,00	sáb 11/04/26	mar 28/04/26	1 día	1 día
131		11.5.11 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W VER ANEXO TÉCNICO	19 días	vie 10/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 1.055.830,00	sáb 11/04/26	mar 28/04/26	1 día	1 día
132		11.5.12 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W, VER ANEXO TÉCNICO	19 días	vie 10/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 6.144.105,00	sáb 11/04/26	mar 28/04/26	1 día	1 día
133		11.5.13 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W VER ANEXO TÉCNICO	5 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	0%	$ 3.869.772,00	jue 23/04/26	mar 28/04/26	0 días	1 día

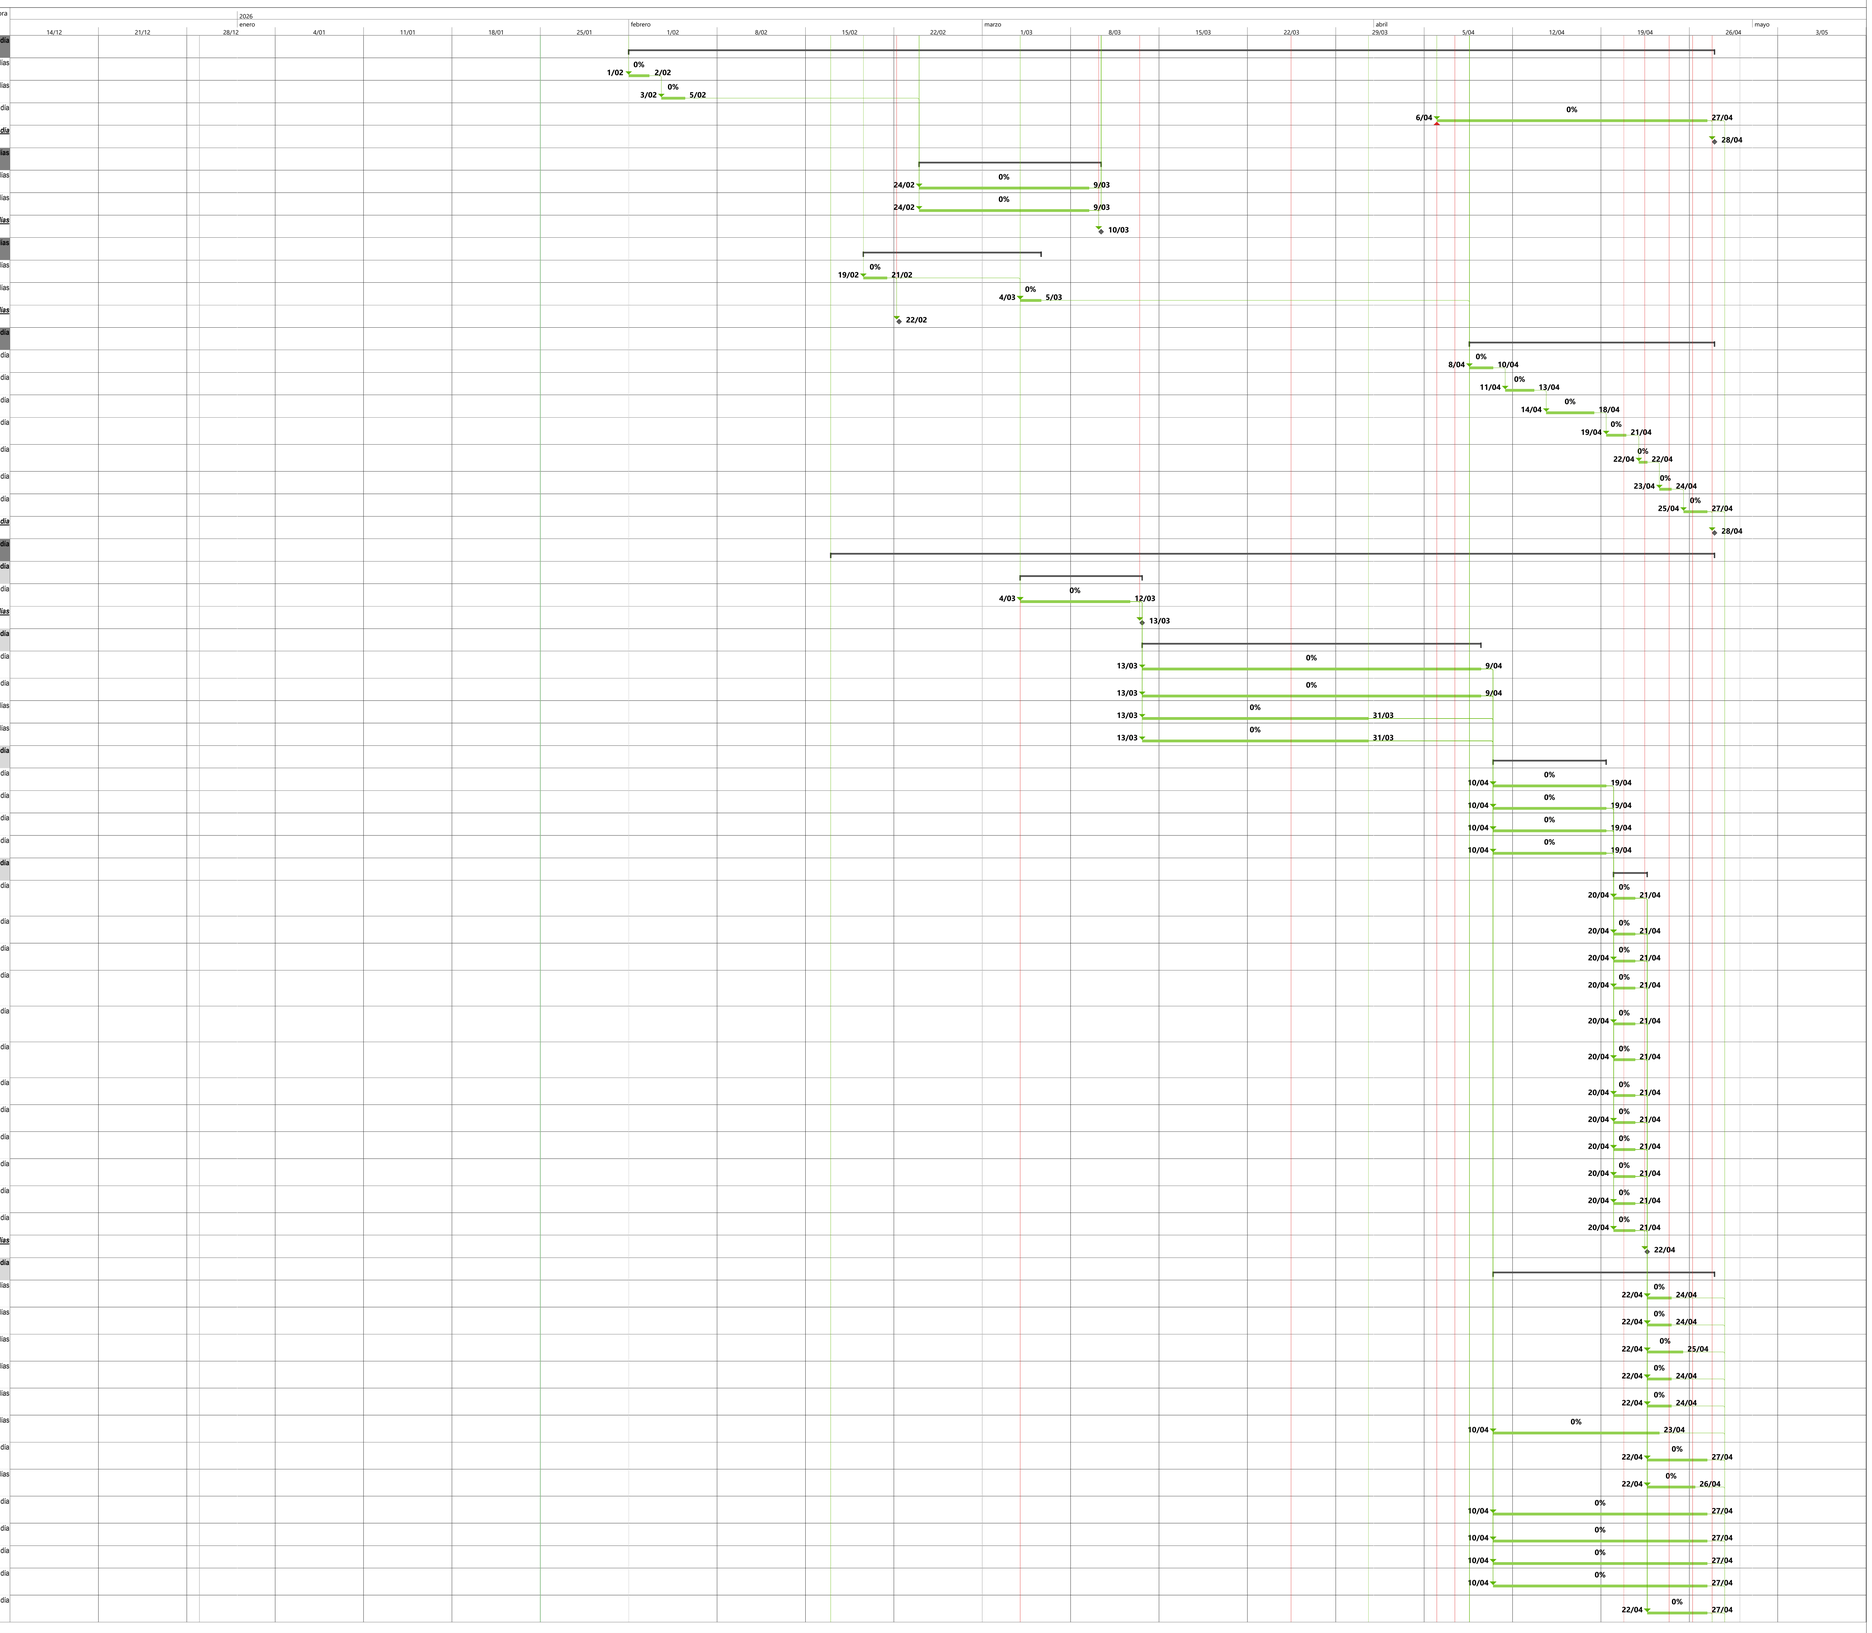

JOHAN A. MONSALVE H.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CUBINGECOL

Cubingecol

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Limite de comienzo	Limite de finalización	Demora permisible	Margen de demora total
134		***ENTREGA DE ILUMINACIÓN INTERNA***	***0 días***	***mar 28/04/26***	***mar 28/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***1 día***	***1 día***
135		**11.6 SISTEMA DE CANALIZACIONES TUBERÍAS**	**60 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 11/04/26**	**0%**	**$ 32.460.460,00**	**jue 19/02/26**	**lun 13/04/26**	**3 días**	**3 días**
136		11.6.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" VER ANEXO TECNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 3.679.356,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
137		11.6.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TECNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 3.654.915,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
138		11.6.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" VER ANEXO TECNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 412.769,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
139		11.6.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" VER ANEXO TECNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 601.440,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
140		11.6.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1", tapa y empaque, circuitos de distribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación).	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 553.036,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
141		11.6.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL VER ANEXO TÉCNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 689.208,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
142		11.6.7 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible VER ANEXO TÉCNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 1.392.440,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
143		11.6.8 Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 VER ANEXO TÉCNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 4.180.060,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
144		11.6.9 Suministro e instalación de canaleta plástica VER ANEXO TÉCNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 1.509.508,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
145		11.6.10 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de accesorios salida cable bandeja Cablofil; VER ANEXO TÉCNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 247.728,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
146		11.6.11 Suministro de materiales y mano de obra para montaje e instalación de bandeja portacables electrozincada de 30 x 5,4 cm VER ANEXO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 12.582.540,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
147		11.6.12 Suministro de materiales y mano de obra para montaje e instalación de tapa para bandeja portacables VER ANEXO TÉCNICO	60 días	mar 17/02/26	sáb 11/04/26	0%	$ 2.957.460,00	jue 19/02/26	lun 13/04/26	0 días	3 días
148		**11.7 SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR**	**16 días**	**dom 12/04/26**	**dom 26/04/26**	**0%**	**$ 21.642.681,00**	**mar 14/04/26**	**mié 29/04/26**	**3 días**	**3 días**
149		11.7.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 4.261.152,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
150		11.7.2 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoelectrico VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 3.561.054,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
151		11.7.3 Suministro e Instalación de Sensor doble VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 3.662.100,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
152		11.7.4 Suministro e Instalación de Strobo multicandela VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 1.008.183,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
153		11.7.5 Suministro e Instalación de Estación Manual; VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 2.564.418,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
154		11.7.6 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 300.990,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
155		11.7.7 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 909.900,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
156		11.7.8 Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente . VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 1.384.888,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
157		11.7.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para elementos activos del sistema, VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 437.844,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
158		11.7.10 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 1.476.776,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
159		11.7.11 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	15 días	dom 12/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 2.075.376,00	mar 14/04/26	mar 28/04/26	0 días	3 días
160		***ENTREGA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD***	***0 días***	***dom 26/04/26***	***dom 26/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***3 días***	***3 días***
161		**11.8 SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA**	**62 días**	**mié 4/03/26**	**mar 28/04/26**	**0%**	**$ 542.424.881,00**	**mié 4/03/26**	**mié 29/04/26**	**0 días**	**0 días**
162		**11.8.1 PROCESAMIENTO TOXICOLOGIA**	**58 días**	**mié 4/03/26**	**vie 24/04/26**	**0%**	**$ 256.777.593,00**	**mié 4/03/26**	**mié 29/04/26**	**0 días**	**0 días**
163		11.8.1.1 Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de 48,000 BTU VER ANEXO	17 días	mié 8/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 53.194.634,00	lun 13/04/26	mar 28/04/26	0 días	5 días
164		***ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TOXICOLOGÍA***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***5 días***	***5 días***
165		11.8.1.2 Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida del ventilador VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 25/03/26	mar 31/03/26	0%	$ 2.106.340,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	31 días	31 días
166		11.8.1.3 Ducto TDC CALIBRE 22 VER ANEXO TÉCNICO	30 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	0%	$ 77.924.385,00	mié 4/03/26	lun 30/03/26	0 días	0 días
167		11.8.1.4 Ducto TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	30 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	0%	$ 32.449.869,00	jue 5/03/26	mar 31/03/26	0 días	1 día
168		11.8.1.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 VER ANEXO TÉCNICO	21 días	jue 12/03/26	lun 30/03/26	0%	$ 25.886.016,00	jue 9/04/26	mar 28/04/26	32 días	32 días
169		11.8.1.6 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	21 días	jue 12/03/26	lun 30/03/26	0%	$ 24.728.355,00	vie 13/03/26	mar 31/03/26	0 días	1 día
170		11.8.1.7 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	17 días	mié 8/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 745.704,00	lun 13/04/26	mar 28/04/26	0 días	5 días
171		11.8.1.8 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12X14 VER ANEXO TÉCNICO	10 días	mié 8/04/26	vie 17/04/26	0%	$ 638.040,00	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	0 días	3 días
172		11.8.1.9 Rejilla para toma de aire 12X14 pulgadas, VER ANEXO TÉCNICO	10 días	mié 8/04/26	vie 17/04/26	0%	$ 528.304,00	dom 19/04/26	mar 28/04/26	12 días	12 días
173		11.8.1.10 Rejilla difusora 4 vias de aire 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 8/04/26	mar 14/04/26	0%	$ 1.132.392,00	sáb 18/04/26	vie 24/04/26	0 días	11 días
174		11.8.1.11 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mié 15/04/26	sáb 18/04/26	0%	$ 3.623.730,00	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	11 días	11 días
175		11.8.1.12 Tablero fuerza y control tipo intemperie VER ANEXO TÉCNICO	30 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	0%	$ 33.819.624,00	mié 1/04/26	mar 28/04/26	32 días	32 días
176		***ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS TOXICOLOGÍA***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***5 días***	***5 días***
177		**11.8.2 AREA INSTRUMENTAL**	**13 días**	**mar 14/04/26**	**dom 26/04/26**	**0%**	**$ 71.364.761,00**	**dom 19/04/26**	**mié 29/04/26**	**3 días**	**3 días**
178		11.8.2.1 Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de 60,000 BTU VER ANEXO	10 días	mar 14/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 68.149.397,00	dom 19/04/26	mar 28/04/26	0 días	5 días
179		***ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***5 días***	***5 días***
180		11.8.2.2 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12X10 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 832.191,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
181		11.8.2.3 Dampers regulación de caudal en la ductería de 14X14 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 344.221,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
182		11.8.2.4 Rejilla para toma de aire 14X14 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 638.804,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
183		11.8.2.5 Rejilla difusora 4 vias de aire 10X12 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 1.400.148,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	0 días	3 días
184		***ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS INSTRUMENTAL***	***0 días***	***dom 26/04/26***	***dom 26/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***3 días***	***3 días***
185		**11.8.3 PROCESAMIENTO ESTUPEFACIENTES**	**9 días**	**sáb 18/04/26**	**dom 26/04/26**	**0%**	**$ 59.402.595,00**	**mar 21/04/26**	**mié 29/04/26**	**3 días**	**3 días**
186		11.8.3.1 Suministro e instalacion de Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared,con capacidad de 36,000 BTU VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 57.325.199,00	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	0 días	5 días
187		***ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ESTUPEFACIENTES***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***5 días***	***5 días***
188		11.8.3.2 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12X12 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 286.394,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
189		11.8.3.3 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 497.136,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
190		11.8.3.4 Rejilla para toma de aire 12X12 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 444.572,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	3 días	3 días
191		11.8.3.5 Rejilla difusora 4 vias de aire 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 849.294,00	mar 21/04/26	mar 28/04/26	0 días	3 días
192		***ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS ESTUPEFACIENTES***	***0 días***	***dom 26/04/26***	***dom 26/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***3 días***	***3 días***
193		**11.8.4 SISTEMA DE EXTRACCION TOXICOLOGIA, INSTRUMENTAL Y ESTUPEFACIENTES**	**27 días**	**mar 31/03/26**	**vie 24/04/26**	**0%**	**$ 67.206.555,00**	**jue 9/04/26**	**mié 29/04/26**	**5 días**	**5 días**
194		11.8.4.1 Sistema de ventilacion mecanica (extracción), VER ANEXO TÉCNICO	10 días	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	0%	$ 33.600.928,00	dom 19/04/26	mar 28/04/26	0 días	9 días
195		***ENTREGA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN LABORATORIOS***	***0 días***	***mar 21/04/26***	***mar 21/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***9 días***	***9 días***
196		11.8.4.2 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 VER ANEXO TÉCNICO	21 días	mar 31/03/26	dom 19/04/26	0%	$ 25.639.740,00	jue 9/04/26	mar 28/04/26	10 días	10 días
197		11.8.4.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	21 días	mar 31/03/26	dom 19/04/26	0%	$ 4.797.927,00	jue 9/04/26	mar 28/04/26	10 días	10 días
198		11.8.4.4 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X12 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 277.397,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días

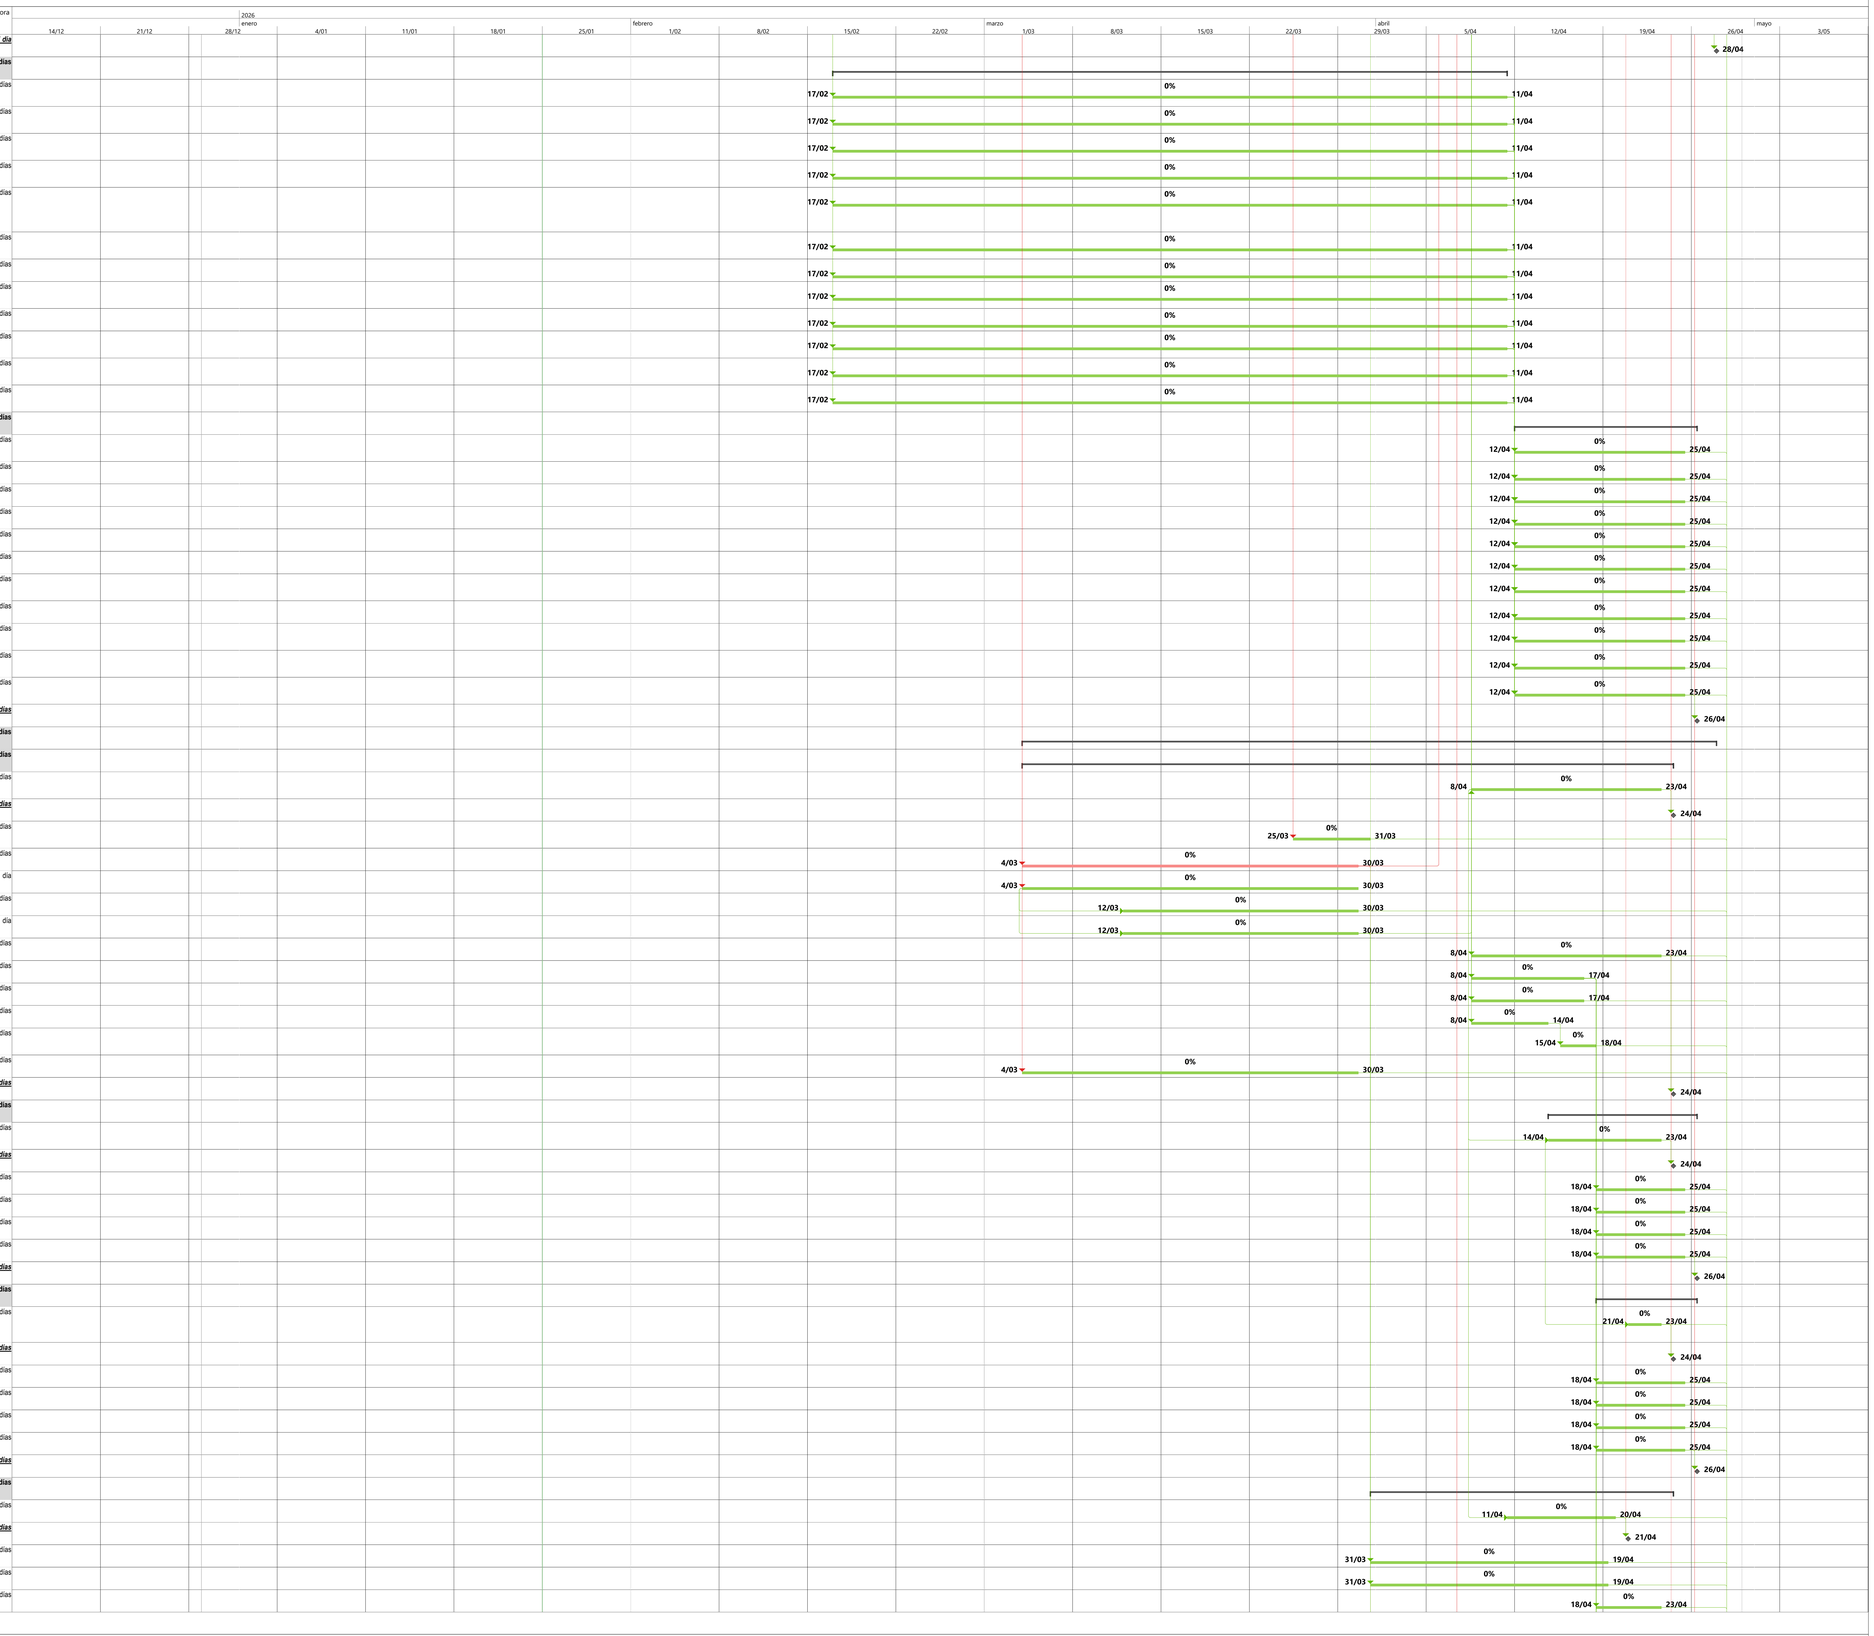

Proyecto: Calendario Base Pere
Fecha: dom 25/01/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

JOHAN A. MONSALVE H.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CUBINGECOL

Cubingecol

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Costo	Límite de comienzo	Límite de finalización	Demora permisible	Margen de demora total
199		11.8.4.5 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 745.704,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días
200		11.8.4.6 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X8 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 369.369,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días
201		11.8.4.7 Rejilla para toma de aire 10X12 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 419.546,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días
202		11.8.4.8 Rejilla para toma de aire 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 539.766,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días
203		11.8.4.9 Rejilla para toma de aire 10X8 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 529.490,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	5 días	5 días
204		11.8.4.10 Rejilla para toma de aire 8X8 VER ANEXO TÉCNICO	6 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	0%	$ 286.688,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	0 días	5 días
205		***ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS LABORATORIOS***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***5 días***	***5 días***
206		**11.8.5 AIRES ACONDICIONADOS**	**8 días**	**mar 31/03/26**	**mar 7/04/26**	**0%**	**$ 32.484.048,00**	**mié 22/04/26**	**mié 29/04/26**	**24 días**	**24 días**
207		11.8.5.1 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	0%	$ 3.107.139,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	24 días	24 días
208		11.8.5.2 Desmonte, retiro y reinstalación de sistema de aire acondicionado minisplit 12000 BTU/18000 BTU/3600 BTU/. VER ANEXO	7 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	0%	$ 29.376.909,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	0 días	24 días
209		***ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL***	***0 días***	***mar 7/04/26***	***mar 7/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***mié 29/04/26***	***mié 29/04/26***	***24 días***	***24 días***
210		**11.8.6 SISTEMAS DE EXTRACCIÓN CABINAS**	**31 días**	**mar 31/03/26**	**mar 28/04/26**	**0%**	**$ 42.439.313,00**	**mar 31/03/26**	**mar 28/04/26**	**0 días**	**0 días**
211		11.8.6.1 Suministro de materiales y mano de obra para el desmonte de motor ventilador VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	0%	$ 12.633.528,00	mar 31/03/26	lun 6/04/26	0 días	0 días
212		11.8.6.2 Ducto de 10 pulgadas de diámetro en fibra de vidrio VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mar 7/04/26	lun 13/04/26	0%	$ 22.498.020,00	mar 7/04/26	lun 13/04/26	0 días	0 días
213		11.8.6.3 Codo 90° de 10 pulgadas de diámetro en fibra de vidrio VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mar 14/04/26	mar 21/04/26	0%	$ 5.570.080,00	mar 14/04/26	mar 21/04/26	0 días	0 días
214		11.8.6.4 Reducción para ducto de 10 pulgadas VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	0%	$ 1.737.685,00	mié 22/04/26	mar 28/04/26	0 días	0 días
215		**11.8.7 UNIDADES EXTRACTORAS LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA**	**29 días**	**mar 31/03/26**	**dom 26/04/26**	**0%**	**$ 12.750.016,00**	**mié 1/04/26**	**lun 27/04/26**	**1 día**	**1 día**
216		11.8.7.1 Desmonte , retiro y Reinstalación de Sistema de extracción de aire existente del laboratorio de toxicologia. VER ANEXO	7 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	0%	$ 4.220.368,00	mié 1/04/26	mar 7/04/26	0 días	1 día
217		11.8.7.2 Ducto o figura TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	20 días	mar 7/04/26	sáb 25/04/26	0%	$ 8.529.648,00	mié 8/04/26	dom 26/04/26	0 días	1 día
218		***ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL***	***0 días***	***dom 26/04/26***	***dom 26/04/26***	***0%***	***$ 0,00***	***lun 27/04/26***	***lun 27/04/26***	***1 día***	***1 día***
219		Fin del proyecto	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26	0%	$ 0,00	mié 29/04/26	mié 29/04/26	0 días	0 días



Proyecto: Calendario Base Pere
Fecha: dom 25/01/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

JOHAN A. MONSALVE H.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CUBINGECOL
