FECHA D/M/A: 02-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4,83 TON

ZONA: TRES

COMUNA: 12 OCTUBRE

BARRIO: LA ESPERANZA

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00AM

TERMINACION: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL SOBRE LA CL97 ENTRE CR72 Y CR72A, CON UN CONTROL DEL TRAFICO VEHICULAR DE LA AUXILIAR, SE ENCONTRO BACHE UNO A INTERVENIR CUBIERTO DE MATERIAL ANTROPICO COMO TEJA DE ASBESTO CEMENTO, PLASTICOS DE USO DIARIO, MADERA Y ELEMENTOS COMO MALETAS, TELERAS; LOS CUALES FUERON ACOPIADOS Y ADECUADAMENTE SEÑALIZADOS COMO SE APRECIA EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO. SE REALIZA PERFILADO DEL BACHE UNO QUE FUE LLENADO CON ANTERIORIDAD POR UN TERCERO, IDENTIFICANDO QUE ESTE NO SE REALIZO TECNICAMENTE; YA QUE SE APRECIA SOCAVACION HACIA EL ANDEN Y HACIA MANUBRIO QUEDANDO EN EVIDENCIA QUE EL ORIGEN QUE GENERO DICHA INTERVENCION NO FUE SOLUCIONADA POR LO QUE LA PAVIMENTACION NO CONSTITUYE LA SOLUCION AL PROBLEMA DE FONDO, MAS BIEN ES UNA MEDIDA PROVICIONAL PARA FALLAR QUE ESTE SE ASEVERE. A LO ANTERIOR SE PROCEDE A CONFORMAR Y COMPACTAR EL SUSTRATO Y REALIZANDO LLANOS CON BASE TRASLADADO DEL BACHE DOS Y MEJORAR EN ALGO LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUSTRATO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Caballero	John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA GOMEZ	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA		X	
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MORA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELFIN RUIZ	X		
30	ANX VIAL	LENNY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HYSQUARNA LP 65001	X		
2	Compresor	INGERSOLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMU 677 INTERNACIONAL	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: CERO	CANTIDAD: 4183 TON
ZONA: TRES	FRENTE DE TRABAJO: 2
COMUNA: 12 OCTUBRE	
BARRIO: LA ESPERANZA	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	———
TERMINACIÓN: 3:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA (S05) DE LOS BACHES DOS Y TRES TRANSCURREN CON NORMALIDAD.

Se deja por escrito que el contratista no se hace responsable de la calidad y garantías a futuro del pavimento, ya que se evidencia en el registro fotografico que el terreno se encuentra con socavacion.

Se deja escombros acopiados y señalizados en la dirección los cuales se encontraron al inicio de jornada los cuales no pertenecen al contratista.

5. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos	John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Camilo Restrepo	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5006989	167223	1	CL 97 72-36	2,75	2,47	0,11	6,79	0,75	1,79
5006988	167224	2	CL 97 72A	2,54	2,10	0,185	5,33	0,99	2,37
5006989	167225	3	CL 97 72-17	1,41	1,52	0,13	2,14	0,28	0,67
TOTALES							14,27	2,01	4,83

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236724	SMV677	4,83	4,83	141	25339	SMV 677	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02-03-2026

10. ESQUEMAS

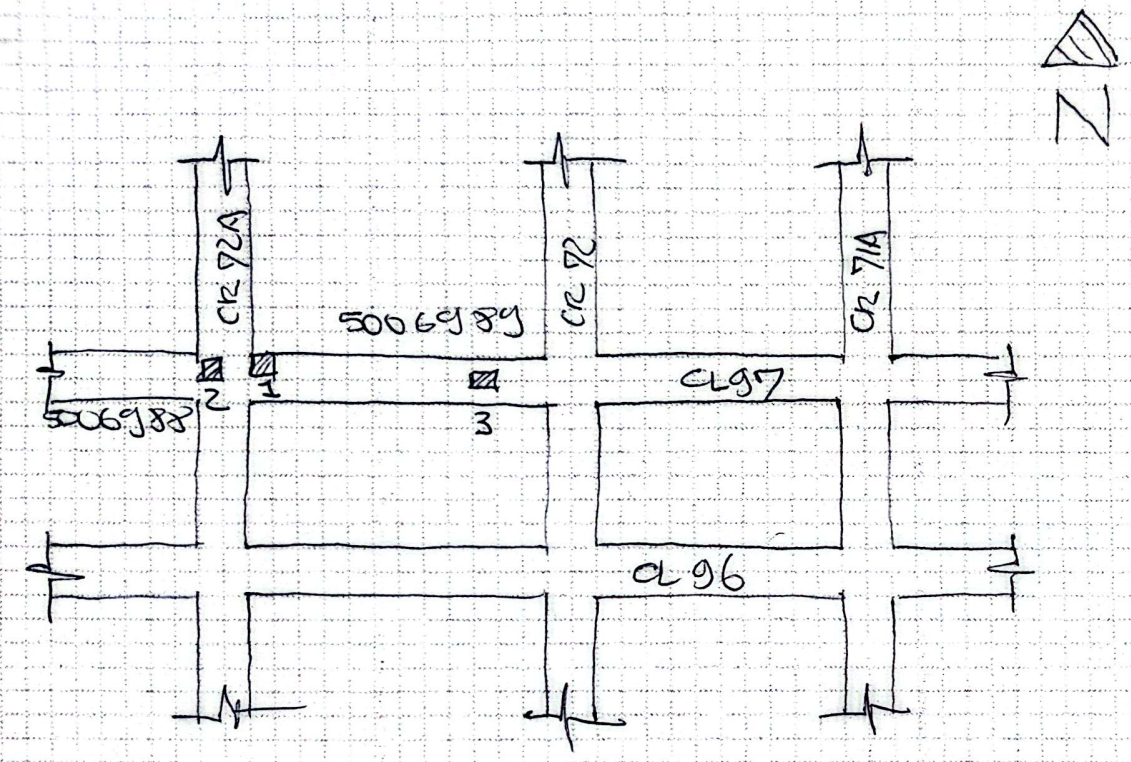

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4183TON ✓
BARRIO	LA ESPERANZA	DIRECCIÓN	CL97 ENTRE CR 72 Y CR 72A

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 236724

FECHA: 02/03/2026

HORA: 9:15:02 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SHV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.49 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25339**

PROVEEDOR: Fiente 2. Vial Med

VALE POR UN VIAJE: Escombros

02-03-2026

PLACA No: SHV 677 CAPACIDAD: 7 M3

PROCOPAL S.A.

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

03 MAR 2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHOS . BASCULA

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
