FECHA (D/M/A): 03-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: C (ROC) | CANTIDAD:

ZONA: DOS

COMUNA: CASTILLA

BARRIO: BELALCAZAR/TRICENTENARIO

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 9:00AM
TERMINACIÓN: 1:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO
TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN EL SEGMENTO 500 69 SH EN ZONA DE LINEA RECTA CON USUAL SIN GENERAR MAYORES COMPLICACIONES PARA EL TRAFICO VEHICULAR. SE INTERVIENEN BACHES UNO, DOS Y TRES DE FORMA PUNTUAL, EL BACHE CUATRO SE ENCONTRO INUNDIMIANDO DE VIA; SE REALIZA LA RESPECTIVA NIVELACIÓN TENIENDO QUE LAS ACOMETIDAS FUERON REPARADAS, COMO HIZO MUCHO DE INVESTIGACIÓN Y DE PARTE DE NOSOTROS SE REALIZA APIQUE DESCARTANDO ALGÚN FALLO POR LO QUE SE PROCEDE A NIVELAR DICHO INUNDIMIANTO.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Soraimy Andrea Ceballos	John Ruben
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Carlos Rodriguez G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	NIA			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	NIA			
6	Ayudante	SIMON URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RUIZ	X		
8	Ayudante	JAIME CAROLINA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	NIA			
12	Ayudante	NIA			
13	Ayudante	NIA			
14	Ayudante	NIA			
15	Ayudante	NIA			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE			
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MUÑA			
18	Operador fresadora	NIA			
19	Operador finisher	NIA			
20	Operador Retroexcavadora	NIA			
21	Operador Vibrocompactador	NIA			
22	Operador Compactador llantas	NIA			
23	Operador Cortador Asfalto	NIA			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	NIA			
26	Operador Barredora	NIA			
27	Coductor Carrotanque	NIA			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 65001			
2	Compresor	INGERSOLL RAND			
3	Fresadora	NIA			
4	Finisher	NIA			
5	Retroexcavadora	NIA			
6	Vibrocompactador	NIA			
7	Compactador llantas	NIA			
8	Cortador Asfalto	NIA			
9	Equipo Imprimación	MARCOSA MARMIX			
10	Placa vibratoria	FECAM F-30			
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	NIA			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET			
16	Volqueta(s)	SMV			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5006954	167245	1	CR 64 96A-320	1,65	1,14	0,12	1,88	0,23	0,541
5006954	114260	2	CR 64 96A -384	1,80	1,48	0,12	2,66	0,32	0,77
5006954	139893	3	CR 64 96A -408	1,50	1,42	0,05	2,13	0,11	0,26
5006926	167247	4	CR 63F 103-47	5,60	3,74	0,065	20,924	1,36	3,27
TOTALES							27,67	2,01	4,84

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236745	SMV677	4,84	4,84	140	25340	SMV 677	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-03-2026

10. ESQUEMAS

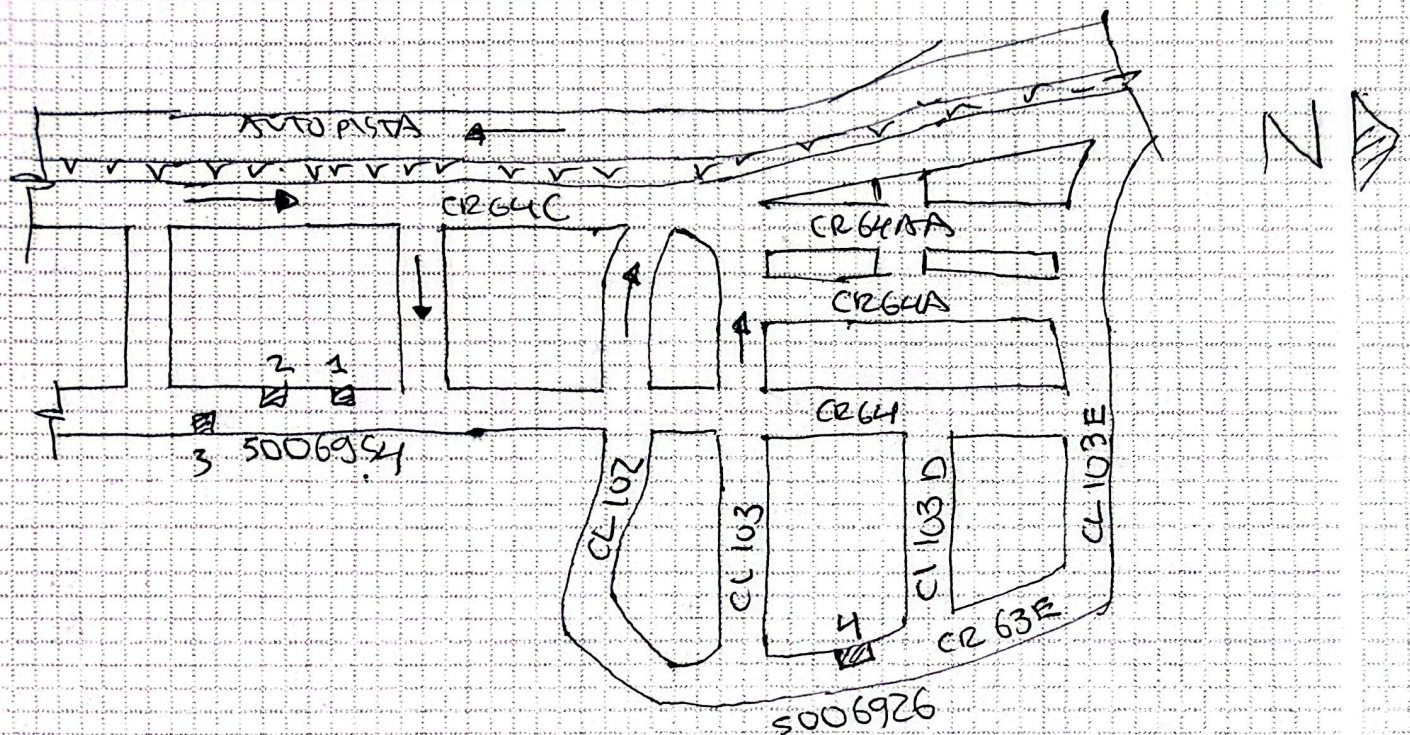

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,84 TON
BARRIO	TRICENTENARIO DE LA CAZAR	DIRECCIÓN	CR 63E 103-40 CR 64 96A

Powered by CamScanner

EST Y PAVIMOS

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

DESPACHOS-BASCULA

Jonathan

TIQUETE DE BASCULA: 236745

FECHA: 03/03/2026

HORA: 9:02:50 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.29 Tonnes

PESO TARA: 7.45 Tonnes

PESO NETO: 4.84 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.84 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 25340**

PROVEEDOR: Frente 2. Vial Incol

VALE POR UN VIAJE: Excombios

03-03-2026

PLACA No: SMV677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.

04 MAR 2026

DESPACHOS-BASCULA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Jeremy C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
