FECHA (D/M/A): 05-03-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO:	CERO
CANTIDAD:	4,82 TON
ZONA	CORREGIMIENTO
COMUNA	SAN CRISTOBAL
BARRIO	ÁREA DE EXPANSIÓN PABELLÓN
FRENTE DE TRABAJO:	2

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00AM	
TERMINACIÓN: 1:30PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: DESPEJADO
	TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE IDENTIFICAN SEIS BACHES EN LA VÍA LLAMADA ANTIGUA VÍA AL MAR QUE REQUIEREN SER INTERVENIDOS QUE SON LA EVOLUCIÓN DE UNA PATOLOGIA EN PIEL DE COCODRILO A BACHES, LOS CUALES SE INTERVIENEN SOLO DOS DEBIDO QUE EL BACHE NOS REGISTRO UN SOBRE ESPESOR QUE NO PERMITIO A REALIZAR EL TERCER BACHE. LOS BACHES INTERVENIDOS INVOLUCRA PATOLOGIA ASOCIADA QUE PERMITA UNA MAYOR ESTABILIDAD DEL BACHE Y QUE NO SE INICIE LA GENERACIÓN DE UNO CONTIGUO AL EJECUTADO.

LOS BACHES PENDIENTES SE INTERVENDRAN EL DÍA LUNES 09-03-2026 O EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA TRANSCURREN CON NORMALIDAD.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Jeremy Andrey C6	NOMBRE: John Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBARO ANTONIO MURA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	(F1) ELKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LENNY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQUARNA LP 65VDL	X		
2	Compresor	INGERSOLLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECUM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	STP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 677	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001531	169302	1A	CL 63 98b-120	2,67	1,66	0,11	4,43	0,49	1,17
2001531	169302	1B	CL 63 98b-120	0,95	1,22	0,11	1,16	0,13	0,31
2001531	169303	2A	CL 63 98b-10	2,24	2,50	0,17	5,60	0,95	2,28
2001531	169303	2B	CL 63 98b-10	1,27	2,05	0,17	2,60	0,44	1,06
TOTALES							13,79	2,01	4,82

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236813	SMV677	4,82	4,82	142	25342	SMV677	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-03-2026

10. ESQUEMAS

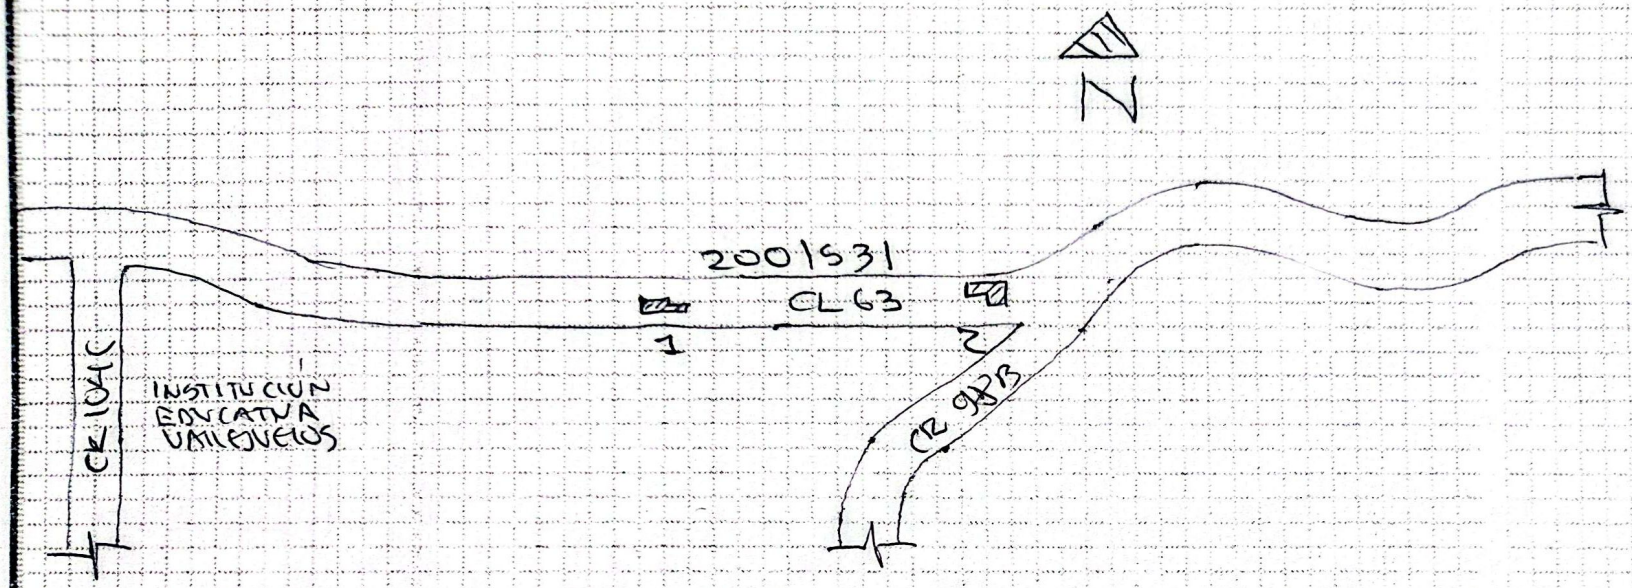

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,82 TON
BARRIO	AREA DE EXPANSIÓN PAJARITO	DIRECCIÓN	CL 63 ENTRE CR 98B Y CR 104C

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236813

FECHA: 05/03/2026

HORA: 8:43:46 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SHV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 12.33 Tonnes

PESO TARA: 7.51 Tonnes

PESO NETO: 4.82 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.82 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25342

PROVEEDOR: Frcn 2. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

05-02-2026

PLACA No: SHV 677

CAPACIDAD 7 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.

RECIBIDO POR: 06 MAR 2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHOS - BASCULA

Jorny C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
