FECHA (D/M/A): 06-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4,87 TON

ZONA: TRES

COMUNA: LA CANDELARIA

BARRIO: LA CANDELARIA

FRENTE DE TRABAJO: DOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 PM

TERMINACIÓN: 4:30 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE INICIAL DE DOS CARRILES SOBRE LA AV COLOMBIA PERMITIENDO EL PASO POR LOS OTROS DOS CARRILES Y A MEDIDA QUE SE AVANZARA CON EL EMPALME SE CERRABA HASTA EL TERCER CARRIL Y LUEGO NOS CAMBIAMOS DE CARRIL CON TODA LA SEÑALIZACIÓN

SE ENCONTRO EMPALME DEL PAVIMENTO CON LA LLAVE DEL BOMBILLANO DETERIORADO POR LO QUE SE DABIA INTERVENIR EL MISMO DE TODA LA CALZADA. SE ENCONTRO DEFORMIDAD A LADO Y LADO DEL EMPALME PERMITIENDO LA ACUMULACIÓN DE AGUA SIN UNA SALIDA FACILITANDO EL DETERIORO DEL ADUCTO PREVIAMENTE INSTALADO POR LO QUE SE ADOPTA EN LA MISMA SENTIDO VEHICULAR UNA CUNETA EN PAVIMENTO PARA FACILITAR LA SALIDA DE AGUA, EN LA MARGEN DERECHA SE TIENE MIL AGUAS LLEGAN A UN NIVEL SUPERIOR DE 3CM POR LO QUE SE SUGIERE UN SUMIDERO PARA EVACUAR EL AGUA, SIN EMBARGO SE MITIGA LA SITUACIÓN Y SE REDUCE EL ENCHARCAMIENTO, SIENDO MENOS VISIBLE

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrea Ceballos (Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA)	NOMBRE: John Rivera (Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA)	NOMBRE: (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR)

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	TAUBO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MANDUCA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTONIO MORA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSURIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELKIN RUIZ	X		
30	AUX VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LP 65001	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMV 677	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-03-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000656	167335	1A	CL 50 52-07	13,87	1	0,121	13,87	1,68	4,03
2000656	167335	1B	CL 50 52-07	9,16	0,30	0,121	2,88	0,35	0,84
TOTALES							16,75	2,03	4,87

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
537530	SMW 697	4,87	4,87	146	25343	SMW 697	SENCILLA	1	PAVIMENTAR

Powered by CamScanner

10. ESQUEMAS

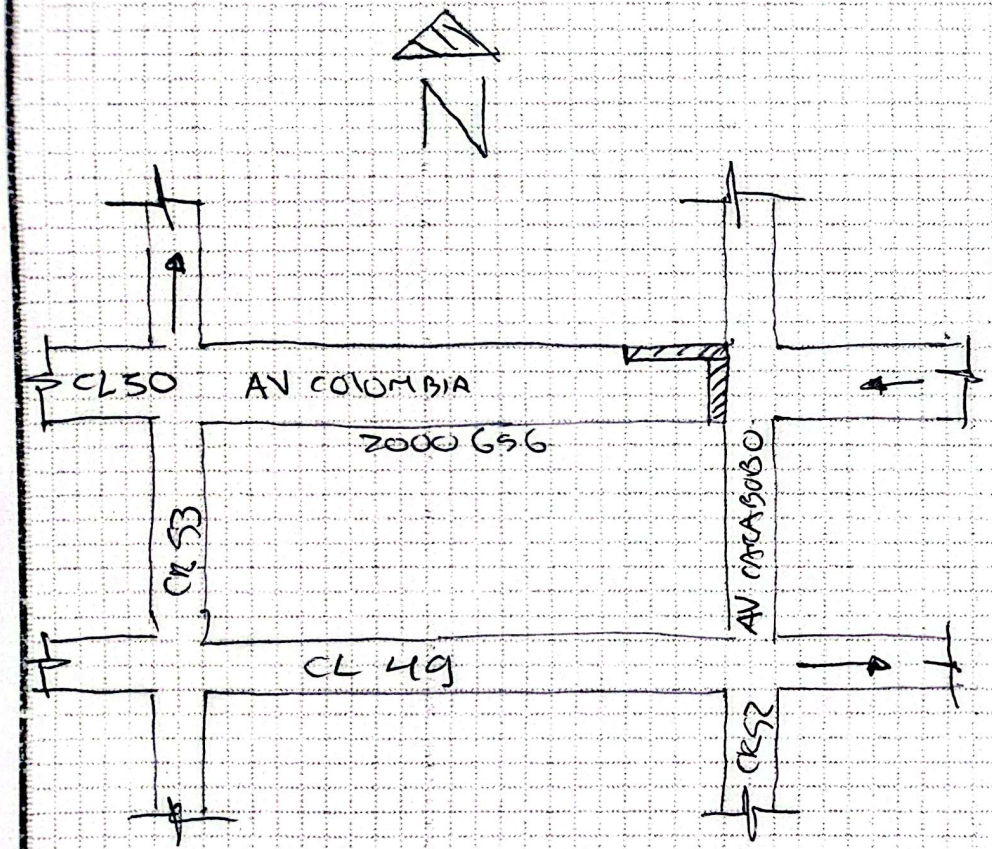

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS.
RANGO:	CERO	CANTIDAD:	4,87 TON.
BARRIO	LA CANDELARIA	DIRECCIÓN	C150 ENTRE CR 52 Y CR 53

Powered by CamScanner

20260306 21:08

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537530
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 4,87 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:12.150,00

ENTRADA: 06 mar 2026 - 09:22 p.
SALIDA: 06 mar 2026 - 09:22 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260309 06:56

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 25343
PLACA: SNV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003594 SUM-2059- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2050
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 09 mar 2026 - 07:14 a.
SALIDA: 09 mar 2026 - 07:14 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 13230
Peso tara : 7280
Peso neto : 5950

Powered by CamScanner
