FECHA (D/M/A): 09-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIGNTO PUNTUAL

RANGO: CERO

CANTIDAD: 4,85TON

ZONA: CORREGIMIENTO

COMUNA: SAN CRISTOBAL

BARRIO: ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO.

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00AM

TERMINACIÓN: 2:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL SOBRE LA CL 63 COSTADO SUR SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE CON CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR CON AYUDA DE DOS AUX DE TRANSITO.

SE INTERVIENE BACHE UNO EL CUAL ESTABA CUBIERTO DE TIERRA YA QUE LA GENTE REALIZABA EL HUECO PARA MITIGAR EL RIESGO ADICIONAL CORRESPONDE A UN TRABAJO HECHO POR OTRA ENTIDAD EL CUAL A LA FECHA NO HABIA PAVIMENTADO, EL CUAL SE EJECUTA CON EL PRESENTE CONTRATO POR EL RIESGO LATENTE QUE CONSTITUYA PARA LOS ACTORES VIALES. ESTE BACHE SE ENCONTRO SOBRE FRESURAS YA QUE SE TUVO QUE RETIRAR EL MATERIAL CONTAMINADO Y PAVIMENTAR SOBRE UNA BASE FIRME.

EL BACHE DOS SE INTERVIENE PRIMERO CADA YA QUE LA OTRA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y BACHE MES SE INTERVIENE ZONA CARGUE DE PAVIMENTO QUE CORRESPONDIA A UNA ANTIGUA ACOMETIDA REALIZADA Y QUE POR SUS DIMENSIONES MASIVAS CONSTITUYA UN RIESGO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andrey Ceballos	John Fredy Rivera
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Jose Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	SORANY ANDREA CEBALLOS	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
4	Rastrillero	JUAN HUMBERTO LONDOÑO	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	SIMÓN URAN JARAMILLO	X		
7	Ayudante	HUGO RIOS	X		
8	Ayudante	JAIME CARDONA	X		
9	Ayudante	FELIPE ARBOLEDA	X		
10	Ayudante	ALBEIRO SUAREZ MENDOZA	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JAIME GABRIEL AGUIRRE	X		
17	Operador compresor	ALBEIRO ANTUNO MURA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	LEIDER PADILLA OSORIO	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	WILLIAN COLORADO	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ELKIN RUIZ	X		
30	APP VIAL	LEIDY USUGA	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	INGERSOLLRAND LP 6500	X		
2	Compresor	INGERSOLLRAND	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM F-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	SZP 329 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	SMU 629	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001535	167377	1A	CL 63 98b -473	1,10	1,07	0,185	1,18	0,22	0,52
2001535	167377	1B	CL 63 98b -473	4,05	1,15	0,185	4,66	0,86	2,07
2001534	167378	2	CL 63 98b - 423	5,00	2,05	0,06	10,25	0,62	1,48
2001534	167379	3	CL 63 98b - 250	1,12	2,42	0,12	2,71	0,33	0,78
TOTALES							18,79	2,07	4,85

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236877	SMV677	4,85	4,85	140	253444	SMV677	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-03-2026

10. ESQUEMAS

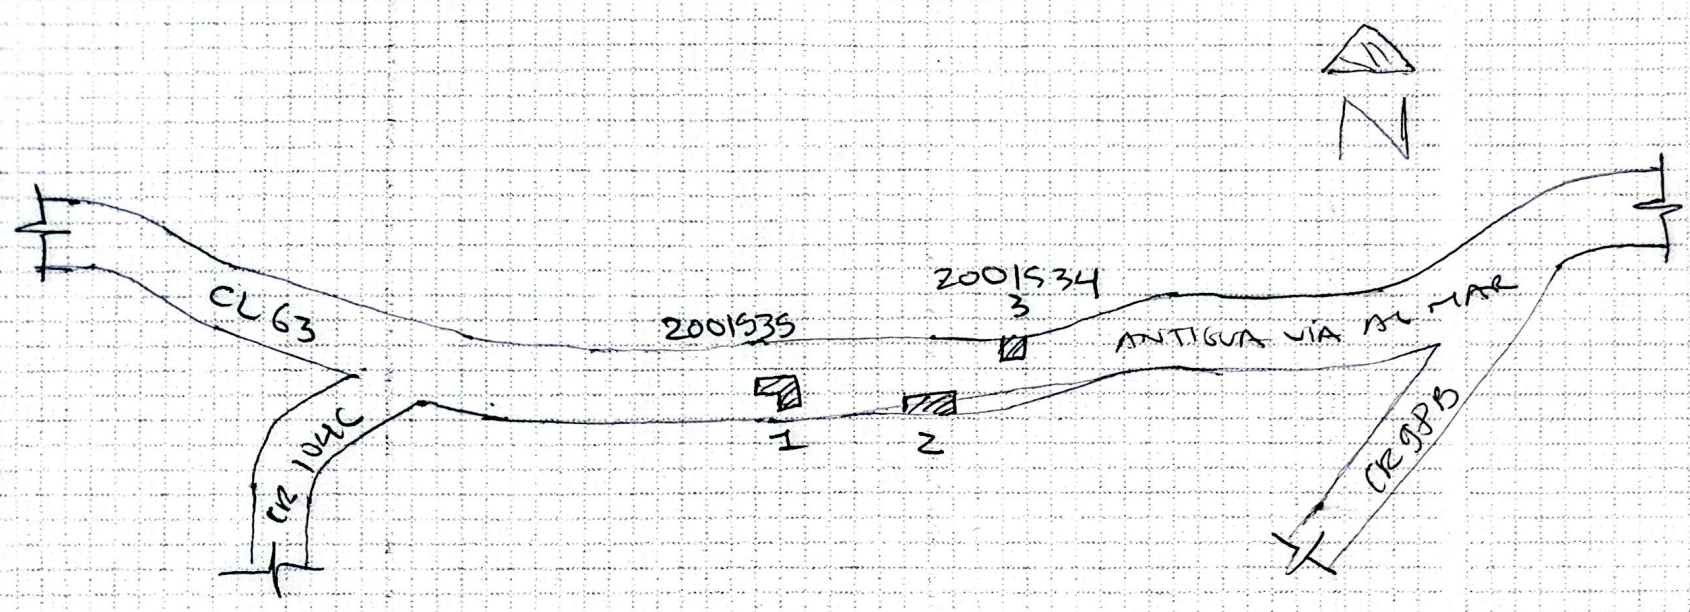

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	DOS
RANGO:	CERO.	CANTIDAD:	4 BACHES
BARRIO	ÁREA DE EXPANSIÓN PARRILLO	DIRECCIÓN	CL 63 98B 250 HASTA 473

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 226872

FECHA: 09/03/2026

HORA: 8:21:36 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMINISTRO ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 8909043209

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.47 Tonnes

PESO NETO: 4.85 Tonnes

PRODUCTO:

REZ. DENSA TIPIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.85 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25344

PROVEEDOR: Frente 2. Vialmey

VALE POR UN VIAJE: Escombros

09-03-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: PROCOPAL S.A. M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

10 MAR 2026

DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
