FECHA (D/M/A): 10-03-2026

# BITACORA DE OBRA

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): | MANTENIMIENTO PUNTUAL |
| RANGO: CERO | CANTIDAD: 4 TONELADAS |
| ZONA: CINCO | FRENTE DE TRABAJO: DOS |
| COMUNA: EL POBLADO | |
| BARRIO: VILLA CARLOTA | |

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

## 2. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 | CONTRATO No. 4600105052 DE 2025 |
| INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 | CONTRATO No. 4600105322 DE 2025 |

| | |
|---|---|
| HORARIO DE LABORES: | JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: |
| INICIO: 7:00 AM | ——— |
| TERMINACIÓN: 2:00 PM | |

## 3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CL76A ENTRE LAS VEGAS Y AV REGIONAL PERMITIENDO EL FLUJO VEHICULAR POR EL OTRO CARRIL GENERANDO UN AUMENTO IMPORTANTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS EN LA ZONA AFECTANDO LA AV REGIONAL, EL CUAL SE LOGRA ATENDER ANTES DEL MEDIO DÍA REDUCIENDO LA AFECTACIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA. SE INTERVIENE BACHE EN EL PUNTO QUE CONSTITUYA UN RIESGO INMINENTE PARA LOS ACTORES VIALES.

SE REALIZA TRASLADO HACIA LA CL9SUR AL LADO DEL CENTRO COMERCIAL SANTAFE PARA ATENDER BACHE INMERSO EN PVM DE COCODRILO EL CUAL SE CONVIRTIO EN MEDIATICO Y FUE NECESARIO UNA INTERVENCIÓN SUPERIOR A LA DE UNA MITIGACIÓN.

LA MEZCLA DE LA PLANTA DE PROCOPAL PRESENTO POCA TRABAJABILIDAD DEBIDO A QUE ESTABA MAS AGLUTINADA O SEA MENOS SUELTA QUE NO FACILITABA SU INSTALACIÓN Y QUE REQUERIA TEMPERATURA MAS BAJAS PARA SU INSTALACIÓN.

## 5. VISITANTES

## 6. FIRMAS

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Sorany Andrea Cebalos | John Rivera |
| Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA | Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR |
| FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: Juan Diego Rodriguez | NOMBRE: |
| Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA | Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-03-2026

## 7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

| No | CARGO | NOMBRE COMPLETO | ASISTENCIA Si | ASISTENCIA No | EMPRESA DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnólogo/Ingeniero | SORANY ANDREA CEBALLOS | X | | |
| 2 | Encargado | N/A | | | |
| 3 | Liguero | LEIDER PADILLA OSURIO | X | | |
| 4 | Rastrillero | IVAN HUMBERTO LONDOÑO | X | | |
| 5 | Rastrillero | N/A | | | |
| 6 | Ayudante | SIMÓN URIAN LARRAHILLO | X | | |
| 7 | Ayudante | HUBO RUIS | X | | |
| 8 | Ayudante | JAIME CARDONA | X | | |
| 9 | Ayudante | FELIPE ARBOLEDA | X | | |
| 10 | Ayudante | ALBEIRO SUAREZ MANDUCA | X | | |
| 11 | Ayudante | N/A | | | |
| 12 | Ayudante | N/A | | | |
| 13 | Ayudante | N/A | | | |
| 14 | Ayudante | N/A | | | |
| 15 | Ayudante | N/A | | | |
| 16 | Operador Rodillo manual | JAIME GABRIEL AGUIRRE | X | | |
| 17 | Operador compresor | ALBEIRO ANTONIO MORA | X | | |
| 18 | Operador fresadora | N/A | | | |
| 19 | Operador finisher | N/A | | | |
| 20 | Operador Retroexcavadora | N/A | | | |
| 21 | Operador Vibrocompactador | N/A | | | |
| 22 | Operador Compactador llantas | N/A | | | |
| 23 | Operador Cortador Asfalto | N/A | | | |
| 24 | Operador Equipo Imprimación | LEIDER PADILLA OSURIO | X | | |
| 25 | Operador Mini cargador | N/A | | | |
| 26 | Operador Barredora | N/A | | | |
| 27 | Coductor Carrotanque | N/A | | | |
| 28 | Conductor Camión | WILLIAN COLORADO | X | | |
| 29 | Conductor Volqueta(s) | ELKIN RUIZ | X | | |
| 30 | AUX VIAL | LEIDY UBUGA | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 8. MAQUINARIA Y EQUIPO

| No | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO) | OPERACIÓN Si | OPERACIÓN No | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodillo manual | HUSQUVARNA LP 6501 | X | | |
| 2 | Compresor | INGERSOLRAND | X | | |
| 3 | Fresadora | N/A | | | |
| 4 | Finisher | N/A | | | |
| 5 | Retroexcavadora | N/A | | | |
| 6 | Vibrocompactador | N/A | | | |
| 7 | Compactador llantas | N/A | | | |
| 8 | Cortador Asfalto | N/A | | | |
| 9 | Equipo Imprimación | MARMITA MANUAL | X | | |
| 10 | Placa vibratoria | FECHA F-30 | X | | |
| 11 | Soplador | N/A | | | |
| 12 | Mini cargador | N/A | | | |
| 13 | Barredora | N/A | | | |
| 14 | Carrotanque | N/A | | | |
| 15 | Camión | SFP 329 CHEVROLET | X | | |
| 16 | Volqueta(s) | SMU 677 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-03-2026

## 9. CALCULO DE CANTIDADES


| SEGMENTO | CONSECUTIVO HUECOS MED | FIGURA No. | DIRECCIÓN | DIMENSIONES L (m) | DIMENSIONES A (m) | DIMENSIONES e (m) | Area (m2) | Vol (m3) | Ton (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003911 | 166256 | 1A | CL 16A 4B-37 | 2,10 | 1,20 | 0,135 | 2,52 | 0,34 | 0,82 |
| 5003911 | 166256 | 1B | CL 16A 4B-37 | 1,63 | 3,95 | 0,135 | 6,44 | 0,87 | 2,09 |
| 5019056 | 167382 | 2 | CL 7 SUR 42-70 | 5,02 | 1,12 | 0,14 | 5,62 | 0,79 | 1,89 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 14,58 | 2,00 | 4,80 ✓ |

| MEZCLA ASFALTICA | | | | | BOTADA DE ESCOMBROS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMISIÓN No | PLACA VOLQ | CANT (TON) | ACUM (TON) | TEMP (°C) | REMISIÓN No | PLACA VOLQ | TIPO (DOBLE/SENCILLA) | No VIAJES | SITIO DISPOSICIÓN |
| 236 899 ✓ | SMV 677 | 4,80 ✓ | 4,80 | 142 | 25345 ✓ | SMV 677 | SENCILLA | 1 | PROCOPAL ✓ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-03-2026

## 10. ESQUEMAS

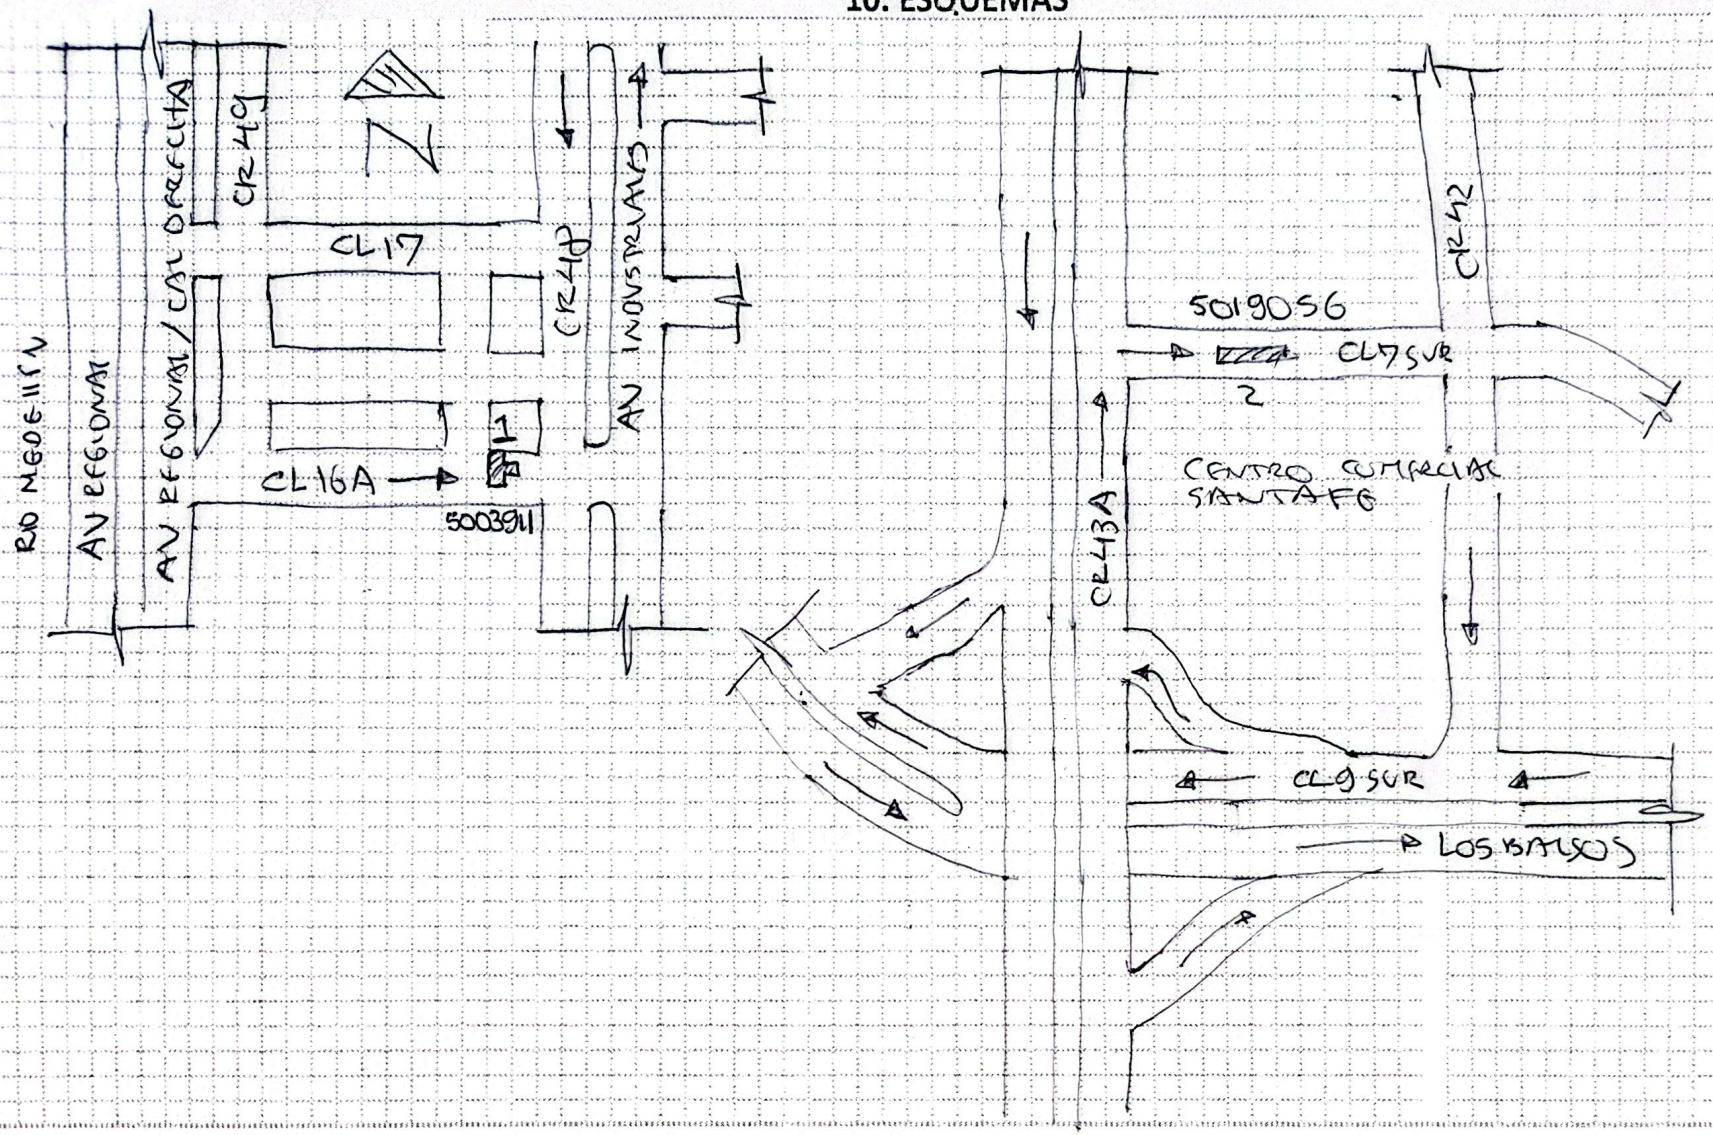


| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE INTERVENCIÓN: | MANTENIMIENTO PUNTUAL | FRENTE | DOS |
| RANGO: | CERO | CANTIDAD: | 4,180 TON |
| BARRIO | VILLA CARLOTA | DIRECCIÓN | CL 7 SUR 42-70<br>CL 16A 48-37 |

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236899

FECHA: 10/03/2026

HORA: 8:32:12 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUBIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.52 Tonnes

PESO NETO: 4.80 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADO: 4.80 Tonnes

Estructuras y Pavimentos S.A.S

**ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S**
NIT: 900.243.322-4

**SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS** Nº 25345

PROVEEDOR: Frente 2. Vialmad

VALE POR UN VIAJE: Escombros

10-02-2026

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

**NOTA IMPORTANTE**

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Soraya C.

**Firma Autorizada**

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
