FECHA (D/M/A): 25-03-2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango #4. Fallos.		
RANGO:	04.	CANTIDAD:	108,12 Mts lineales MSC-19 RAP.
ZONA	04.	FRENTE DE TRABAJO:	07.
COMUNA	10; la Candelaria.		
BARRIO	Inf_16; la Alpujarra.		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO :	9:00 pm
TERMINACIÓN:	5:00 am.
JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	JORNADA NOCTURNA.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Sin, despejado.

TARDE: Sin, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera Correcta las Condiciones q'e imparte el PMT para intervenciones viales nocturnas y segun el Caso. Aun se evidencia ausencia de Elementos reflectivos se refuerza señalizacion con (3) Maletines mas.
- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante la Jornada laboral y el hpv de riesgo. Tambien la instalacion de la Camilla; botiquin; extintor. usar bien el anti-talud.
- Se solicita al Contratista proteger Sumideros y Zonas verdes aledañas a la Obra del material Sobrante. Tambien la instalacion del Baño movil; punto ecologico; herramientas; elementos quimicos kit antiderrame. Se solicita recuperar mangueras para mitigar el bote de agua que se presenta.
- Mantenimiento al baño movil por parte de Empresa gestora del servicio.
- Señalizacion; demarcacion; demolicion; limpieza; aplicacion; acabado; Compactacion; orden y aseo.
- Mezcla asfaltica de PAVIMENTAR / Tipo de hueco MSC-19 RAP / Temperatura en obra (140° c).
- Fresado depositado en ACOPIO LA 10 / Escombros en PAVIMENTAR
- Patologias: desgaste Superficial; Fisuras y Grietas; abultamientos; fracturas en bloque.
- Base granular: No se Evidencia. Remanente de fresado en buen estado.
- El proceso Constructivo no ha presentado eventos relevantes que lo alteraron.
- El Equipo utilizado no presento fallas mecanicas.

5. VISITANTES

Gestion tipica => Intervention.
Samir Zuluaga => Ambiental intervention.

6. FIRMAS

NOMBRE: Mateo Zapata.	Paola Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 25-03-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Nolvo Zapata.	x		E y P.
2	Encargado	Fabian Nuñez	x		
3	Liguero	Edison Jimenez.	x		
4	Rastrillero	Miguel Perea	x		
5	Rastrillero	Jose Rufino	x		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Diego Caballos	x		
8	Ayudante	Naftony Burgos	x		
9	Ayudante	Cristian Aguirre	x		
10	Ayudante	Brayan Polo	x		
11	Ayudante	Nicolas Cotano	x		
12	Ayudante	Yubier Vera.	x		
13	Ayudante	Bernardo Cujavid.	x		
14	Ayudante	Wilder Prechnilla.	x		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Faustino Cotano	x		
18	Operador fresadora	Jose Cordoba.	x		
19	Operador finisher	Alejandro Trentes	x		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Diego Meneses.	x		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Edison, Jimenez.	x		
25	Operador Mini cargador	Richard Patiño	x		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhon Jairo Muñoz.	x		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Auxiliar Transito.	Leidy Herrera.	x		
	Auxiliar Transito.	Enson Velazquez.	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Mikasa 685.	x		E y P.
2	Compresor	Kaeser M50 -185.	x		
3	Fresadora	Wirtgen, W-200.	x		
4	Finisher	Vogele Super 1303-3.	x		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Hamm 75 HD	x		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Lee Boy L210.	x		
10	Placa vibratoria	Hundu GX 200	x		
11	Soplador				
12	Mini cargador	New Holland L-318.	x		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton, TM 655.	x		
16	Volqueta(s)	International / Kenworth / Freightliner.	x		
		Herramienta menor.	x		

FECHA (D/M/A): 21-03-2026.


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001452	N.A	1	CR 55 CL 33 Y CL 40A	54,80	3,90	0,10	213,72	21,37	51,51
2001452	N.A	2	CR 55 CL 33 Y CL 40A	5,00	3,14	0,05	17,70	0,89	2,13
2001452	N.A.	3	CR 55 CL 33 Y CL 40A.	63,50	3,56	0,10	226,06	22,61	54,48
TOTALES							457,48.	44,86	108,12

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
539100	TAP993	27,08	27,08	1490	26655.	TJZ678	Doble.	1.	Acopio 1a30
539101	SRN501	27,01	54,09	1470	26656.	EQX167	Doble.	1.	Acopio 1a30
539102	TAP993	27,02	81,11	1480	26657.	TJZ678	Doble.	1.	Acopio 1a30
539103	SRN501	27,01	108,12.	1470.	26658.	EQX167.	Doble.	1.	Acopio 1a30

FECHA (D/M/A): 27-03-2026.

10. ESQUEMAS

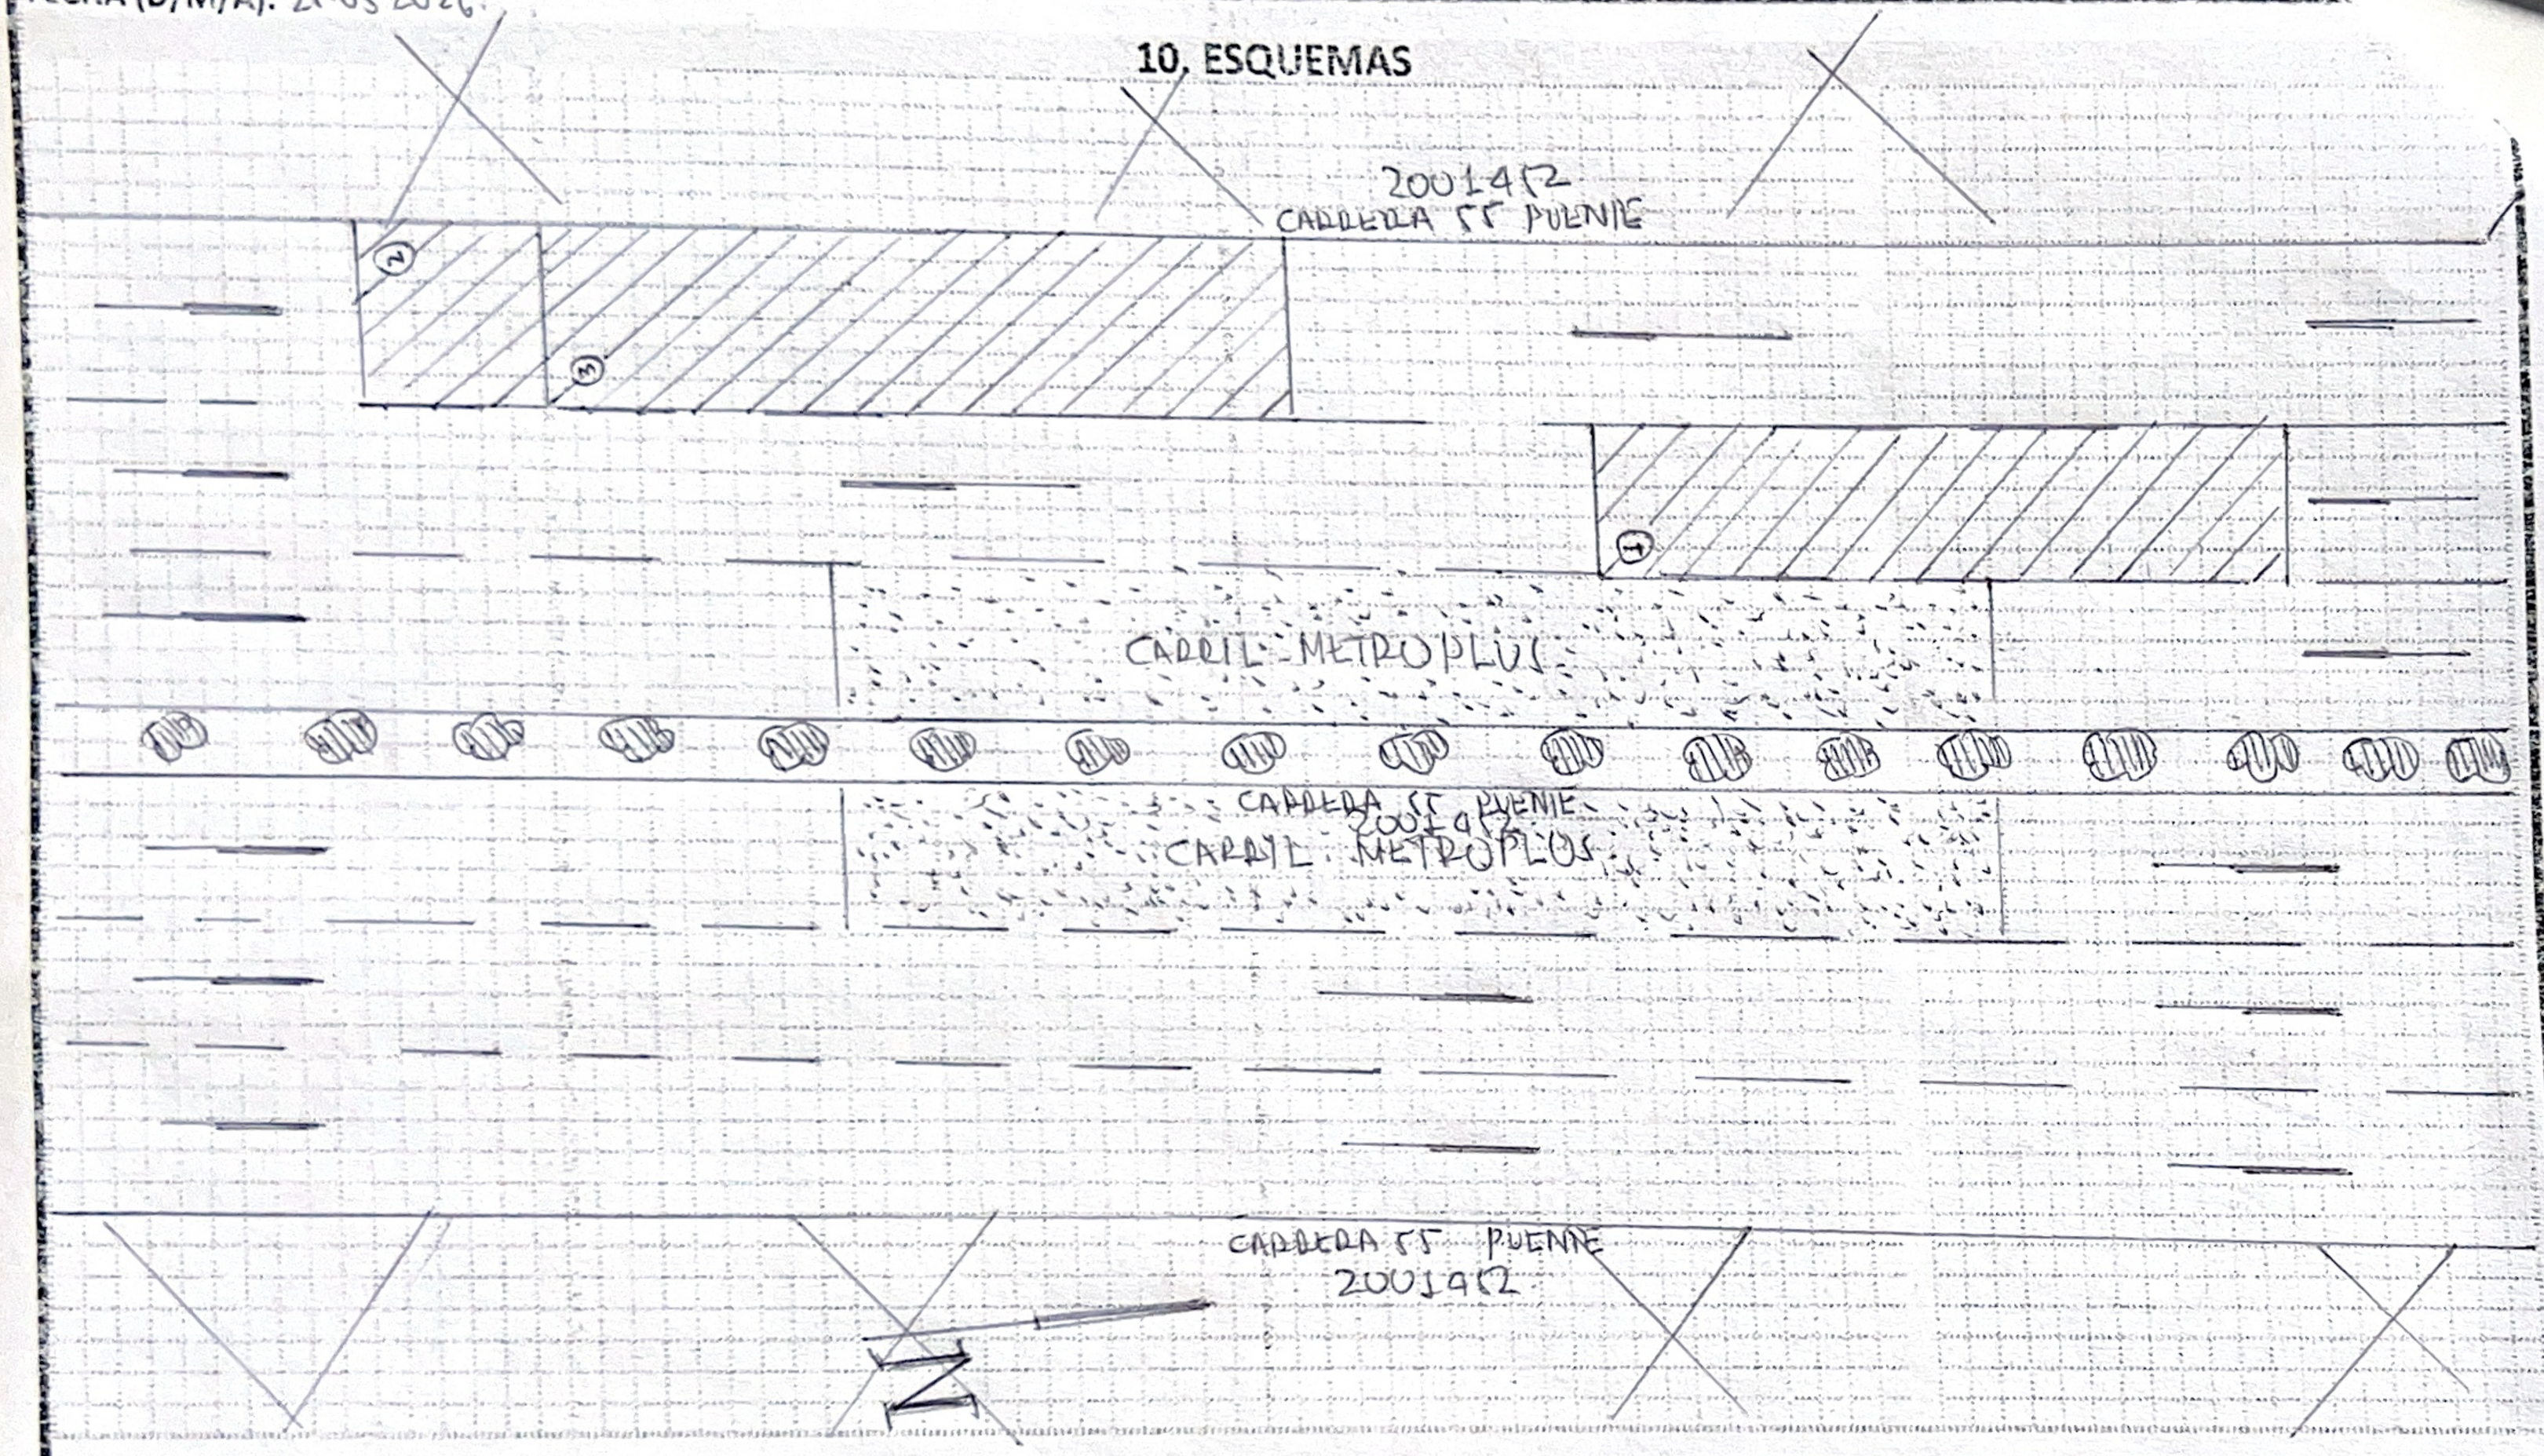

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Rango #4 Fallos.	FRENTE	05.
RANGO:	04.	CANTIDAD:	108,12 m^3 Incluidas MIC-19 RAP.
BARRIO	Inct_16; la alpujarra.	DIRECCIÓN	CR 55 (Puente.) CL33 Y CL40A

----------20260325 23:03

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539103
PLACA: SMH092
CONDUCTOR: SEBASTIAN VASQUEZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
- tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 27,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
ENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
LMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.740,00
PESO BRUTO:38.750,00

ENTRADA: 25 mar 2026 -a11:04 p.
SALIDA: 25 mar 2026 - a11:07 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260325 22:52

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539102
PLACA: TJZ629
CONDUCTOR: JUAN PABLO RAMOS

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 27,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
LMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.290,00
PESO BRUTO:39.310,00

ENTRADA: 25 mar 2026 -a10:52 p.
SALIDA: 25 mar 2026 - a10:52 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260325 22:45

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539101
PLACA: SRN501
CONDUCTOR: LUIS FELIPE ZAPATA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 27,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.590,00
PESO BRUTO:38.600,00

ENTRADA: 25 mar 2026 -a10:48 p.
SALIDA: 25 mar 2026 - a10:48 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260325

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539100
PLACA: TAF993
CONDUCTOR: OVIDIO POSSO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 27,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: VOOOOO3687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.[illegible]
PESO BRUTO:39.040,00

ENTRADA: 25 mar 2026 -a10:41 p.
SALIDA: 25 mar 2026 - a10:41 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26657

PROVEEDOR: Cr consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fresado
PLACA No: TJ768 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Tramo 1a 30
RECIBIDO POR:

25-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel C
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Mateo Zapata

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26658

PROVEEDOR: Cr consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fresado
PLACA No: EQX167 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Tramo 1a 30
RECIBIDO POR:

25-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel C
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Mateo Zapata

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos

auditoría externa.

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26655

PROVEEDOR: Cr Consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fresado
PLACA No: TJ768 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Tramo 1a 30
RECIBIDO POR:

25-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel C
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Mateo Zapata

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26656

PROVEEDOR: Cr consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fresado
PLACA No: EQX167 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Tramo 1a 30
RECIBIDO POR:

25-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel C
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Mateo Zapata
