FECHA (D/M/A): 30 · 03 · 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango # 4. Fallos
RANGO: 04.	CANTIDAD: 117,33 m² fresadas NSC-19 RAP MBIA
ZONA: 03	FRENTE DE TRABAJO: 05
COMUNA: 10; La Candelaria.	
BARRIO: 1012; Perpetuo Socorro.	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 p.m.

TERMINACIÓN: 5:00 am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

JORNADA NOCTURNA.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco; Nublado

TARDE: lluvias intensidad media.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera correcta las Condiciones de Imparte el PMT para intervenciones viales nocturnas y segun el Caso. Si hay novedades informar al especialista encargado. El Contratista despues de las 9:00 pm hace Cierre total.
- Se solicita al Contratista aplicar de manera correcta el uso de EPP durante Jornada laboral y el tipo de riesgo. Tambien lo Correcto instalacion de Cumilla; boliquin y extintor.
- Se solicita al Contratista proteger las obras de drenaje, alcantari; anteriores del material particulado subsante. de lo Contrario limpiar. Tambien lo Correcto instalacion de Baño movil; punto ecologico; kit. antiderrame; Elementos quimicos; herramientas.
- Se solicita al Contratista aplicar Correctamente el Plan de Contigencias de aguaceros segun el Caso (Fuerte de Juntas y Superficie) para garantizar adherencia.
- localizacion; demarcacion; demolicion; limpieza; imprimacion; aplicacion mezcla, acabado; compactacion; orden y aseo. / Mezcla asfaltica de PAVIMENTAR / Tipo NSC-19 RAP MBIA / Temperatura (127°C). Optima.
- En los reboje hallados en la acera de Evidencia que el agua no drena por gravedad; por lo cual en la mezcla asfaltica se aplica en su punto cero con el fin de garantizar el curso a obra de drenaje.
- Patologias: desgaste superficial; ahellamiento; desniveles; fracturas; desgaste; envejecamiento; grietas
- Se garantiar. Remanente de Fresado en bienes Condiciones para generar estabilidad.
- Material fresado depositado en ACOPIO LA 3D / Escombros depositados en PAVIMENTAR.

5. VISITANTES

Cristian Correa = Interventoria.

6. FIRMAS

NOMBRE: Mateo Zapata.	Pablo Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alfonso Castro Rioja	NOMBRE: Juan J. Bermudez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 30-03-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Mateo Zapata.	X		E y P.
2	Encargado	Fabian Nuñez	X		
3	Liguero	Edison Jimenez	X		
4	Rastrillero	Miguel Perea.	X		
5	Rastrillero	Jose Reyes	X		
6	Ayudante	Brady Polo	X		
7	Ayudante	Diego Ceballos	X		
8	Ayudante	Nicolas Guluno	X		
9	Ayudante	Adrony Burgo	X		
10	Ayudante	Dino Ciudad	X		
11	Ayudante	Cubler Vera.	X		
12	Ayudante	Carlos Aguirre	X		
13	Ayudante	Wilder Pechuga	X		
14	Ayudante	Bernardo Ciudad.	X		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Faustino Cuyano	X		
18	Operador fresadora	Jose Cordoba	X		
19	Operador finisher	Alejandro Fuentes	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Diego Meneses	X		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Edison Jimenez	X		
25	Operador Mini cargador	Richard Palmo	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhon Jairo Muñoz	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
		Teidy Herrera.	X		
		Edison Velazquez.	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Mikasa 68r	X		E y P.
2	Compresor	Kaeser SM 18r	X		
3	Fresadora	Wirtgen W-100.	X		
4	Finisher	Vogele Supa 1303-3	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Hamm 75 HD	X		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Lee boy L250	X		
10	Placa vibratoria	Honda GX 200.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	New Holland L318	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton, 111, 6T	X		
16	Volqueta(s)	International / Kenworth / Freightliner.	X		
		Hchumenty menor.	X		

FECHA (D/M/A): 30-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000013		1	CRSI CL36 Y CL37	3.26	4,55	0,101	14,83	1,50	3,61
3000013	121680.	2	CRSI CL36 Y CL37	80,0	3,56	0,10	284,80	28,48	68,64
3000013		3	CRSI CL36 Y CL37	4,70	4,0	0,101	18,80	1,90	4,58
3000013		4	CRSI CL36 Y CL37	12,12	6,20	0,10	75,14	7,51	18,11
3000013		5	CRSI CL36 Y CL37	11,50	8,0	0,101	92,00	9,29.	22,39
TOTALES							485,58.	48,68.	117,33

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
539622	TRL740	26,12	26,12	1500
539623	SMX568	26,04	52,16	1480
539624	SRN501	26,03	78,19	1490
539625	TAP993	26,01	104,20	1470
539626	GMO65	13,13	117,33	1480

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26667	TJ2678	Doble	1	Acopio 930 (~~Pavimentar~~)
26668	TJ2629	Doble.	1	Acopio 930
26669	TJ2678	Doble.	1	Acopio 930
26670	TJ2629	Doble.	1	Pavimentar.

FECHA (D/M/A): 30-03-2022

10. ESQUEMAS

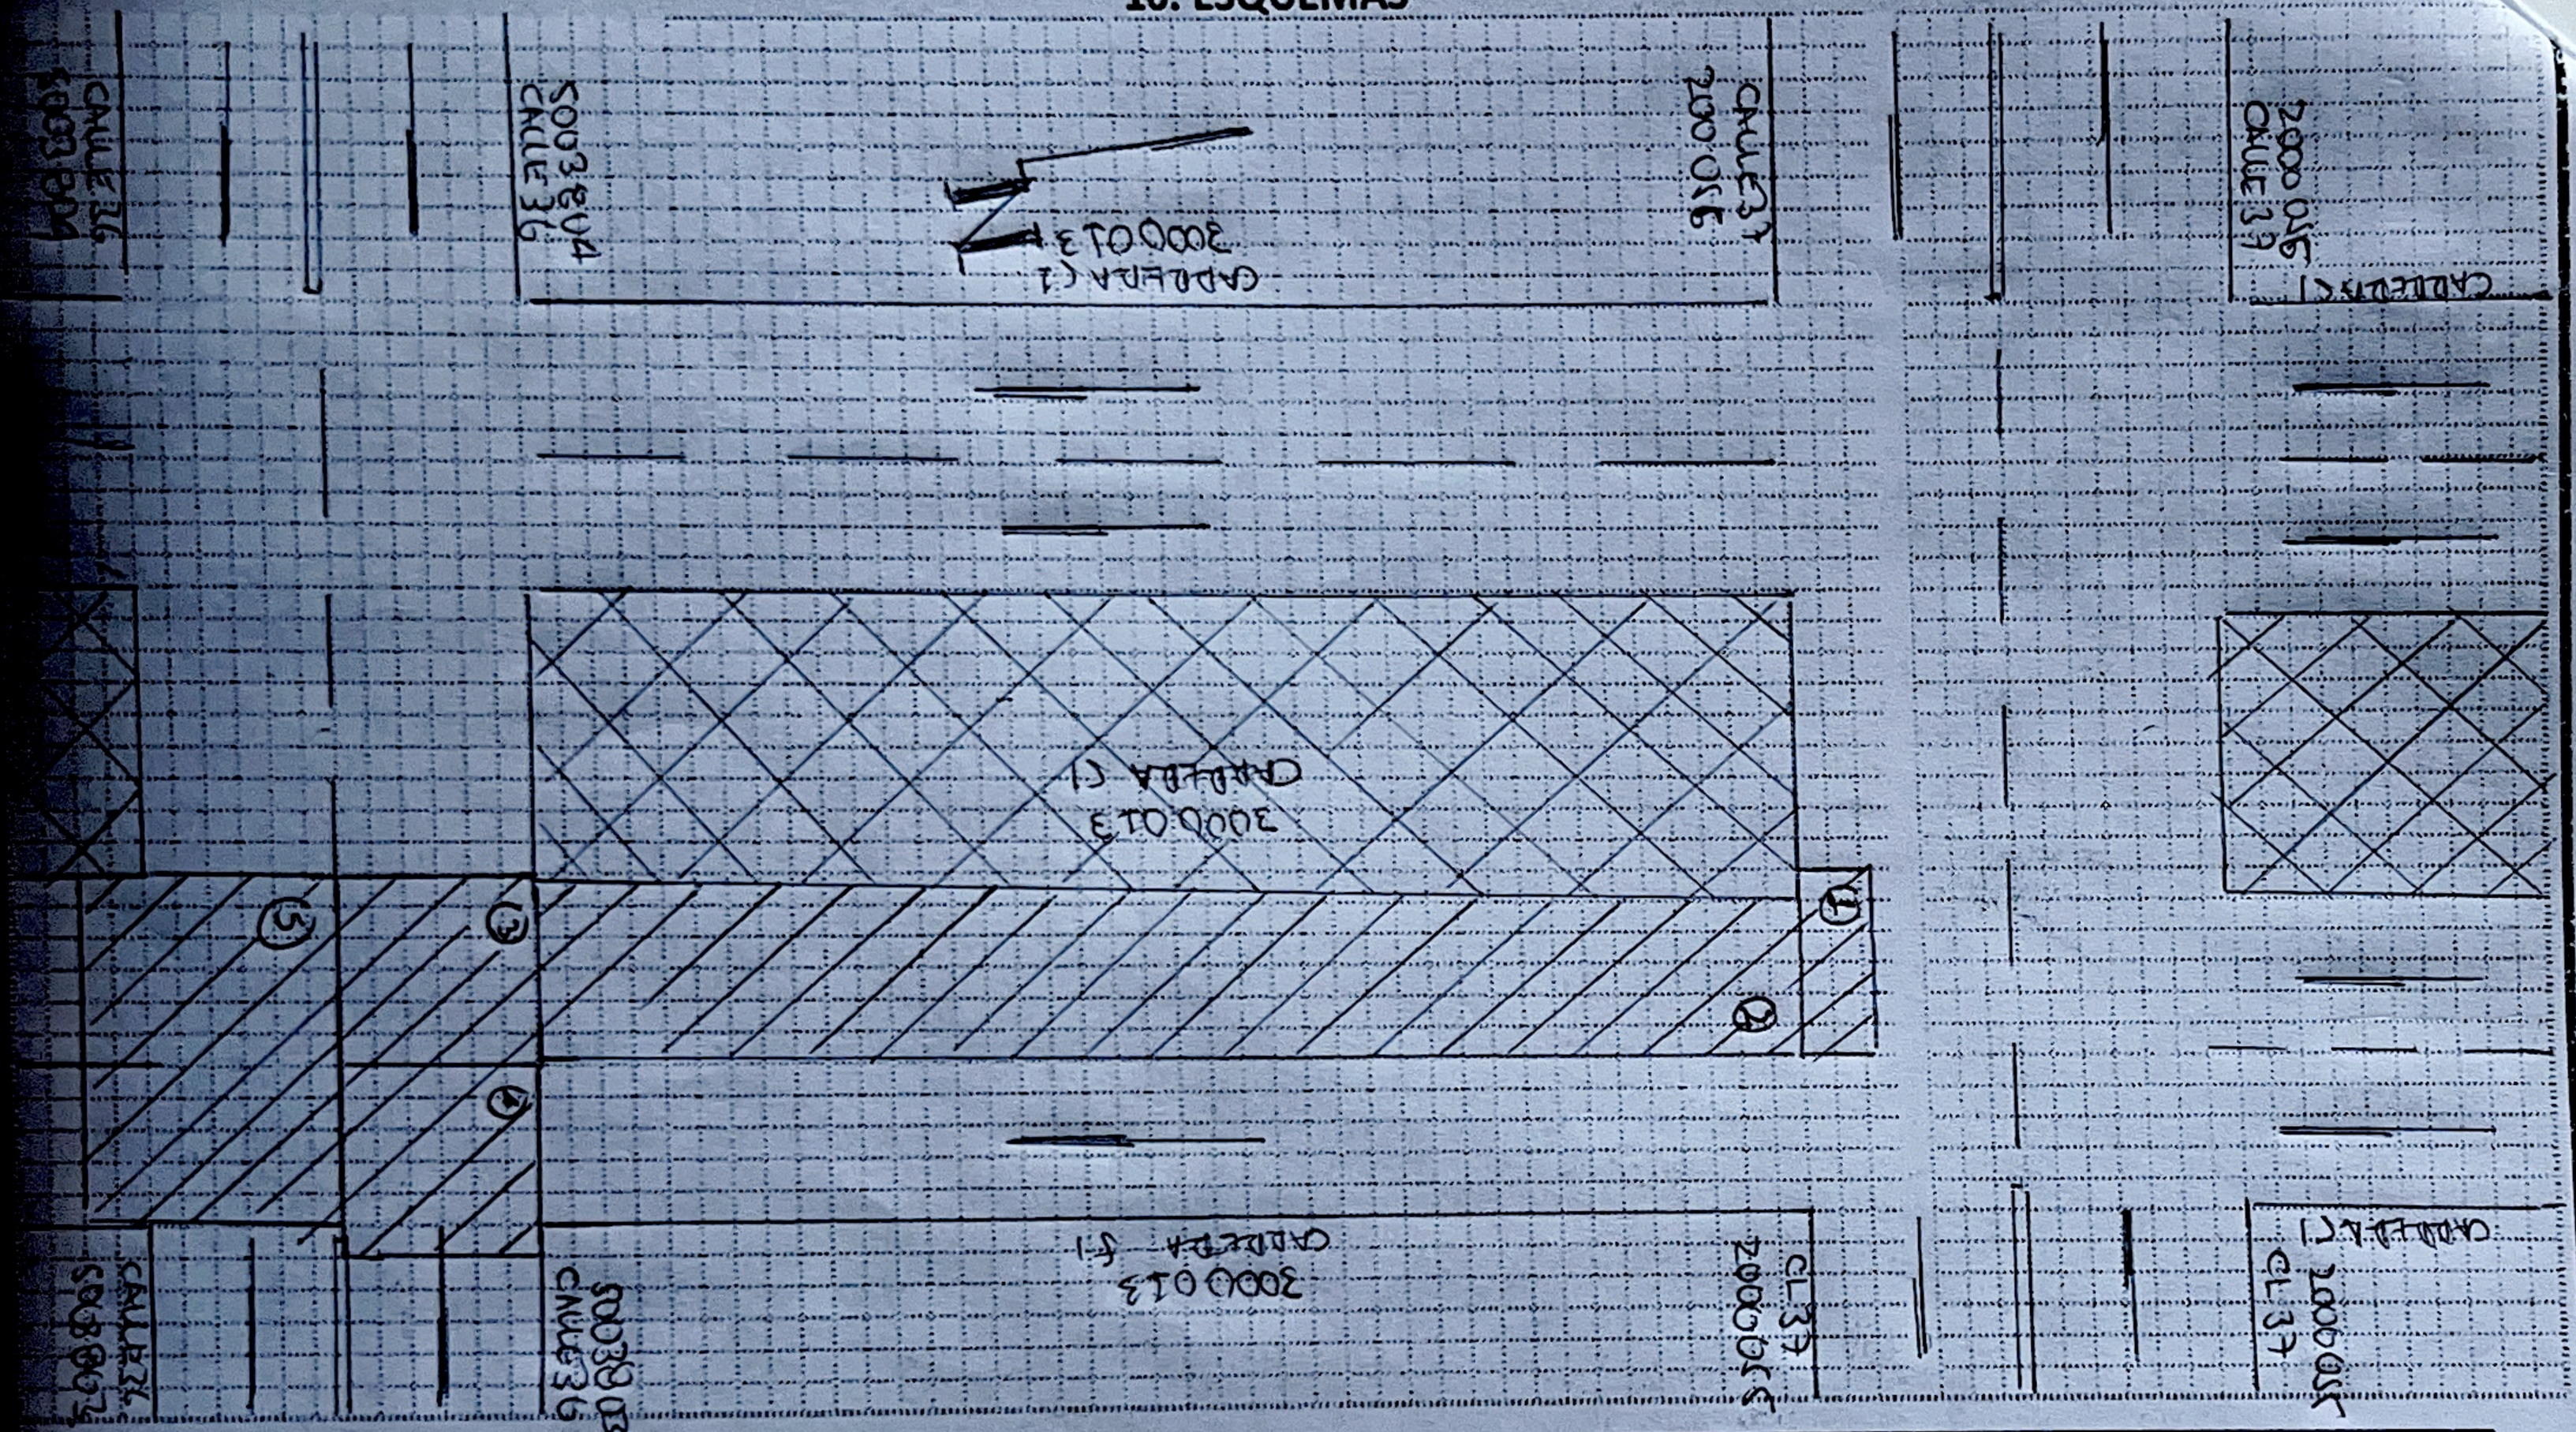

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bungo #4. Fallos.	FRENTE	05.
RANGO:	04.	CANTIDAD:	117,33. m^3 toneladas MSC-19 RAP MBIA
BARRIO	1012; Peripelvo Sumapo.	DIRECCIÓN	CR 51 CL 36 Y CL 37.

20260330 21:36

- Version 1

9625

asfaltica MSC-1

ESTRUCTURAS Y PAVI

-2149-EYP MALLA VI

11.960,00
37.970,00

-m09:48 p.
- m09:48 p.

RIO DE BASCULA

UCTOR

CLIENTE
inistros a terceros

m. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20260330 21:49
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539624
PLACA: SRN501
CONDUCTOR: LUIS FELIPE ZAPATA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 11.590,00
PESO BRUTO:37.620,00

ENTRADA: 30 mar 2026 -m09:30 p.
SALIDA: 30 mar 2026 - m09:30 p.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20260330 21:36
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539623
PLACA: SMX568
CONDUCTOR: MATEO ARANGO DIAZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.230,00
PESO BRUTO:38.270,00

ENTRADA: 30 mar 2026 -m09:27 p.
SALIDA: 30 mar 2026 - m09:27 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20260330 21:30
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539622
PLACA: TRL740
CONDUCTOR: GIOVANY ESTRADA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 26,12 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 12.130,00
PESO BRUTO:38.250,00

ENTRADA: 30 mar 2026 -m09:25 p.
SALIDA: 30 mar 2026 - m09:25 p.
TEMPERATURA:150,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20260330 21:27

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539626
PLACA: GTY061
CONDUCTOR: Edi Alexander yali

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 13,13 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 8.090,00
PESO BRUTO:21.220,00

ENTRADA: 30 mar 2026 - 09:53 p.
SALIDA: 30 mar 2026 - 09:53 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26669

PROVEEDOR: Cs Consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: TJ7 678 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Acopio La 3D
RECIBIDO POR:

30-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel E
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26667

PROVEEDOR: Cs Consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: TJ7 678 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Acopio La 3D
RECIBIDO POR:

30-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel E
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

2058

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26670

PROVEEDOR: VIALMED FAS
VALE POR UN VIAJE: Escombrizo
PLACA No: TJ7 629 CAPACIDAD: 15 M3
DESTINO: Pavimentos
RECIBIDO POR: Jun Camilo P

30-03-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Mateo Zorrilla
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26668

PROVEEDOR: Cs Consorcio Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Fiesado
PLACA No: TJ7629 CAPACIDAD: 17 M3
DESTINO: Acopio La 3D
RECIBIDO POR:

30-3-26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Daniel P
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Para el proponente, persona jurídica, la experiencia se contará a partir de la fecha de su constitución.

La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de
