a tales lineamientos y se da cumplimiento de estos parámetros previa revisión por parte de la interventoría.

CEDULA	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	CARGO	INGRESO	% DE DEDICACIÓN
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA							
3277174	GARCÍA	CASTILLO	GERMAN	ANDRÉS	INGENIERO RESIDENTE	5/12/2025	100%
86073936	CAGÜEÑAS	HOLGUÍN	HENRY	MAURICIO	PROFESIONAL SISO	5/12/2025	100%
35263063	MORENO	QUIROGA	MARÍA	EDITH	DIRECTOR DE OBRA	5/12/2025	30%
79542505	RUIZ	CORREDOR	ALEXANDER		INGENIERO ELÉCTRICO	5/12/2025	30%
PERSONAL DE APOYO EN ACTIVIDADES DE OBRA							
17360103	RODRÍGUEZ	GAMBOA	ALBERTO		AUXILIAR DE TRAFICO	05/12/2025	
1006822787	ROJAS	BARBOSA	CAMILO	ANDRÉS	AUXILIAR	05/12/2025	
86049664	BARBOSA	QUEVEDO	ALIPIO		MAESTRO CONSTRUCTOR	11/12/2025	
1121919739	SALAZAR	MORALES	JULIÁN	ANDRÉS	AUXILIAR DE TRAFICO	11/12/2025	
86040166	VIGOYA	DAZA	JAVIER	ALEXANDER	VIGILANTE	17/12/2025	
3210495	FUQUEN	CARRASCO	HERNESTO		AYUDANTE DE OBRA	29/12/2025	
74245750	CEPEDA	BERNAL	GERNAINE		AYUDANTE DE OBRA	20/01/2026	
1125004112	CRISTANCHO	CHAMARRAVI	DARWIN	YUSEMID	AYUDANTE DE OBRA	21/01/2026	
1123203247	LAGOS	CABRERA	RUBEN	DARIO	AYUDANTE DE OBRA	2/01/2026	
1193081559	MARQUEZ	LADINO	BRAYAN	DAVID	AYUDANTE DE OBRA	16/01/2026	
86086177	SALGADO	BALTA	PABLO	JESUS	AYUDANTE DE OBRA	21/01/2026	

Tabla 11 Registro de personal de obra

13.2.2 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Se ha dado cumplimiento con el pago salarial y de seguridad social del personal del CONSORCIO GM HACHA, esto se evidencia con la relación y entrega de pagos y planillas como anexos del ***SEGUNDO INFORME DE OBRA***, previa verificación por parte de la interventoría.

13.2.3 RELACIÓN DE LIQUIDACIONES DE ACUERDO CON EL PERSONAL LIQUIDADO.

Durante el presente periodo se presente liquidación del siguiente personal el cual puede evidenciarse en el ***INFORME MENSUAL N°2 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO***.

14 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para efectos del seguimiento realizado por la interventoría durante el mes de enero (Informe No. 2), el contratista de obra presentó el informe mensual de Seguridad y Salud en el

Trabajo, elaborado por el profesional competente, en el cual se describen las actividades y acciones ejecutadas en cumplimiento de la normatividad vigente.

Dicho informe incluye aspectos relacionados con la entrega de elementos de protección personal (EPP), implementación de señalización en obra, conformación de brigadas de emergencia y la relación de elementos y condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de las actividades constructivas.

En este sentido, la interventoría verificó la información suministrada, evidenciando que las medidas implementadas corresponden a las necesidades del proyecto y contribuyen a la prevención de riesgos laborales. Así mismo, se constató que el personal cuenta con la dotación adecuada y que se han adoptado acciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad en el área de intervención.

14.1 ELEMENTOS DE SST EN OBRA

Para cumplimiento de la implementación de pautas de seguridad y salud en el trabajo se contó con los siguientes elementos en obra.

- Camilla
- Extintor
- Botiquín
- Kit de derrames
- Señalizaciones
- Valla informativa
- Disposición de residuos

14.2 REPORTE DE ENTREGA DE EPP

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
DOTACIÓN DEL PERSONAL	X			El personal contaba con la dotación apropiada para la ejecución de las actividades
Dotación completa	X			
Buen estado	X			
Uso según zona de trabajo	X			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				Las instalaciones de obra se encuentran señalizadas y con la dotación de elementos de protección personal y de primeros auxilios.
Dotación completa	X			
Buen estado	X			
Fácil acceso y operación	X			
Uso según zona de trabajo	X			
Existencia de elementos primeros auxilios	X			
MAQUINARIA - EQUIPO				La maquinaria, equipos y el personal operario cumple con los conocimientos básicos.
Estado del equipo	X			
Idoneidad operarios	X			

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN				Las zonas de trabajo respetan las condiciones adecuadas de acuerdo con la política **"cero accidentes"**
Uso permanente	X			
Uso según zona de trabajo	X			
VIGILANCIA				
Personal suficiente	X			
Diurna	X			Se cuenta con un vigilante de las instalaciones.
Nocturna	X			Se cuenta con un vigilante de las instalaciones.
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia	NO			No aplica de conformidad con los riesgos determinados para el proyecto
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	X			Se verifico la afiliación del personal de obra
SOCIALIZACIONES				Los temas fueron cumplidos con el cronograma completados al 100%
Charlas en seguridad y salud en el trabajo aplicadas al proyecto	X			
EXÁMENES PERIÓDICOS				Se realizo examen a todo el personal de obra.
Exámenes médicos de ingreso	X			

Tabla 12 Reporte De Entrega De EPP

14.3 REPORTE DE ACCIDENTES

INDICADORES HSE			
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR: no se presentaron accidentes en el presente periodo.			

Tabla 13 Reportes de accidentalidad

15 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control al contratista de obra, durante el mes de enero la interventoría realizó la verificación de las actividades ambientales

desarrolladas, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental establecido por la entidad contratante. En este proceso se evidenció el adecuado desarrollo de las actividades técnico-constructivas, en concordancia con los lineamientos ambientales definidos para el proyecto.

Para tal efecto, el contratista presentó el **INFORME AMBIENTAL DE OBRA No. 02**, en el cual se relacionan, de acuerdo con el avance del contrato, las acciones implementadas en el marco de las fichas ambientales. Estas actividades corresponden a la aplicación de medidas de gestión ambiental orientadas a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos generados durante las diferentes etapas del proyecto.

La interventoría realizó la revisión de dicho informe, verificando la adecuada implementación de los programas ambientales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, evidenciando coherencia entre las actividades ejecutadas en campo y lo reportado por el contratista.

15.1 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA.

En desarrollo de las funciones de seguimiento, control y verificación ambiental, durante el mes de enero (Informe No. 2), la interventoría realizó inspecciones a las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GM HACHA, identificando los siguientes aspectos relevantes en el desarrollo de la obra:

- ✓ **Transporte de materiales en volquetas:** Se verificó que los vehículos destinados al transporte de materiales de excavación, escombros y agregados operaran cumpliendo con las medidas de control establecidas, especialmente en lo relacionado con el cubrimiento de la carga mediante lona o manto, con el fin de evitar la dispersión de material particulado durante su desplazamiento. Esta medida contribuye a la protección del entorno, la seguridad de peatones y usuarios de la vía, y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

- ✓ **Ubicación de baños portátiles y puntos de hidratación**: La interventoría constató la adecuada disposición de los baños portátiles y puntos de hidratación para el personal de obra, recomendando su ubicación estratégica dentro del área de intervención, de manera que se garantice su accesibilidad, condiciones óptimas de higiene y salubridad, y la seguridad de los trabajadores, en concordancia con la normativa aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ **Manejo integral de residuos sólidos:** Se evidenció la implementación de un punto de acopio temporal de residuos sólidos, debidamente señalizado, que permite la separación en la fuente conforme a lo establecido en la Resolución 2184 de 2019. Para ello, se dispusieron recipientes diferenciados por código de colores, facilitando

una gestión adecuada de los residuos, minimizando impactos ambientales y permitiendo su posterior recolección por gestores autorizados.

- ✓ **Accesos y tránsito peatonal:** Se realizó la verificación de los accesos al área de obra y de las condiciones de tránsito peatonal en su entorno, destacando la necesidad de mantener rutas seguras, señalizadas y libres de obstáculos. Lo anterior, con el fin de garantizar la movilidad de la comunidad, prevenir incidentes y dar cumplimiento a las medidas de manejo ambiental y seguridad vial establecidas para el proyecto.

16 ADMINISTRACIÓN

16.1 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

16.1.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Respecto a la maquinaria y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades, el contratista realizó uso de los siguientes.

MAQUINARIA	ESPECIFICACION	CANTIDAD
RETRO EXCAVADORA	RETRO EXCABADORA SINOMACH 630 A	1
EXCAVADORA DE ORUGAS	EXCAVADORA HITACHI	1
EQUPIO	**ESPECIFICACION**	**CANTIDAD**
ESTACION TOPOGRAFIA	TOPCON GTS-	1
NIVEL TOPOGRAFIA	SOKIA B40 SERIAL 246212	1
GNSS – RTK GPS	HI TARGET V30 PLUS LT	1
BASTON - PRISMA	TOPO CON	1
TRIPODE	GENERICO	1
REGLA MIRA	GENERICO	1

HERRAMIENTA	CANTIDAD
MANGUERA DE NIVELES	1
ESTACAS	1
PALA	1
MACETA	1

16.1.2 ACTIVIDAD CONSTRUCTIVAS

Las labores en el área de influencia se realizaron bajo las directrices establecidas por el gobierno nacional acordes al plan de manejo ambiental dispuesto en el proyecto.

Durante el periodo comprendido entre **01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026** se realizó actividades tales como:

1	**PARQUE DEL HACHA**	
1,2	**EXPLANACIONES**	
1,2,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3
1,3	**MATERIALES GRANULARES**	
1,3,1	"RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2"" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO"	M3
1,3,2	SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3
1,4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	
1,4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3
1,5	**SARDINELES, ANDENES Y ZONAS VERDES**	
1,5,2	SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML
1,5,5	LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	M2

Tabla 14 Actividades ejecutadas

16.1.3 OFICINA DEL CONTRATO

Para todos los efectos el contratista de obra cuenta con el desarrollo de las actividades administrativas en la ciudad de Villavicencio-Meta.

De igual manera cuenta con un espacio remoto en las instalaciones de obra, donde se encuentra diariamente el personal técnico del proyecto.

16.1.4 RELACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo para el poryecto y el utilizado en el desarrollo del contrato de obra, es el mismo personal minimo de apoyo de la propuesta, por lo que se relaciona en este informe en el item 13.2.1 **REGISTRO DE PERSONAL**

16.1.5 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO – ACTAS DE COMITÉ

A continuación, se presenta la relación de ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES realizadas por la INTERVENTORÍA como soporte de las mesas técnicas de trabajo del proyecto objeto del presente informe del mes de enero.

ACTA DE REUNION	FECHA	OBJETIVO
ACTA DE REUNION No.6	22/01/2026	Se llevó a cabo un comité con la participación de la Supervisión, representantes del Contratista de Obra y la Interventoría, con el objeto de revisar los diseños del proyecto Parque del Hacha y analizar la viabilidad de realizar ajustes al diseño original, orientados a lograr una mayor armonización con el componente ambiental del proyecto, priorizando la preservación de los individuos arbóreos existentes y minimizando la necesidad de intervenciones sobre el arbolado.
ACTA DE REUNION No.7	23/01/2026	Se realizó una visita técnica en obra en la cual se inspeccionaron los individuos arbóreos localizados dentro del área de intervención, verificando su estado fitosanitario, su ubicación respecto al diseño del proyecto y el grado de interferencia con las actividades constructivas previstas, con el propósito de establecer la viabilidad de su preservación o la necesidad de definir actuaciones específicas sobre los mismos.

Tabla 15 Actas de comité

16.1.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA

No.	FECHA	CONTRATO No.	NUMERO DE RADICADO	EMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO
1	5/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-012	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	REQUERIMIENTO ENTREGA INFORMES MENSUALES DE OBRA No. 1 MES DE DICIEMBRE 2025- CONTRATO No. 3631 DE 2025.
2	6/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-013	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO PARA EL TEMA AMBIENTAL - CONTRATO No. 3631 DE 2025.
3	6/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-014	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PMA.

4	14/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-015	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	SOLICITUD DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA - CONTRATO No. 3631 de 2025.
5	16/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-016	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	REITERACIÓN – INCUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).
6	19/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-017	CONSORCIO INTERHACHA 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Remisión de documentación para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal.
7	20/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-018	CONSORCIO INTERHACHA 2025	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ESCANEO DE CARPETA CONTRACTUAL - CONTRATO DE OBRA No. 3631 DE 2025.
8	28/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-018A	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	Observaciones al informe mensual de diciembre (mes N°1)
9	28/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-019	CONSORCIO INTERHACHA 2025	CONSORCIO GM HACHA	Solicitud de informe de la cantidad de árboles, especies arboriferas y bambús que fueron talados del parque del hacha.
10	29/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-020	CONSORCIO INTERHACHA 2025	OFICINA DE CONTRATACIÓN	Remisión de garantías Contrato de interventoría N°3701 de 2025 conforme al acta de prorroga N°01.
11	30/01/2026	CM-012-2025-Cont. 3701-2025	CIH-2025-021	CONSORCIO INTERHACHA 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A OBRA DICIEMBRE (MES No.01)

Tabla 16 Correspondencia enviada

16.1.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No.	FECHA	CONTRATO No.	NUMERO DE RADICADO	EMITIDO POR	REMITIDO A	ASUNTO
1	5/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-19	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Respuesta a sus comunicaciones CIH-2025-006, CIH-2025-010 y CIH-2025-012.
2	15/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-20	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Cumplimiento de compromisos - Entrega Documentación técnica de aprovechamiento forestal Parque del Hacha.
3	16/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-21	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Remisión de brochure de colores y definición de moldes para concreto.
4	16/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-22	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Respuesta a su comunicación CIH-2025-014 del 06 de enero de 2025 que tiene por objeto "SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PMA" y reiteración CIH-2025-016 del 16 de enero de 2025.
5	16/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-23	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Respuesta a su comunicación CIH-2025-015 ddel 14 de enero de 2026 que tiene por asunto "SOLICITUD DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA-CONTRATO No. 3631 de 2025".
6	16/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-24	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Respuesta a su comunicación CIH-2025-006 del 17 de diciembre de 2025 que tiene por asunto "Observaciones de topografía".

7	16/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-25	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Entrega del Diseño modificado, según recomendaciones y observaciones del 30 de diciembre de 2025.
8	16/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-26	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Respuesta a su comunicación CIH-2025-013 del 06 de enero de 2026 que tiene por asunto "SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO PARA EL TEMA AMBIENTAL - CONTRATO No. 3631 de 2025".
9	20/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-27	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Entrega del informe MENSUAL N°01.
10	29/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-28	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Respuesta a su comunicación CIH-2025-019 del 28 de enero de 2026 que tiene por asunto "Solicitud de informe de la cantidad de árboles, especies arbóreas y bambús que fueron talados del parque de hacha".
11	29/01/2026	3631-2025	GM-HACHA-29	CONSORCIO GM HACHA	CONSORCIO INTERHACHA 2025	Solicitud de realización de comité para análisis de prorroga al contrato de referencia.

Tabla 17 Correspondencia recibida

16.1.8 BITÁCORA

Para todos los efectos el contratista de OBRA diligencio y llevo a cabo el registro de la BITÁCORA con el reporte de avance de las actividades, personal, maquinaria, equipos utilizados, condiciones climáticas, esta reposa como anexo del ***INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 2.***

17 INFORME FINANCIERO

Como lo indica la interventoría, el contratista realiza el corte al **31 DE ENERO DE 2026**, del CONTRATO DE OBRA NO. 3631 DE 2025 no presenta avances financieros imputables al valor actual del contrato, ya que hasta la fecha no se han realizado facturaciones por la ejecución de obra.

Durante el período evaluado, solo se ejecutó el trámite administrativo correspondiente al anticipo contractual, el cual equivale al **30%** del valor total del contrato, el cual corresponde a **SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($640.922.892,30)**. Dicho anticipo se encuentra en proceso de desembolso final, sin que a la fecha se haya efectuado amortización alguna. A continuación, se relaciona el plan de inversión aprobado.

17.1 MANEJO DEL ANTICIPO

A continuación, se relaciona el plan de inversión y manejo del anticipo, presentado por el contratista de obra y avalado por la interventoría para el contrato de obra No. 3631 de 2025.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y costos directos del personal	$ 32.046.144,62	5,00%
2	Transporte de materiales	$ 64.092.289,23	10,00%
3	Compra de materiales	$ 384.553.735,38	60,00%
4	Alquiler de maquinaria y Equipos	$ 160.230.723,07	25,00%
	TOTAL	**$ 640.922.892,30**	**100%**

Tabla 18 Plan de inversión Anticipo

Para el corte del presente informe que corresponde al corte de **01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026,** no se realizó ningún giro conforme al plan de inversión de anticipo presentado por el CONSORCIO GM HACHA.

En consecuencia, el estado financiero del contrato es de **CERO (0%)** por ciento y se resume de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR $	CONCEPTO	VALOR $
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 2.136.409.641,00	VALOR DE ANTICIPO	$ 640.922.892,30
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0,00	VALOR AMORTIZADO DE ANTICIPO	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR	$ 2.136.409.641,00	VALOR DE ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 640.922.892,30

17.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha no se ha efectuado ningún desembolso al contratista CONSORCIO GM HACHA.

17.3 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR NETO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.136.409.641,00
VALOR ANTICIPO	$ 640.922.892,30
VALOR GIRADO ANTICIPO	$ 0.00
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 2.136.409.641,00

18 INFORME LEGAL

18.1 DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

De acuerdo con las obligaciones contractuales el contratista CONSORCIO GM HACHA debe acatar las que cita la **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** de la minuta del contrato 3701 de 2025.

Además de todo lo anterior, para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá:

1. *Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, en la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 marzo de 2003, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.*
2. *Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato electrónico, deberá constituir las garantías pactadas en el contrato y realizar la publicación si hay lugar a ello.*
3. *El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto contratado con total autonomía técnica y administrativa.*
4. *Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo al municipio y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás.*
5. *El contratista deberá Comprometerse a entregar productos de buena calidad.*
6. *Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Esta es de propiedad del Municipio de Villavicencio, y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.*

7. *Presentar al Supervisor del contrato mensualmente y de manera oportuna informes y demás documentos soporte que se requieren para hacer corte de facturación de cada periodo ejecutado.*
8. *Atender diligente y oportunamente todos los requerimientos y/o recomendaciones técnicas, jurídicas, financieras, etc., por el supervisor designado por la Entidad durante la ejecución del contrato.*
9. *Mantener el precio señalado en la oferta sin reajuste alguno, durante toda la vigencia del contrato.*
10. *Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.*

Así como dar cumplimiento legalmente a la **CLAUSULA DECIMA CUARTA – GARANTÍAS.**

A la fecha se evidencia por parte de la interventoría que se ha dado cumplimiento a las obligaciones de la minuta del contrato por parte del contratista de obra lo que soporte para definir que el objeto del contrato está en continuo cumplimiento.

19. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

- Durante el mes de enero, la interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y de seguridad a las actividades ejecutadas por el contratista, evidenciando el desarrollo de obras correspondientes a las etapas iniciales del proyecto, tales como excavaciones, rellenos, conformación de subbase, solados en concreto, instalación de sardinel prefabricado y colocación de losetas tipo alerta.

- Las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos establecidos en los diseños y especificaciones del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de calidad, seguridad y cumplimiento normativo. Se destaca la correcta ejecución de procesos como la compactación de materiales, nivelación de superficies y alineación de elementos prefabricados, fundamentales para la estabilidad y funcionalidad de las obras.

- En cuanto al componente técnico, los trabajos de excavación manual en conglomerado y la posterior conformación de rellenos y subbases permitieron avanzar en la preparación estructural del terreno, constituyéndose en una base adecuada para la ejecución de las actividades posteriores del proyecto.

- La interventoría evidenció que las actividades relacionadas con la instalación de elementos urbanos, tales como sardinel prefabricado y losetas de alerta, se ejecutaron cumpliendo con los criterios de accesibilidad, alineación y acabados requeridos, contribuyendo a la funcionalidad y seguridad del espacio público intervenido.

- Desde el componente ambiental, se verificó la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, evidenciando el control en el manejo de materiales, residuos sólidos y condiciones del entorno, contribuyendo a la mitigación de impactos generados por la obra.

- En relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo, se constató el cumplimiento de las medidas de control y prevención de riesgos, incluyendo la dotación de elementos de protección personal, señalización en obra y condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades constructivas.

- Respecto al avance del proyecto, para el periodo evaluado se registró un avance programado acumulado del **66,44 %,** frente a un avance ejecutado acumulado del **24,35 %,** evidenciándose un desfase significativo respecto a la programación inicial. No obstante, las actividades ejecutadas durante el mes corresponden a procesos necesarios para la consolidación técnica del proyecto y el desarrollo de las fases constructivas posteriores.

- Teniendo en cuenta la documentación presentada por el contratista, así como la verificación realizada por la interventoría, se certifica que durante el Periodo No. 02, comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, el CONSORCIO GM HACHA dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, incluyendo la ejecución de actividades de obra, el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y la presentación del INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02 con sus respectivos soportes.

- En términos generales, las actividades desarrolladas durante el mes de enero contribuyen al avance progresivo del proyecto, evidenciando cumplimiento técnico en la ejecución de las obras, aunque con la necesidad de implementar acciones que permitan mejorar el rendimiento y cumplimiento de la programación establecida.

Aprobación del Informe:

ING. HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Anexos:

- Copia bitácora de obra.
- Actas de comité.
- Correspondencia enviada y recibida.
- Planillas de seguridad social de obra.
- Certificado calibración de equipos de topografía de obra.
- Informe de contratista de obra.

CONSORCIO INTERHACHA 2025

COPIA BITÁCORA DE OBRA.

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N A

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N A

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la espcificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Ejecución simultánea de excavación manual y relleno con material mixto, incluyendo extendido, humedecimiento y compactación manual.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la espcificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Ejecución sostenida de excavaciones, rellenos y conforme a la secuencia constructiva.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	8	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuidad en la conformación y compactación de subbase granular, con excavaciones puntuales de ajuste.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Desarrollo simultáneo de rellenos finales y subbase granular, manteniendo progresión uniforme de los frentes de la zona norte y sur.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Avance de subbase granular y culminación de excavaciones en sectores definidos del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la espcificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, elemento interno para la consruccion del anden perimentral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de instalación de sardinel prefabricado en tramos con subbase terminada. Continuación de subbase en sectores restantes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la espcificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, elemento interno para la consruccion del anden perimentral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Instalación de sardinel prefabricado y ajustes finales de subbase granular para garantizar alineación y confinamiento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la espcificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, elemento interno para la consruccion del anden perimentral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N A

OBSERVACIONES GENERALES

Avance en colocación de sardinel prefabricado y finalización de subbase granular para la zona norte del anden perimetral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la espcificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, elemento interno para la consruccion del anden perimentral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Cierre de actividades de excavación, relleno y subbase para el anden perimetral de la zona norte y este . Finalización de instalación de sardinel prefabricado de la zona sur.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de instalación de loseta alerta prefabricada sobre base de arena, con nivelación inicial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Rasidente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuación de instalación de loseta alerta prefabricada, garantizando alineación y pendientes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldia de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Instalación de loseta alerta para el anden perimetral, manteniendo continuidad y control de niveles.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	Maria E. Moreno Q.
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Colocación sostenida de loseta alerta prefabricada y correcciones menores de alineación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	21	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Avance en instalación de loseta alerta, ejecución de sellos en sectores terminados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuación de loseta alerta prefabricada, garantizando uniformidad y acabado superficial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Instalación de loseta alerta en nuevos frentes y revisión de áreas previamente ejecutadas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Ejecución continua de loseta alerta, manteniendo ritmo constante de producción.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Cierre progresivo de instalación de loseta alerta y sellos finales de la aprte noreste del anden perimetral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una bse de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización total de la instalación de loseta alerta prefabricada de la parte norte del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Preparación de superficies y frentes para actividad de solado en concreto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) en sectores definidos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	30	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuación de solado en concreto, garantizando espesores y acabado conforme a especificaciones.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	31	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

CONSORCIO INTERHACHA 2025

ACTAS DE COMITE

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Tipo de Reunión:	**Presencial** X **Hibrida** **Virtual**
Link Reunión (Hibrida- Virtual):	
Contrato de Interventoría:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3701-2025**
Contrato de Obra:	**CONTRATO DE OBRA No.3631-2025**
Dependencia:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**
Acta Número:	06
Fecha de la reunión:	22 de enero de 2026
Hora de Inicio:	11:00 am.
Hora de Terminación:	04.00 pm.
Fecha reunión de Seguimiento:	Por definir

PARTICIPANTES

Por parte del municipio de Villavicencio

- El señor Alcalde, alexander Baquero Sanabria.
- La Secretaría de Infraestructura, Maritstella Santana S.
- El director de Obras Civiles, Arquitecto Diego Barbosa
- Y la Arquitecta Camila Sánchez

Por parte del CONSORCIO GM HACHA, contratista de obra.

- Ingeniera, María Edith moreno Quiroga en calidad de directora de obra
- Ingeniero, Leonardo Alfonso Quiroga Palma en calidad de apoyo técnico de obra
- Ingeniera, Karen stephanie Ramirez Patiño en calidad de apoyo administrativo de obra

Por parte del CONSORCIO INTERHACHA, interventoría al contrato de obra.

- La arquitecta, Alejandra Ballen, como profesional administrativo de interventoría.
- El arquitecto, Andrés Hernández, como profesional de interventoría.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar y socializar la modificación no sustancial al diseño inicial del proyecto, relacionada con ajustes en texturas, colores y ubicación del mobiliario urbano, apoyada en imágenes tipo RENDER y en la sustentación técnica de las causas que motivan dichos ajustes, con el fin de que la entidad defina los acabados y demás aspectos pertinentes para garantizar la continuidad del proyecto.

ORDEN DEL DÍA

1. **Contextualización del proyecto y objetivos de la reunión**
2. **Sustentación integral de la modificación no sustancial al diseño**

   - Ajustes en texturas, colores y ubicación del mobiliario urbano
   - Presentación de imágenes tipo RENDER
   - Sustentación técnica de las causas de la modificación no significativa

3. **Observaciones, comentarios y aclaraciones por parte de la entidad**
4. **Definición de acabados y lineamientos para la continuidad del proyecto**
5. **Conclusiones, compromisos y cierre de la reunión**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a la reunión prevista con el propósito de definir los aspectos relevantes relacionados con el diseño del proyecto de adecuación del espacio público del **Parque del Hacha**, para lo cual se dispone un espacio de articulación conjunta entre las partes involucradas, las cuales se encuentran debidamente relacionadas en el presente documento como asistentes.

Para todos los efectos, toma la palabra el contratista de obra **CONSORCIO GM HACHA**, quien realiza la exposición de los ajustes al diseño, partiendo de la premisa de que la necesidad de dichos ajustes surge como resultado de la visita ambiental efectuada por la autoridad ambiental competente **CORMACARENA**, realizada el día 17 de diciembre de 2025, en el marco de la cual se inició un proceso de identificación de impactos ambientales y definición de medidas de mitigación, orientadas principalmente a la disminución de la poda de especies arbóreas.

Bajo este escenario, y en atención a la salvaguarda de la esencia ambiental del espacio público objeto de intervención, así como al cumplimiento de los compromisos y acciones derivados del componente ambiental, asumidos por las partes involucradas, se determinan los ajustes al diseño y la modificación no sustancial del mismo. En este sentido, se presenta la **planta arquitectónica** y las **imágenes tipo RENDER** del proyecto, en las cuales se visualizan los colores y texturas propuestos para aprobación, así como la explicación integral de las acciones desarrolladas a la fecha, incluyendo los aspectos relacionados con el mobiliario urbano y demás elementos relevantes, con el fin de contar con el soporte técnico necesario para la ejecución y desarrollo de las adecuaciones proyectadas.

Sustentación integral de la modificación no sustancial al diseño.

Acto seguido se realizó la sustentación integral de la modificación no sustancial al diseño inicial del proyecto, explicando los ajustes propuestos en relación con las texturas, colores y la ubicación del mobiliario urbano, los cuales no alteran la concepción general, funcional ni técnica del diseño previamente aceptado por el contratista de obra conforme a los entregados por la entidad durante el proceso de licitación y expuesto para todos los efectos en el comité técnico de fecha 30 de diciembre de 2025 dentro del cual se identificaron aspectos a tener en cuenta

Durante este espacio y teniendo en cuenta las orientaciones dadas, se presentaron imágenes tipo RENDER como soporte visual, permitiendo a los asistentes identificar de manera clara los cambios planteados y su integración con el diseño original. Así mismo, se expusieron las causas técnicas y contextuales que fundamentan la modificación no significativa, las cuales responden a criterios funcionales y de adecuación al entorno y principalmente del tema ambiental para la mitigación de la tala de algunas especies arbóreas identificadas. Además de ello se hizo énfasis en que era supremamente importante aterrizar esta planta arquitectónica para efectos de avanzar de forma paralela en el componente eléctrico, de diseño fotométrico y seguidamente de ubicación de la red eléctrica conforma a los cambios dispuestos.

- Se presento entonces planta arquitectónica impresa y visible donde se identificaban las zonas duras, blandas y distribución de los espacios de plazoletas y ubicación del monumento al hacha.
- Se presento imágenes render donde se visualiza acabados en colores y texturas, posibles alturas, acabados de los estampados y ubicación de mobiliario urbano.
- Se presento carta de colores y tipos de moldes dentro para la obtención toma de decisiones al respecto.

De igual forma se tocó el tema al respecto del mobiliario urbano de las casetas de vendedores que se reubicaron temporalmente sobre la carrera 31, en este espacio se requiere definir el proceder de estas personas en el área y que se defina puntos y cantidades para tener en cuenta para efectos de determinar las zonas blandas, duras y demás. Asi mismo se precisa que si bien hay unas acciones pendientes del tema cultural con CORCUMVI, se determine además si existe la necesidad de contar con algún otro permiso, licencia o demás y se precise si se debe hacer entrega de este espacio con cumplimiento de requisitos adicionales a los de alumbrado y culturales.

Producto de lo anterior se presentaron las siguientes **Observaciones, comentarios y aclaraciones por parte de la entidad contratante.**

Durante este punto, se abordaron inquietudes relacionadas con los acabados, materiales y coherencia del diseño propuesto, generándose un intercambio técnico orientado a precisar los alcances de la modificación, asi mismo se identificó un aspecto demasiado importante que resalta el tema de patrimonio cultural y de conservación en el entendido de la historia del espacio público objeto de intervención y dentro de esta premisa se precisan las siguientes temas que se deben considerar de importancia para tener en cuenta, según las consideraciones y punto de vista de la entidad a través de la secretaria de Infraestructura.

1. Contemplar el cumplimiento de los requisitos establecidos en comités anteriores que tiene que ver con el traslado del monumento al hacha, teniendo en cuenta el tema patrimonial que representa el mismo y que es de suma importancia salvaguardar su estabilidad. En cuestión a esto se precisa que debido al hito cultural su trayectoria y otras consideraciones del patrimonio, se deberá contemplar su ubicación y precisar el diseño entorno al monumento.
2. Establecer parámetros normativos del porcentaje de zonas duras y blancas del proyecto.
3. Identificar la cantidad y ubicación de las especies contempladas para tala.
4. Se precisa la opción de revisar la bahía vehicular del costado de la carrera 31 a fin de mejorar y posiblemente incluir un espacio destinado para el servicio de estación productiva y estratégica del centro.

5. Con relación a la estación de bicicletas y mesas de ping pong que se ubican en el diseño conforme al alcance contractual se precisa llevar estas cantidades a ceros teniendo en cuenta que el propósito de este espacio público y la cultura ciudadana no se relacionan con este tipo de mobiliario.
6. Para el tema de estampados (texturas) y colores, se precisan unos puntos de referencia de la ciudad como ejemplo y se llega a la conclusión que estos deberán tener relación con el entorno urbanístico colindante, de igual forma se hace la apreciación al respecto de incluir un elemento interno, sin embargo esto queda a consideración presupuestal además.
7. Se identifica la necesidad de hacer una implantación en las zona donde se ubicaría, a futuro, el CAÍ a efectos de tener en cuenta si el espacio es el adecuado o existe la necesidad de adecuar más área.
8. Con relación a las luminarias y mástiles, se referencian puntos estratégicos de la ciudad ya intervenidos para efectos de identificar los insumos y tener una similitud, siendo que estos ya fueron aprobados en su momento por alborada y ayuda a agilizar los procesos de recibo.
9. Con relación al mobiliario de casetas se estima conforme a las necesidades expuestas por el contratista que se deberá determinar con la Dirección de espacio público, la información solicitada y tenerla en cuenta para los ajustes al diseño si es que se requiere, asi mismo el Sr Alcalde manifiesta que se puede evaluar la posibilidad de incluir en el presupuesto la elaboración de un mobiliario nuevo, estético y acorde al nuevo espacio y se precise el costo de estos y se incluya en el presupuesto como una adición, teniendo en cuenta un red de energía hasta las cajas que se ejecute por el consorcio.
10. De igual forma se precisa por parte del Director de Obras civiles, Arquitecto Diego Barbosa que no se requiere tramitar permisos adicionales de espacio público ya que el contrato es del Municipio y la entidad que suscribe estos es el mismo Municipio.

Otras consideraciones del contratista al respecto.

En el entendido de lo que expresa el Municipio como Entidad contratante y al respecto de tomar una decisión que permita y garantice el desarrollo continuo del proyecto el CONSORCIO GM HACHA manifiesta que si bien todas y cada una de las consideraciones dadas por parte de la entidad tienen un soporte de cumplimiento normativo y justificación conforme a necesidades del área y su concepción, el uso, y otros temas. Este tipo de cambios y de decisiones al respecto de modificar el diseño estarían cambiando su concepción en una totalidad drástica que además no tiene coherencia con el alcance presupuestal que se contempló y que si bien el alcance presupuestal puede ser objeto de cambio, se deben determinar unas pautas claras al respecto de determinar el balance entre lo contractual y el diseño. En ese sentido que los cambios que sea que se requieran por estética, norma u otros factores, se deberán especificar por parte del Municipio, siendo este quien determina la necesidad real y no por el contratista ya que los cabios aportados correspondían únicamente a ajustes mínimos y la toma de esta decisión no sería de su resorte.

Asi las cosas se deja la salvedad al respecto de que el contrato se encuentra en desarrollo y las actividades preliminares ya han sido ejecutadas, en las cantidades que se detallan con el mensual N° 01 entregado a la interventoría y que de ser posible se requiere que se notifiquen los ajustes de forma rápida para no afectar el avance de la obra.

4. Definición de acabados y lineamientos para la continuidad del proyecto

Como resultado de la discusión técnica, se procedió a la definición de los acabados y lineamientos generales que servirán de referencia para la continuidad del proyecto. Estos lineamientos permitirán orientar las siguientes etapas de ejecución, garantizando coherencia entre el diseño ajustado y su implementación, sin afectar el alcance, plazo ni presupuesto del proyecto.

5. Conclusiones, compromisos y cierre de la reunión

Finalmente, se consolidaron las conclusiones de la reunión y se establecieron los compromisos derivados de los temas tratados, precisando las responsabilidades y acciones a seguir. Una vez agotados los puntos del orden del día, se dio por finalizada la reunión, dejando constancia de lo tratado para los fines pertinentes.

Se cierra el comité quedando como pendiente desarrollar las respectivas mesas de trabajo mediante las cuales se resuelvan de fondo las consideraciones dadas por las partes.

DECISIONES TOMADAS

Se define como necesidad atender información de los vendedores ambulantes con la dirección de espacio público.
Sacar del presupuesto el suministro de las mesas de ping pong y la estación de bicicletas.
Determinar el diseño y valor de la red de conexión de energía de los puntos a las casetas de vendedores.
No hacer el traslado del monumento al hacha, sin embargo, si se deben considerar actividades de restauración y mejoramiento para que se vincule a las necesidades del proyecto.
De manera general esperar los cambios que el Municipio considere aterrizar al diseño y para ello reevaluar las decisiones anteriores, en este punto se desarrollaran mesas de trabajo y se dijo como primer espacio el día viernes 23 de enero de 2026, a las 8.00 am en las instalaciones de la secretaria de infraestructura.

Con relación al tema de permisos y licencias se debe en comité adelantar las necesidades y en coherencia de los cambios que se requieran aplicarlas al proyecto.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR.**
- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1			
2			
3			

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Jamstella Santana	Sec. Infraestructura	
Camila Suchez Montaño	Contratista Infraestructura	Camila Suchez M
Diego Barbosa	Director O.C.	
Maria E Moreno C.	Director obra	
ANDRES HERNANDEZ B	INTERVENTORIA	

NOMBRE DE LA REUNIÓN								
Tipo de Reunión:	**Presencial**	**X**	**Hibrida**		**Virtual**			
Link Reunión (Hibrida- Virtual):								
Contrato de Interventoría:	**3701 DE 2025**							
Contrato de Obra:	**3631 DE 2025**							
Dependencia:								
Acta Número:	N°07							
Fecha de la reunión:	23-01-2026							
Hora de Inicio:	3:00 P.M							
Hora de Terminación:	5:00 P.M							
Fecha reunión de Seguimiento:								

PARTICIPANTES

Contratista de obra: German Andres Garcia Castillo
Director de obra: Maria Moreno Quiroga

Interventoría, Especialista ambiental: Juan Carlos Romero
Apoyo de Interventoría: Andres Hernandez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Definir técnicamente las acciones a seguir frente a los individuos arbóreos que interfieren con el diseño del proyecto, priorizando su conservación y el cumplimiento ambiental.

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Siendo el día 23 de enero de 2026, se realizó visita técnica a la obra del Parque del Hacha, con la participación del contratista de obra, la interventoría, los profesionales ambientales y el acompañamiento de un ingeniero forestal

adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, con el fin de revisar en campo los individuos arbóreos relacionados en el informe técnico radicado ante Cormacarena el 21 de enero de 2026.

El ingeniero forestal Antonio Pinzón, quien hace parte de la Secretaría de Medio Ambiente, participó durante la visita técnica, siendo el profesional encargado de validar técnicamente los individuos arbóreos susceptibles de intervención, de acuerdo con su estado, localización y relación con el diseño del proyecto.

El objetivo de la visita fue verificar la ubicación y el estado de los individuos arbóreos, así como su relación con el diseño del proyecto, considerando su posible interferencia con las zonas duras previstas. De igual manera, se analizó la viabilidad de preservar algunos de estos individuos mediante ajustes al diseño, con el propósito de evitar intervenciones innecesarias.

Durante el recorrido se evidenció que varios individuos arbóreos interfieren con áreas definidas como zonas duras en el diseño original. Sin embargo, se constató que algunos de estos individuos no presentan afectaciones fitosanitarias que justifiquen la aplicación de tratamientos silviculturales, siendo su principal condición la interferencia con la proyección geométrica del diseño del proyecto.

En este contexto, el profesional ambiental de la Alcaldía emite su recomendación técnica, indicando que, para aquellos individuos que no presentan afectaciones fitosanitarias relevantes, debe priorizarse su conservación, recomendando la adecuación del diseño del proyecto, aun cuando ello implique la modificación de algunas zonas duras previamente establecidas.

Dicha recomendación es acogida por la interventoría y el contratista de obra, quienes coinciden en que la protección y salvaguarda de los individuos arbóreos debe prevalecer, siempre que sea técnicamente viable, y que los ajustes al diseño deben ser analizados y definidos antes de continuar con la ejecución de actividades en las áreas involucradas.

Como resultado de la visita, se concluye que las actividades constructivas asociadas a las zonas en conflicto no deberán ejecutarse hasta tanto se definan y validen los ajustes de diseño correspondientes, en concordancia con la recomendación ambiental emitida y con la validación técnica realizada por el ingeniero forestal de la Secretaría de Medio Ambiente.

DECISIONES TOMADAS

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES


- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**
- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**


No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1			
2			
3			


Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Germán Andrés García Castro	R/L CONSORCIO GM HACKA Residente de obra	
Andrés Hernández B	APOYO INTERVENTORIA	
Mona E Moreno Quevedo	Director obra Contratista	Mona E Moreno Q.
Juan Carlos Romero	Especialista Ambiental INTERV.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

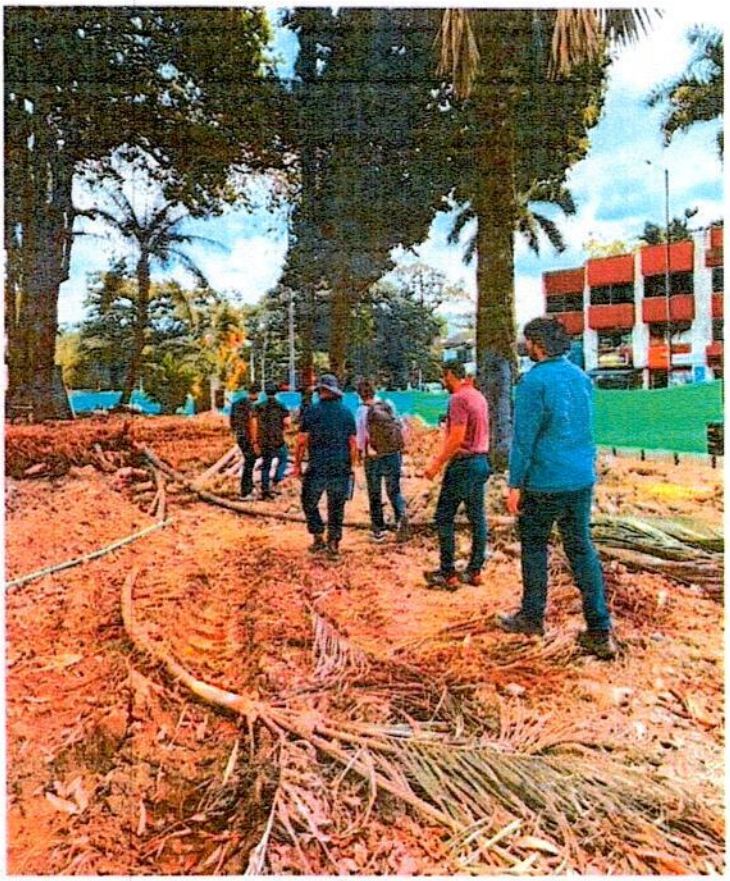

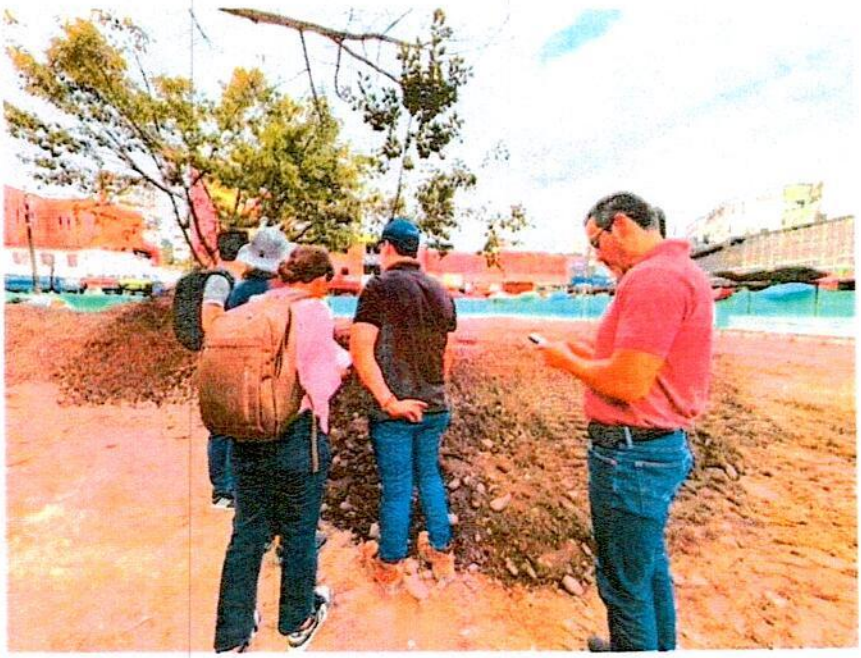

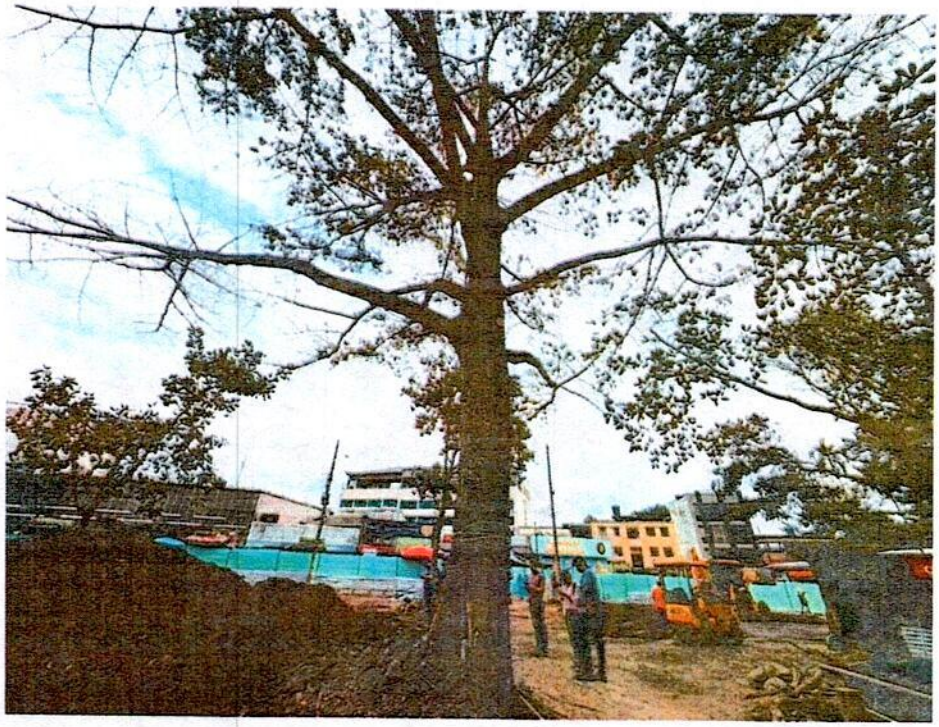



CONSORCIO INTERHACHA 2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

CONSORCIO INTERHACHA 2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 30 de enero de 2026

30 ENE 2026 Hora 2:33
0315
03 carpetas

CIH-2025-021

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Cra. 20 #37a55, Villavicencio, Meta
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CM-012-2025 – **CONTRATO NO 3701 DE 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

"ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE DEL HACHA, UBICADO ENTRE LAS CALLES 35A Y 36 Y ENTRE LAS CARRERAS 31 Y 32, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META"

Asunto: ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A OBRA DICIEMBRE (MES No.01).

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito realizar la entrega del informe mensual N° 01 correspondiente al periodo comprendido del 5 al 31 de diciembre del 2025, se complementa la información y los anexos.

Se anexa documentación en 3 carpetas organizadas en 1 caja que contiene el informe de interventoría a obra del contrato "ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE DEL HACHA, UBICADO ENTRE LAS CALLES 35A Y 36 Y ENTRE LAS CARRERAS 31 Y 32, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META".

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Atentamente,

ING. HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 29 de enero de 2026

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 29 ENE 2026 HORA
2538
Recibido de:
Recibido No. Folios

Señores
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Calle 40 N.º 33 - 64 Centro PISO 2
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CM-012-2025 **– Contrato N° 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: Remisión de garantías Contrato de interventoría N°3701 de 2025 conforme el acta de prorroga N°01.

Respetados señores.

Adjunto remitimos el anexo correspondiente al contrato de interventoría 3701 de 2025 citado en referencia, conforme a la siguiente relación.

ANEXO	POLIZA	AMPARO	FOLIOS
2	620- 47- 994000059192	Cumplimiento (Cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio)	02

Sin otro particular.

Atentamente,

ING. HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203186132

PÓLIZA No: 620 - 47 - 994000059192 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	23	01	2026
FECHA DE IMPRESIÓN	23	01	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO INTERHACHA 2025 IDENTIFICACIÓN: NIT 902.011.747-2

DIRECCIÓN: CL 2 A # 30 - 56 BRR LA CORALINA CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO: 6086638378

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.324-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.324-3

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/12/2025	15/06/2026	42,472,360.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/12/2025	15/02/2029	10,618,090.00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/02/2026	13/02/2031	42,472,360.00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA MODIFICACION

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE PRORROGA No. 01 DE FECHA 29/12/2025 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 13/02/2026, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 822007239 - ARM CONSULTING SAS - PART: 90.00%
NIT 901891714 - INGENIERIA E INTERVENTORIA CRISMA SAS - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 892099324 - MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR
$ ****95,562,810.00	$ **********18,816	$*****6,000.00	$ ********4,715	$ **********29,531

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	6002	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/wps_digitalclientlogin MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070006203186 13

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA207B0D0EF87D57

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@dgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 6:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:** https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de tos clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2569 DIC 23 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

RECIBO DE CAJA No. 620142156

Aseguradora Solidaria de Colombia

AGENCIA	TRANSACCIÓN Nro.	FECHA DE RECAUDO	TIPO PAGADOR
VILLAVICENCIO	620232389	28/01/2026	ASEGURADO

NOMBRE PAGADOR	C.C o NIT
CONSORCIO INTERHACHA 2025	902011747

TOMADOR PÓLIZA
CONSORCIO INTERHACHA 2025

DETALLE DE PAGO
PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000059192 - NRO. ELECTRÓNICO 6203186132

VALOR EN LETRAS (en Pesos)	VALOR RECIBO
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS	$ 29,531.00

PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000059192 - ANEXO 2 AGENCIA VILLAVICENCIO, TOMADOR PÓLIZA: NIT-902011747 CONSORCIO INTERHACHA 2025 . VALOR PAGADO $ 29,530.85 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 620232389

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 20 de enero de 2026

CIH-2025-018

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Calle 40 N.° 33 - 64 Centro PISO 2
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CM-012-2025 – **Contrato N° 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ESCANEO DE CARPETA CONTRACTUAL – CONTRATO DE OBRA No. 3631 DE 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría permite solicitar respetuosamente su autorización para realizar el escaneo de la carpeta física correspondiente a los DOCUMENTOS DEL ACTA DE INICIO del Contrato de Obra No. 3631 de 2025, cuyo objeto es la "Adecuación del área pública del Parque del Hacha, entre calles 35A y 36 y entre carreras 31 y 32, en el municipio de Villavicencio – Meta", la cual se radico ante la entidad de la Alcaldía en el mes de diciembre 05 del 2025.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el respaldo digital (backup) de la carpeta contractual de la interventoría presentó fallas técnicas que ocasionaron la pérdida parcial de la información archivada, situación que hace necesario reconstruir el expediente documental, con el fin de garantizar la trazabilidad, el adecuado seguimiento técnico, administrativo y contractual, así como la correcta custodia de la información del proyecto.

En este sentido, agradecemos su colaboración autorizando el acceso a la documentación correspondiente para proceder con su digitalización, asegurando que esta será utilizada exclusivamente para fines institucionales y conforme a los principios de confidencialidad y manejo documental vigentes.

Quedamos atentos a su respuesta y a la programación que estimen pertinente para adelantar esta actividad.

Cordialmente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 20 ENE 2026
HORA 10:57
2214

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 19 de enero de 2026

CIH-2025-017

Señores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Cra. 20 #37a55, Villavicencio, Meta
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratación CM-012-2025 – **Contrato No 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: Remisión de documentación para trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control que adelanta esta Interventoría en el marco del Proyecto Parque del Hacha, nos permitimos informar que se llevó a cabo la revisión de la información y documentación presentada por el contratista de obra, correspondiente a la solicitud del Permiso de Aprovechamiento Forestal que debe ser tramitado ante la autoridad ambiental CORMACARENA.

Una vez verificada la documentación desde el componente técnico-ambiental, se remite la información a la Secretaría de Infraestructura para su revisión y validación. En caso de no presentarse observaciones, se solicita adelantar la radicación formal de la solicitud ante CORMACARENA, con el fin de agilizar el trámite del permiso y dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y legales asociadas al proyecto.

Para tal efecto, se anexa la siguiente documentación:

- Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal.

- Inventario forestal.

- Mapas de ubicación de los individuos a aprovechar.

- Archivo KML con la ubicación georreferenciada de los individuos a aprovechar.

- Fichas técnicas de las especies forestales.

- Copia de la tarjeta profesional del ingeniero forestal responsable de la elaboración de los documentos.

Agradecemos se nos informe oportunamente cualquier observación, comentario o requerimiento adicional que surja durante el proceso de revisión, con el fin de realizar los ajustes necesarios y continuar avanzando en el trámite del permiso ambiental correspondiente.

Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Remision documentacion permiso forestal - CIH-2025-017

1 mensaje

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>
Para: infraestructura@villavicencio.gov.co, obrasciviles@villavicencio.gov.co
CC: luisc.gutierrezbolivar@gmail.com

19 de enero de 2026 a las 4:51 p.m.

Buena tarde, cordial saludo
Envío oficio remitiendo la documentación para solicitar el permiso forestal.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y respuesta.

4_MapaIndividuos.png

6 archivos adjuntos

17- Remision documentacion permiso forestal.docx
256K

2_PAF_ParqueHacha_v2.pdf
1233K

3_InventrioForestal.xlsx
177K

5_KmlIndividuos.kml
7K

7_Tarjeta Profesional.pdf
87K

6_FichasEspecies.xlsm
19465K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 16 de enero de 2026

CIH-2025-016

Señores
CONSORCIO GM HACHA.
R/L GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CM-012-2025 – **CONTRATO No 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: REITERACIÓN – INCUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones propias de la interventoría y en atención al seguimiento técnico, administrativo y ambiental realizado al proyecto, nos permitimos reiterar la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) correspondiente al Contrato de Obra No. 3631 de 2025, la cual ya fue requerida previamente y a la fecha no ha sido atendida, configurándose un incumplimiento a las obligaciones contractuales y ambientales del contratista.

Como resultado de las visitas técnicas, comités de seguimiento y actividades de coordinación adelantadas con la supervisión y el contratista de obra, la interventoría ha evidenciado la necesidad inmediata de ajustar y actualizar el PMA, con el fin de incorporar las condiciones reales del proyecto, especialmente en lo relacionado con la cantidad de árboles existentes y la evaluación de los impactos ambientales directos e indirectos generados por la ejecución de las actividades.

La no actualización ni presentación oportuna del PMA afecta el adecuado desarrollo del proyecto y contraviene la normativa ambiental vigente, así como las disposiciones contractuales que rigen la ejecución de la obra.

En consecuencia, se requiere de manera inmediata la presentación formal de la actualización del PMA, debidamente ajustada y lista para su implementación, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir del recibo del presente oficio.

De no recibirse respuesta dentro del término señalado, la interventoría se verá en la obligación de dejar constancia del incumplimiento y proceder conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad aplicable, informando a la supervisión y a la entidad contratante para las acciones a que haya lugar.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

REITERACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL PMA

1 mensaje

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>
Para: consorciogmhacha2@gmail.com

16 de enero de 2026 a las 10:00 a.m.

Buen día
Por medio de la presente, remito oficio solicitando nuevamente la solicitud de actualización del PMA.

16- SOLICITUD DE REITERACIÓN PMA.pdf
106K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 14 de enero de 2026

CIH-2025-015

Señores
CONSORCIO GM HACHA.
R/L GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CM-012-2025 – **CONTRATO No 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: SOLICITUD DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA – CONTRATO No. 3631 de 2025

Cordial saludo

En desarrollo de las funciones de seguimiento, control y verificación propias de la interventoría, y como resultado de las visitas técnicas realizadas al proyecto, se ha evidenciado que el Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) no permanece de manera permanente y continua en el frente de obra, situación que ha sido recurrente.

Al respecto, se recuerda que la presencia permanente del Residente de SST en el sitio de ejecución del proyecto constituye una obligación contractual, indispensable para garantizar la adecuada coordinación de las actividades constructivas, la correcta supervisión en campo y la oportuna toma de decisiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

La interventoría, ha identificado debilidades en el control del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores, así como falencias en las medidas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual incrementa de manera significativa el riesgo de incidentes y accidentes laborales.

En consecuencia, esta interventoria solicita de manera formal que el Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo haga presencia permanente y continua en el proyecto, ejerciendo un control efectivo sobre las actividades en ejecución y velando estrictamente por el cumplimiento de las normas de seguridad, el uso correcto y obligatorio de los EPP y la protección integral de todos los trabajadores que intervienen en la obra.

Lo anterior se fundamenta en lo establecido en el *ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO – 8.1 PERSONAL CLAVE (página 12)*, publicado en la plataforma SECOP II, donde se especifica la obligatoriedad de contar con el personal clave con la dedicación exigida. Adicionalmente, en dicha plataforma se encuentra publicado el *PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL*, cuyo estricto cumplimiento es de carácter obligatorio.

8.1 Personal Clave

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.

El personal relacionado corresponde al siguiente

- UN (01) Ingeniero Civil/ Arquitecto - Director de Obra (Dedicación 30%).
- UN (01) Ingeniero Civil/Arquitecto Esp - Residente de obra (Dedicación 100%)
- UN (01) Ingeniero electricista - especialista (Dedicación 30%)
- UN (01) Tecnólogo- SST (Dedicación 100%)

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ANEXO – 7.21



CONSORCIO GM HACHA

Finalmente, se precisa que, conforme a la documentación contractual aportada, el profesional designado para el cargo de Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo es el señor *HENRY MAURICIO CAGUEÑAS HOLGUÍN*, quien deberá dar cumplimiento integral a las obligaciones y dedicación establecidas contractualmente.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Gmail CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

SOLICITUD DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA – CONTRATO No. 3631 de 2025

1 mensaje

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com> 14 de enero de 2026 a las 11:51 a.m.
Para: consorciogmhacha2@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto oficio correspondiente al asunto mencionado.

cordialmente,

CONSORCIO INTERHACHA 2025

15- RESIDENTE SISO.pdf
229K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 06 de enero de 2026

CIH-2025-014

Señores
CONSORCIO GM HACHA.
R/L GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CM-012-2025 – **CONTRATO No 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PMA

Cordial saludo

En ejercicio de las funciones propias de la interventoría, y como resultado de las visitas técnicas realizadas a la obra, así como de los comités de seguimiento y las actividades de coordinación adelantadas con la supervisión y el contratista de obra, la interventoría se permite solicitar de manera formal la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto correspondiente al Contrato de Obra N.° 3631 de 2025, cuyo objeto es la "Adecuación del área pública del Parque del Hacha, ubicado entre las calles 35A y 36 y entre las carreras 31 y 32, en el municipio de Villavicencio – Meta".

A partir del seguimiento técnico, administrativo y ambiental efectuado por la interventoría, se ha evidenciado la necesidad de realizar una modificación al PMA, con el fin de incorporar las actualizaciones ambientales requeridas conforme a las condiciones reales identificadas en el proyecto.

En este sentido, la interventoría considera indispensable contar con la actualización e implementación del PMA, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto, considerando la cantidad de árboles existentes y evaluando los impactos ambientales directos e indirectos que puedan generarse en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PMA

1 mensaje

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>
Para: consorciogmhacha2@gmail.com

6 de enero de 2026 a las 3:44 p.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito reenviar la información remitida por la obra para su conocimiento

cordialmente,

CONSORCIO INTERHACHA

14- SOLICITUD DE PMA.pdf
107K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 06 de enero de 2026

CIH-2025-013

Señores
CONSORCIO GM HACHA.
R/L GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CM-012-2025 – **CONTRATO No 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO PARA EL TEMA AMBIENTAL – CONTRATO No. 3631 de 2025

Cordial saludo

Por medio del presente me comunico a ustedes con el fin de solicitar los siguientes documentos ambientales del contrato de obra No. 3631-2025

- Documentos de la empresa a donde se dispondrá el material RCD y Excavación - Incluir documento donde la empresa confirme que autoriza la disposición generada del Parque del Hacha
- Documentos de la Empresa del transporte de material
- Documentos de la Mina donde se usará el material pétreo
- Documentos de la empresa que alquila los baños portátiles y Certificado de la implementación de los baños portátiles

Se recuerda que mensualmente deben pasar el reporte de las actividades ejecutadas durante el mes

- Cantidad de RCD y excavación generada
- Cantidad de material pétreo ingresado
- Puntos de hidratación del personal
- Preoperacionales de la maquinaria vigente
- Adicionar también los vales de excavación y RCD retirado, incluir certificado generado por ZODME

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

CIH-2025-013 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL TEMA AMBIENTAL

1 mensaje

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>
Para: consorciogmhacha2@gmail.com

6 de enero de 2026 a las 11:52 a.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito reenviar la información remitida por la obra para su conocimiento

cordialmente,

CONSORCIO INTERHACHA

13- SOLICITUD AMBIENTAL.pdf
115K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

Villavicencio, 05 de enero de 2025

CIH-2025-012

Señores
CONSORCIO GM HACHA.
R/L GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN CM-012-2025 – **CONTRATO No 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: REQUERIMIENTO ENTREGA INFORMES MENSUALES DE OBRA No. 1 MES DE DICIEMBRE 2025 – CONTRATO No. 3631 de 2025

Cordial saludo

En atención al cronograma establecido para la entrega de los informes de obra correspondientes al Contrato de Obra No. 3631 de 2025, se recuerda que estos deben ser remitidos dentro de los primeros días de cada mes para su respectiva revisión.

No obstante, a la fecha no se ha recibido el informe correspondiente, pese a que se había asumido el compromiso de realizar su entrega los primeros días de cada mes, situación que hasta el momento no se ha visto reflejada.

Por lo anterior, desde esta interventoria se solicita dar cumplimiento inmediato a este compromiso, teniendo en cuenta que los informes de obra constituyen un insumo indispensable para la elaboración de los informes de interventoria, los cuales deben ser presentados a la entidad contratante.

No sobra aclarar y reiterar que el informe debe contener el componente técnico o informe de obra, el ambiental, el SST, dicha información debe entregarse de manera física firmada en original por el profesional autorizado y copia en medio magnético en carpetas libres de ácidos blancas con los documentos debidamente foliados con máximo 200 folios en cada carpeta.

Por todo lo anterior se solicita que den cumplimiento de sus obligaciones contractuales y para tal fin alleguen la información solicitada.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

CIH-2025-012 - REQUERIMIENTO ENTREGA INFORMES MENSUALES DE OBRA No. 1

1 mensaje

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com> 5 de enero de 2026 a las 2:36 p.m.
Para: consorciogmhacha2@gmail.com

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito reenviar la información remitida por la obra para su conocimiento

cordialmente,

CONSORCIO INTERHACHA

12- REQUERIMIENTO ENTREGA DE INFORMES No. 1.pdf
6520K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 29 de enero de 2026.

GM-HACHA-29

Recibido Daniela Gómez
2:45 p.m 29-01-26.

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: Solicitud de realización de comité para análisis de prorroga al contrato de referencia

Respetados señores:

En desarrollo del Contrato de Obra No. 3631 de 2025 correspondiente al proyecto Parque del Hacha, el CONSORCIO GM HACHA solicita la programación de un comité técnico con el fin de presentar y sustentar la **solicitud de Prórroga No. 02 del plazo contractual**.

La solicitud se fundamenta en la necesidad de reorganizar la secuencia constructiva inicialmente prevista, derivada de ajustes en la implantación del diseño frente a condiciones identificadas en campo, particularmente relacionadas con el componente ambiental existente en el área de intervención. Si bien el proyecto mantiene frentes activos en el sector norte (Plazoleta de los Cuenteros) y en el sector noreste (Plazoleta de Juegos), donde continúan ejecutándose actividades como rellenos, instalación de bordillos, solados y andenes en concreto, la incorporación de ajustes y la coordinación técnica requerida han impactado la programación inicial.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente la programación de un comité para el día 03 de febrero de 2026, con el fin de exponer la situación y definir las condiciones correspondientes.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 29 de enero de 2026.

GM-HACHA-28

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: : Respuesta a su comunicación CIH-2025-019 del 28 de enero de 2026 que tiene por asunto "Solicitud de informe de la cantidad de árboles, especies arbóreas y bambús que fueron talados del parque de hacha".

Cordial saludo,

En atención al requerimiento elevado por su parte, conforme a lo descrito en el asunto, el **CONSORCIO GM HACHA** se permite informar que la información solicitada, relacionada con la elaboración de insumos para dar respuesta oportuna a un derecho de petición allegado por la Alcaldía, ha sido remitida de manera previa, completa y oportuna en distintas comunicaciones formales.

En efecto, en desarrollo del componente ambiental del proyecto, esta información fue puesta en conocimiento de la interventoría mediante los oficios **GM-HACHA-11, GM-HACHA-12, GM-HACHA-16 y GM-HACHA-20**, en los cuales se incluyeron los soportes técnicos y documentales correspondientes.

Ahora bien, frente a la especificación solicitada respecto a la **cantidad, relación y ubicación de especies arborícolas, así como la cantidad y tipo de bambúes**, es preciso señalar que dichos aspectos se encuentran descritos dentro de los documentos anteriormente remitidos. En lo concerniente a la identificación puntual de las especies arboríferas, esta no fue determinada inicialmente por el Consorcio, dado que corresponde a las mismas especies definidas previamente en el **Concepto Técnico CT-0863/2025**, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Villavicencio, de fecha **08 de septiembre de 2025.**

Adicionalmente, la información requerida fue ratificada y complementada en el **ACTA DE VISITA N° PM-GA.3.1.2.025.578**, levantada por **CORMACARENA** con ocasión de la visita realizada el día **17 de diciembre de 2025**, en la cual se consignan de manera expresa los aspectos ambientales objeto del presente requerimiento.

No obstante lo anterior, y con el fin de atender su solicitud y facilitar la consulta integral de la información, el CONSORCIO GM HACHA procede a **remitir nuevamente los documentos referidos**, consolidados en un solo envío, para que desde la interventoría se realice la revisión correspondiente y se cuente con

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

un único escenario documental que permita dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la entidad contratante.

Para todos los efectos, se allegan los siguientes documentos:

- Oficios **GM-HACHA-11, GM-HACHA-12, GM-HACHA-16 y GM-HACHA-20**, con sus respectivos anexos y soportes.
- **Concepto Técnico CT-0863/2025**, de fecha 08 de septiembre de 2025, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Villavicencio.
- **ACTA DE VISITA N° PM-GA.3.1.2.025.578**, realizada por CORMACARENA el día 17 de diciembre de 2025.

Agradecemos se realice la revisión integral de la documentación allegada, la cual contiene la información requerida de manera suficiente y conforme a las actuaciones previamente surtidas dentro del proyecto y en caso de requerir una adicional este consorcio se encuentra a la espera de sus requerimientos.

Sin otro particular,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Respuesta a su comunicación CIH-2025-019 del 28 de enero de 2026

1 mensaje

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: consorciointerhacha@gmail.com

29 de enero de 2026 a las 10:52 a.m.

Cordial saludo,

Adjunto envío para su conocimiento y fines pertinentes Respuesta a su comunicación CIH-2025-019 del 28 de enero de 2026.

Sin otro particular,

--
German Andrés Garcia Castillo
Representante Legal.
Consorcio GM HACHA

GM-HACHA-20.zip

6 archivos adjuntos

- ACTA DE VISITA CORMACARENA.pdf 1211K
- GM HACHA 011-Informe Tala Arboles.pdf 546K
- GM HACHA 012-SOLICITUD TALA ARBOLADO.pdf 1670K
- GM HACHA 16-SOLICITUD TALA ARBOLADO.pdf 4282K
- GM HACHA 28.pdf 330K
- PERMISO DE MEDIO AMBIENTE - TALA Y PODA DE ARBOLES.pdf 3266K

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 20 de enero de 2026.

GM-HACHA-27

Recibido Daniela Gómez
3:30 p.m 21-01-2026.

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: : Entrega del informe MENSUAL N° 01.

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales, adjunto me permito hacer entrega del informe de obra mensual N° 01 correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 junto con los soportes correspondientes y conforme a las necesidades del proyecto.

Sin otro particular,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 16 de enero de 2026.

GM-HACHA-26

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: : Respuesta a su comunicación CIH-2025-013 del 06 de enero de 2026 que tiene por asunto "SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO PARA EL TEMA AMBIENTAL – CONTRATO No. 3631 de 2025"

Cordial saludo,

En atención a los requerimientos ambientales manifestados en su oficio, adjunto envio la documentación requerida para efectos de conocimiento y fines correspondientes

- Documentos de la empresa AGREGADOS Y TRITURADOS DEL META que es el sitio donde se está realizando la compra de materiales.
- Documentos de la empresa ZODME, punto de disposición de material sobrante ambiental.
- Documentos de la empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. donde se realiza la disposición de residuos RCD y ordinarios.
- Documentos de la empresa BAMOCOL que es el proveedor de servicios de alquiler de baños portátiles.

Sin otro particular,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Respuesta a su comunicación CIH-2025-013 del 06 de enero de 2026 que tiene por asunto "SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO PARA EL TEMA AMBIENTAL – CONTRATO No. 3631 de 2025"

1 mensaje

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: consorciointerhacha@gmail.com

17 de enero de 2026 a las 1:02 p.m.

Cordial saludo,

Adjunto envió oficio GM-HACHA-26 para sus conocimientos y fines pertinentes.

En espera de sus comentarios,

--
German Andrés Garcia Castillo
Representante Legal.
Consorcio GM HACHA

Anexos del oficio GM-HACHA-26.zip

GM HACHA 26.pdf
320K

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 16 de enero de 2026.

GM-HACHA-25

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: Entrega del Diseño modificado, según recomendaciones y observaciones del 30 de diciembre de 2025.

Cordial saludo,

En atención a la visita de obra de seguimiento y control al desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones dadas a la presentación del diseño arquitectónico ajustado expuesto por el CONSORCIO GM HACHA el día 30 de diciembre de 2025 en comité de seguimiento N° 05, adjunto envio la siguiente información para su conocimiento y fines pertinentes la última versión de diseño.

Plano en dwg de la planta arquitectónica.
Imágenes RENDER.

En consecuencia de ello se espera comentarios al respecto.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Gmail CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Entrega del Diseño modificado, según recomendaciones y observaciones del 30 de diciembre de 2025.

3 mensajes

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com> 17 de enero de 2026 a las 1:00 p.m.
Para: consorciointerhacha@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto envió oficio GM-HACHA-25 para sus conocimientos y fines pertinentes.

En espera de sus comentarios,

--
German Andrés Garcia Castillo
Representante Legal.
Consorcio GM HACHA

3 archivos adjuntos

- **GM HACHA 25.pdf** 311K
- **Diseño Hacha 1.42.dwg** 5028K
- **RENDER.zip** 13149K

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com> 19 de enero de 2026 a las 11:08 a.m.
Para: ingcamilabuitrago@gmail.com

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **CONSORCIO GM HACHA** <consorciogmhacha2@gmail.com>
Fecha: El sáb, 17 ene. 2026 a la(s) 1:00 p.m.
Asunto: Entrega del Diseño modificado, según recomendaciones y observaciones del 30 de diciembre de 2025.
Para: <consorciointerhacha@gmail.com>
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

- **GM HACHA 25.pdf** 311K
- **Diseño Hacha 1.42.dwg** 5028K
- **RENDER.zip** 13149K

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 16 de enero de 2026.

GM-HACHA-24

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: : Respuesta a su comunicación CIH-2025-006 del 17 de diciembre de 2025 que tiene por asunto "Observaciones de topografía

Cordial saludo,

De manera atenta y dando respuesta a sus requerimientos, me permito dar respuesta de las observaciones de topografía, que fueron revisadas por el profesional en topografía del consorcio, de la siguiente manera.

Observación: Los Deltas y GPS están ubicados en el área de impacto del proyecto, debido a esto hace que cuando se inicie a ejecutar la demolición o excavaciones estos amarres se van a perder. Se recomienda instalar dos puntos de control fuera del área de intervención.

Respuesta: Para conocimiento de la interventoría, en el levantamiento inicial entregado se referencian dos puntos deltas fijados dentro del espacio público en intervención y la vía denominados (D8 y D5) mismos que se fijaron estratégicamente con el din de facilitar las actividades de replanteo, considerando el cerramiento instalado.

No obstante, y atendiendo la recomendación de la interventoría, se fijan dos puntos de referencia fuera del área de intervención, denominados GPS 01 y GPS 02, los cuales se señalan en la siguiente imagen.



CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Observaciones:

- Se solicita el informe de georreferenciación de los amarres del proyecto.
- Se solicita el cálculo y resultado de la poligonal cerrada incluyendo los dos puntos de control antes mencionados.
- Se solicita la nivelación y contra nivelación y resultado final de los Deltas y GPS, esto con el fin de tener establecido para futuros cálculo de movimientos de material.

Respuesta: Para efectos del amarre del levantamiento [illegible]

Ahora bien, es importante precisar que la exigencia de disponibilidad total del personal debe guardar correspondencia con las necesidades reales y verificables de la ejecución contractual, así como con el ejercicio efectivo de las funciones de seguimiento y control por parte de la interventoría en el marco del contrato. En tal sentido, cualquier observación relacionada con presuntas ausencias o incumplimientos debe encontrarse debidamente soportada, ser objetiva y estar contrastada con la realidad operativa del proyecto, además de ser especificada de manera puntual, a efectos de permitir su adecuada verificación y trazabilidad.

En consecuencia, se solicita que en próximos requerimientos se identifiquen de manera clara, objetiva y documentada las situaciones que motiven el requerimiento formulado, no es posible acoger la solicitud en los términos planteados, sin perjuicio de la permanente disposición del contratista para atender de forma coordinada, razonable y conforme a la normatividad vigente las necesidades del proyecto.

Finalmente, el CONSORCIO GM HACHA reitera su compromiso con la correcta ejecución del proyecto y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas y normativas que le son aplicables. Así mismo, manifiesta su total disposición para continuar trabajando de manera articulada y colaborativa con la interventoría, atendiendo de forma oportuna cualquier observación que, debidamente sustentada, contribuya al adecuado desarrollo de la obra y al logro de los objetivos comunes del contrato.


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA Y USO DE EPP






CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

CONSORCIO GM HACHA

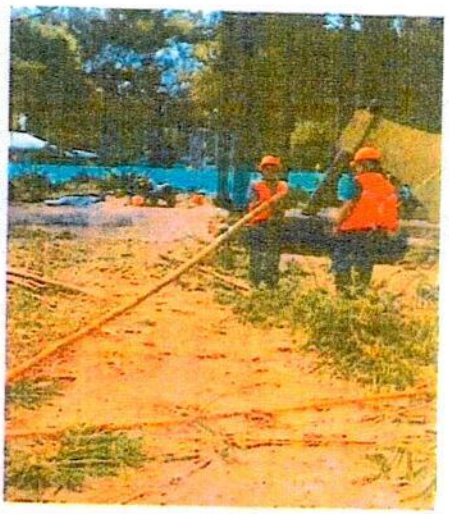

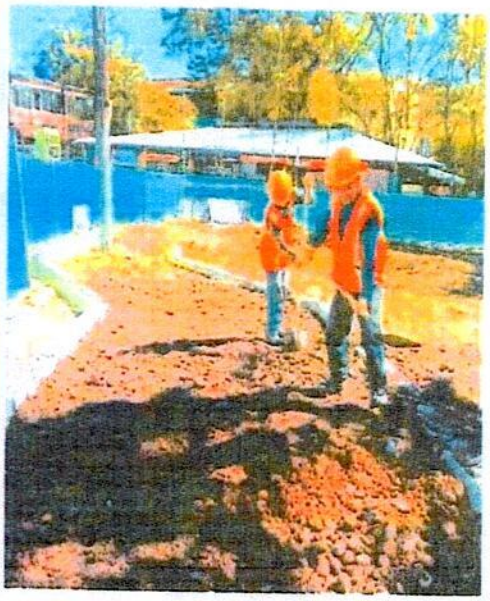Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Respuesta a su comunicación CIH-2025-015 del 14 de enero de 2026 que tiene por asunto "SOLICITUD DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA – CONTRATO No. 3631 de 2025"

1 mensaje

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: consorciointerhacha@gmail.com

17 de enero de 2026 a las 12:53 p.m.

Cordial saludo,

Adjunto envió oficio GM-HACHA-23 para sus conocimientos y fines pertinentes.

En espera de sus comentarios,

--
German Andrés Garcia Castillo
Representante Legal.
Consorcio GM HACHA

GM HACHA 23.pdf
748K

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 16 de enero de 2026.

GM-HACHA-22

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: : Respuesta a su comunicación CIH-2025-014 del 06 de enero de 2025 que tiene por objeto "SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PMA" y reiteración CIH-2025-016 del 16 de enero de 2025.

Cordial saludo,

De manera atenta y en atención a los requerimientos formulados, el CONSORCIO GM HACHA se permite adjuntar el documento PMA CONSORCIO GM HACHA que incluye el conjunto de fichas ambientales estructuradas, las cuales establecen de manera clara los objetivos, impactos asociados, medidas de manejo, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento, permitiendo así el control efectivo de las actividades del proyecto y la verificación de su desempeño ambiental.

Tambien es preciso recordar que el presupuesto correspondiente al componente ambiental se articula con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), mismo que se adjunta para que con base en las actividades allí contempladas, se puedan evaluar de manera objetiva las necesidades propias de la ejecución de la obra.

Ahora bien, frente a las aseveraciones descritas en su escrito, específicamente cuando se indica la necesidad de *"incorporar las actualizaciones ambientales requeridas conforme a las condiciones reales identificadas en el proyecto"*, así como de *"garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto, considerando la cantidad de árboles existentes y evaluando los impactos ambientales directos e indirectos que puedan generarse, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente"*, es preciso manifestar que el CONSORCIO GM HACHA ha dado cumplimiento previo a la identificación de las condiciones reales del proyecto.

De igual forma, se han ejecutado las actividades ambientales correspondientes durante el desarrollo de las obras, salvaguardando el adecuado avance del proyecto y evitando cualquier afectación o perjuicio de carácter ambiental. En ese sentido, las diferentes actuaciones adelantadas han sido oportunamente puestas en conocimiento de la interventoría a través de informes, comités de trabajo y demás espacios de seguimiento establecidos.

Por lo anterior, a la fecha no se tiene claridad respecto de la existencia de requerimientos adicionales por parte de la interventoría que permitan identificar de manera concreta qué aspecto se considera pendiente o por resolver. En consecuencia, el oficio mediante el cual se estima un presunto incumplimiento carece de sustento, toda vez que el contratista de obra ha atendido de manera integral las necesidades y obligaciones a su cargo.

Lo anterior se expone a continuación con el fin de garantizar la trazabilidad del requerimiento y de las actuaciones realizadas.

1. Mediante oficio GM-HACHA-05 del 01 de diciembre se elevó consulta formal a la secretaria de Medio Ambienta acerca del alcance técnico del documento relacionado con tala y poda – CT.0863/2025 del 08 de septiembre de 2025. Como es de conocimiento este era el documento de soporte ambiental con el que contaba el proyecto.

2. A través del oficio GM-HACHA-11 de fecha 12 de diciembre de 2025 se hizo entrega al CONSORCIO INTERHACHA 2025 del Informe Técnico de Inventario, Correlación y Análisis de Interferencias del Arbolado – Proyecto Parque del Hacha, esto producto de la intervención que tuvo el proyecto por parte de la autoridad ambiental CORMACARENA, en ese soporte técnico se estaba dando un análisis detallado de lo siguiente.

    - El inventario georreferenciado de 25 árboles y 47 palmas identificados dentro del área de intervención.
    - La correlación técnica entre el levantamiento topográfico y el permiso ambiental de tala y poda vigente, indicando las diferencias encontradas entre ambos conjuntos de coordenadas.
    - La identificación de los individuos que presentan interferencia con el diseño arquitectónico y urbanístico del proyecto, como insumo para la actualización o complementación del permiso ambiental.
    - Las conclusiones y observaciones técnicas necesarias para el proceso de verificación en campo por parte de la autoridad ambiental.

3. Mediante comunicación GM-HACHA-12 del 15 de diciembre de 2025 se entregó el documento denominado "Solicitud de Tala de arbolado existente – Proyecto Parque del Hacha" elaborado conforme a las necesidades de la interventoría quien requirió extraer esta información del soporte inicialmente notificado a través del inventario técnico.

4. El día 18 de diciembre de 2025 se recibió en el proyecto visita de la autoridad ambiental CORMACARENA en donde se hacen requerimientos al respecto de las acciones ambientales desarrolladas y se suscribe ACTA DE VISITA N° PM-GA.3.1.2.025.578, Acción que fue debidamente informada a las partes.

5. Para todos los efectos y como consecuencia del numeral anterior se llevó a cabo comité de obra el día 20 de diciembre de 2025 donde se contó con la participación del profesional ambiental de la Secretaria de Infraestructura, interventoría y obra a fin de evaluar las necesidades técnicas de índole ambiental según los requerimientos de la corporación.

6. Mediante comunicación GM-HACHA-16 del 23 de diciembre de 2025 y con relación a las orientaciones y observaciones dadas por la interventoría se hace entrega nuevamente del informe "Solicitud de Tala de arbolado existente – Proyecto Parque del Hacha".

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

7. Se llevo a cabo comité de seguimiento el día 30 de diciembre de 2025 donde se identificaron necesidades del proyecto, entre ellas el requerimiento de la autoridad ambiental y en este espacio se adquirió el compromiso de hacer por parte del CONSORCIO GM HACHA un trabajo con un profesional FORESTAL y entregar el insumo N° 11 de la LISTA DE CHEQUEO SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÁRBOLES ÚNICO que corresponde al documento Plan de aprovechamiento Forestal Único y el listado de especies objeto del levantamiento de veda.

8. Por último, para el cierre a la fecha de los tramites y demás acciones ambientales, se ha dado cumplimiento por el CONSORCIO GM HACHA mediante la entrega del documento de aprovechamiento forestal, tanto a la interventoría como al Municipio de Villavicencio, mediante oficio GM-HACHA-20 de fecha 15 de enero de 2026 para que adelante los demás trámites pendientes.

Finalmente, se han adelantado otros espacios donde se han tratado los demás temas ambientales, sin embargo si es consideración de la interventoría alguna otra información, que este dentro del alcance contractual y que se requiera, se está a la espera de su solicitud formal.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Respuesta a su comunicación CIH-2025-014 del 06 de enero de 2025 que tiene por objeto "SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PMA" y reiteración CIH-2025-016 del 16 de enero de 2025.

2 mensajes

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: consorciointerhacha@gmail.com
17 de enero de 2026 a las 12:52 p.m.

Cordial saludo,

Adjunto envió oficio GM-HACHA-22 para sus conocimientos y fines pertinentes.

En espera de sus comentarios,

--
German Andrés Garcia Castillo
Representante Legal.
Consorcio GM HACHA

3 archivos adjuntos

- **GM HACHA 22.pdf**
  370K
- **1.1. PRESUPUESTO OFICIAL AMBIENTAL SST.pdf**
  159K
- **PMA CONSORCIO GM HACHA.pdf**
  458K

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>
Para: "ingcamilabuitrago@gmail.com" <ingcamilabuitrago@gmail.com>
17 de enero de 2026 a las 2:09 p.m.

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 16 de enero de 2026.

GM-HACHA-21

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: Remisión de brochure de colores y definición de moldes para concreto

Respetados señores:

Por medio del presente, y en el marco de la ejecución de las actividades correspondientes a las zonas duras del proyecto de referencia, nos permitimos remitir para su conocimiento el **brochure de moldes para concreto estampado**, identificado como **archivo "A_moldes"**, el cual contiene las diferentes alternativas de diseño disponibles para la ejecución de este tipo de acabado.

Con base en la revisión técnica realizada por parte del equipo de obra, y atendiendo criterios de funcionalidad, durabilidad y coherencia con el diseño arquitectónico del proyecto, **se recomienda la utilización de los siguientes moldes**:

- **Molde MT-10 – Adoquín Espina de Pescado "Andenes perimetrales"**
- **Molde MT-51 – Abanico Europeo Old City "Zonas duras internas"**

No obstante, para efectos de completar la definición de los acabados proyectados, **se solicita a la interventoría indicar el tercer diseño a utilizar**, o en su defecto, manifestar si existe alguna **preferencia particular por otro molde** contenido dentro del brochure remitido.

Así mismo definir los colores exactos adjuntados en el documento **"Carta colores generales".**

Quedamos atentos a sus observaciones y a la definición correspondiente

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

GM-HACHA-021

1 mensaje

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: consorciointerhacha@gmail.com

16 de enero de 2026 a las 4:07 p.m.

Cordial saludo,

adjunto envío lo referenciado en el asunto.

Sin otro particular,

3 archivos adjuntos

- **GM-HACHA-021.docx**
  102K
- **1 Carta Colores General.pdf**
  1578K
- **A_moldes_15.pdf**
  3891K

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 15 de enero de 2026.

GM-HACHA-20

Señores
MUNICIPIO ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
Atn. Secretario de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
infraestructura@villavicencio.gov.co
Villavicencio - Meta

Con copia.
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: : Cumplimiento de compromisos – Entrega Documentación técnica de aprovechamiento forestal Parque del Hacha.

Cordial saludo,

De manera atenta y en cumplimiento de los compromisos adquiridos para el avance y desarrollo del contrato, me permito adjuntar para su conocimiento y trámite correspondiente la información del componente forestal, requerida para la gestión del permiso de tala ante la corporación ambiental CORMACARENA.

Para todos los efectos, y conforme a la gestión realizada, se hace entrega de la siguiente información.

- Borrador del Oficio de solicitud
- Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal
- Inventario Forestal
- Mapas de ubicación individuos a aprovechar
- KML con ubicación de individuos a aprovechar
- Fichas técnicas especies
- Tarjeta Profesional Ingeniero Forestal.

Con lo anterior, es preciso mencionar que el oficio de solicitud corresponde a un borrador, el cual podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades del caso. Con la entrega de la presente documentación se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por el CONSORCIO GM HACHA.

CONSORCIO GM HACHA

Ahora bien, queda pendiente el diligenciamiento del FORMULARIO **FUN (Formato Único Nacional de Solicitud)**, el cual contiene información de carácter técnico. En este sentido, nuestro personal estará atento para su diligenciamiento y presentación cuando así se requiera.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Entrega Documentación técnica de aprovechamiento forestal Parque del Hacha

5 mensajes

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: infraestructura@villavicencio.gov.co, consorciointerhacha@gmail.com 15 de enero de 2026 a las 2:44 p.m.

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo del contrato de obra.

Para todos los efectos se hace entrega de la siguiente documentación.

Borrador del Oficio de solicitud
Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal
Inventario Forestal
Mapas de ubicación individuos a aprovechar
KML con ubicación de individuos a aprovechar
Fichas técnicas especies
Tarjeta Profesional Ingeniero Forestal.

Conforme a los anteriores productos se deja claro que el oficio de solicitud es un borrador que podrá ser ajustado por la entidad si así lo requiere y quedaría pendiente el diligenciamiento del documento FUN (Formato Único Nacional de solicitud) para lo cual se estará en disposición por parte del CONSORCIO.

Cordialmente,

German Andrés Garcia Castillo
Representante Legal.
Consorcio GM HACHA

1. Borrador Oficio_solicitud.docx

2_PAF_ParqueHacha_v2.pdf

3_InventrioForestal.xlsx

4_MapaIndividuos.png

5_KmlIndividuos.kml

6_FichasEspecies.xlsm

7_Tarjeta Profesional.pdf

GM HACHA 20.pdf
327K

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 05 de enero de 2026.

GM-HACHA-19

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: Respuesta a sus comunicaciones CIH-2025-006, CIH-2025-010 y CIH-2025-012.

Cordial saludo,

En atención a las comunicaciones recibidas por su parte, y con el fin de dar respuesta por parte del CONSORCIO GM HACHA, me permito informar que mediante el presente oficio se atienden de manera conjunta los requerimientos formulados descritos en el asunto.

En tal sentido, a continuación se discrimina cada una de las comunicaciones, indicando de forma individual y ordenada la respuesta correspondiente a cada una de ellas, conforme a lo descrito en el asunto y a los temas planteados en cada requerimiento.

- **Oficio CIH-2025-006 del 17 de diciembre de 2025 que tiene por asunto "Observaciones de topografía".**

Conforme a los requerimientos formulados, se realizó el respectivo traslado de la información al profesional topógrafo encargado, con el fin de que dé cumplimiento a las observaciones indicadas. Una vez se cuente con la información y documentación correspondiente, esta será remitida para su conocimiento y fines pertinentes.

- **Oficio CIH-2025-010 del 23 de diciembre de 2025 que tiene por objeto "Solicitud del trámite del PMT, avalado por la secretaria de movilidad".**

Respecto a lo solicitado, es preciso mencionar que el documento correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) fue entregado dentro del trámite de documentación previa al inicio del contrato, el día 04 de diciembre de 2025, mediante el oficio GM-HACHA-08, junto con el respectivo radicado ante la Secretaría de Movilidad de Villavicencio. No obstante, y con el fin de atender nuevamente su requerimiento, se allega el documento en formato digital.

- **Oficio CIH-2025-012 del 05 de enero de 2026 que tiene por objeto "Requerimiento entrega informes mensuales de obra N° 01 MES DE DICIEMBRE 2025 – CONTRATO N° 3631 de 2025".**

En relación con el requerimiento del informe mensual de obra N.° 01, me permito informar que, debido a la falta de claridad en la comunicación entre las partes, no se tenía conocimiento previo del corte establecido para su presentación. Sin embargo, una vez precisado que el corte corresponde al 31 de diciembre de 2025, el CONSORCIO GM HACHA procederá a organizar y presentar la documentación correspondiente, conforme a las orientaciones impartidas por su parte.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación adicional o requerimiento que considere pertinente.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

Gmail

CONSORCIO INTERHACHA 2025 <consorciointerhacha@gmail.com>

Respuesta a sus comunicaciones CIH-2025-006, CIH-2025-010 y CIH-2025-012.

1 mensaje

CONSORCIO GM HACHA <consorciogmhacha2@gmail.com>
Para: consorciointerhacha@gmail.com

5 de enero de 2026 a las 6:13 p.m.

Cordial saludo,

adjunto envío lo referenciado en el asunto.

Sin otro particular,

2 archivos adjuntos

GM HACHA 19.pdf
329K

PMT - PARQUE HACHA_Env.pdf
2309K

CONSORCIO INTERHACHA 2025

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78
Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA DEPENDIENTES

CONTRATO DE OBRA N°	**3631 DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GM HACHA R/L GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
NIT:	902004406-7
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**3701 DE 2025**
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHACHA 2025 R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
NIT:	902011747-2
SUPERVISOR:	

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1/01/2026-31/01/2026	al

NOMBRES Y APELLODOS	CARGO /OFICIO	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN	AFILIACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	ASIGNACIÓN SALARIAL	N° DE PLANILLA	AFILIACION				
									EPS	PENSION	ARL	NIVEL	CCF
GARCÍA CASTILLO GERMAN ANDRÉS	ING RESIDENTE	3.277.174	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	5/12/2025		$ 2.500.000	9499086421	SANITAS	PORVENIR	SURA	V	COFREM
CAGÜEÑAS HOLGUÍN HENRY MAURICIO	SISO	86.073.936	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	5/12/2025	-	$ 2.500.000	9499086421	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	V	COFREM
RODRIGUEZ GAMBOA ALBERTO	AUXILIAR DE TRAFICO	17.360.103	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	10/12/2025	-	$ 1.750.905	9497824831	SANITAS		SURA	V	COFREM
ROJAS BARBOSA CAMILO ANDRÉS	AYUDANTE DE OBRA	1.006.822.787	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	5/12/2025	26/01/2026	$ 1.750.905	9497824831	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	V	COFREM
BARBOSA QUEVEDO ALIPIO	MAESTRO CONSTRUCTOR	86.049.664	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	11/12/2025	1/01/2026	$ 1.750.905	9497824831	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	V	COFREM
SALAZAR MORALES JULIAN ANDRÉS	AUXILIAR DE TRAFICO	1.121.919.739	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	11/12/2025		$ 1.750.905	9497824831	SANITAS	PORVENIR	SURA	V	COFREM
VIGOYA DAZA JAVIER ALEZANDER	VIGILANTE	86.040.166	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	17/12/2025	30/01/2026	$ 1.750.905	9497824831	CAJACOPI	COLPENSIONES	SURA	V	COFREM
FUQUEN CARRASCO HERNESTO	AYUDANTE DE OBRA	3.210.495	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	29/12/2025		$ 1.750.905	9497824831	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	V	COFREM
CEPEDA BERNAL GERNAINE	AYUDANTE DE OBRA	74.245.750	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	20/01/2026		$ 1.750.905	9497824831	CAJACOPI	PROTECCIÓN	SURA	V	COFREM
CRISTANCHO CHAMARRAVI DARWIN YUSEMID	AYUDANTE DE OBRA	1.125.004.112	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	21/01/2026		$ 1.750.905	9497824831	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	V	COFREM
LAGOS CABRERA RUBEN DARIO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.203.247	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	2/01/2026		$ 1.750.905	9497824831	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	V	COFREM
MARQUEZ LADINO BRAYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	1.193.081.559	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	16/01/2026		$ 1.750.905	9497824831	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	V	COFREM
SALGADO BALTA PABLO JESUS	AYUDANTE DE OBRA	86.086.177	CONTRATO DE OBRA	DEPENDIENTE	21/01/2026		$ 1.750.905	9497824831	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	V	COFREM

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos. Se aclara que los pagos correponidentes al mes de enero.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **sábado, 8 de febrero de 2025**

Firma:
CONSORCIO GM HACHA
R/L GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO

Firma:
MARIA EDITH MORENO QUIROGA
DIRECTORA DE OBRA

Firma:
CONSORCIO INTERHACHA 2025
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES

Firma:
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES:

Edificio de la Gobernación Avenida Fundadores Calle 16 No. 8 -35 Centro Inírida - Guainía secretariaplaneacion@guainia.gov.co

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA - INDEPENDIENTES

CONTRATO DE OBRA Nº	**3631 DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GM HACHA R/L GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
NIT:	902004406-7
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**3701 DE 2025**
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHACHA 2025 R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
NIT:	902011747-2
SUPERVISOR:	

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1/01/2026-31/01/2026	al

NOMBRES Y APELLODOS	CARGO /OFICIO	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN	AFILIACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	ASIGNACIÓN SALARIAL	Nº DE PLANILLA	AFILIACION				
									EPS	PENSION	ARL	NIVEL	CCF
MORENO QUIROGA MARIA EDITH	DIRECTO DE OBRA	35.263.063	CONTRATO DE OBRA	INDEPENDIENTE	5/12/2025		$ 1.650.000	9498511936-9499046384	SANITAS	PORVENIR	SURA	V	NA
RUIZ CORREDOR ALEXANDER	ING. ELÉCTRICO	79.542.505	CONTRATO DE OBRA	INDEPENDIENTE	5/12/2025		$ 1.750.905	36095882 - 9499046384	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	V	NA
GONZALES CETINA MARIA DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE TRAFICO	1018405880	CONTRATO DE OBRA	INDEPENDIENTE	1/01/2026	30/01/2026	$ 1.750.905	6010345588-9501092017	SURA	PORVENIR	SURA	V	N/A
	AUXILIAR DE TRAFICO												

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos. Se aclara que los pagos correponidentes al mes de enero.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **sábado, 8 de febrero de 2025**

Firma:
CONSORCIO GM HACHA
R/L GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO

Firma:
MARIA EDITH MORENO QUIROGA
DIRECTORA DE OBRA

Firma:
CONSORCIO INTERHACHA 2025
R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES

Firma:
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES:

Edificio de la Gobernación Avenida Fundadores Calle 16 No. 8 -35 Centro Inírida - Guainía secretariaplaneacion@guainia.gov.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004406	7	CONSORCIO GM HACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GM HACHA	CL 15 47 21	VILLAVICENCIO-META	3112471584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	32270749	9499086421	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$5,281,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86049664	BARBOSA QUEVEDO ALIPIO		X					X											230301	1	$58,364	$9,400	CCFC55	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
2	CC	86073936	CAGUEÑAS HOLGUIN HENRY MAURICIO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	74245750	CEPEDA BERNAL GERMAINE	X																	230201	11	$641,999	$102,800	CCFC55	11	$641,999	$25,700	CCF34	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
4	CC	1125004112	CRISTANCHO CHAMARRAVI DARWIN YUSEMID	X																	230301	10	$583,635	$93,400	EPSIC5	10	$583,635	$23,400	CCF34	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
5	CC	3210495	FUQUEN CARRASCO ERNESTO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	3277174	GARCIA CASTILLO GERMAN ANDRES																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1123203247	LAGOS CABRERA RUBEN DARIO	X																	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPSC34	29	$1,692,542	$67,800	CCF34	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
8	CC	1193081559	MARQUEZ LADINO BRAYAN DAVID	X																	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF34	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
9	CC	17360103	RODRIGUEZ GAMBOA ALBERTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
10	CC	1006822787	ROJAS BARBOSA CAMILO ANDRES		X					X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF34	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
11	CC	1121919739	SALAZAR MORALES JULIAN ANDRES							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	86086177	SALGADO BALTA PABLO JESUS	X																	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF34	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
13	CC	86040166	VIGOYA DAZA JAVIER ALEXANDER		X					X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	Afiliados(13)																						$16,205,794	$2,593,400			$17,956,699	$718,900			$17,956,699	$718,900			$17,956,699	$1,250,400		$0	$0		$5,281,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004406	7	CONSORCIO GM HACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GM HACHA	CL 15 47 21	VILLAVICENCIO-META	3112471584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	32270749	9499086421	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$5,281,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,593,400	$0	$0	$2,593,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$680,200	$0	$0	$680,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,810,400	$0	$0	$1,810,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$102,800	$0	$0	$102,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,250,400	$0	$0	$1,250,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,250,400	$0	$0	$1,250,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$718,900	$0	$0	$718,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$718,900	$0	$0	$718,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$718,900	$0	$0	$718,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$98,200	$0	$0	$98,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$67,800	$0	$0	$67,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$23,400	$0	$0	$23,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$254,200	$0	$0	$254,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,100	$0	$0	$35,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$240,200	$0	$0	$240,200
TOTAL				13	$5,281,600	$0	$0	$5,281,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004406	7	CONSORCIO GM HACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GM HACHA	CL 15 47 21	VILLAVICENCIO-META	3112471584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32279511	9499046384	Y	2026/02/03	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$243,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	35263063	MORENO QUIROGA MARIA EDITH							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	79542505	RUIZ CORREDOR ALEXANDER							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	Afiliados(2)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810	$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004406	7	CONSORCIO GM HACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO GM HACHA	CL 15 47 21	VILLAVICENCIO-META	3112471584	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32279511	9499046384	Y	2026/02/03	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$243.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$0	$0	$243,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$0	$0	$243,800
TOTAL				2	$243,800	$0	$0	$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35263063		MORENO QUIROGA MARIA EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 15 47 21	VILLAVICENCIO-META	6664845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32780991	9498511936	I	2026/02/13	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$1,063,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	35263063	MORENO QUIROGA MARIA EDITH																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$208,800	0	$0	$0	No	$1,063,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,063,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35263063		MORENO QUIROGA MARIA EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 15 47 21	VILLAVICENCIO-META	6664845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32780991	9498511936	I	2026/02/13	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$1,063,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$0	$0	$208,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$208,800	$0	$0	$208,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$1,063,800	$0	$0	$1,063,800

PLANILLA NRO. 36095882 Tipo I 2026 01 ASOPAGOS

DATOS GENERALES																
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	79562503	ALEXANDER RUIZ CORREDOR			ÚNICO		0	2026-01	2026-01	36095882		PRIVADA	1	SURATEL	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CL 26 37 31		VILLAVICENCIO	1	META	50	3123528860	0	RECEPCIONOFICINA2023@GMAIL.COM		6201		0	1	2026-02-03	2026-02-02

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	MORA COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS002	800130907	218900	0	0	0	0	0	218900	0	0	0	218900	0	0	0	0	218900	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-16	900336004	280200	0	0	0	0	0	0	280200	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	MORA COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SURATEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	280200
SALUD	218900
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	499100

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEXANDER RUIZ CORREDOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-79542505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-03
FECHA DE PAGO:	2026-02-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FINANDINA S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36095882
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36095882
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
... S002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
4	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121904938		RAMIREZ PATIÑO KAREN STEPHANIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE40 A NO 19 08 LA FLORENCIA	VILLAVICENCIO-META	3202356234	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32800096	9498437312	I	2026/02/10	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1121904938	RAMIREZ PATIÑO KAREN STEPHANIE																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0	No	$696,600
Total	Afiliados(1)																					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0		$696,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121904938		RAMIREZ PATIÑO KAREN STEPHANIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE40 A NO 19 08 LA FLORENCIA	VILLAVICENCIO-META	3202356234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32800096	9498437312	I	2026/02/10	2026/02/03	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600

2026/02/03 11:38 AM

CONSORCIO INTERHACHA 2025

CERTIFICADO CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA DE OBRA.

Calle 2A No. 30-56 Barrio La Coralina, Villavicencio-Meta Tel: 608 663 83 78

Correo electrónico: consorciointerhacha@gmail.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO TECNICO

EFIX FJDynamics STEC Hi-Target

RECIBO
No. 3268

Bogotá D.C **SEPTIEMBRE 16 de 2025**

Señor(es)
VELASQUEZ ORTIZ MAYCOL
NIT/CC: 1121880977
VILLAVICENCIO

Apreciados señores

La Estación Total de marca STEC modelo AXIS 1T con serie No. 322293, fue revisada en nuestro laboratorio, cumple con los parámetros del fabricante STEC y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y está en perfectas condiciones ópticas y mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 2376512076435
DE ALTA PRECISIÓN 0.001 mm
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARÁMETROS TÉCNICOS

Resolución angular	±(2mm+2mm*D)m.s.e
Precisión angular directa	2"
Aumento	30X
Medición máxima con un prisma	5000m
Medición máxima sin prisma	1500m
Campo de vision	1°30'
Sistema compensador	Dos ejes
Sensibilidad del compensador	4'
Precisión del compensador	1"
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C
Estándar IP	IP55
Torque movimiento fino	Verificado
Aumentos y campo visual a 100 m	Verificado

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE CALIBRACIÓN

Fecha de verificación de calibración	**MARZO**	**19**	**de**	**2026**

Centro Autorizado de Servicio Técnico
BOGOTA, D.C. Carrera 29 No. 39B - 48 La soledad • PBX: 457 2128 - 3104955199
MEDELLIN: C.E. Nutibara Cra. 80 No. 39 - 159 Of 309 • Tel. (4) 2059673 / 350 8417083
CIUDAD DE PANAMA: Avenida la pulida Calle 10 Río Abajo • Tel.: 507 - 261 4886 - +507 6805-3117

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO TECNICO

EFIX FJDynamics STEC Hi-Target

RECIBO
No. 3268

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo a los parámetros técnicos de estaciones totales de topografía según su correspondiente modalidad, se da el presente certificado de verificación calibración por una duración de seis (6) meses, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

El procedimiento de calibración realizado al equipo tendrá una garantía máxima de un (1) mes, previa evaluación del error obtenido, siempre y cuando este no se deba a desperfectos físicos del equipo no reportados por el cliente; en cuyo caso, se efectuará el diagnóstico y cotización correspondiente de la reparación a la que se dé lugar; la reparación debe ser autorizada por el cliente por escrito.

Para cualquier aclaración, favor comunicarse con nuestro laboratorio, unidad de Ingeniería, al (1) 457 21 28 o visítenos en la Carrera 29 No. 39 B 48 en Bogotá D.C.

Cordialmente,

Departamento de ingeniería
CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO TECNICO

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO TECNICO, no asume ninguna responsabilidad por mal manejo, transporte o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: Sofia Salcedo.
