FECHA (D/M/A): 2/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,02 ton
ZONA	4
COMUNA	13 - San Javier
BARRIO	El SOCORRO
FRENTE DE TRABAJO:	7

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	—
TERMINACIÓN: 5:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localización del Frente de trabajo y zona a intervenir.
2. Señalización de áreas de intervención según Pmt.
3. Marcación de BACHES con Patologías (Piel de cocodrilo, Grietas, huecos, etc)
4. demolición de carpeta asfáltica con compresor y martillo.
5. limpieza de BACHES y Retiro de ESCOMBROS.
6. LIGA con emulsión asfáltica en Frío
7. Instalación de mezcla ASFÁLTICA MDC-19 TEMP TIBIA
8. Compactación de mezcla ASFÁLTICA con VIBRO-COMPACTADOR manual
9. Cargue de ESCOMBROS manual en Volqueta.
10. Retiro de Señalización con Pmt.
11. Orden y ASEO en Frente de Trabajo.

Nota: se atiende dirección del listado CL 47B CR 102-31; SIMO (155109)

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A.	Jonny Alexander Angulo Gomez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Restrepo G	NOMBRE: José Luis Guzmán. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 2/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian Marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro Osorio		X	
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Cristian Camilo Orlas			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	JAVIER PABON			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Esteranny Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Huswarna LP - 6500			
2	Compresor	THESER HSO - 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Mamuta Eyp			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LFK 838 Sabaneta.			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 2/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
S004814	155109	1	CL 47B CR 102-31	3,41	3,09	0,09	10,54	0,95	2,28
S005382	167358	2	CL 47B CR 102-102	10,74	1,6	0,08	17,18	1,37	3,30
S005382	167359	3A	CL 47B CR 102-93	1,9	3,68	0,10	6,99	0,70	1,68
S005382	167359	3B	CL 47B CR 102-93	4,96	3,16	0,10	15,67	1,57	3,76
TOTALES							50,39	4,59	11,02


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
537034	SNR 969	11,02	11,02	149°C	25298	SNR 969	Sencilla	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 2/03/2026

10. ESQUEMAS

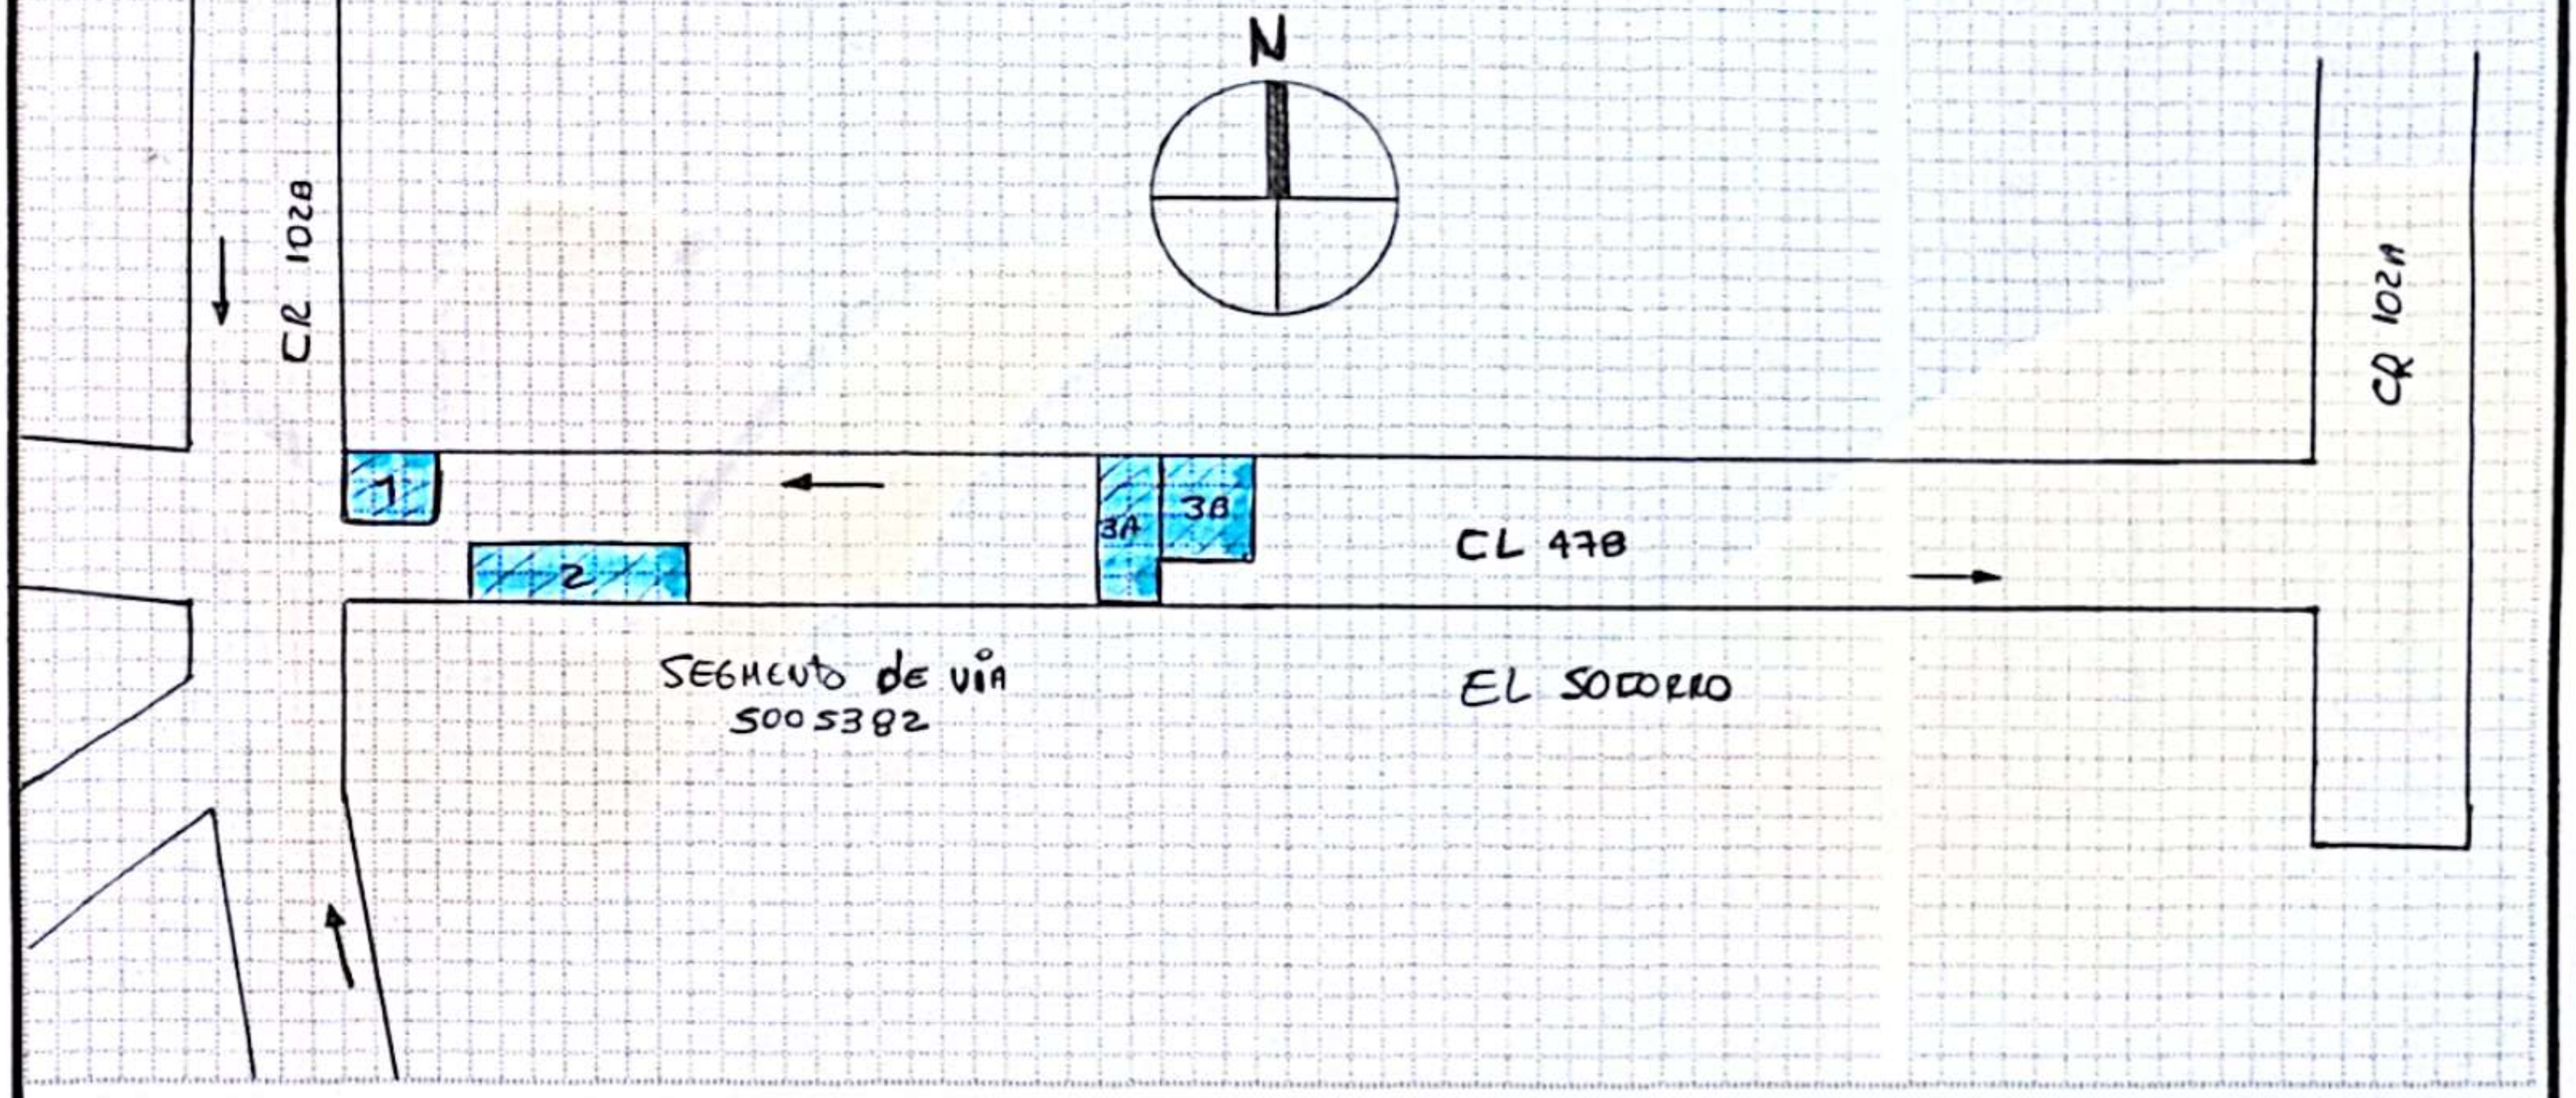

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.02 ton
BARRIO	El SOCORRO	DIRECCIÓN	CL478 CR 102-31

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25298

PROVEEDOR: SUM - 2052

VALE POR UN VIAJE: Escombro

2/03/2026

PLACA No: SNR969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR: 2/3/2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

ADICION DE MATERIALES ---2026/03/02 08:5

PAVIMENTAR S.A

NIT: 800.040.018-6

Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1.

TIQUETE DE BASCULA: 537034

PLACA: SNR969 537034

CONDUCTOR: DANIS MORALES

PRODUCTO:11524-9 Mezcla asfaltica MDC 1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. META: 11,02 Ton 11,02ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V00000387 SUM-2149-ETP MALLA VI
ALMED
2026 -#2149

PESO TARA: 7.740,00
PESO BRUTO:15.760,00

ENTRADA: 02 mar 2026 -08:57 a.
SALIDA: 02 mar 2026 - 08:57 a.
TEMPERATURA:149,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

2/03/2026

FIRMA DEL CONDUCTOR

Juliana Alzate A

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros

MONEDA:0,00

OBSERVACIONES

Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner
