FECHA (D/M/A): 4/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,02 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 16-Belén	
BARRIO: El Moral- los Almendros	

Alcaldia de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	—
TERMINACIÓN: 5:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Nublado Parcialmente
TARDE	Soleado Parcialmente

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localizacion del Frente de Trabajo y zona a intervenir.
2. Señalizacion de Obras de intervencion segun Pmt.
3. Marcacion de Baches con Patologias (Piel de Cocodrilo, Grietas, Huecos, Etc)
4. Demolicion de carpeta asfaltica con Compresor y martillo.
5. Limpieza de Baches y Retiro de Escombros.
6. Liga con emulsion asfaltica en Frio.
7. Instalacion de mezcla asfaltica MDO-19 Temp Tibiá
8. Compactacion de mezcla asfaltica con Vibro-Compactador manual.
9. Cargue de Escombros manual en Volqueta.
10. Retiro de Señalizacion con Pmt.
11. Orden y Aseo en Frente de Trabajo.

Nota: Se Atiende Pompeyano a solatud de la SIF, se Retira el adoquinado y la arena para encontrar BASE Firme y Reemplazarlo con mezcla Asfaltica.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A	Jonny Alexander Arbelo Gomez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Ivo Alejandro Castro R	NOMBRE: José Luis Guzman .S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 4/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Johana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Johan Maria			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro Osorio			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Cristian Camilo Orlal			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabón			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Estefany Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP - 6500			
2	Compresor	KAESER MSD - 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita EyP			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LRK 838 Sabaneta			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 4/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001564	167364	1	05758 CL 32d - 35	8,02	3,6	0,159	28,87	4,59	11,02
TOTALES							28,87	4,59	11,02


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
537253	SNR969	11,02	11,02	147°C	25300	SNR 969	Sencilla	1	PACIMENTAR

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 4/03/2026

10. ESQUEMAS

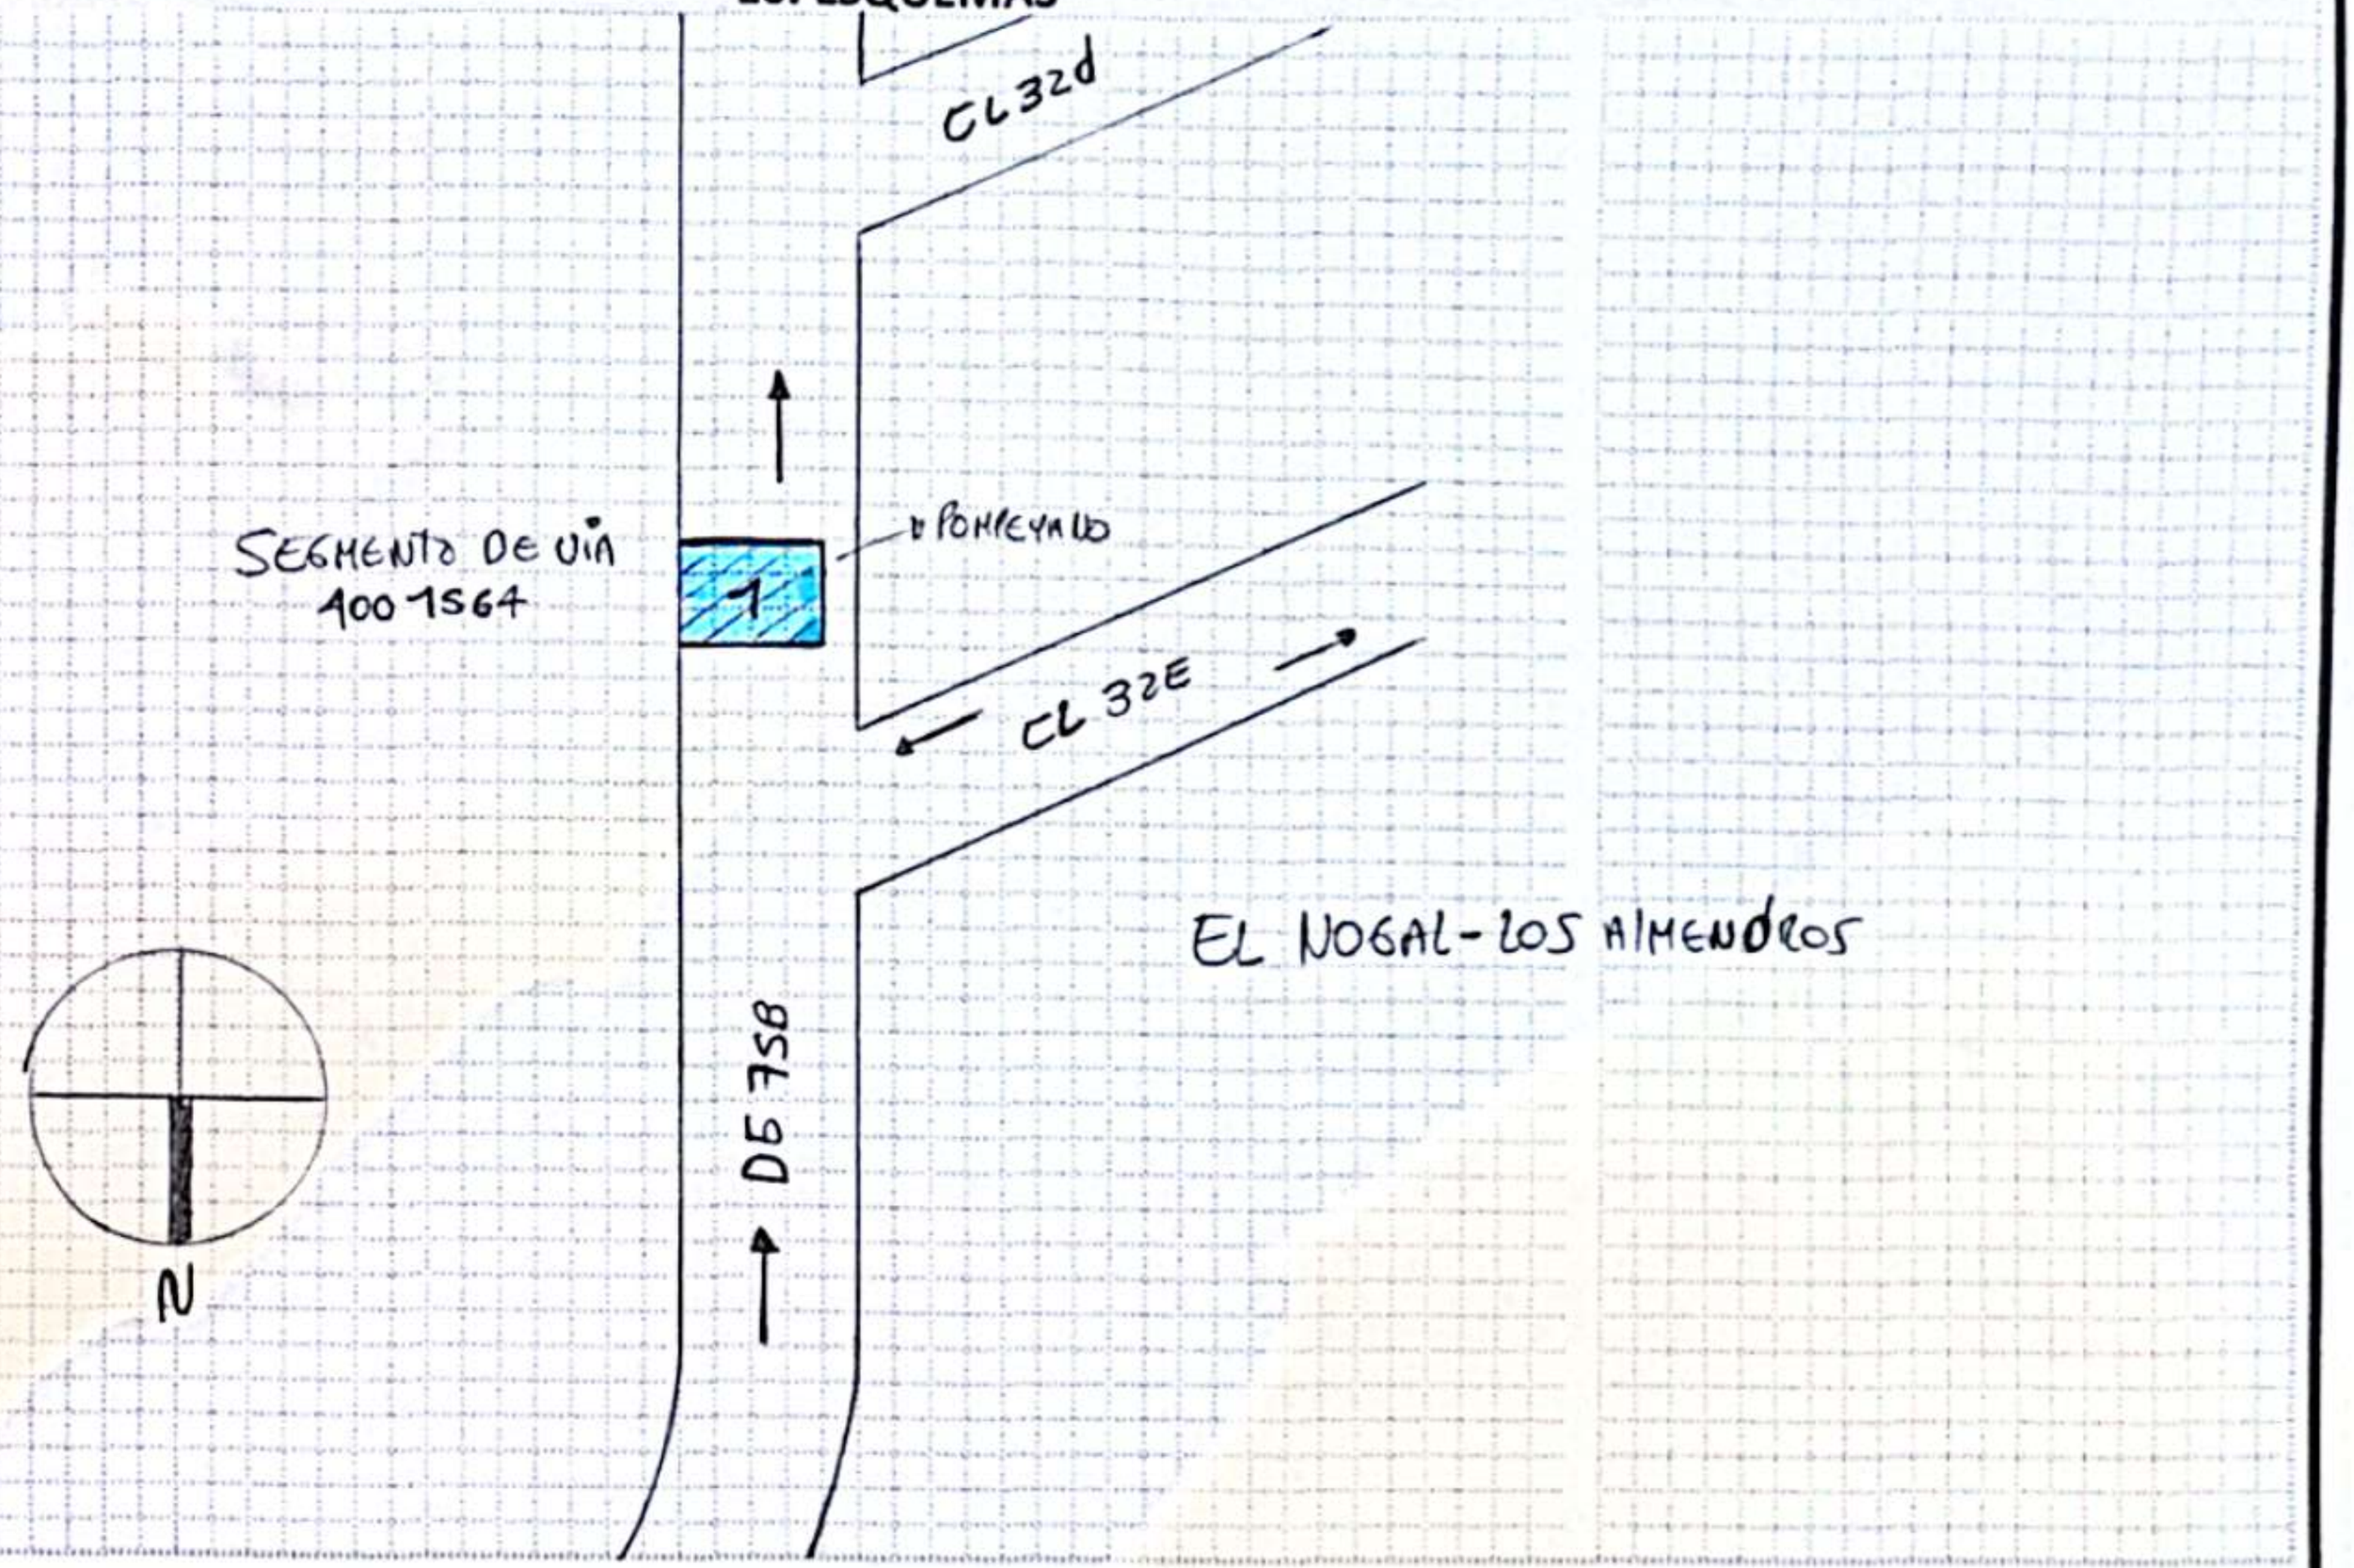

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,02 ton
BARRIO	El Nogal- Los Almendros	DIRECCIÓN	DG 75B CL 32d-35

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25300

PROVEEDOR: SUM - 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro

4/03/2026

PLACA No: SNR 904 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentos Juan Cruz

RECIBIDO POR: 4/03/2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

2026/03/04 06:39

EMISION DE MATERIALES

PAVIMENTAM S.A

NIT: 800.040.014-6

Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537253

PLACA: SNR969

CONDUCTOR: DANTS MORALES

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1

9 - tibia -

asfalto 60 -70 - EAP

CANT. NETA: 11,02 Ton

11,02ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI

MENTOS

OBRA: V000003697 SUM-2149-EYP MALLA VI

ALMED

2026 #2149

PESO TARA: 7.740,00

PESO BRUTO:18.760,00

ENTRADA: 04 mar 2026 - 08:39 a.

SALIDA: 04 mar 2026 - 08:39 a.

TEMPERATURA:147,00

4/03/2026

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Juliana Alzate A.

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros

HUMEDAD:0,002

OBSERVACIONES

Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner
