FECHA (D/M/A): 5/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,03 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 16- Guayabal	
BARRIO: La colina	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 am; TERMINACIÓN: 5:00 pm	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublada Parcialmente

TARDE: Nublada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localizacion del frente de trabajo y zona a intervenir
2. Señalizacion de areas de intervencion segun Prot.
3. Marcacion, de BACHES con patologias (piel de cocodrilo, Grietas, huecos, etc)
4. demolicion de carpeta asfaltica con compresor y martillo.
5. limpieza de BACHES y Retiro de ESCOMBROS.
6. Liso con emulsion asfaltica en Frio
7. Instalacion de mezcla asfaltica MDC-19 + RAP Fibra
8. Compactacion de mezcla Asfaltica con Vibro-compactador manual
9. Cargue de escombros manual en volqueta
10. Retiro de escombros y señalizacion
11. Orden y Aseo en frente de Trabajo.

Nota: Se hace mitigacion EN el segmento DE VIA 5018190.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A. Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Jonny Alexander Angulo Gómez Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 5/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian Marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro Osorio			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Cristian Camilo Orlas			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabon			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Estermy Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husvarna LP - 6500			
2	Compresor	INGSOR MSO- 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Navarita E4P			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LKK 838 Sabaneta			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 5/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5018190	167365	1	CR 55 CL 72 SUR-14	5,34	2,42	0,105	12,92	1,36	3,26
5018190	167366	2	CR 55 CL 72 SUR - 12	4,45	2,42	0,12	10,77	1,29	3,10
5018190	167367	3	CR 55 CL 72 SUR - 09	3,50	1,47	0,12	5,15	0,62	1,48
5018190	167368	4	CR 55 CL 72 SUR - 06	3,80	2,00	0,12	7,60	0,91	2,19
TOTALES							36,44	4,18	10,03


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236821	SNR 969	10.03	10.03	141°C	26351	SNR 969	Sencilla	1	PLOCOPAL

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 5/03/2026

10. ESQUEMAS

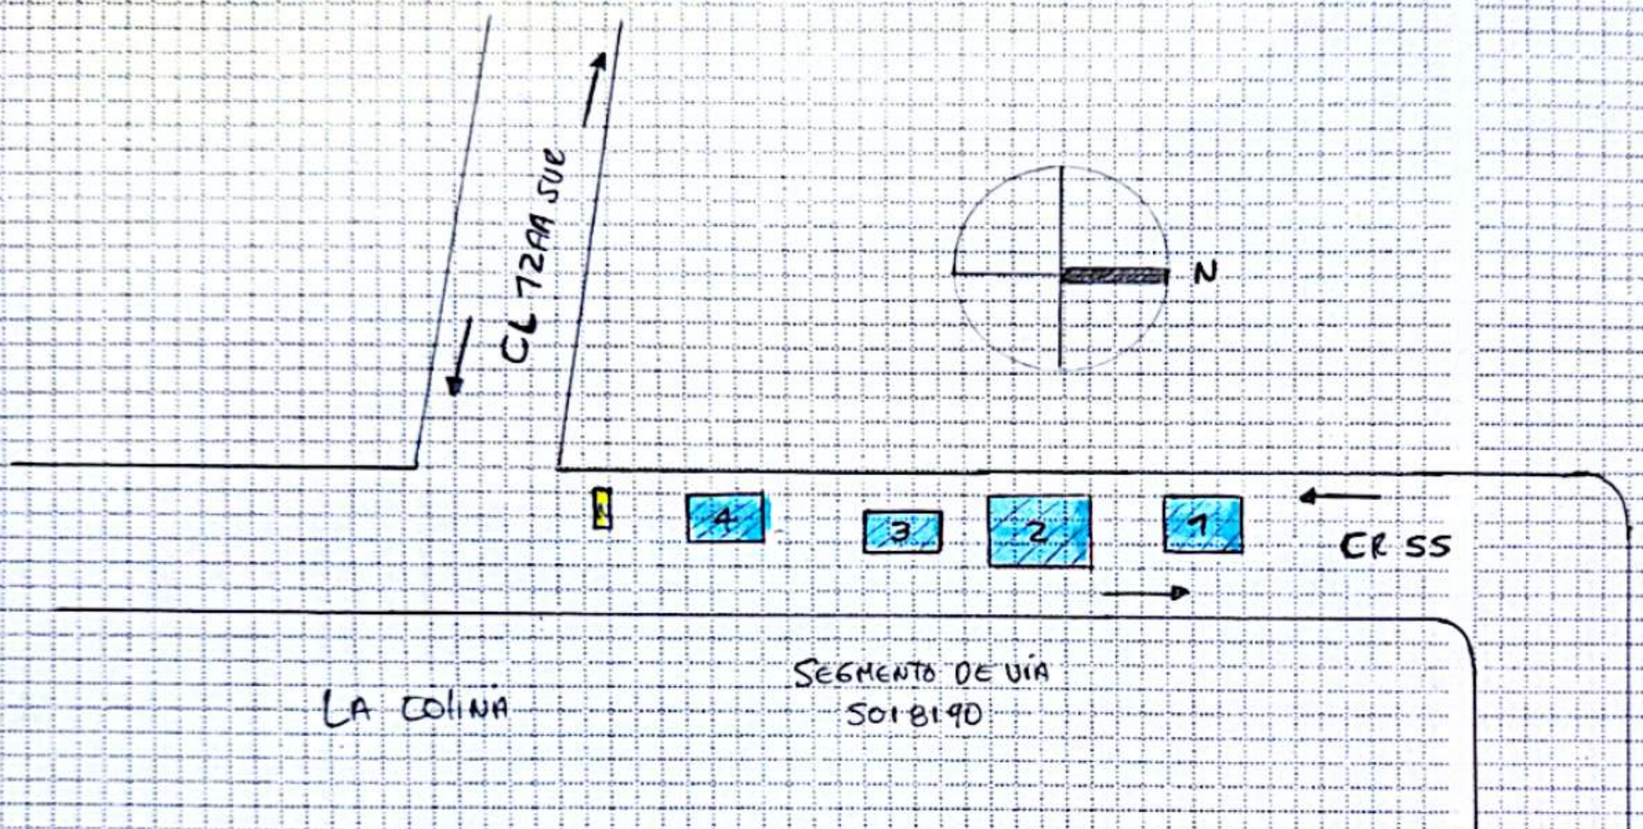

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,03 ton
BARRIO	LA Colina	DIRECCIÓN	CR 55 CL 12 SUR-14

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

06-03-26

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26351

PROVEEDOR: Frente #7- Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

5/03/2026

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal PROCOPAL S.A.

RECIBIDO POR: 5/03/2026 06 MAR 2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHO - PROCOPAL
Juliana Alzate A
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.

Impresión Digital

TIQUETE DE BASCULA: 236821

236821

FECHA: 05/03/2026

HORA: 9:29:30 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

MAIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904390

PESO BRUTO: 17.90 Toneles

PESO TARA: 7.87 Toneles

PESO NETO: 10.03 Toneles 10.03 ton

Juliana Alzate A

PRODUCTO:12

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MD19

TEMPERATURA: 111°

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADO: 40.96 Toneles

5/03/2026

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner
