FECHA (D/M/A): 6/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,02 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 15- GUAYABAL	
BARRIO: LA Colina	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO :	7:00 am
TERMINACIÓN:	5:00 Pm
JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	—

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	nublado
TARDE	nublado parcialmente

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localizacion del Frente de Trabajo y Zona a Intervenir.
2. Señalizacion de areas de intervencion Segun Pmt.
3. Marcacion de Baches con Patologia (Piel de cocodrilo, Grietas, huecos, etc)
4. demolicion de Carpeta asfaltica con Compresor y martillo.
5. Limpieza de Baches y Retiro de Escombros.
6. Liga con emulsion asfaltica en Frio.
7. Instalacion de mezcla asfaltica MDC-19 + Rap Tibin.
8. Compactacion de mezcla asfaltica con Vibro-compactador Manual.
9. Cargue de Escombros manual en Volqueta.
10. Retiro de Señalizacion Con Pmt.
11. Orden y Aseo en Frente de Trabajo.

Notas Se Realizan 2 Intervenciones

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A.	Jonny Alexander Angulo Gomez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R	NOMBRE: Jose Luis Guzman D
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 6/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juana Alzate - Ana Zapata			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian Marin		X	
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro Osorio			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Cristian Camilo Orlas			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabon			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Estefany Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Hus Varna LP - 6500			
2	Compresor	Kaeser MSO - 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita E y P			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ckk 838 Sabaneta.			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 6/03/2020

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
SO17223	165795	1A	CR 55 CL 122 SUR-22	1,45	1,20	0,13	1,74	0,23	0,54
SO17223	165795	1B	CR 55 CL 122 SUR-22	4,64	3,85	0,13	17,86	2,32	5,57
SO17223	165796	2	CR 55 CL 122 SUR-24	4,50	1,98	0,128	8,91	1,14	2,74
SO17223	167369	3	CR 55 CL 122 SUR-13	2,20	2,01	0,11	4,42	0,49	1,17
TOTALES							32,94	4,18	10,02


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236843	SNB 919	10,02	10,02	142°C	26353	SNB 919	Sencilla	1	PROCOPAL

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 6/05/2026

10. ESQUEMAS

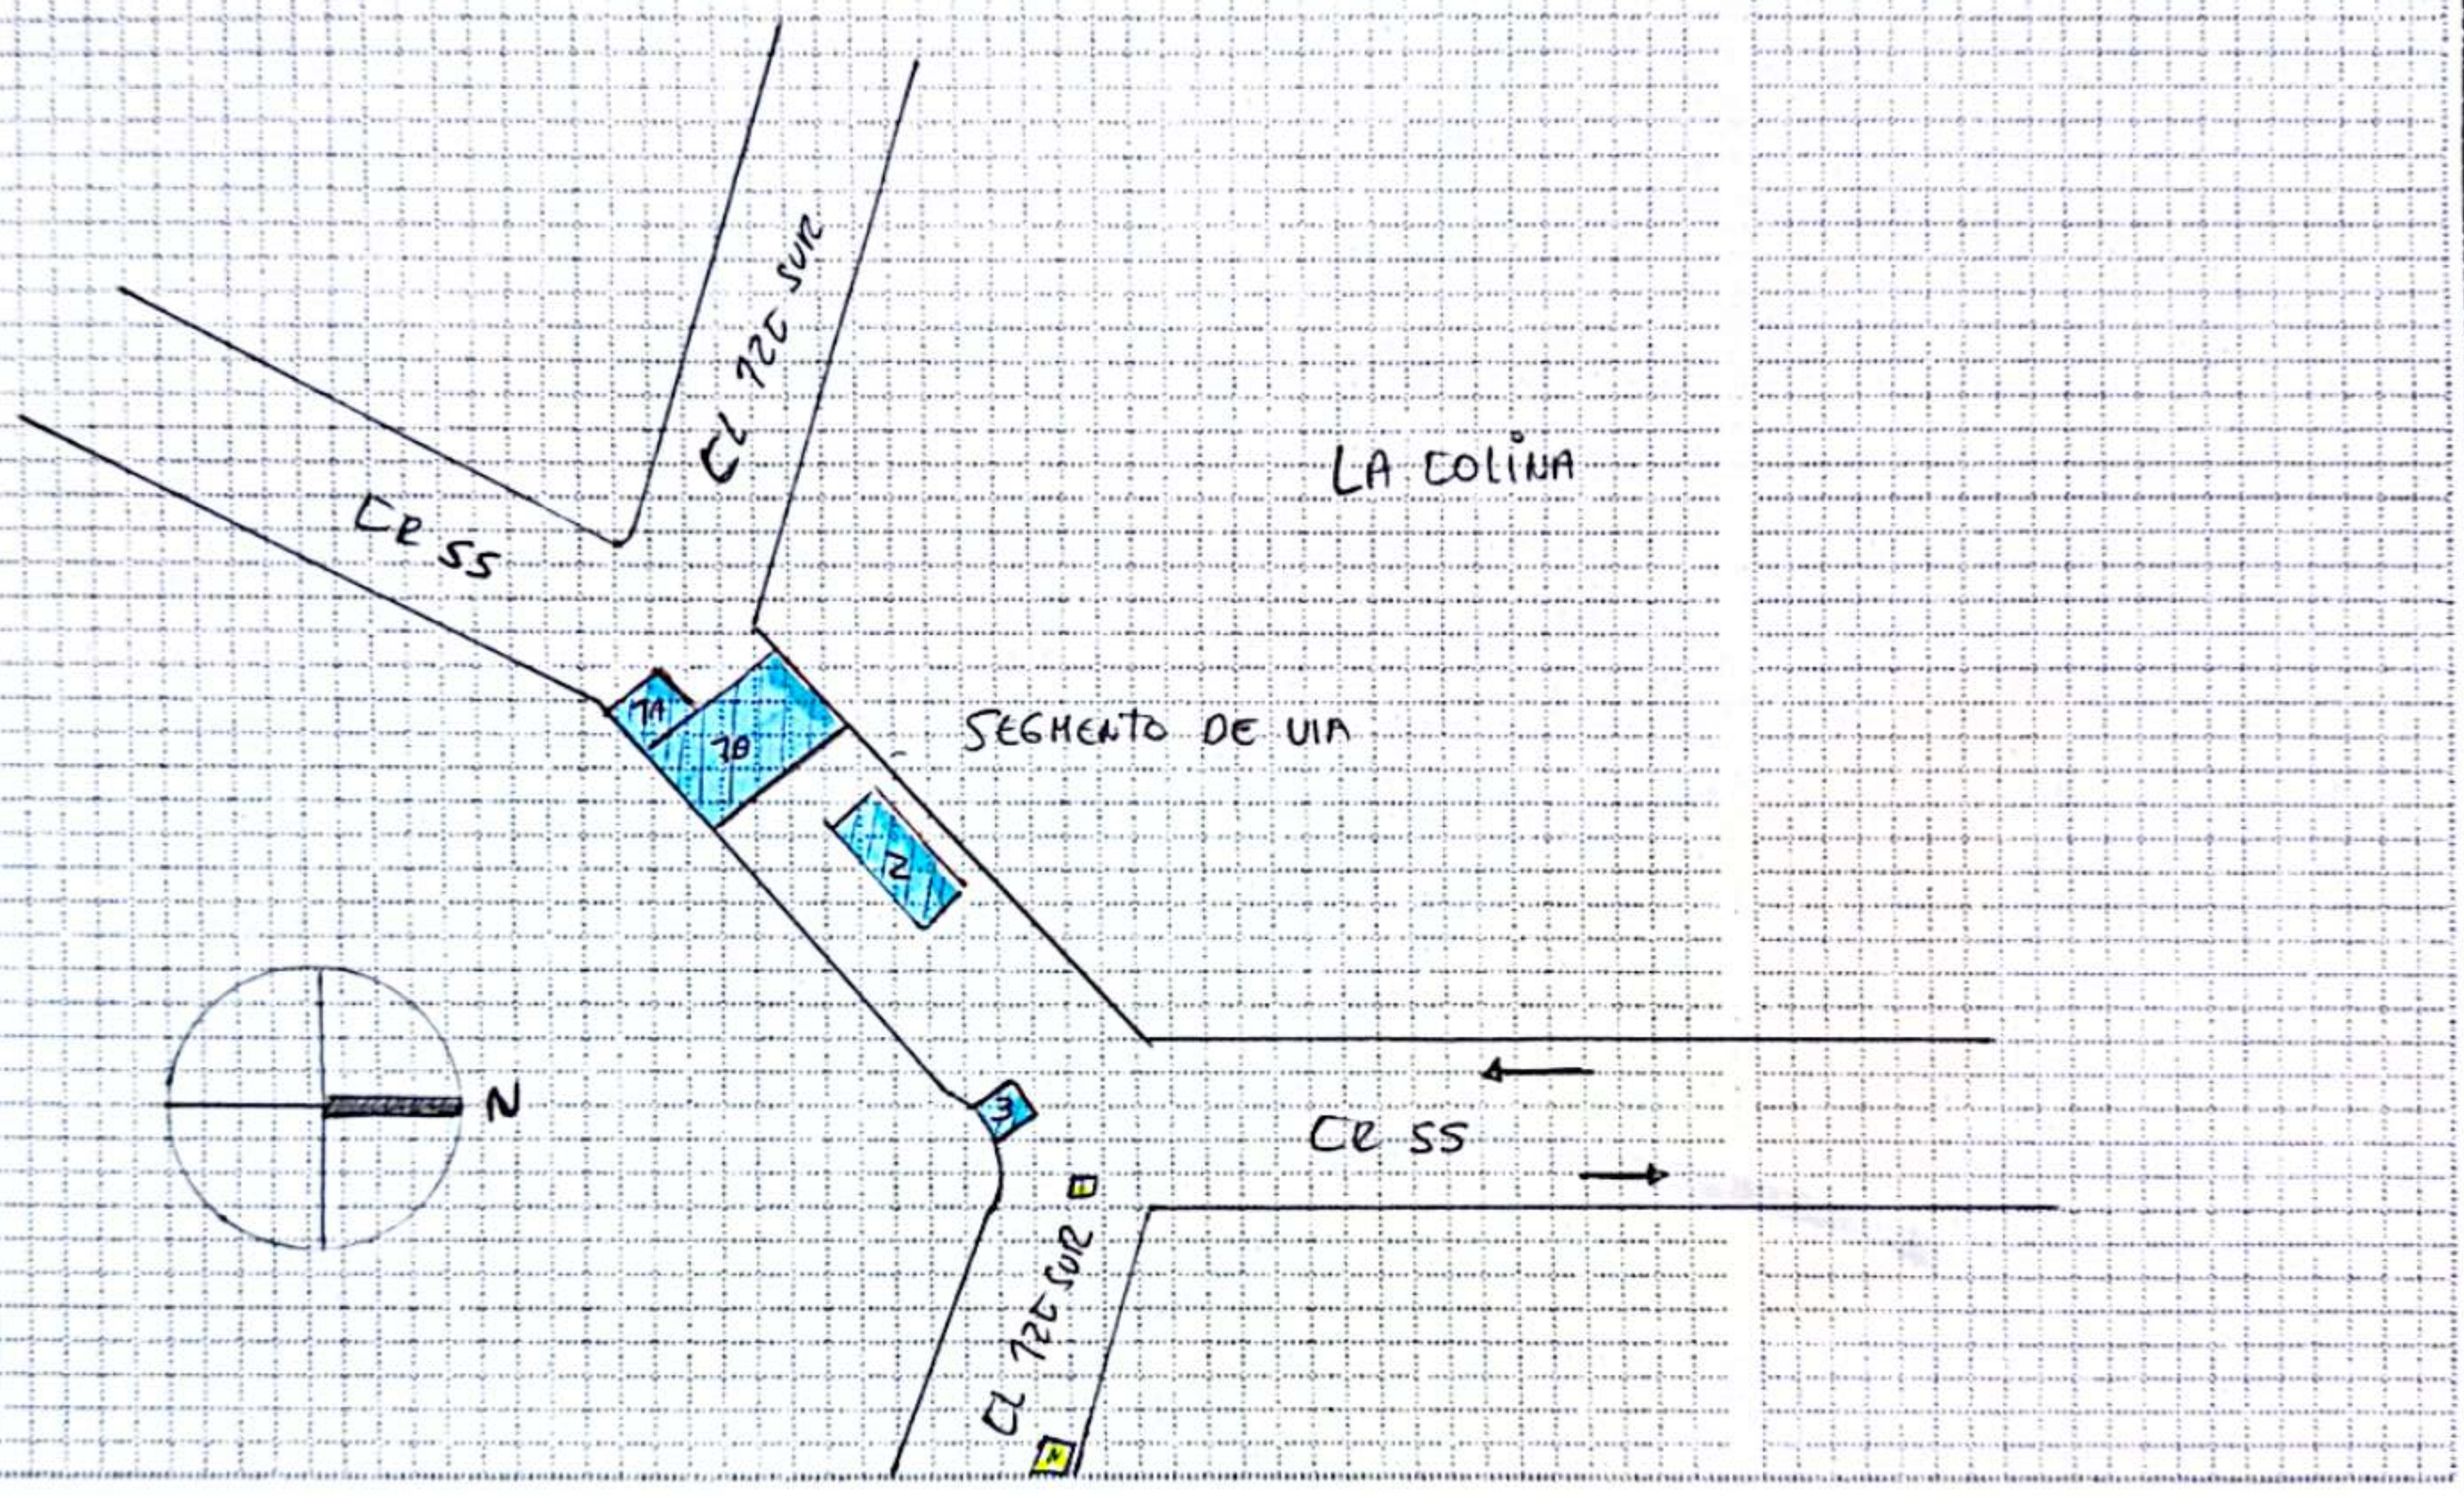

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,02 ton
BARRIO	La Colina	DIRECCIÓN	CL 72C SUR CR 54-152

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26353

PROVEEDOR: Victoriano's Frente 7

VALE POR UN VIAJE: Escombros

06-03-26

PLACA No: SNR969 CAPACIDAD PROCOPAL S.A. M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: 6/03/2026 06 MAR 2026

DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 236843

FECHA: 06/03/2026

HORA: 8:51:05 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMINIMEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 17.79 Toneles

PESO TARA: 7.77 Toneles

PESO NETO: 10.02 Toneles

10,02 ton

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142.0

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 31.12 Toneles

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner
