FECHA (D/M/A): 12/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10.09 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 15- Guayabal	
BARRIO: La Colina	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 am; TERMINACIÓN: 5:00 pm	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Nublado parcialmente; TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localizacion del frente de trabajo y zona a intervenir.
2. Señalizacion de areas de intervencion Segun Pmt.
3. Marcacion De baches con Patologias (Piel de cocodrilo, Grietas, Huecos, etc)
4. demolicion de carpeta asfaltica con compresor y martillo.
5. limpieza de BACHES y Retiro de escombros.
6. Liga con emulsion asfaltica en frio.
7. Instalacion de mezcla asfaltica MDC-19 + RAP TIBIA.
8. Compactacion de mezcla asfaltica con Vibro-compactador Manual
9. Cargue de Escombros manual en Volqueta.
10. Retiro de señalizacion con Pmt.
11. Orden y Aseo en frente de Trabajo.

Nota: Se Realizan mitigaciones en la Av. GUAYABAL CR 52 CL 13 SUR.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A. Vo. Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Jonny Alexander Angulo Gomez Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro P. Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzman. L Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Uzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Seebstian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro osorio			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Euer Uruga			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona.			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabon			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial.	Esteban Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Hyswarna LP - 6500			
2	Compresor	ITMESEK HSO-108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita EyP			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	CKK Saganeta			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000772	167529	1A	CR 53 CL 13 SUR - 24	2,46	2,36	0,157	5,81	0,91	2,19
4000772	167529	1B	CR 53 CL 13 SUR-24	8,6	1,36	0,17	11,70	1,99	4,77
4000772	163571	2	CR 53 CL 13A SUR-5	3,26	1,23	0,17	4,01	0,68	1,64
4000771	167528	3	CR 53 CL 12C SUR-12	3,6	1,23	0,14	4,93	0,62	1,49
		4							
TOTALES							25,94	4,20	10,09

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
537869	SNR 969	10,09	10,09	147°C

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26357	SNR 969	SENCILLA	1	PROVENTAR


Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/03/2026

10. ESQUEMAS

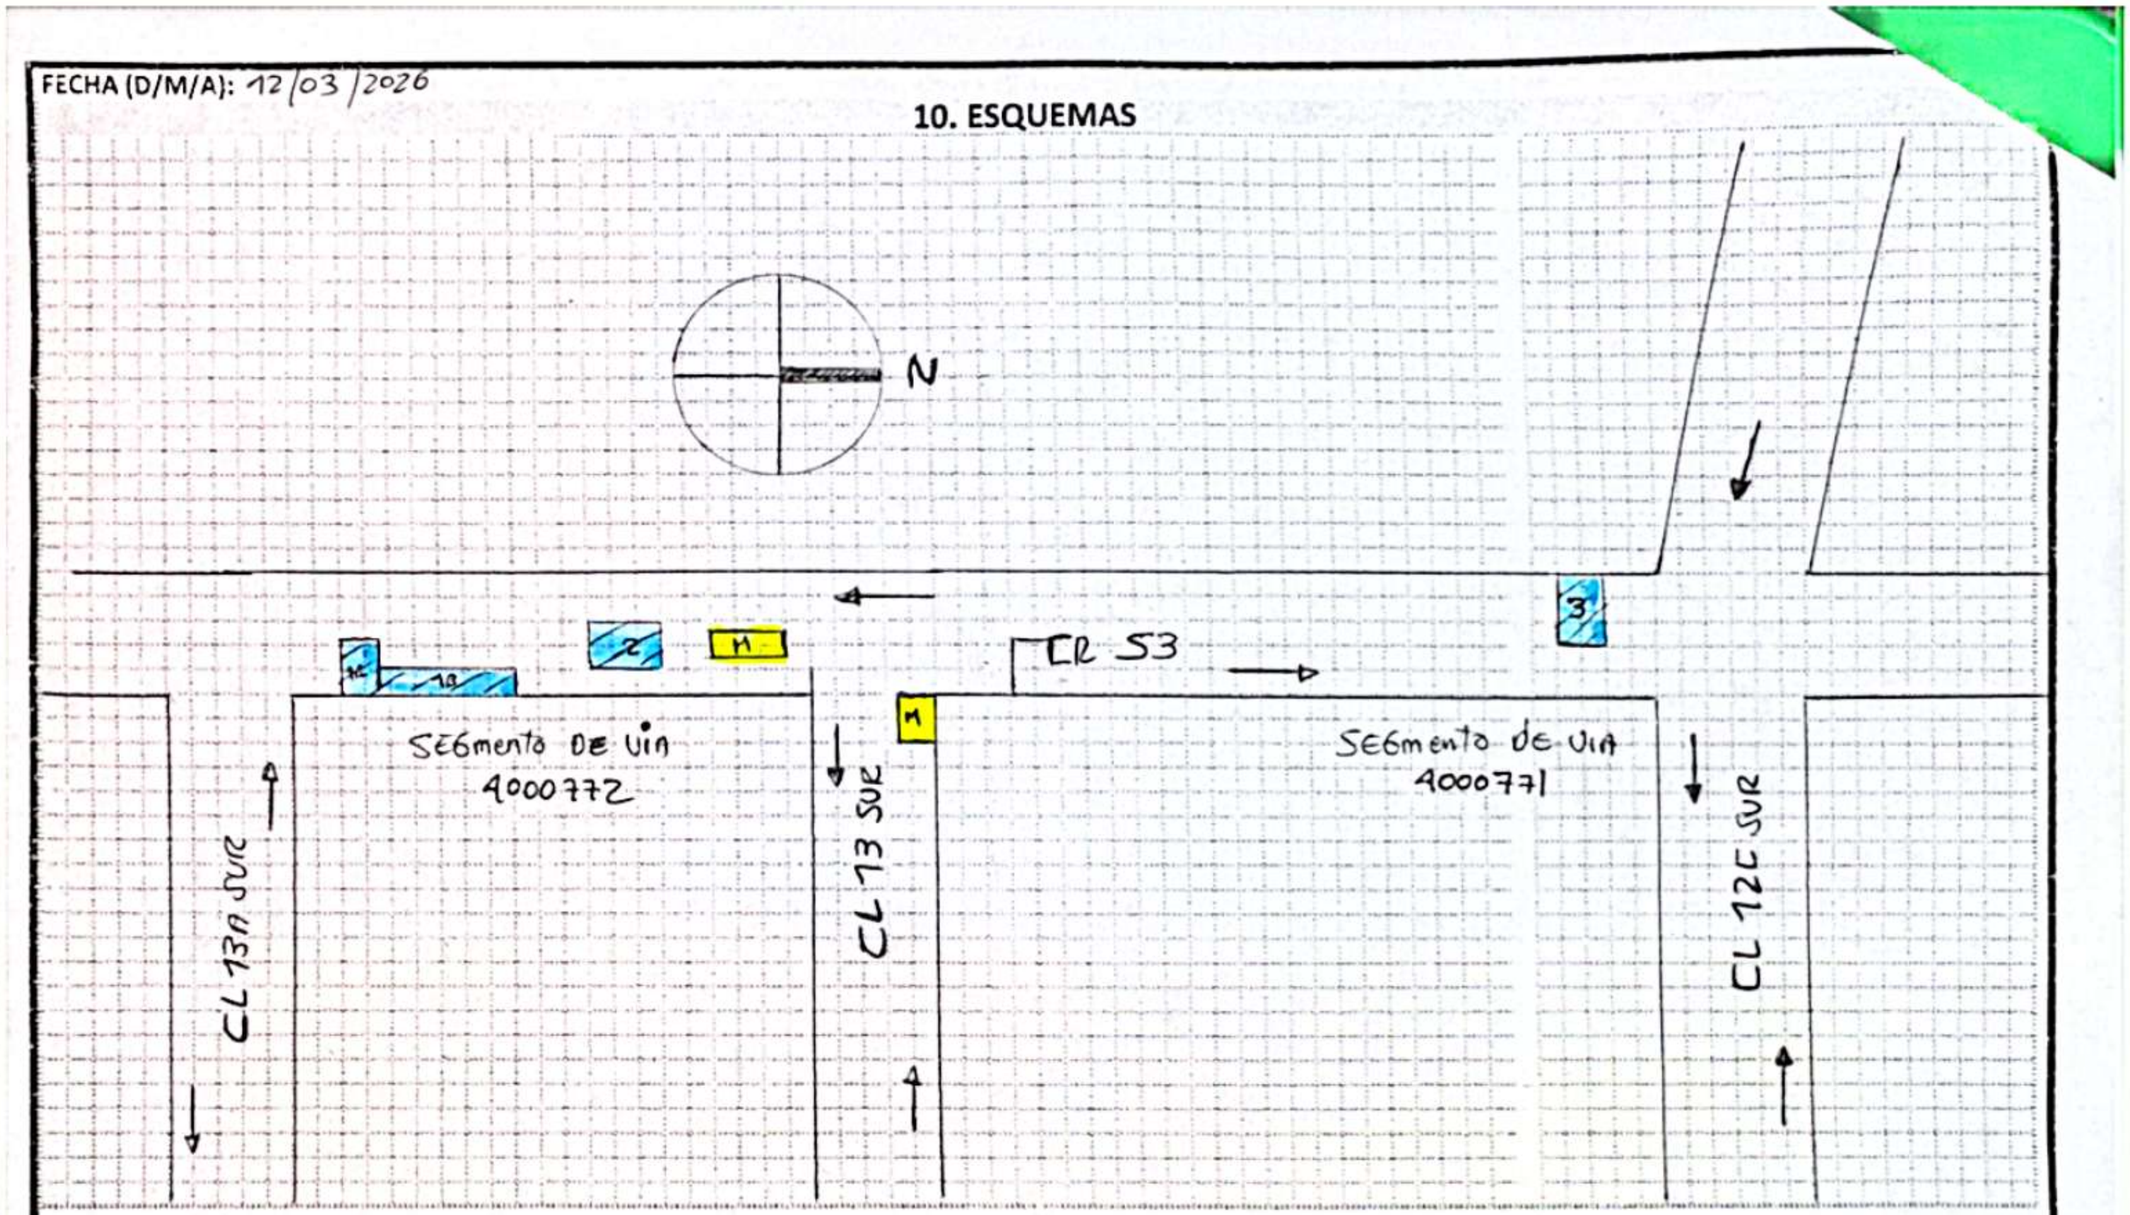

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Anual	FRENTE	7
RANGO:	7	CANTIDAD:	10,09 ton
BARRIO	LA Colina	DIRECCIÓN	CR 53 CL 12C SUR.

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26357

PROVEEDOR: SUM - 2149

VALE POR UN VIAJE: Escombro

12/03/2026

PLACA No: SNR964 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR: Oscar Calle

12/03/2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

20260312 08:52

REMISION DE MATERIALES

PAVIMENTAR S.A

NIT: 900.040.014-6

Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537869

PLACA: SNR964 537869

CONDUCTOR: DAVIS MORALES

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -

asfalto 60 -70 - RAP

CANT. NETA: 10,09 Ton 10,09 ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED

2026 M2149

PESO TARA: 7.740,00

PESO BRUTO:17.830,00

ENTRADA: 12 mar 2026 -a08:54 a.

SALIDA: 12 mar 2026 - a08:59 a.

TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

12/03/2026

FIRMA DEL CONDUCTOR

Juliana Alzate A.

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros

HUMEDAD:0,00%

OBSERVACIONES

Obras + Sub. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner
