FECHA (D/M/A): 13/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,08 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 15- Guayabal	
BARRIO: La Colina	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 am	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Se presenta daño en volqueta lo que dificulta La llegada de la mezcla.
TERMINACIÓN: 5:35 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleada
TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localización del Frente de Trabajo y Zona a Intervenir.
2. Señalización de áreas de Intervención Segun Ant.
3. Marcación de Baches con Patrones (Piel de cocodrilo, Ondas, huecos, Etc)
4. Demolición de carpeta asfaltica con compresor y martillo
5. Limpieza de Baches y Retiro de Escombros.
6. Liga con emulsión asfaltica en Frio.
7. Instalación de mezcla asfaltica MDC-19 + Rap Fresa
8. Compactación de mezcla asfaltica con Vibro-compactador manual.
9. Cargue de Escombros manual en Volqueta.
10. Retiro de Escombros Restantes y señalización Ant.
11. Orden y Aseo en Frente de Trabajo.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Abadía A.	Jorge Alexander Angulo Gomez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE: José Luis Guzmán S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Nubio Alvarez			
8	Ayudante	Julian Marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Alvaro Osorio			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Ever Usuga			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabon			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Estiany Velez			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP - 6500			
2	Compresor	Ingersoll MSO - 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita EYP			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	CHEVROLET Silverado.			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
S018192	166054	1	CL 12AA SUR CR 55-163	3.16	2.96	0,127	9,35	1,19	2,85
S030042	166740	2A	CL 12AA SUR CR 55A-55	1.36	4,42	0,12	6,01	0,72	1,73
S030042	166740	2B	CL 12AA SUR CR 55A-55	2,09	1,86	0,12	3,89	0,42	1,12
S018193	167527	3	CR 55B CL 12AA SUR	4,01	3,5	0,13	14,04	1,82	4,38
TOTALES							33,29	4,20	10,08


MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	PEMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538013	SNR969	10,08	10,08	149°C	263558	SNR 969	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/03/2026

10. ESQUEMAS

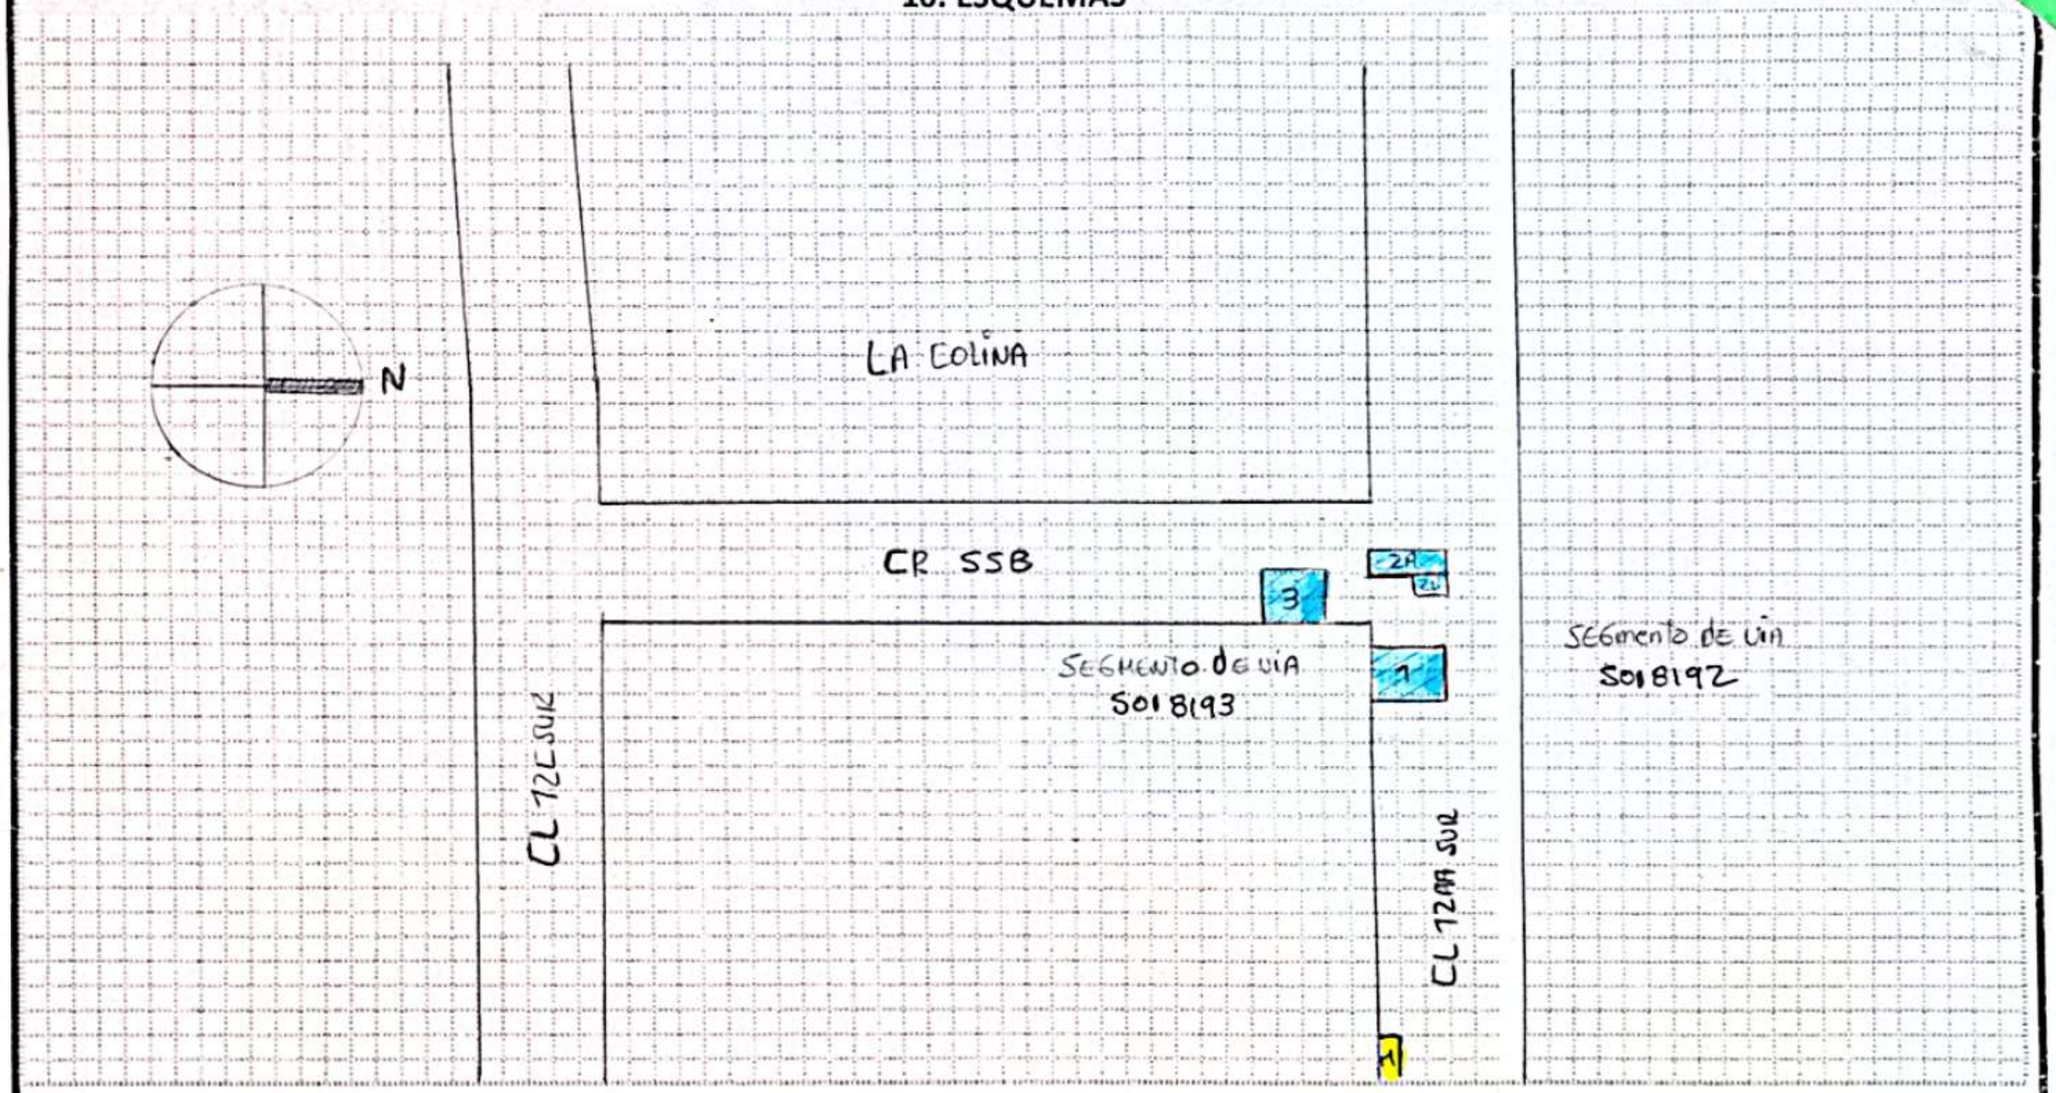

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,08 ton
BARRIO	LA Colina	DIRECCIÓN	CL 12AA SUR CR 55B

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26358

PROVEEDOR: Frente #7 Almed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

13/03/2026

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pixacay

RECIBIDO POR: 13/03/2026

PROCOBAL S.A
Nit. 890.906.350-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

REMISION DE MATERIALES -20260313 10:19
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2026 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538013
PLACA: SNR969 538013
CONDUCTOR: DANIS MORALES

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - Tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. META: 10,08 Ton 10,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 M2149

PESO TARA: 7.740,00
PESO BRUTO:17.820,00

ENTRADA: 13 mar 2026 - a10:20 a.
SALIDA: 13 mar 2026 - a10:20 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

13/03/2026

FIRMA DEL CONDUCTOR

Juliana Alzate A

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0.002
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner
