FECHA (D/M/A): 20-05-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Demarcación horizontal
RANGO: N/A	CANTIDAD: N/A
ZONA	5
COMUNA	14 El Poblado
BARRIO	1423 Santa María de los Ángeles
FRENTE DE TRABAJO:	7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 pm	Jornada nocturna
TERMINACIÓN: 5:30 am	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	SOCO
TARDE	SOCO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza instalación señalización vertical para cumplimiento PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Se realiza encintado de marcación vial
- Aplicación de pintura plástico en frío
- Se realiza aplicación de microesferas para dar retroreflectividad y durabilidad a la pintura instalada
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	James S Taborda Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 20-01-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Jara	X		Consorcio Vial MEJ 2025
2	Encargado	Catalina Castillo Montoya	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jorge Andrés Cortes Parra (Cinturón)	X		
7	Ayudante	Jhonatan Castrillón Correa	X		
8	Ayudante	Catalina Caviria Estrada	X		
9	Ayudante	Luis Fernando Hurtado Cadavid	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Ronny Arturo Castillo Bermudez	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	IMC - WNN395	X		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):20-03-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000034	4.1.2003		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	21,00	21,00	linea division carril 0.12 (segmentada de 1 metro) plastico en frio
2000034	4.1.3		CR 48 FINPUE CL 12 SUR DG 47	1,00	69,30	69,30	linea de eje 0.12 plastico en frio
2001400	4.1.2005		CR 48 - CL 15 SUR FINPUE CL 12 SUR	1,00	27,00	27,00	(9 LINEAS DE 3m) linea de paso peatonal 0.40 plastico en frio
2001400	4.1.2005		CR 48 - CL 15 SUR FINPUE CL 12 SUR	1,00	2,60	2,60	linea de paso peatonal 0.40 plastico en frio
2001400	4.1.2005		CR 48 - CL 15 SUR FINPUE CL 12 SUR	1,00	2,50	2,50	linea de paso peatonal 0.40 plastico en frio
2001400	4.1.2005		CR 48 - CL 15 SUR FINPUE CL 12 SUR	1,00	1,40	1,40	linea de paso peatonal 0.40 plastico en frio
TOTALES						123,80	

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 20-03-2026

9. ESQUEMAS

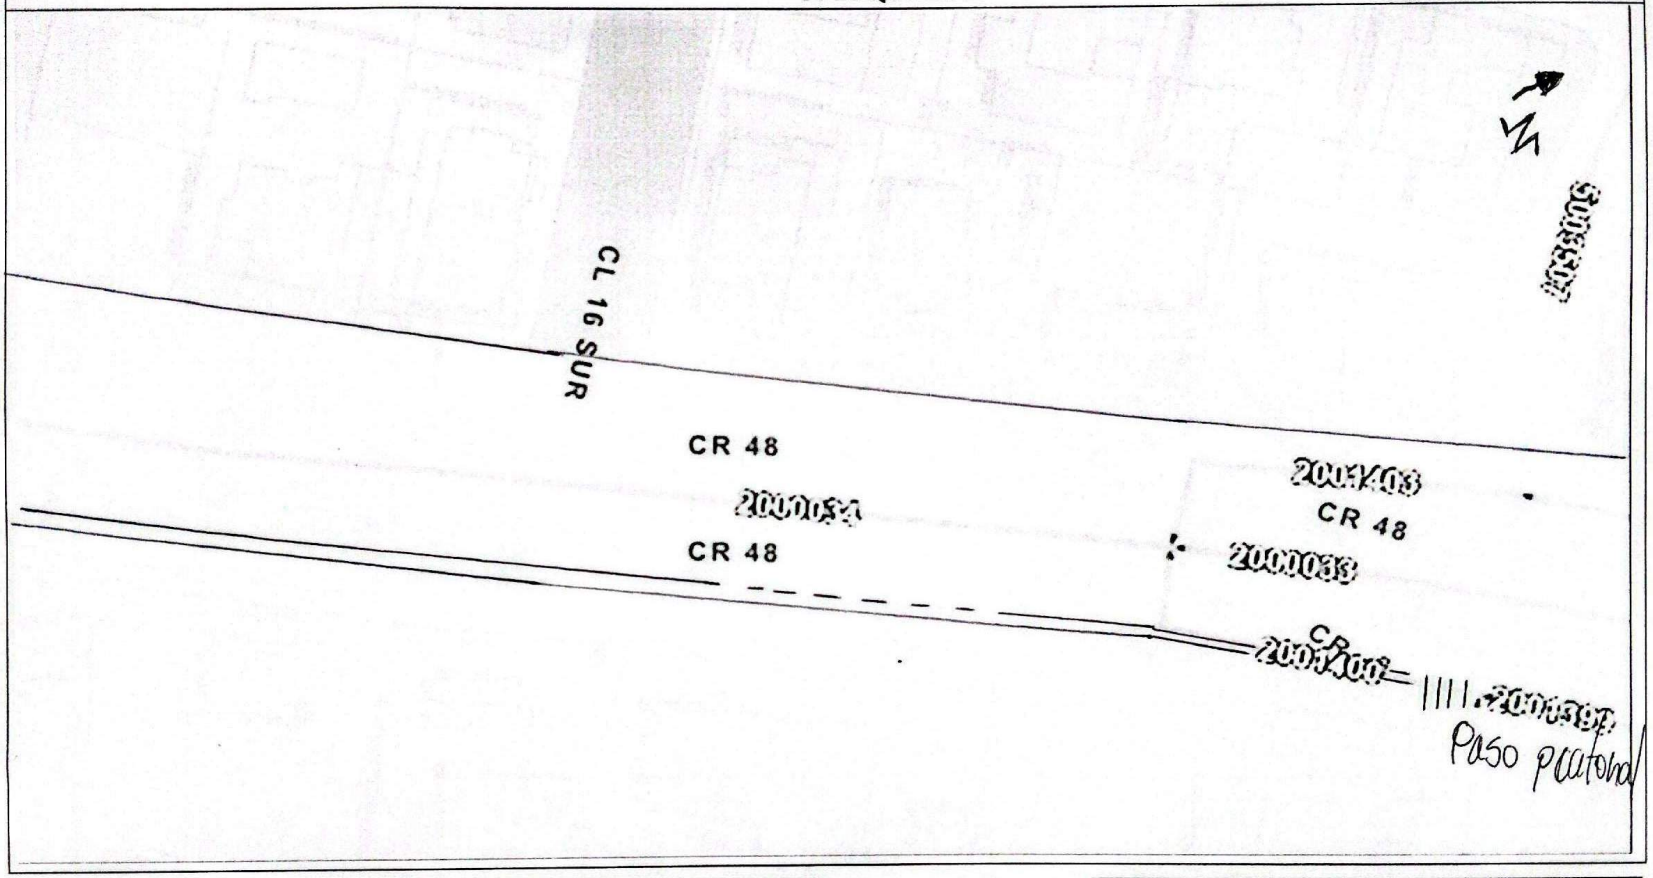

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Demarcación horizontal	**CUADRILLA:**	7
RANGO:	N/A	**CANTIDAD:**	N/A
BARRIO	Santa María de los Ángeles	**DIRECCION:**	CR 48 CL 15 SUR FINAL CL 12 SUR

Powered by CamScanner
