FECHA (D/M/A): 24-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Demarcación Horizontal
RANGO: N/A	CANTIDAD: N/A
ZONA	6
COMUNA	15 Guayabal
BARRIO	1504 Santa fe
FRENTE DE TRABAJO:	7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 8:00 pm
TERMINACIÓN: 5:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA / noche: nublado-seco
TARDE: seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización para dar cumplimiento al PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Limpieza de las áreas a intervenir
- Inicia encintado para realizar las figuras
- Aplicación pintura amarilla para ojo de alguila.
- Aplicación pintura roja y azul para fuerte ciclonta
- Se aplica pintura para flecha frente y giro
- Se realiza prueba de galga para espesor pintura aplicada
- Se realiza prueba de retroactividad de la pintura aplicada
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas.
- Retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Jaime S Taborda. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A
NOMBRE: David Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X		Consorcio Vial MED 2025
2	Encargado	Catalina Castillo Montoya	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jorge Andres Cortes Parra	X		
7	Ayudante	Jhoficun Castillon Correa	X		
8	Ayudante	Geraldin Garcia Estrada	X		
9	Ayudante	Luis Fernando Hurtado Cadavid	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Ronny Arturo Castillo Parmalee	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Podillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JMC - NNN 349 - 2026	X		
16	Volqueta(s)				
	01 bano movil	506	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):24-03-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
5000244	4.1.2001		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	0,62	0,62	bicicleta ciclorruta plastico en frio
5000244	4.1.2001		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	0,62	0,62	bicicleta ciclorruta plastico en frio
5000244	4.1.3		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	5,60	5,60	corchetes cicloruta plastico en frio
5000244	4.1.2005		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	10,80	10,80	cuadros de ceda el paso de (0.40m* 0.40m) plastico en frio
5000244	4.1.2001		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	15,75	15,75	tapete cicloruta (color rojo)
5000244	4.1.2003		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	3,35	3,35	linea de borde derecho 0.12 blanca plastico en frio
5000244	4.1.2001		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	3,60	3,60	tapete cicloruta (color rojo)
5000244	4.1.2001		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	0,86	0,86	tapete cicloruta (color rojo)
5000244	4.1.2005		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	3,77	3,77	linea de detencion 0.40 plastico en frio
5000244	4.1.1		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	2,10	2,10	texto pare plastico en frio
5000244	4.1.2001		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
5000244	4.1.1		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	2,20	2,20	flecha de frente y giro plastico en frio
5000244	4.1.3		CL 24 CR 50 + CR 52	14,00	3,00	42,00	14 lineas de 3m de eje 0.12 plastico en frio
5000244	4.1.3		CL 24 CR 50 + CR 52	1,00	30,22	30,22	linea de eje 0.12 plastico en frio
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 24-03-2026

9. ESQUEMAS

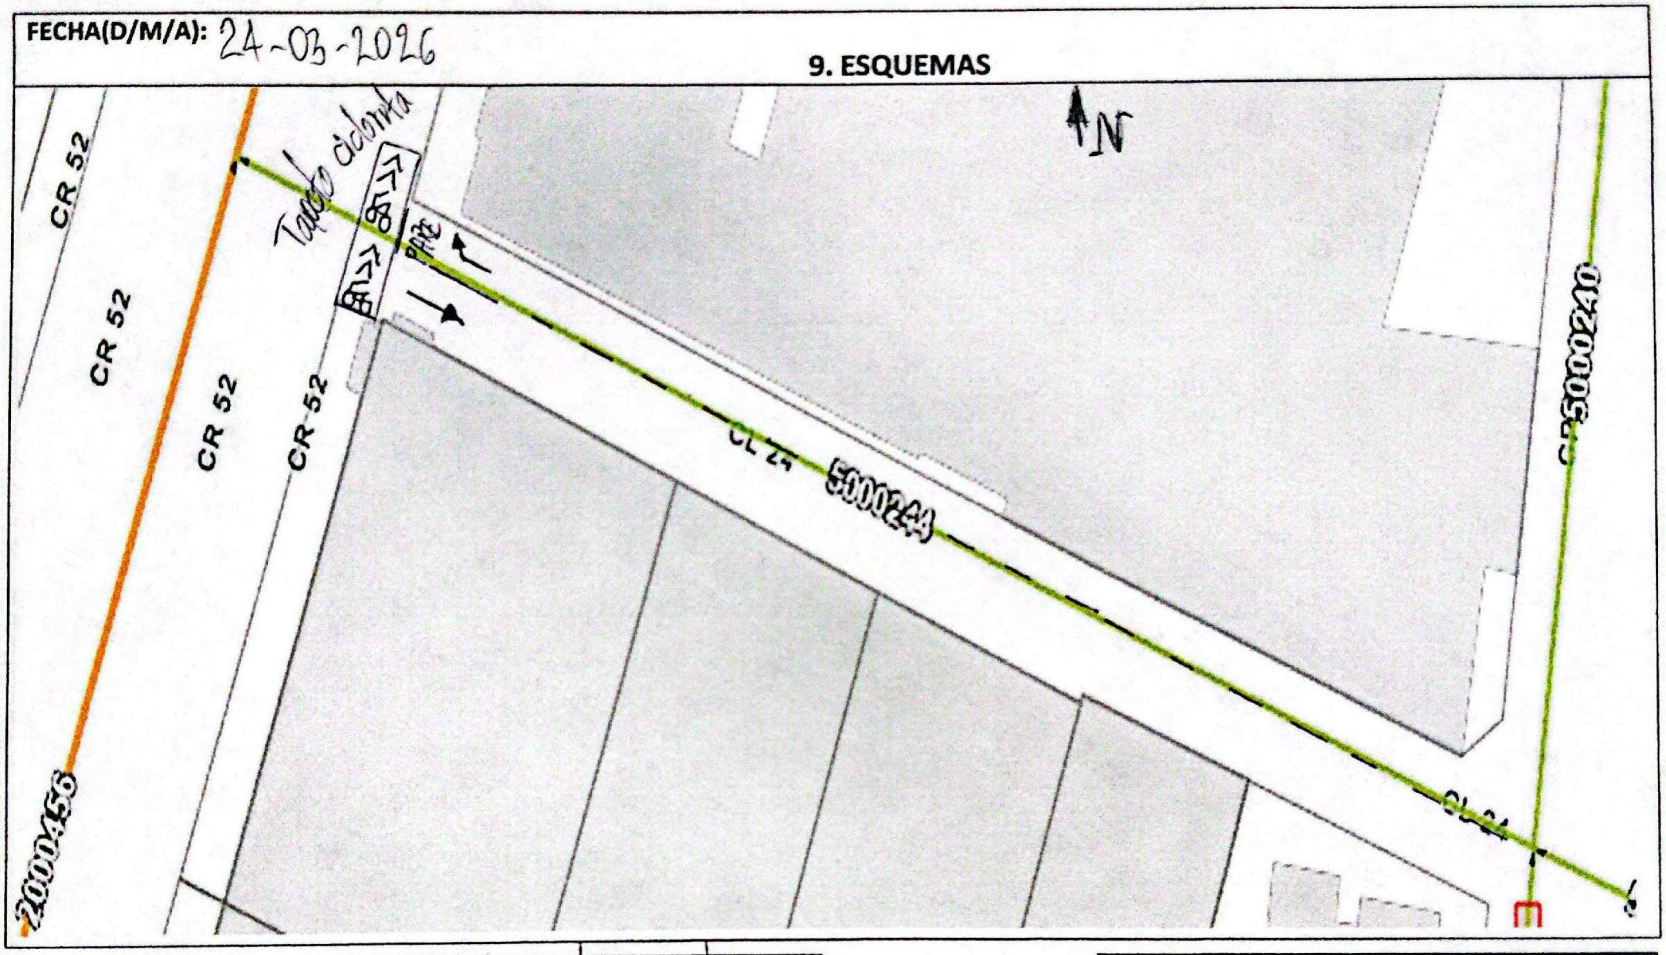

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Demarcación horizontal	**CUADRILLA:**	7
RANGO:	N/A	**CANTIDAD:**	N/A
BARRIO	Santa fé	**DIRECCION:**	CL 24 CR 50 CR 52

Powered by CamScanner
