FECHA (D/M/A): 28-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Demarcación horizontal

RANGO: N/A

CANTIDAD: N/A

ZONA: 4

COMUNA: 13 San Javier - 12 La América

BARRIO: 1304 Los Alcazares - 1206 Santa Lucía

FRENTE DE TRABAJO: 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 5:35 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: nublado - seco

NOCHE TARDE: seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización para dar cumplimiento PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Limpieza de las áreas a intervenir
- Inicia enmascarado para realizar figuras CR 89A CR 90
- Aplicación pintura amarilla para ojo vía
- Aplicación pintura flecha frente y giro
- Aplicación pintura flecha
- Se realiza prueba de rugosidad para espesor pintura aplicada
- Se chequean ángulos de las figuras realizadas
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Jaime S Taborda Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Ortiz A.
NOMBRE: Daniel Acuña G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X		Consorcio Vial MEJ 2025
2	Encargado	Rafael Castillo Montoya	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jorge Andres Cortes Para	X		
7	Ayudante	Jhonatan Castrillon Cerra	X		
8	Ayudante	Geraldin Patricia Zafra	X		
9	Ayudante	Luis Fernando Hurtado	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Ronny Arturo Castillo Pinzón	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JMC - NNN 395 - 2026	X		
16	Volqueta(s)				
		Herramienta menor	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):28-03-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4000389	4.1.1		CR 90 CL 48B CR 89A	1,00	4,20	4,20	texto pare plastico en frio
4000389	4.1.2005		CR 90 CL 48B CR 89A	1,00	7,67	7,67	linea de detencion 0.40 plastico en frio
4000389	4.1.3		CR 90 CL 48B CR 89A	1,00	25,05	25,05	linea de berma continua 0.12 plastico en frio
4000389	4.1.1		CR 90 CL 48B CR 89A	1,00	2,20	2,20	flecha de frente y giro plastico en frio
4000389	4.1.3		CR 90 CL 48B CR 89A	1,00	16,80	16,80	linea de eje continua 0.12 plastico en frio
4000388	4.1.2001		CR 89A CR 90 CR 89B	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
5004937	4.1.2001		CR 92B CL 47F CL 48	1,00	5,08	5,08	flecha doble giro plastico en frio
5004937	4.1.1		CR 92B CL 47F CL 48	1,00	2,10	2,10	texto pare plastico en frio
5004937	4.1.2005		CR 92B CL 47F CL 48	1,00	3,30	3,30	linea de detencion 0.40 plastico en frio
4000371	4.1.3		CL 48 CR 92A CR 92B	1,00	7,42	7,42	linea de eje continua 0.12 plastico en frio
4000371	4.1.3		CL 48 CR 92A CR 92B	1,00	20,18	20,18	linea de eje continua 0.12 plastico en frio
4000371	4.1.1		CL 48 CR 92A CR 92B	1,00	2,20	2,20	flecha de frente y giro plastico en frio
4000371	4.1.2001		CL 48 CR 92A CR 92B	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
4000370	4.1.3		CL 48 CR 92 CR 92A	1,00	6,00	6,00	linea de eje continua 0.12 plastico en frio
4000370	4.1.2001		CL 48 CR 92 CR 92A	1,00	19,32	19,32	resalto plastico frio
4000370	4.1.3		CL 48 CR 92 CR 92A	1,00	16,60	16,60	linea de eje continua 0.12 plastico en frio
4000370	4.1.2001		CL 48 CR 92 CR 92A	1,00	1,20	1,20	flecha de frente plastico en frio
4000370	4.1.2001		CL 48 CR 92 CR 92A	1,00	3,15	3,15	flecha frente doble giro plastico frio
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 28-03-2026

9. ESQUEMAS

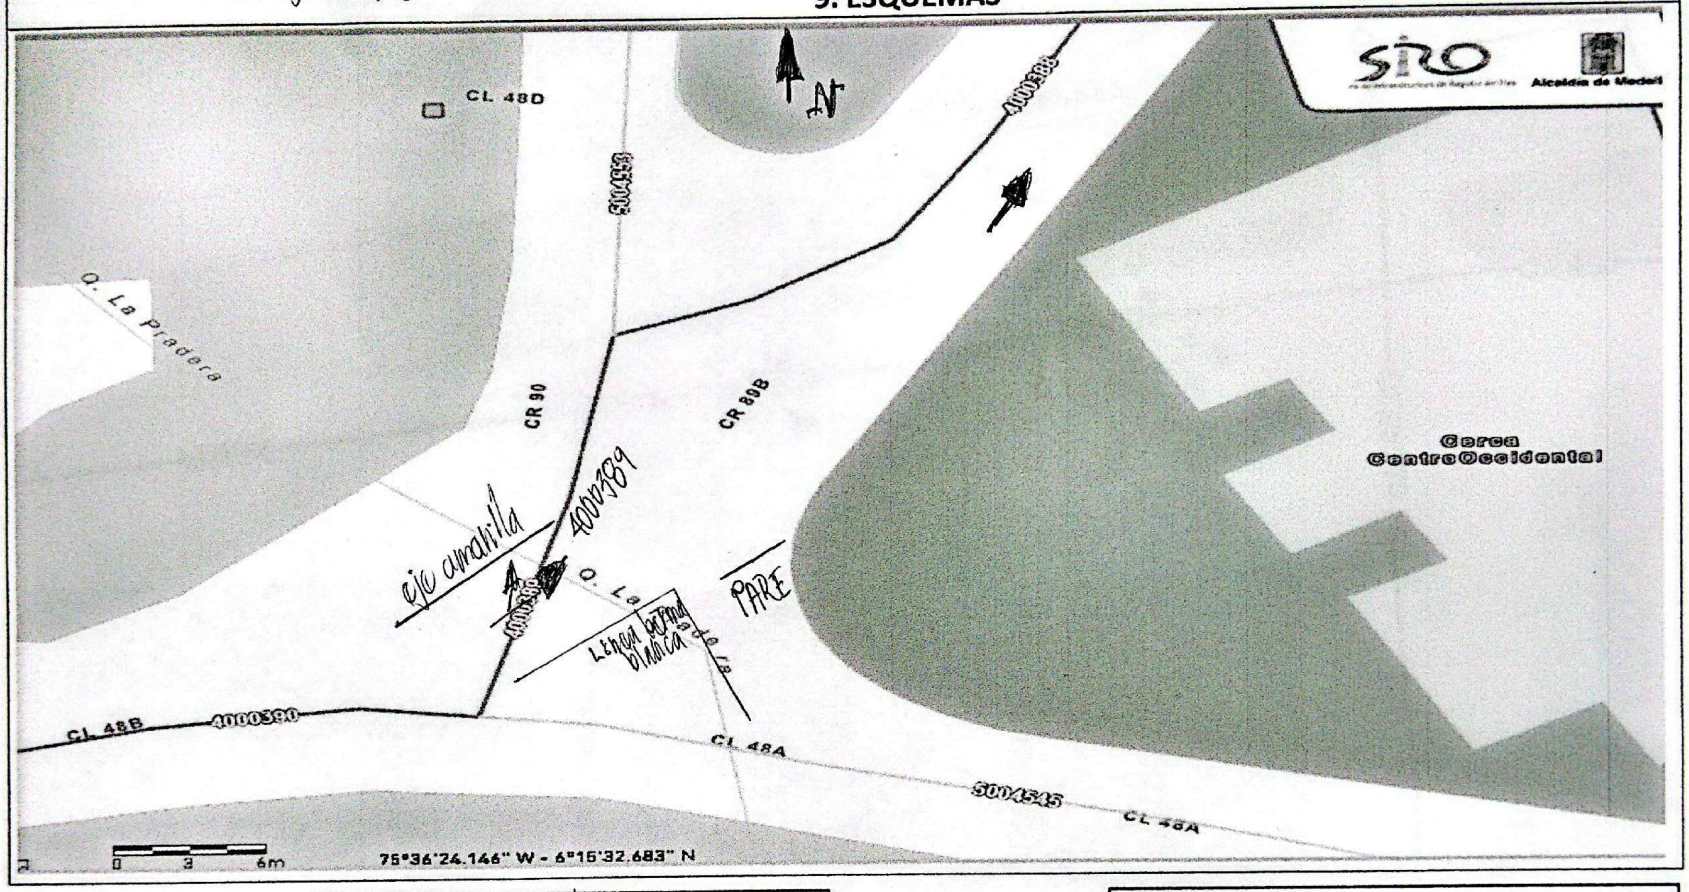


TIPO DE INTERVENCIÓN:	Demarcación horizontal	**CUADRILLA:**	7
RANGO:	N/A	**CANTIDAD:**	N/A
BARRIO	Los Alcazares	**DIRECCION:**	CR 90 CL 48B CR 89A

Powered by CamScanner

FECHA(D/M/A): 28-03-2026

9. ESQUEMAS

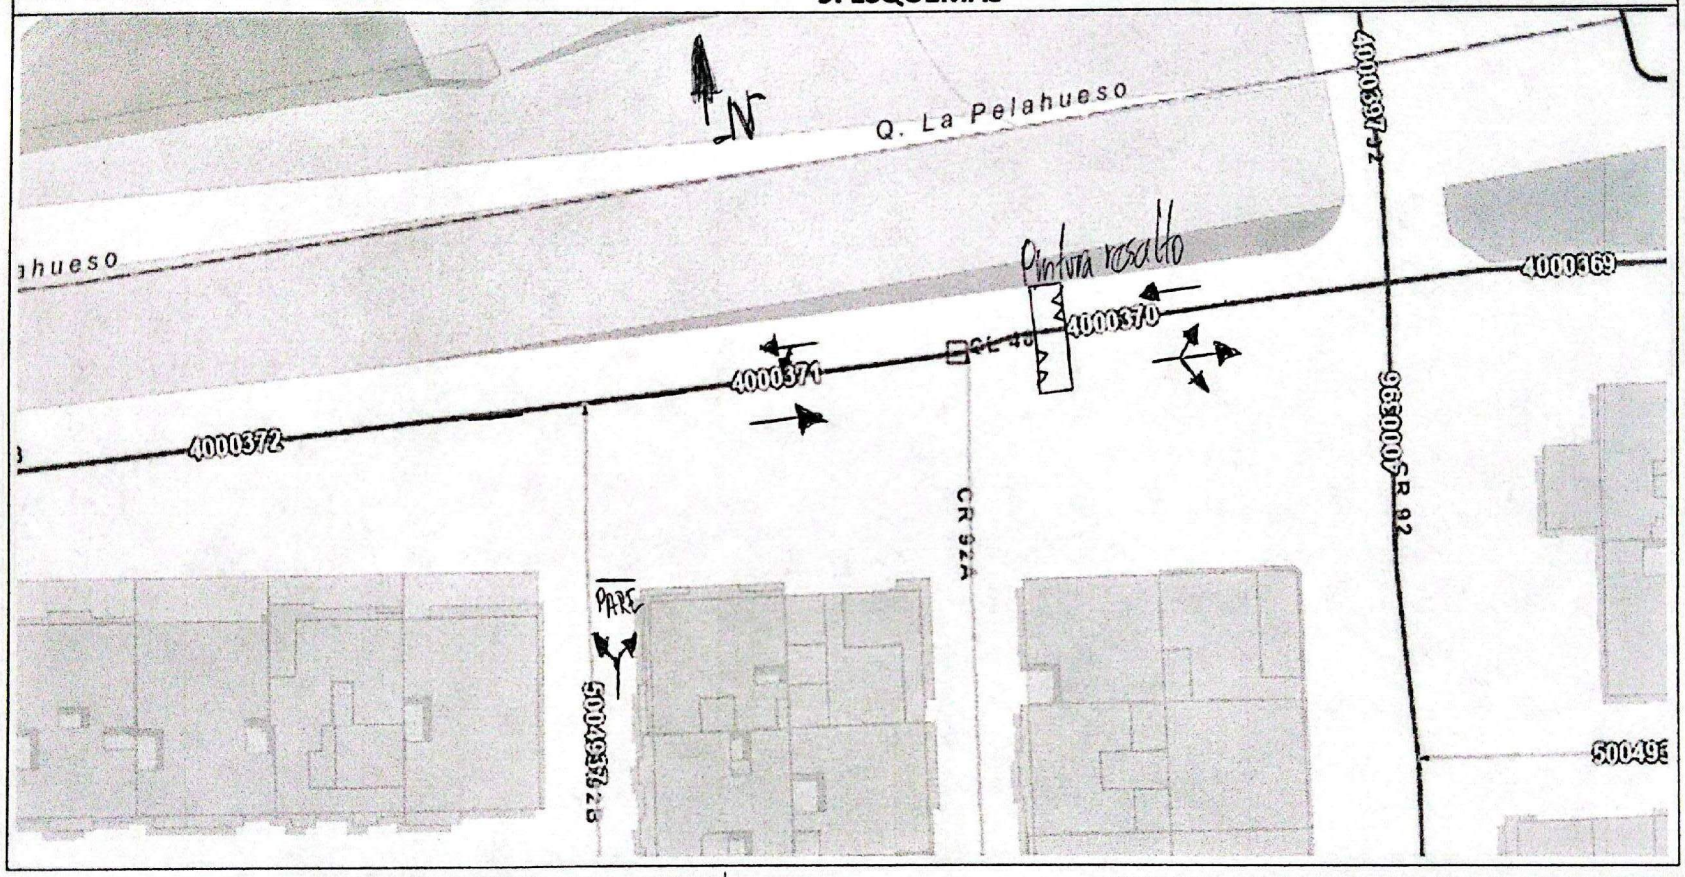

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Demarcación horizontal	**CUADRILLA:**	7
RANGO:	N/A	**CANTIDAD:**	N/A
BARRIO	Santa Lucía	**DIRECCION:**	CL 48 CR 92 Y CR 92B

Powered by CamScanner
