FECHA (D/M/A): 11 DE MARZO 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 CANTIDAD: 10.06 TON

ZONA 3

COMUNA 8

BARRIO VILLA TINA

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 5:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA NUBLADO

TARDE SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL EN EL ÁREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT.

.CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL CARRIL CON MALLA Y BALIZAS

.MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS.

.ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE, ENCONTRADA EN LOS BACHES QUE ESTAN SIENDO INTERVENIDOS.

.IMPRIMACIÓN DE BACHES.

.LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA WLW 714, CON 10.06 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBSA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 10:30 AM.

.CHEQUEO DE TEMPERATURA 139°C

.EXTENSION DE MEZCLA

.NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2- CAPAS.

.RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS

.RETIRO DE SEÑALIZACIÓN

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	MARTHA R. LÓPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 DE ENERO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ESPITIA	X		
7	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
8	Ayudante	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
10	Ayudante	HANS VILLADA	X		
11	Ayudante	ALEXANDER GOEZ.	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JHONEDISON YALI	X		
		JULIANA DIAZ	X		
		LUZ ANDREA VILLAMIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	WLW 714	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 DE MARZO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002291	167298	1A	CR 16 CL 56C - 36	7.20	1.72	0.14	12.38	1.73	4.15
4002291	167298	1B	CR 16 CL 56C - 36	6.40	1.58	0.14	10.11	1.42	3.41
4002291	167447	2	CR 16 CL 56C - 30	5.70	1.30	0.14	7.41	1.04	2.50
TOTALES							29.90	4.19	10.06

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
537759	WLW 714	10.06		146	25642	WLW 714	SENCILLO	1	PROCOPS

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 DE MARZO 2026

10. ESQUEMAS

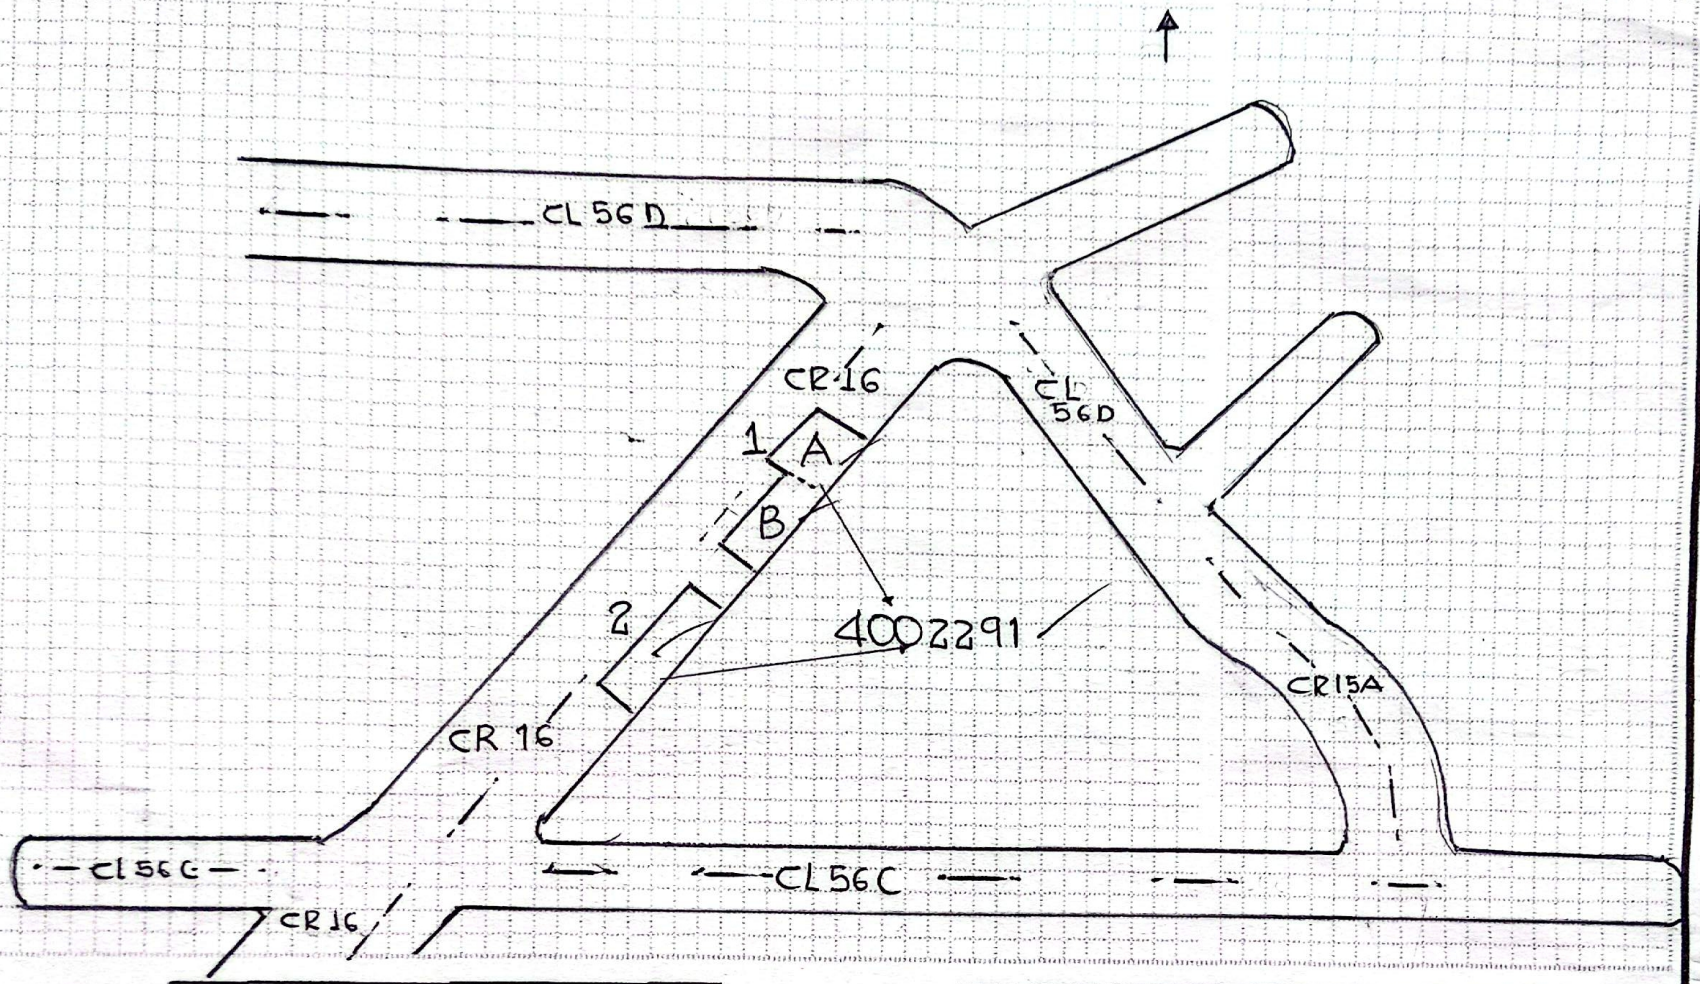

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.06 TON.
BARRIO	VILLATINA	DIRECCIÓN	CR16 CL 56C-36

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 11 DE MARZO 2026.

W4

20260311 08:51
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 537759
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON EDINSON YALY

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-9 - tibirita -
asfalto 60 -70 - BAP
CANT. NETA: 10,06 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V00000368? SUM-2149-EYP MALLA VIAL ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:17.970,00

ENTRADA: 11 mar 2026 - 08:52 a.
SALIDA: 11 mar 2026 - 08:52 a.
TEMPERATURA:146,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

EDISON YALI
1022401226

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25642

PROVEEDOR: Vial Md
VALE POR UN VIAJE: Escombro
11-3-26
PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal 2058 F-9
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner
