FECHA (D/M/A): 13 ABRIL 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 10,07 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: VILLA TINA

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM.

TERMINACIÓN: 3:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT.

. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BOLIZAS.

. ACOPIO TEMPORAL DE ESCOMBROS. - NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ENCONTRADOS EN BACHES INTERVENIDOS. DEMOLICIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA ENCONTRADO EN BACHES.

- IMPRIMACIÓN DE BACHES. - LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA WLW714, CON 10,07 TON DE MEZCLA MDC19 CON RSP DE PLANTA PAVIMENTOR A LAS 11:40 AM.

- CHEQUEO DE TEMPERATURA 152°C. - EXTENSIÓN DE MEZCLA. - NIVELACION DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS. - RETIRO DE ESCOMBROS. - RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE LOS BACHES INTERVENIDOS, EL VIBROCOMPACTADOR NO PRESENTÓ FUNCIONAMIENTO EN SU SISTEMA DE VIBRACION. EN CONSECUENCIA, LA COMPACTACIÓN DE LA CAPA FINAL DE LA MEZCLA COLOCADA SE EJECUTÓ MEDIANTE EL USO DE PLACA VIBRATORIA COMPLEMENTADA CON PASADAS DEL VIBROCOMPACTADOR EN MODO ESTÁTICO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson L.	NOMBRE: MARTHA P. LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JUAN DAVID RENGIFO	NOMBRE: JOSE LUIS GUZMAN A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13 MARZO 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SEENS	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA.	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ESPRILLA	X		
7	Ayudante	ALBINO DE JESUS JULIO GARCIA	X		
8	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
9	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
10	Ayudante	HANS VILLADA	X		
11	Ayudante	ALEXANDER GOEZ	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SEENS	X		
17	Operador compresor	JAVIER RAMIREZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JHON EDISON YAIL	X		
		JULIANO DIAZ	X		
		LUZ ANDRES VILLAMIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND.	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)	GTX043	X		
		WIW 714	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13 MARZO 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002410	167469	1A	CR17CL55-09	4.10	4.55	0.14	18.66	2.61	6.26
4002410	167469	1B	CR17CL55-09	1.40	2.32	0.14	3.25	0.46	1.10
4002410	150956	2	CR17 CL 55 -10	4.30	1.85	0.11	7.96	0.88	2.11
4002410	167470	3 NIVELACION	CR17 CL 55-10 -SM	2.75	1.85	0.05	5.09	0.25	0.60
TOTALES							34.96	4.20	10.07

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
538010	WLW714	10.07		148


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
25644	WLW714	SENCILLO	1	PROCOPSI

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13 MARZO 2026

10. ESQUEMAS

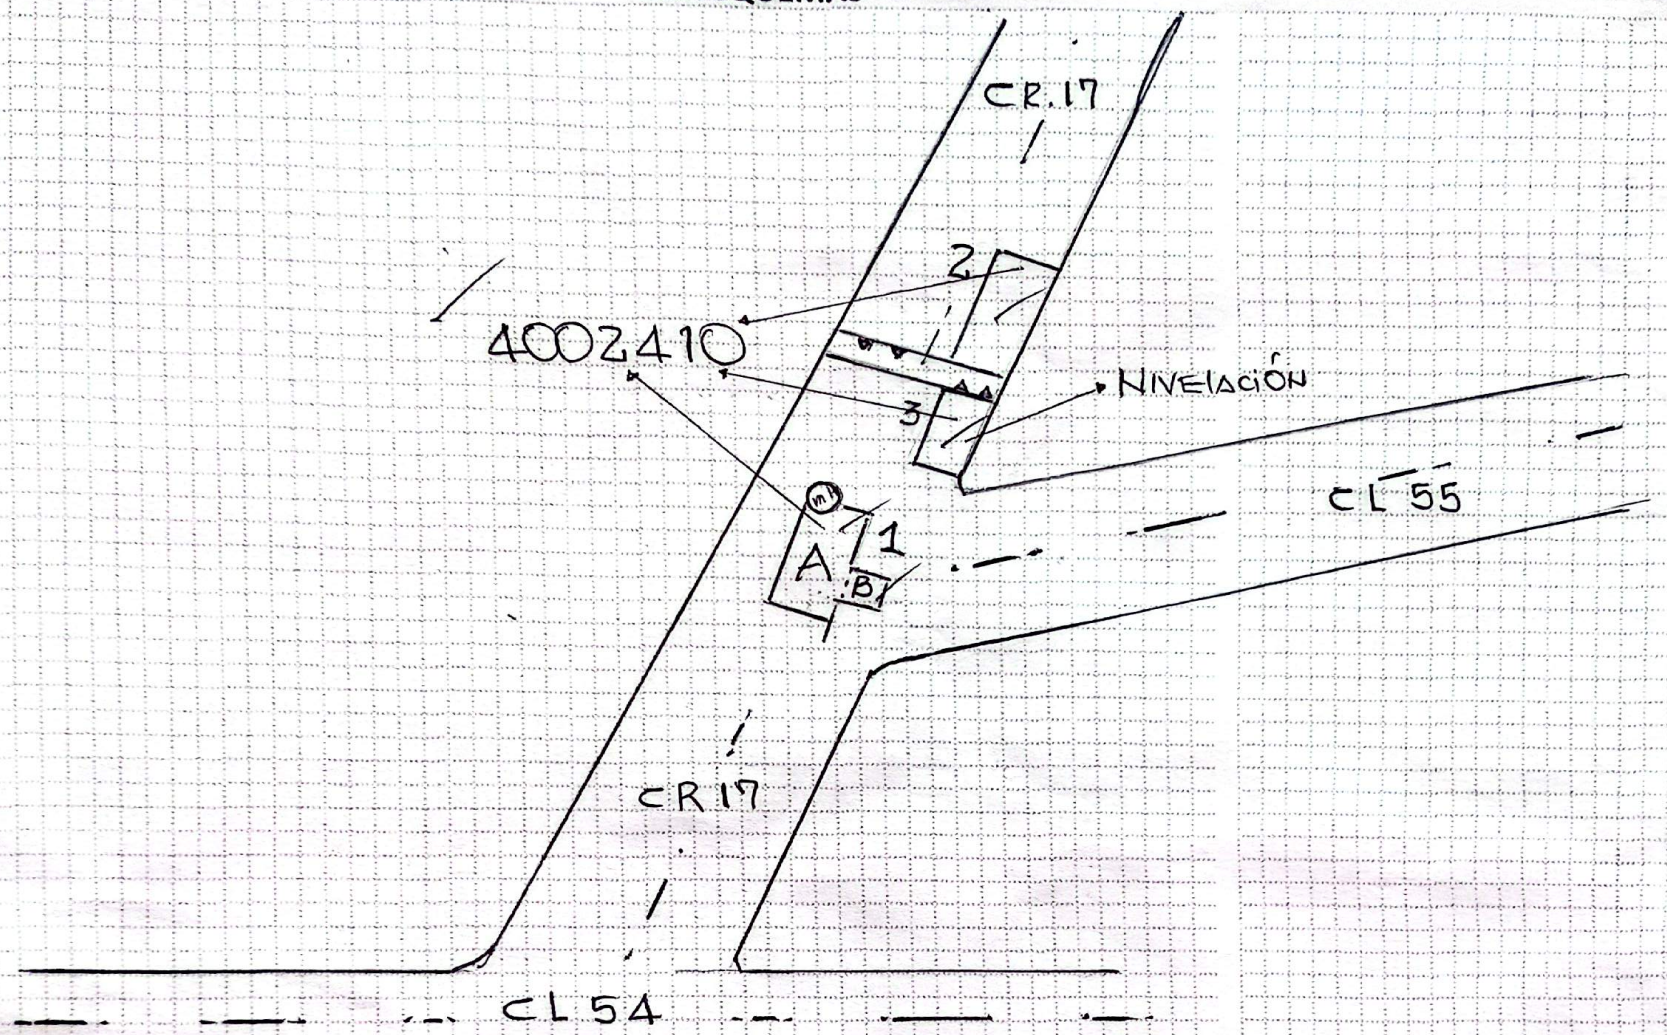

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.07 TON
BARRIO	VILLATINA	DIRECCIÓN	CR17 CL 55-10

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 13 MARZO 2026

wf

REMISION DE MATERIALES 20260313 10:10
PAVINENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA 536010
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON EDINSON YALY

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - CAP
CANT. NETA: 10,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:17.980,00

ENTRADA: 13 mar 2026 - 10:10 a.
SALIDA: 13 mar 2026 - 10:10 a.
TEMPERATURA:140,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LÓPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25644

PROVEEDOR: Vial Sur
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal 2058 - F9
RECIBIDO POR:

13-3-26

PROCOPAL S.A
Nit. 890 [illegible]-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Sum
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner
