FECHA (D/M/A): 24-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1- diurno | CANTIDAD: 10,15 TON

ZONA: 2

COMUNA: 7- Robledo

BARRIO: Monte claro

FRENTE DE TRABAJO: 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 07:00 am
TERMINACIÓN: 03:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones y junto al contratista. Instalacion de señalizacion vertical según PMT. Ubicacion de las controladoras vial, Instalacion de Señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil camilla, extintor, botiquin, punto ecologico... Marcado y demolicion del pavimento afectado. limpieza de las intervenciones, acopio de los escombros, aplicacion de emulsión asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 fibia con rap de pavimentar en dos capas, la segunda capa tiene espesor de mezcla compacta por lo general entre 2 y 4 cm de espesor. Cargue de escombros a la volqueta, aseo general de la obra, recogida de herramienta y señalización.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

Sorany C

NOMBRE: Sorany Andrey Ceballos G Vo. Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Alvarez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Marquez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-03-2026.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sorany Ceballos	✓		
2	Encargado	-			
3	Liguero	Leiver Padilla	✓		
4	Rastrillero	Juan Londoño	✓		
5	Rastrillero	Emiro Mosquera	✓		
6	Ayudante	Simon Jaramillo	✓		
7	Ayudante	Jaime Carmona.	✓		
8	Ayudante	Hugo Rios	✓		
9	Ayudante	Alberto Suarez	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz.	✓		
11	Ayudante	José Sanches	✓		
12	Ayudante	|			
13	Ayudante	|			
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Sanchez	✓		
17	Operador compresor	Alberto Mora	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher	|			
20	Operador Retroexcavadora	|			
21	Operador Vibrocompactador	|			
22	Operador Compactador llantas	|			
23	Operador Cortador Asfalto	|			
24	Operador Equipo Imprimación	Leiver Padilla	✓		
25	Operador Mini cargador	|			
26	Operador Barredora	|			
27	Coductor Carrotanque	|			
28	Conductor Camión	William colorado	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
30	Controladora Vial	Leidyana Ponce	✓		
31	Controladora Vial	Leidy Usuga	✓		
		|			
		|			
		|			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Musqvarna	✓		
2	Compresor	Dobsan C-185.	✓		
3	Fresadora	|			
4	Finisher	|			
5	Retroexcavadora	|			
6	Vibrocompactador	|			
7	Compactador llantas	|			
8	Cortador Asfalto	|			
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecón - Honda	✓		
11	Soplador	|			
12	Mini cargador	|			
13	Barredora	|			
14	Carrotanque	|			
15	Camión	chevrolet NNR 2012	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		
		|			
		|			
		|			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5018944	165422	1A	CL 72 CR 91D-240	3,60	3,40	0,13	12,24	1,59	3,82
5018944	165422	1B	CL 72 CR 91D - 240	3,10	2,24	0,13	6,94	0,90	2,17
5018944	167655	2	CL 72 CR 91D - 200	4,00	2,40	0,12	9,60	1,15	2,76
5018944	158257	3	CL 72. CR 91D - 160	2,50	1,80	0,13	4,50	0,59	1,40
TOTALES							33,28.	4,23	10,15

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538793	SMV677	10,15	—	148.	26602	SMV677	Sencillo	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 24-03-2026

10. ESQUEMAS

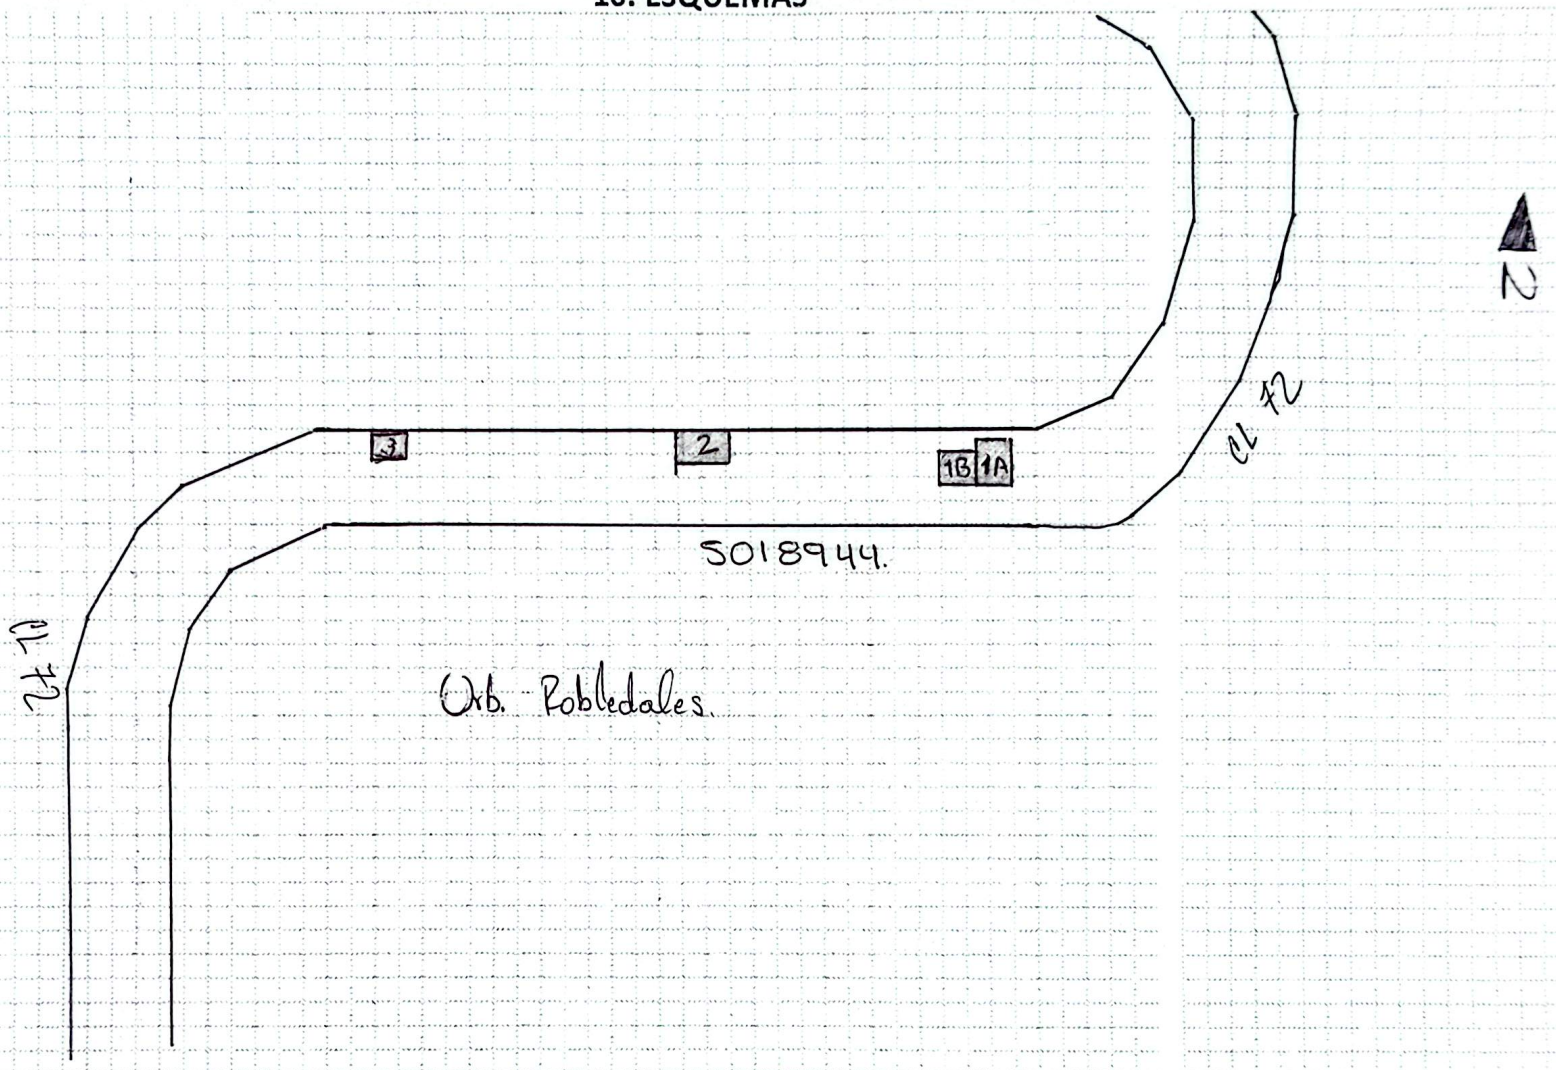

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	12
RANGO:	1 - Diurno	CANTIDAD:	10,15 TON
BARRIO	Monte Claro.	DIRECCIÓN	CL 72 CR 91D - 160 a 240

Powered by CamScanner

20260324 07:37

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538793
PLACA: SHV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 ? - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,15 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.430,00

ENTRADA: 24 mar 2026 -m07:38 a.
SALIDA: 24 mar 2026 - m07:38 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260324 15:17

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24602
PLACA: SHV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003731 SUM-2193-ESCOMBROS NO VA
VIAL EYP #2193
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 25 mar 2026 -m06:16 a.
SALIDA: 25 mar 2026 - m06:16 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 15780
Peso tara : 7280
Peso neto : 8500

Powered by CamScanner
