FECHA (D/M/A): 30/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 10.07 tr

ZONA: 7

COMUNA: 60

BARRIO: Corregimiento San Cristobal

FRENTE DE TRABAJO: 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00am

TERMINACIÓN: 3:00pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado, lluvias de 12:38pm a

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las áreas de trabajo, instalación de baño portátil, camilla, papeleras de sobres para depósito de residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación, actividades de demolición de pavimento en mal estado, retiro de escombros, limpieza, compactación de base portante, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla MDC-19 compactada mecanicamente.
Hora de llegada de la mezcla a la obra 9:30 a.m
Verificación de temperatura de la mezcla.
Patologías: desgaste del pavimento, piel de cocodrilo, huecos, desmoronamiento.
Fuertes lluvias de 12:38pm a 7:15pm se suspende actividades.
Al terminar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Sorany Andreey C.C
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Sorany Andreey C.C

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: José Luis Guzmán

FECHA (D/M/A): 30 | 03 | 2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sarany Andrea Ceballos	X		EyP
2	Encargado	Yeiver Padilla Osorio	X		EyP
3	Liguero	Juan Londoño Urrego	X		EyP
4	Rastrillero	Luis Emiro Vasquez	X		EyP
5	Rastrillero	Simon Jaramillo	X		EyP
6	Ayudante	Hugo de Jesus Rios	X		EyP
7	Ayudante	Alberto Suarez	X		EyP
8	Ayudante	Jeferson Muñoz Balladales	X		EyP
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Guillermo Sánchez	X		EyP
17	Operador compresor	Alberto Vera	X		EyP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	William Colorado	X		Jose Luis Hamit
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	X		EyP
30	Control vial	leidy Usuga	X		Conservia

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Llamita manual	X		
10	Placa vibratoria	Fecon FC 30			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet, modelo 2012	X		
16	Volqueta(s)	International modelo 2012			

Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE

FECHA (D/M/A): 30 | 03 | 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	To (kg)
	767746	1	CL 62 CR 137 - 102	6.50	3.45	0.10	22.43	2.24	5.38
	767747	2	CL 62 CR 137 - 93	3.80	2.00	0.11	7.60	0.84	2.07
	767748	3	CL 62 CR 137 - 89	3.75	2.10	0.109	7.88	0.86	2.06
6000373	762450	4	CR 137 CL 62 - 57	3.55	1.45	0.05	5.15	0.26	0.62
TOTALES									10.07

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
539484	SHV677	10.07		145

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26606	SHV677	Sencilla	1	Pavimenta

FECHA (D/M/A): 30/03/2026

10. ESQUEMAS

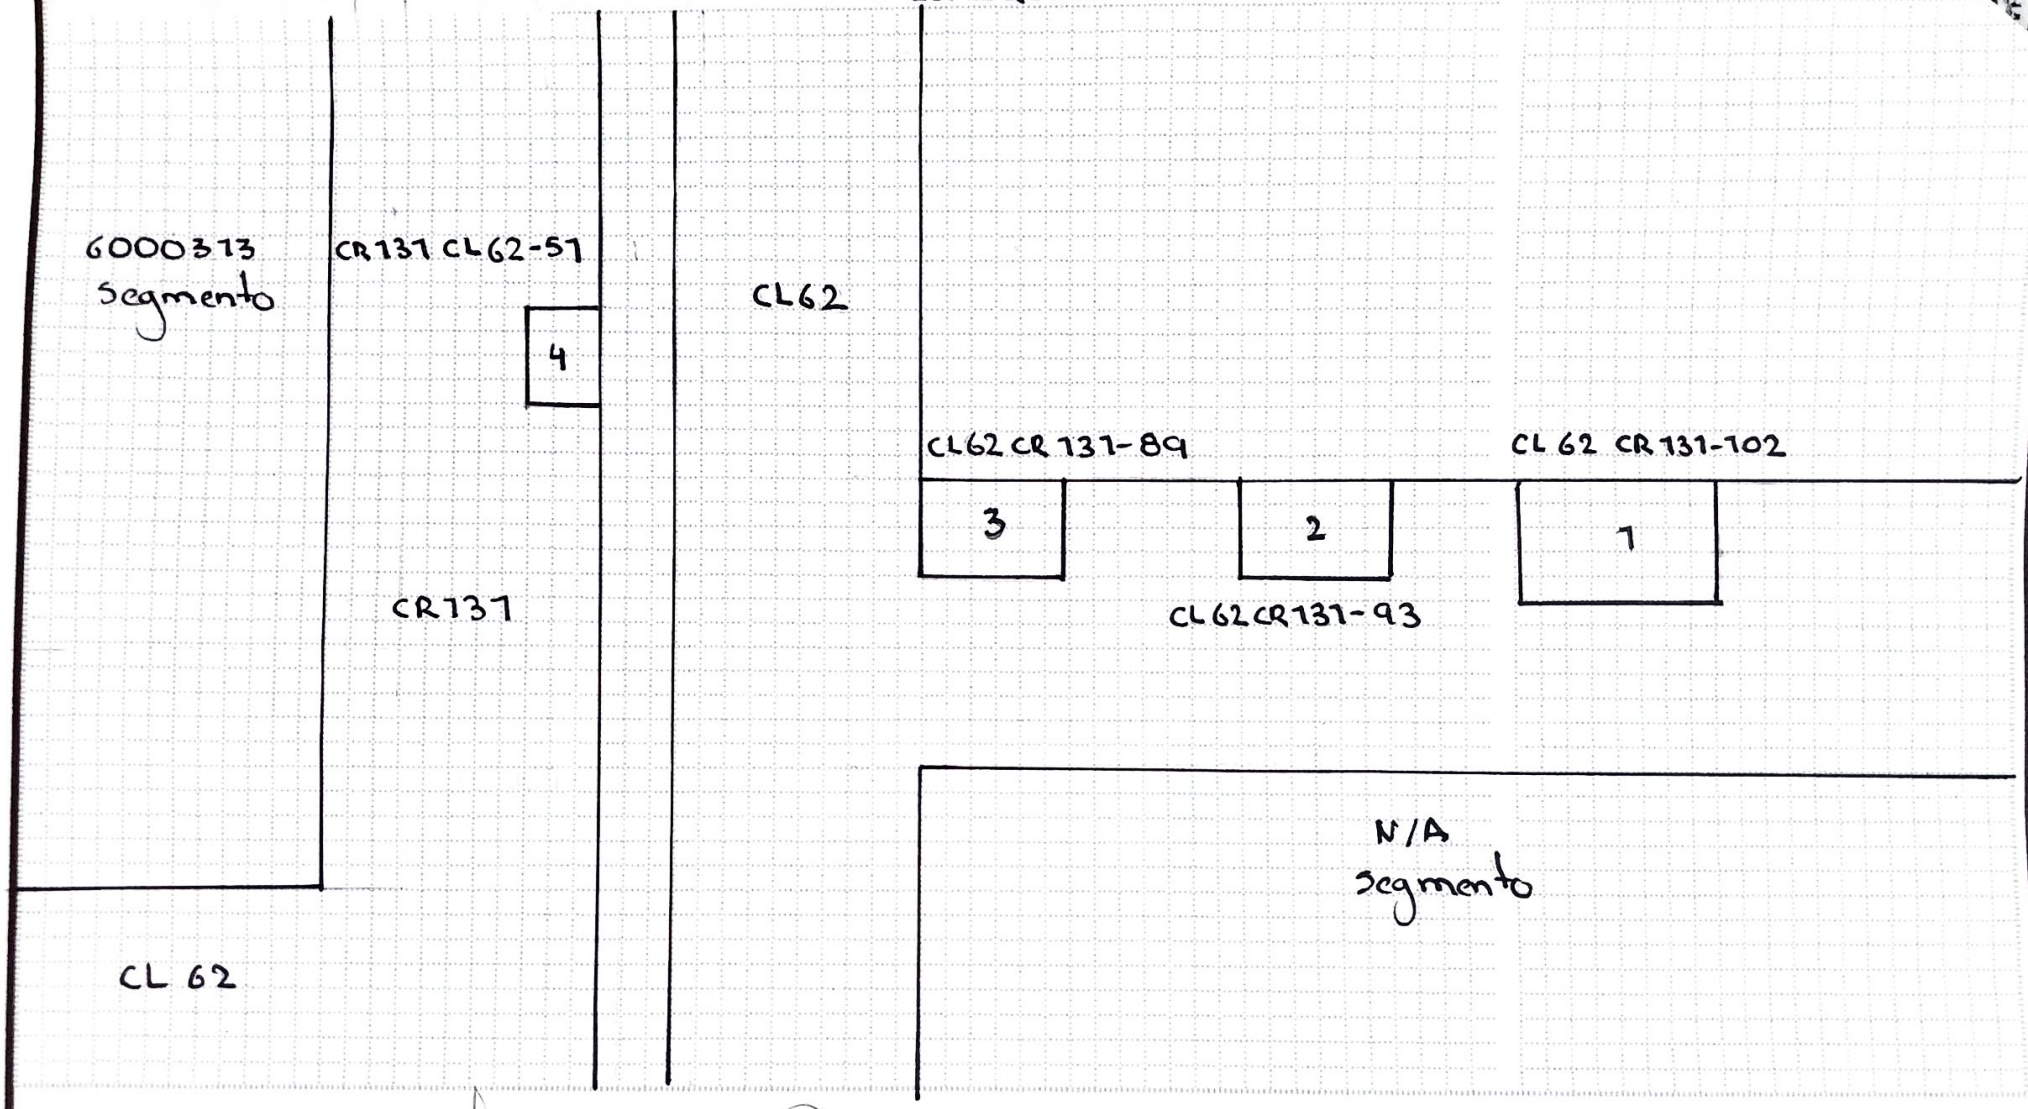

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	12
RANGO:	7	CANTIDAD:	10.07
BARRIO	Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal	DIRECCIÓN	CL 62 CR 137-102

REMISION DE MATERIALES 20260330 07:16
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539484
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED 2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.350,00

ENTRADA: 30 mar 2026 - 07:58 a.
SALIDA: 30 mar 2026 - 07:58 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260331 06:34
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26606
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 31 mar 2026 - 06:35 a.
SALIDA: 31 mar 2026 - 06:35 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 14940
Peso tara : 7280
Peso neto : 7660

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26606**

PROVEEDOR: 2058

30-03-2026

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: SMV 677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Soraya C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
