FECHA (D/M/A): 31/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULAC.
1	Tecnólogo/Ingeniero	Sarang Andrea Caballos	X		EyP
2	Encargado				
3	Liguero	Leiver Padilla Osorio	X		EyP
4	Rastrillero	Juan Londoño Orrego	X		EyP
5	Rastrillero	Luis Emiro Vasquera	X		EyP
6	Ayudante	Simon Jaramillo	X		EyP
7	Ayudante	Hugo de Jesus Rios	X		EyP
8	Ayudante	Albeiro Suarez	X		EyP
9	Ayudante	Jeferson Muñoz Balladales	X		EyP
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Guillermo Sanchez	X		EyP
17	Operador compresor	Albeiro Uloa	X		EyP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Willian Colorado	X		Jose luis Hamit
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	X		EyP
30	Control vial	leidy Usuga	X		Consorcio

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Hiroyama LP 6500	X		
2	Compresor	Daotan C185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marinita Manual	X		
10	Placa vibratoria	Fecon FC 30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet modelo 2012	X		
16	Volqueta(s)	International modelo 2012	X		

FECHA (D/M/A): 31/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5000108	764742	1	CL25A CR65E-55	8.40	3.50	0.09	29.40	2.65	6.35
5000108	767757	2	CL25A CR 65E-43	5.55	1.46	0.094	8.10	0.76	1.83
5000108	767758	3	CL25A CR 65E-35	6.80	2.35	0.10	15.98	1.60	3.84
TOTALES									12.02

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
539664	SUV677	12.02		143

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26607	SUV 677	Sencilla	1	Pavimento

FECHA (D/M/A): 31/03/2026

10. ESQUEMAS

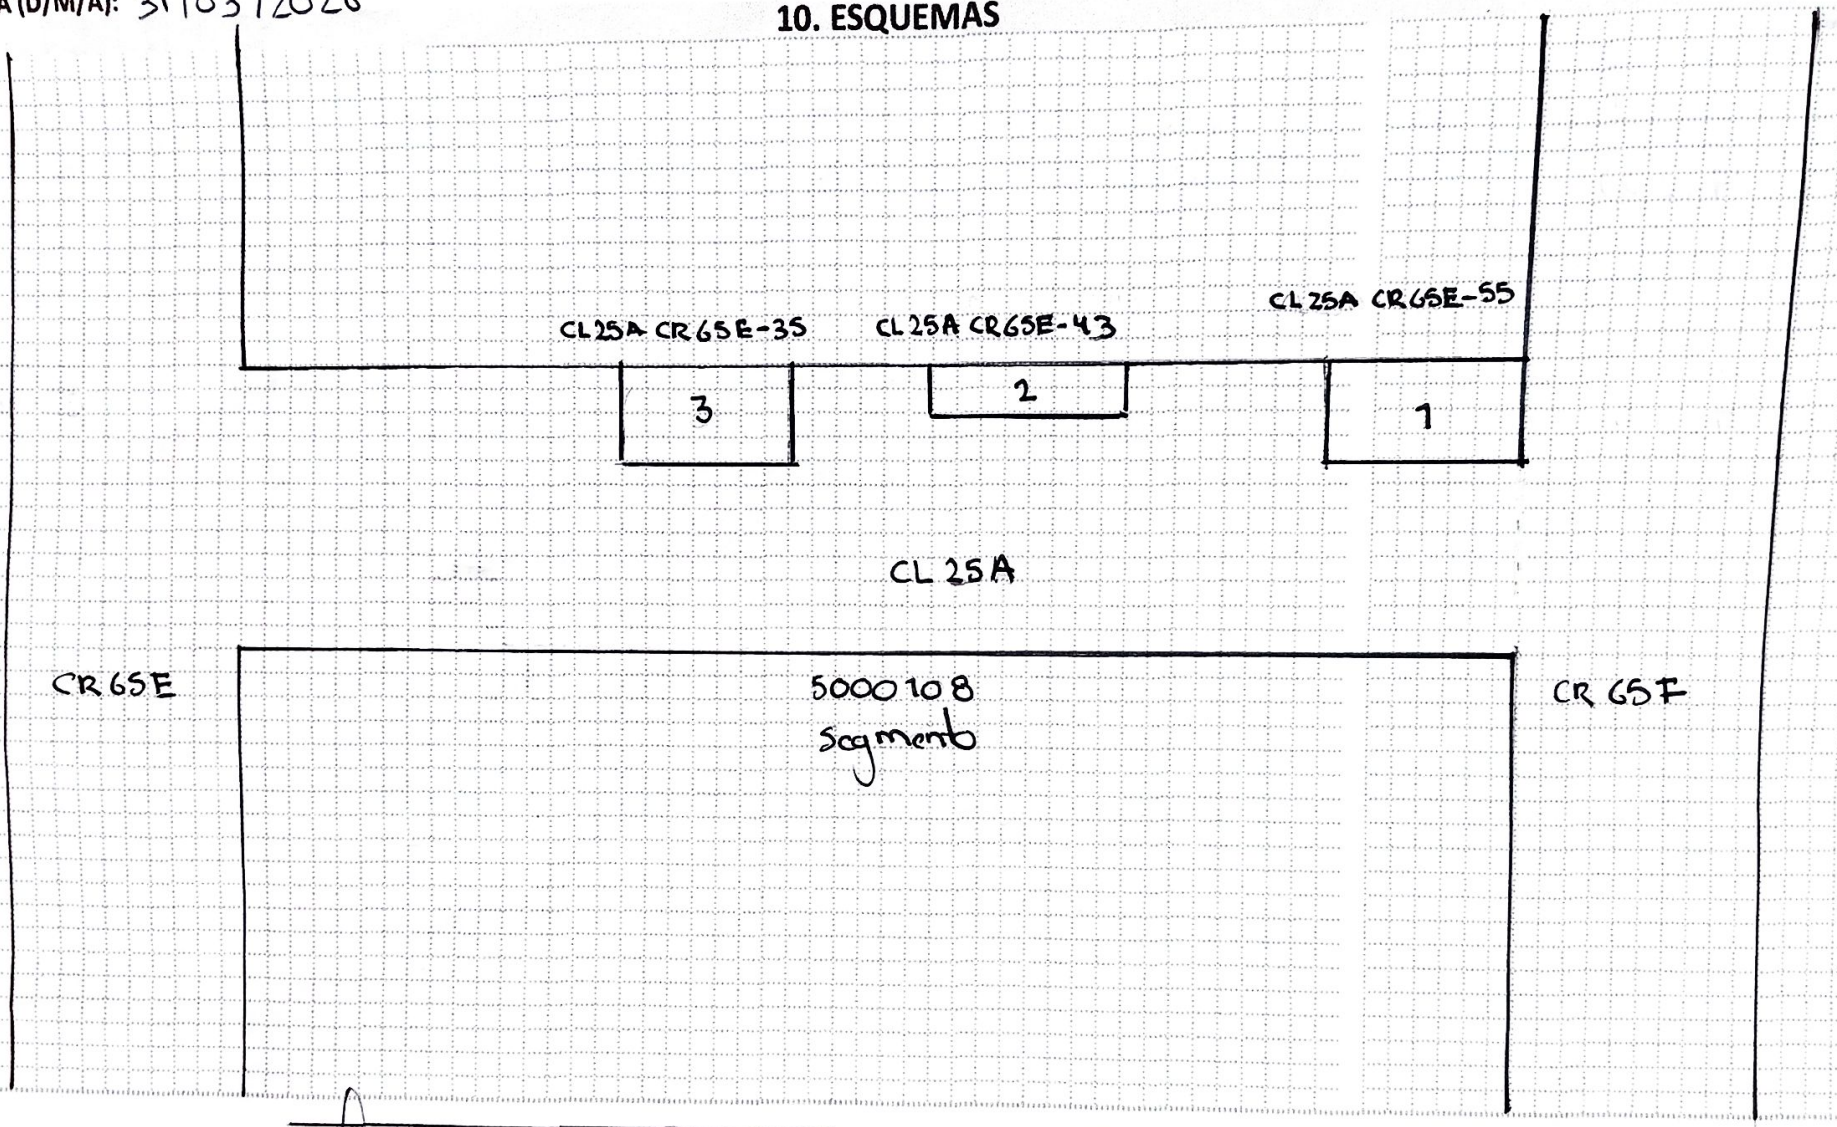

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	72
RANGO:	7	CANTIDAD:	72.02 t
BARRIO	Trinidad	DIRECCIÓN	CL 25A CR 65E-55

REMISION DE MATERIALES -20260331 08:24
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 539664
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:19.310,00

ENTRADA: 31 mar 2026 - 08:28 a.
SALIDA: 31 mar 2026 - 08:28 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras * Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES -20260331 14:46
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26607
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 31 mar 2026 - 02:48 p.
SALIDA: 31 mar 2026 - 02:48 p.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18820
Peso tara : 7280
Peso neto : 11540

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 26607

PROVEEDOR: 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

31-03-2026

PLACA No: SMV 627 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sorany C.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

BITACORA DE OBRA

FECHA (D/M/A): 31/03/2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Parcial
RANGO: 1	CANTIDAD: 72.02 t
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 12
COMUNA: 15	
BARRIO: Trinidad	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377
CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 am
TERMINACIÓN: 3:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las areas de trabajo, instalación de baño portatil, camilla, papeleras de colores para deposito de residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación, actividades de demolición de pavimento en mal estado, retiro de escombros, limpieza, compactación de base portante, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezda UDC-19 compactada mecanicamente.
Hora de llegada de la mezda a la obra
Verificación de temperatura de la mezda.
Patologías: desgaste del pavimento, huecos, descascaramiento, piel de cocodrilo, grietas.
Se realiza intervención de baches y mitigaciones
Al terminar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Soruny Andrel Caballos (Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA)	(Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Luis Restrepo (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA)	NOMBRE: Jose Luis Cuzcano D. (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR)
