FECHA (D/M/A): 19-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

Alcaldía de Medellín
Distrito
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO:	1
CANTIDAD:	1302
ZONA	3
COMUNA	8
BARRIO	Villa Hermosa
FRENTE DE TRABAJO:	13

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO:	07:00 Am
TERMINACIÓN:	02:00 PM
JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleada
TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se Presenta al punto indicado para la realizacion de las Actividades, se comienza con la identificacion de baches los cuales se procede con la Demolicion, limpieza, imprimacion Para luego Aplicacion de Mezcla asfaltica. Durante la Jornada se atienden 2 mitigaciones entre cl 60 y cl 61 esta en la cRA 50, se realiza limpieza y mantenimiento a #2 sumideros colmatados en cl 65 #39-74, con esto se culmina la Jornada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	JPG	Cleyton Perea
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	JPG	
NOMBRE:	Juan David Rodriguez	Juan J. Bonilla S
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado	Angel Mosquera	✓		
3	Liguero	Jaime Grisales	✓		
4	Rastrillero	Luis Miguel Suarez	✓		
5	Rastrillero	Emilio Benitez	✓		
6	Ayudante	Julio Moreno Murillo	✓		
7	Ayudante	Yunier Renteria	✓		
8	Ayudante	Carlos Mosquera	✓		
9	Ayudante	Alexis Perez	✓		
10	Ayudante	Luis Fernando Angel	✓		
11	Ayudante	Arley Agudelo	✓		
12	Ayudante	Eliecer Gimenez			
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Drainler Solano	✓		
17	Operador compresor	Alberto Bedoya	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Juan Carlos Londoño	✓		
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Auxiliar vial	Angelina Moreno	✓		
31	SST	Jhon Jairo Zapata	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Mikasa MBH 601	✓		
2	Compresor	Ingersoll Rand dossan c185 01	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita			
10	Placa vibratoria	Honda Fecon XT200 08	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Doung Feng ST2198	✓		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008678	167594	1A	CL65 CR39 87	3,65	2	0,12	7,30	0,88	2,10
5008678	167594	1B	CL65 CR39 87	3,2	2,65	0,12	8,48	1,02	2,44
4004124	167601	2	CR39A CL65 4	2,25	1	0,12	2,25	0,27	0,65
4004124	167602	3	CR39A CL65 10	1,3	1,7	0,12	2,21	0,27	0,64
4004124	167604	4	CR39A CL65 13	1,8	2,6	0,12	4,68	0,56	1,35
4004124	167606	5	CR39A CL65 25	1,8	3,9	0,12	7,02	0,84	2,02
5008585	167607	M1	CRA5D CL60 84	3,4	3,2	0,05	10,88	0,54	1,31
5008585	167611	M2	CRA5D CL60 11	9,5	0,95	0,07	9,03	0,63	1,52
TOTALES									17,02

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
5385581	IDZ844	17,02		146	25860	IDZ844	Sencilla	9	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14-03-2026

10. ESQUEMAS

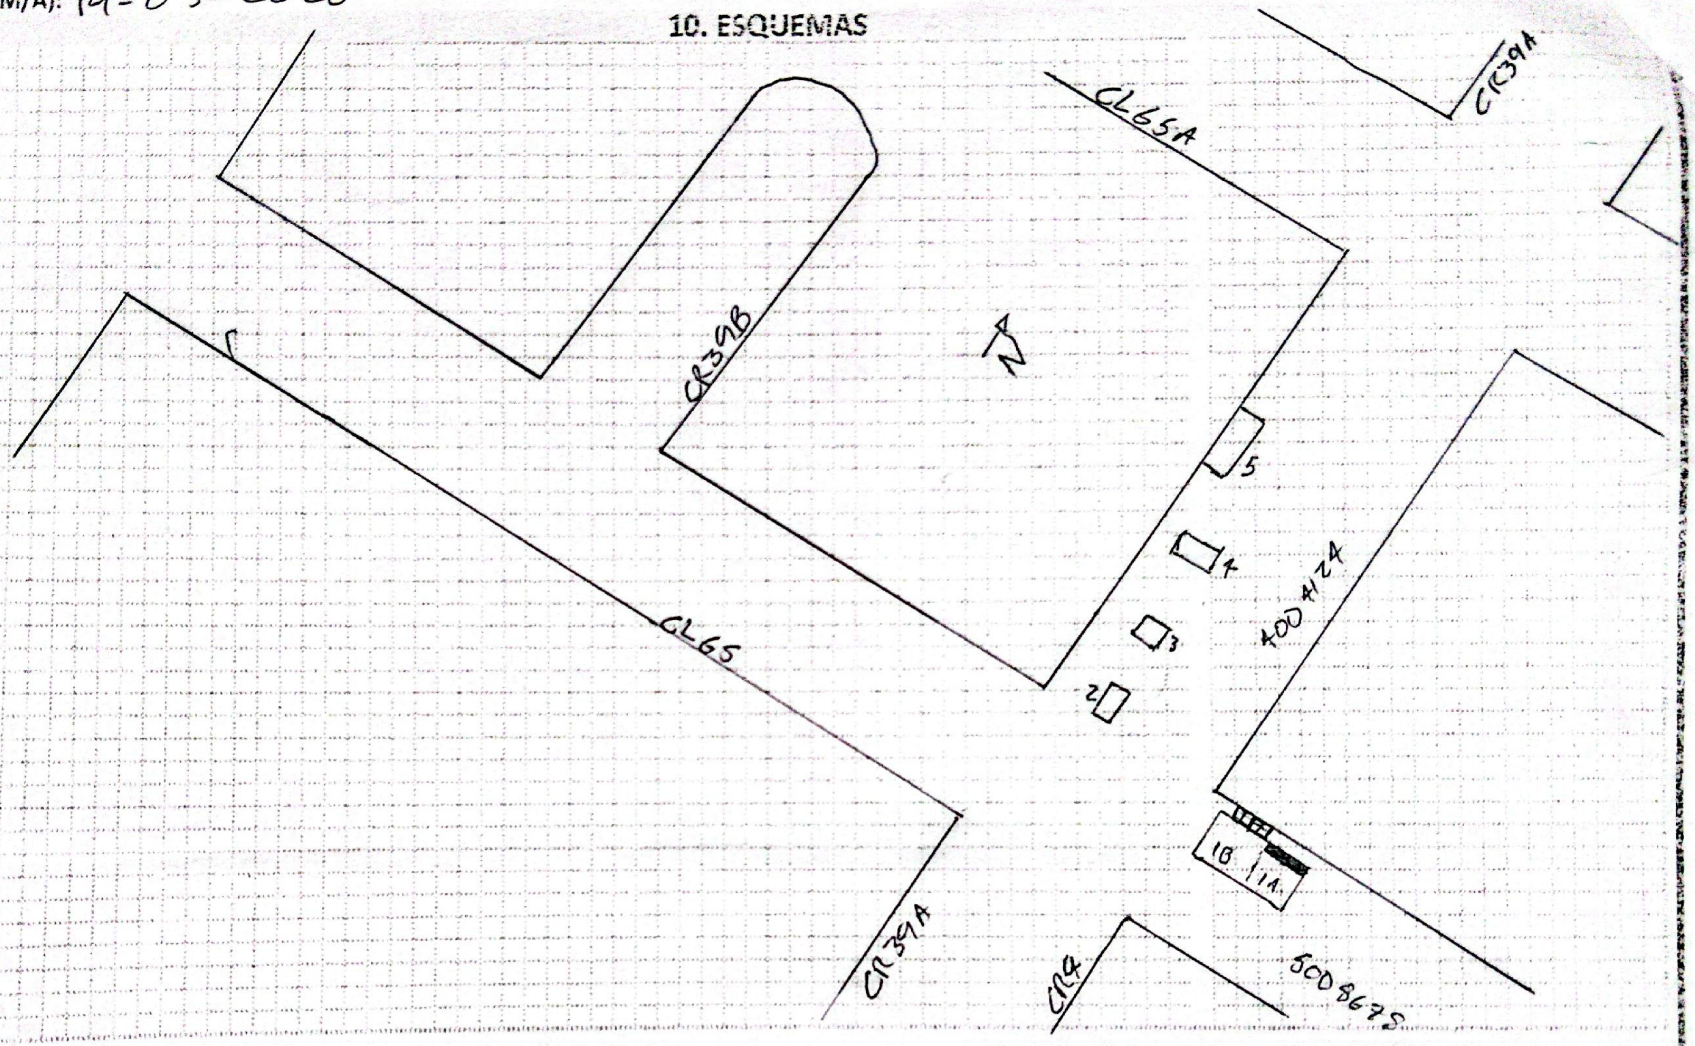

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	13
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,02
BARRIO	villa Hermosa	DIRECCIÓN	CR39A (CL65 - CL65A)

Powered by CamScanner

20260319 08:53
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538581
PLACA: IDZ899
CONDUCTOR: JORGE RESTREPO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED 2026 M2149
PESO TARA: 7.250,00
PESO BRUTO:19.270,00

ENTRADA: 19 mar 2026 - 08:53 a.
SALIDA: 19 mar 2026 - 08:53 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25860

PROVEEDOR: Virtuer 2025 - Frente 21
VALE POR UN VIAJE: Escombros
PLACA No: TDZ899
CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: pavimentar
RECIBIDO POR:

19 marzo 26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuela Cuenca
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
