FECHA (D/M/A): 07-03-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12.01
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 15	
BARRIO: Guayabal	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 07:00 AM
TERMINACIÓN: 02:30 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta Al Punto acordado, se realiza la marcacion de los baches de Acuerdo a la necesidad de la via, se realiza la instalacion de Punt, para continuar con actividades de tamolicion, Limpieza, Aplicacion de Emulcion e instalacion de mezclas. Durante la ejecucion de Actividades se Afectan señalizacion horizontal en CRA 51 #12B sur 81 Donde se Bromoramente lineas internas y Externas de Adurado. Durante la ejecucion de Actividades se realiza instalacion de recebo de segunda capa en bache #6B.

5. VISITANTES

Ingeniero Ambiental

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga	Cleyton Perez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Luis Rodriguez	NOMBRE: Juan J. Bermúdez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Vsuga	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cerquera	✓		
7	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba	✓		
8	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
9	Ayudante	Jerry Perea	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muños	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Gomez	✓		
		Leidyana Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER	-		
2	Compresor	INGERSOLL	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Manuita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SV0470	✓		
16	Volqueta(s)	STH139 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000739	167194	6D	CL12BSUR CR51	1,6	1,45	0,07	2,32	0,16	0,39
4000739	167229	1	CR51 CL12BSUR 83	4,2	4,5	0,2	18,90	3,78	9,07
4000739	167196	2A	CL145 CR51 25	1,3	2,2	0,1	2,86	0,29	0,69
4000739	167196	2B	CL145 CR51 25	2,5	3,1	0,1	7,75	0,78	1,86
TOTALES									12,01

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236725	STH139	12,01		142	24551	STH139	sencilla	4	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02-03-2026

10. ESQUEMAS

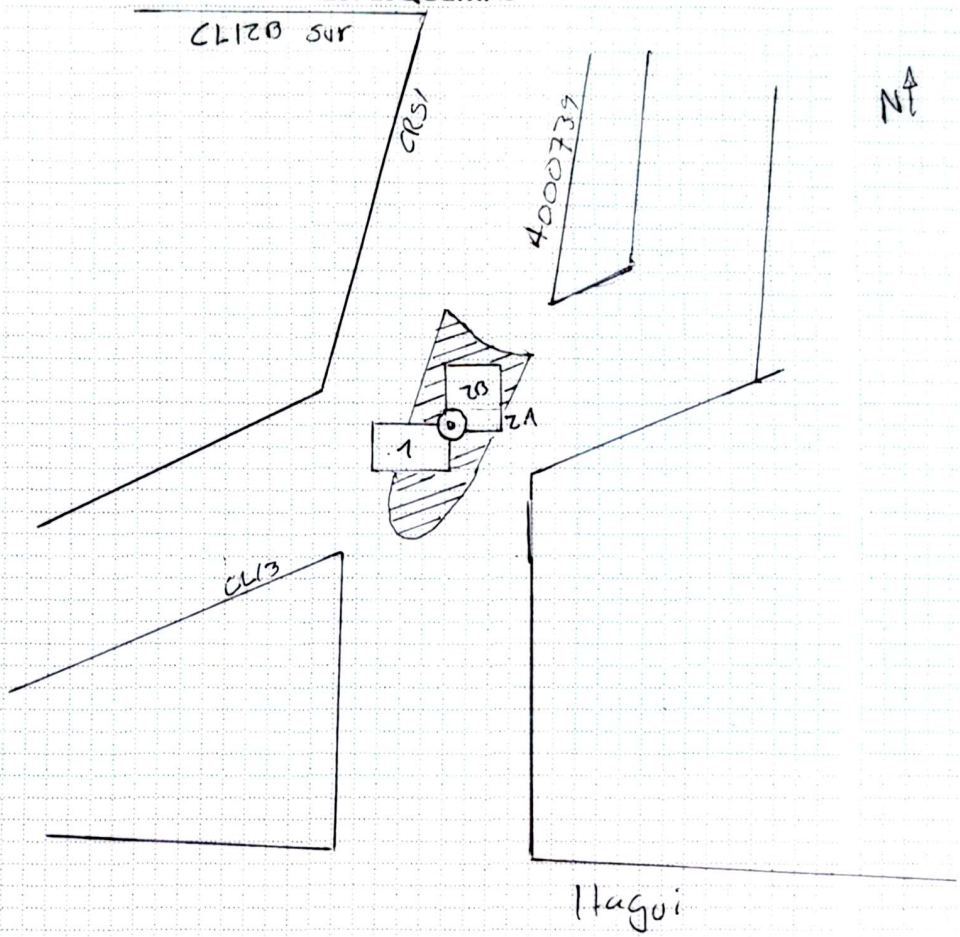

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,01
BARRIO	Aguacatala	DIRECCIÓN	CR51 (CL12B SUR - CL17 SUR)

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26151

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

02/03/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

PROCOPAL S.A.

DESTINO: PROCOPAL

RECIBÍDO POR: 03 MAR 2026

DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Usuga

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

TIQUETE DE BASCULA: 236725

FECHA: 02/03/2026

HORA: 9:18:40 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUMINISTRO: ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 19.80 Tonnes

PESO TARA: 7.81 Tonnes

PESO NETO: 12.0 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.04 Tonnes

Angel Usuga

Powered by CamScanner
