FECHA (D/M/A): 05-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD:
ZONA: 1	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 4 Aranjuez 3) Aranjuez	
BARRIO: Sevilla	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 AM	N/A
TERMINACIÓN: 03.00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleada
TARDE	nublado - lluvias de 1:30PM a 2:30PM

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta a las 7 am para dar inicio a las Actividades en los sitios designados, luego de un recorrido se identifican los baches mas criticos que requieren intervencion inmediata, Se procede con la marcacion y posterior intervencion

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga	Cleiton Perea
Vo. Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez	NOMBRE: Juan J. Bonilla R
Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Ospina	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Gutiérrez Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Cerquera	✓		
7	Ayudante	Victor Alfonso Cordoba	✓		
8	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
9	Ayudante	Jenry Perea	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Gomez	✓		
30	Auxiliar Vial				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SVD 420	✓		
16	Volqueta(s)	STH 139 Sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003180	167310	1	CL68 CRS1D 14	3,1	4,5	0,1795	13,95	2,50	6,01
5003151	167311	2A	CRS1D CL67A 51	9,6	0,8	0,17	7,68	1,31	3,13
5003151	167311	2B	CRS1D CL67A 51	1,2	1,8	0,17	2,16	0,37	0,88
TOTALES									10,32

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236792	STH139	10,02		142


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24554	STH139	Sencilla	1	Provisional

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-03-2026

10. ESQUEMAS

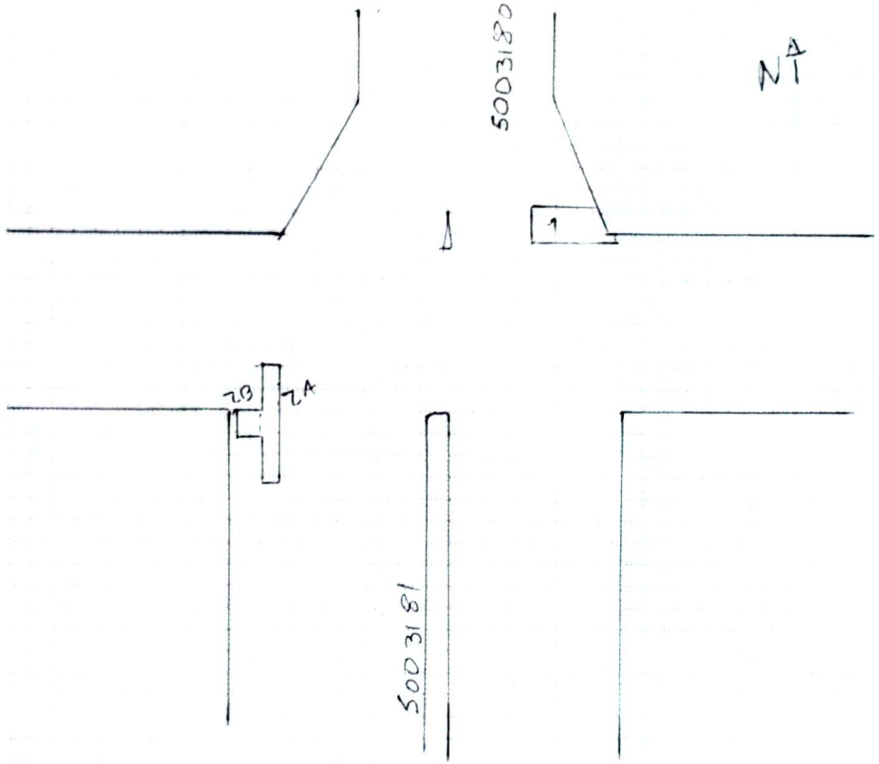

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion puntual	FRENTE	7A
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,0L
BARRIO	Sevilla	DIRECCIÓN	CL6B - CRA1D

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234815

FECHA: 05/03/2026

HORA: 8:53:52 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 17.85 Tonnes

PESO TARA: 7.83 Tonnes

PESO NETO: 10.02 Tonnes

PRODUCTO: Angel Usuga

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MIC1P

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 26.86 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26154

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

05/03/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

PROCOPAL S.A.

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR: 06 MAR 2026

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHOS

Angel Usuga

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
