FECHA (D/M/A): 06-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 1,01
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 15 Guayabal	
BARRIO: Trinidad	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 AM	N/A
TERMINACIÓN: 03:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Durante la ejecucion de las Actividades en el bache #1 se evidencia una fuga de agua de los Servicios Publicos, al terminar la demolicion del bache se evidencia que esta fuga existia antes de la intervencion. El contratista procede a realizar el reporte ante EPM dejando como numero de radicado 6001672, se procede con la aplicacion de mezcla asfaltica al bache debido al acto impacto que representa para los Actores viales un bache abierto en la via por tiempo extenso, se deja un punto de desague para evitar la afectacion de la base por el agua, se realiza la Aplicacion de la mezcla debido a que EPM no cuenta con personal disponible para realizar la intervencion de manera oportuna, siendo la 1:30 pm se realiza limpieza de baño movil.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Uruga	clayton Perea
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Pedro Arroyave	NOMBRE: Juan J. Bermudez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel USUGA	✓		
2	Encargado		✓		
3	Liguero	Sergio Gustavo Perea	✓		E y P
4	Rastrillero	Jhony Londoño	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Eduiter cerquera escudero	✓		
7	Ayudante	Victor Alfonzo cordoba	✓		
8	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
9	Ayudante	Jhony Perea	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Gomez	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER	✓		
2	Compresor	KASSER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	FOTON SV0420	✓		
16	Volqueta(s)	STH139	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5000148	167370	1	CL27A CRS4 62	3,9	4,5	0,17	17,55	2,98	7,16
5000148	167371	2	CL27A CRS4 68	0,8	3,5	0,16	2,8	0,45	1,08
5000148	167372	3	CL27A CRS4 06	2,01	2	0,16	4,02	0,64	1,54
5000148	167374	4	CL27A CRS4 65	4	0,8	0,16	3,20	0,51	1,23
TOTALES									11,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236841	STH139	11,01		142


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
24555	STH139	sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-03-2026

10. ESQUEMAS

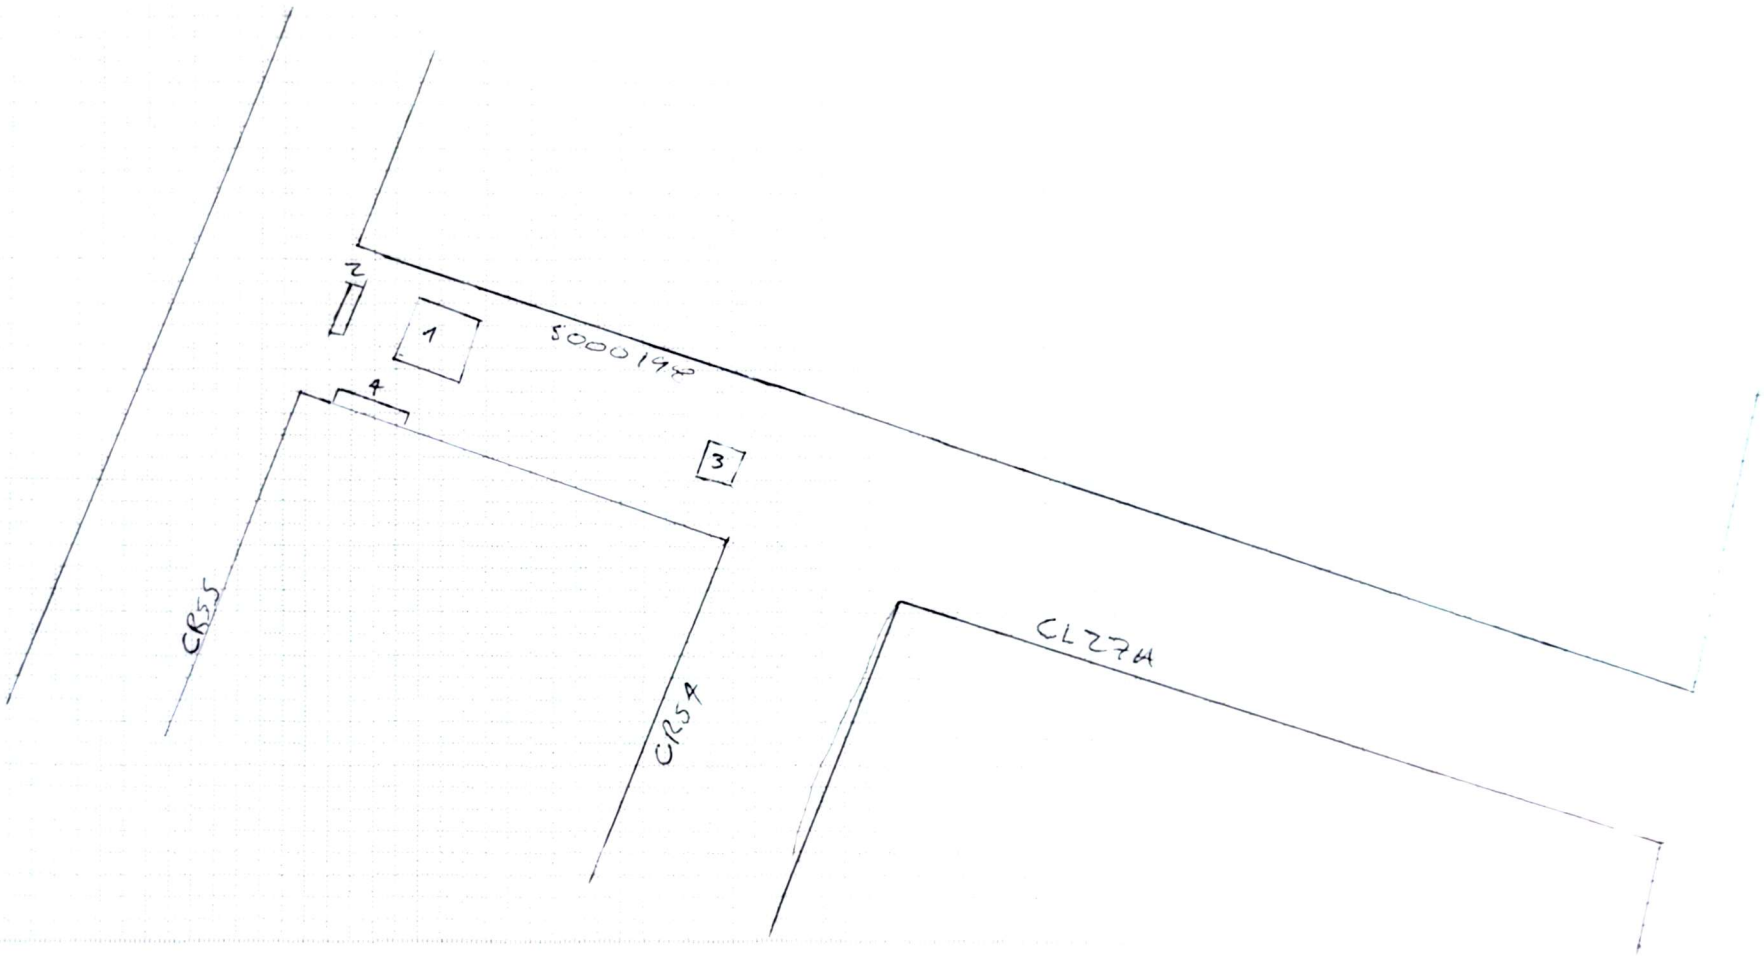

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	7	CANTIDAD:	11,01
BARRIO	Trinidad	DIRECCIÓN	CL 27A (CR54 - CR55)

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26155

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

06/03/2026

PLACA No: STH 739 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Usuga
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Angel Usuga

Powered by CamScanner
