FECHA (D/M/A): 11-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO:	
CANTIDAD:	12,05

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA	5
COMUNA	15
BARRIO	Guayabal
FRENTE DE TRABAJO:	14

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 07:00 AM	N/A
TERMINACIÓN: 02:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA Soleada

TARDE Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta a las 7 am para dar inicio a las actividades del dia, comenzando con la instalacion de su Pmt, posteriormente se realiza identificacion de baches a intervenir, se procede con su demolicion, limpieza, imprimacion y Aplicacion de Mezcla asfaltica, el contratista, realiza Aseo a baño portatil

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Cleyton Perea Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jose Alejandro Castro R. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Ussa			
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Estefano Perez			
4	Rastrillero	Johny Londoño			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Esneider Vergara Escudero			
7	Ayudante	Victor Alfonso Cordoba			
8	Ayudante	Eduardo Jose Mendoza			
9	Ayudante	Jarry Perez			
10	Ayudante	Jeferson Muñoz			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano			
17	Operador compresor	Freddy Muñoz			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez			
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Barrera			
30	Auxiliar Vial	Leidisma Ponce			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ROAD RACER			
2	Compresor	KAESER			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marini			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton GVO 420			
16	Volqueta(s)	STHIGH Sencilla			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000742	167443	1A	CL 12B SUR CRS1 59	2,4	3,94	0,12	9,46	1,13	2,72
4000742	167443	1B	CL 12B SUR CRS1 59	5,4	4,5	0,16	24,30	3,89	9,33
TOTALES									12,05

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236931	STH139	12,05		141	26158	STH139	Sencilla	7	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-03-2026

10. ESQUEMAS

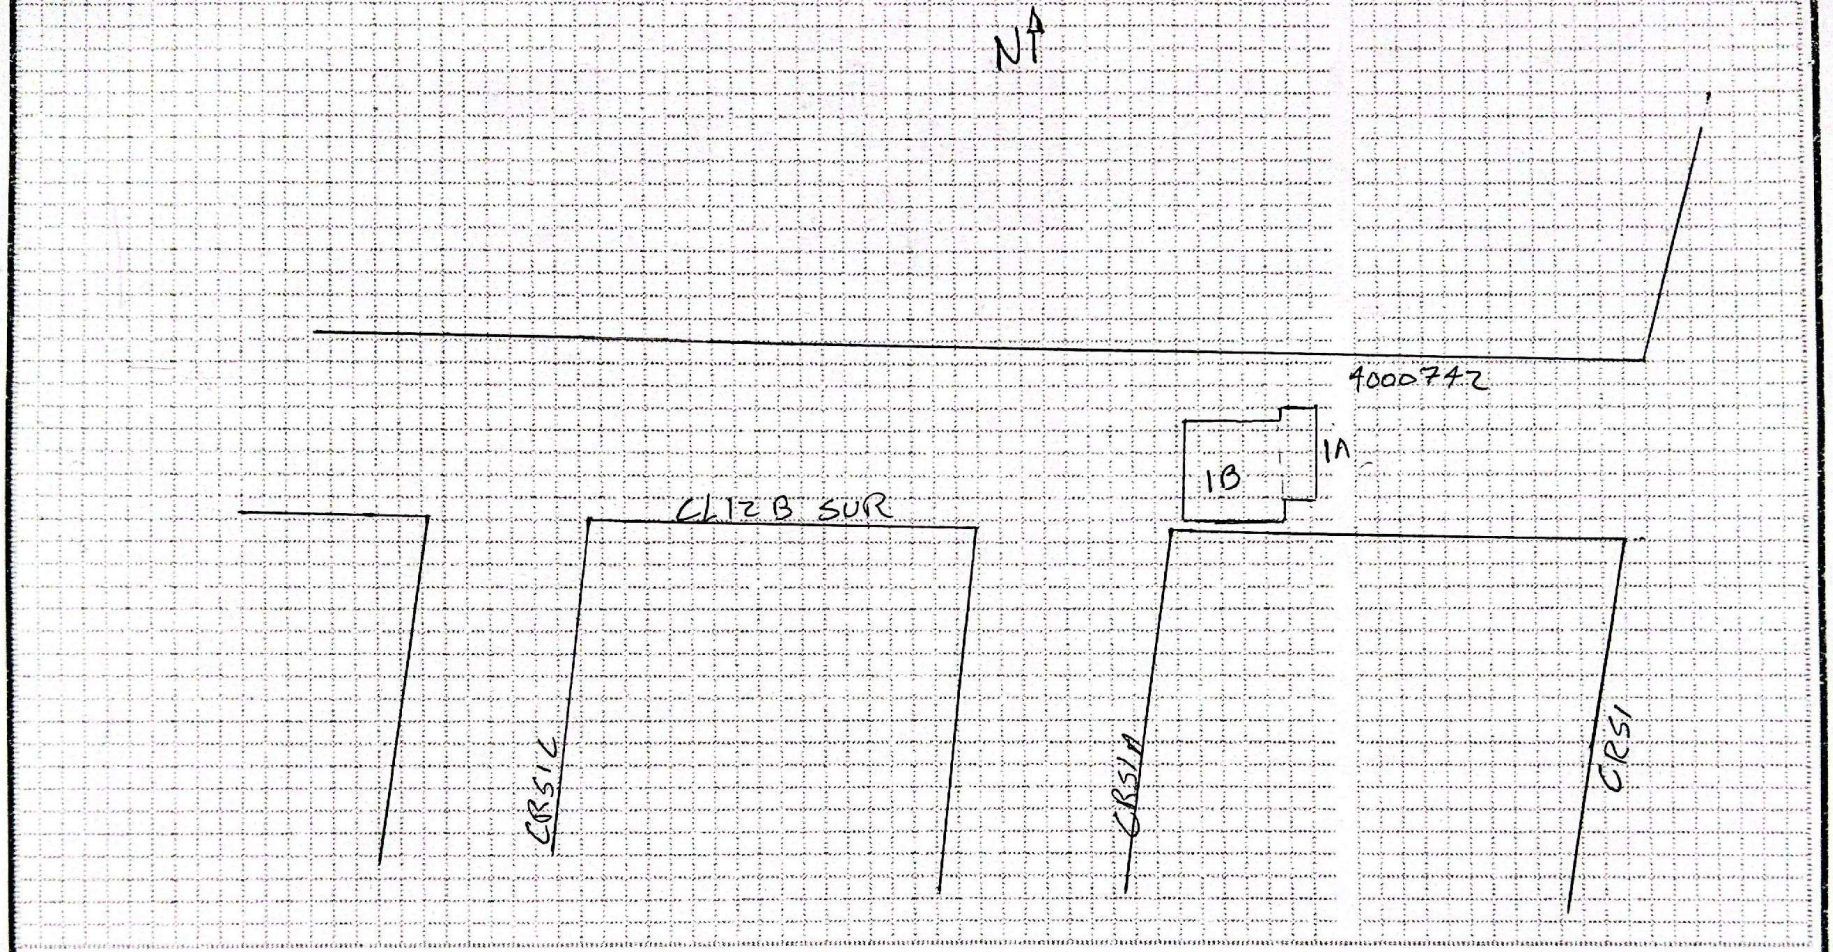

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	4	CANTIDAD:	12,65
BARRIO	Guayabal	DIRECCIÓN	CL12B SUR (CRS1 – CRS1A)

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Jonathan Mesa

TIQUETE DE BASCULA: 236931

FECHA: 11/03/2026

HORA: 9:21:19 AM

CONDUCTOR: ALVARO GOMEZ

PLACA: STH139

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.83 Tonnes

PESO TARA: 7.78 Tonnes

PESO NETO: 12.05 Tonnes

Angel Uruga

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 20.40 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26158

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

11/03/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

PROCOPAL S.A.

RECIBIDO POR:

12 MAR 2026

Angel Uruga.

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHOS - BASCULA

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
