FECHA (D/M/A): 16/08/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutinal		
RANGO:	2	CANTIDAD:	10,01 ton
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	14
COMUNA	15 - Cayagni		
BARRIO	La Colina		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105062 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105422 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublada
TARDE: Nublada

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localizacion del frente de trabajo y zona a intervenir
2. Señalizacion de area de intervencion segun pmt.
3. Marcacion de baches con patologias (piel de cocodrilo, Grietas, huecos, etc)
4. demolicion de carpeta asfaltica con compresor y martillo.
5. Limpieza de baches y retiro de escombros.
6. liga con emulsion asfaltica en frio.
7. Instalacion de mezcla asfaltica MDC-19 + Rap 15%m
8. Compactación de mezcla asfaltica con vibro-compactador Manual
9. Cargue de escombros manual en Volqueta.
10. Retiro de Señalizacion con pmt.
11. Orden y Aseo en frente de Trabajo.

Nota: Se ejecuta Segunda Capa correspondiente al Bache el 12E SUR CR 55B Sitio "167531"

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A.	Jenny Alexander Bristol Gomez
Vo Bo TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo Bo INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA

FECHA (D/M/A): 18/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Yohandriz Acosta			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto carlos Vasquez			
17	Operador compresor	EVER USUGA			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Parson			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador Vial	Estefany Velez			
31	Controlador Vial	Janet Ortiz			
32	Controlador Vial	Marcelly Rincon			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Hyswarna LP - 6500			
2	Compresor	KAESER MSO - 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita E y P			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LKK 838 SABANETA.			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
S018189	167646	1	CR SS CL 12C SUR-98	5,5	1,8	0,143	9,90	1,42	3,4
S018189	167647	2A	CRSS CL 12CSUR - 96	4,6	2,12	0,15	9.75	1,46	3,51
S018189	167647	2B	CRSS CL 12SUR - 96	1,32	1,76	0,15	2,32	0,35	0,84
S0118194	167531	3	CL 12C SUR CR SSB	5,3	1,97	0,09	10,44	0,94	2,26
			⇩						
			SEGUNDA CAPA						
TOTALES							32,42	4,17	10,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
538481	SMU 676	10,01	10,01	149°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26359	SMU 676	SENCILLA	1	PAVIMENTAR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/03/2026

10. ESQUEMAS

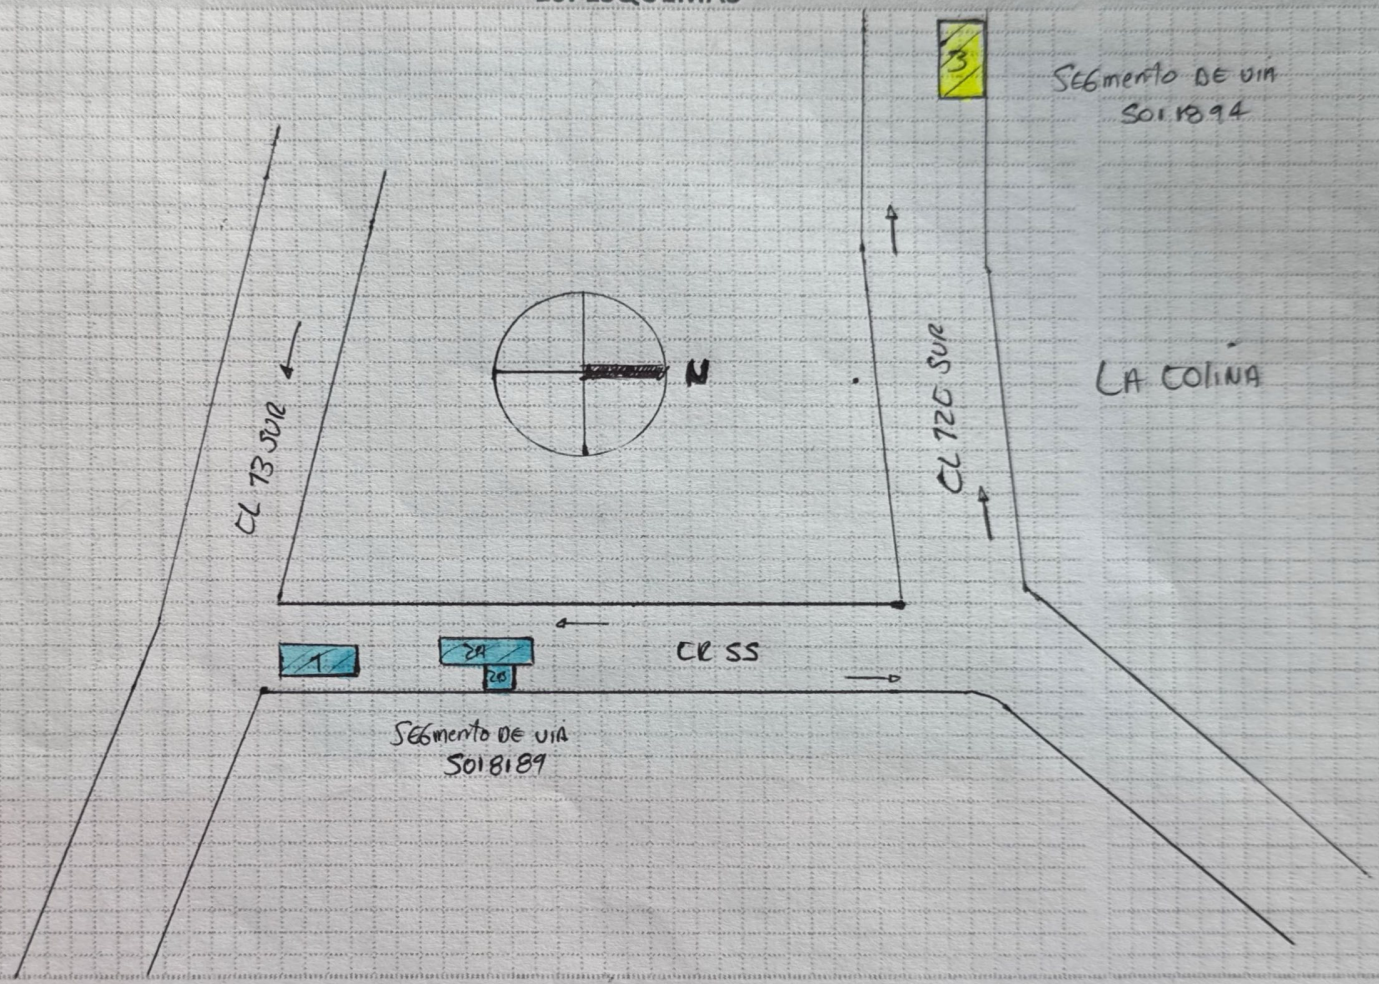

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,01 Ton
BARRIO	LA colina	DIRECCIÓN	CR 5S CL 13 SUR.

Scanned with CamScanner

REMISION DE MATERIALES 20260318 10:53
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538481
PLACA: SMV676 538481
CONDUCTOR: WILSON ALZATE

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,01 Ton
10,01 ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED 2026 #2149
PESO TARA: 7.320,00
PESO BRUTO:17.330,00

ENTRADA: 18 mar 2026 - 10:53 a.
SALIDA: 18 mar 2026 - 10:53 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

18/03/2026

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS No 26359

PROVEEDOR: SUM - 2058 — 18/03/2026
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

18/03/2026

Scanned with CamScanner
