FECHA (D/M/A): 20/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCION (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rutinal

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10,09 ton

ZONA: 6

COMUNA: 15- Guayabal

BARRIO: La Colina

FRENTE DE TRABAJO: 14-

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACION: 4:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localización del frente de trabajo y zona a intervenir
2. Señalización de áreas de intervención SEÑ Pmt.
3. Marcación de sectores con patologías (nivel de pavimento, huecos, fisuras, etc.)
4. Demolición de carpeta asfáltica con compresor y martillo.
5. Limpieza de sectores y retiro de escombros.
6. Liga con emulsión asfáltica en frío.
7. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 + Rap Tack.
8. Compactación de mezcla asfáltica con vibro-compactador Manual
9. Cargue de escombros manual en Volqueta
10. Retiro de señalización con Pmt.
11. Orden y aseo en frente de trabajo.

Nota: Se Realizan 6 intervenciones en la Jornada complementaria.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Johana Alzate A.
Vo Bo RESIDENTE(S) INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:
Vo Bo RESIDENTE(S) INTERVENTORIA

NOMBRE: Jonny Alexander Arcila Cano
Vo Bo RESIDENTE(S) INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: José Luis Cifuentes A.
Vo Bo RESIDENTE(S) INTERVENTORIA

FECHA (D/M/A): 20/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Alvaro Alvarez			
8	Ayudante	Julian marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante	Yohandriz Acosta		X	
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Elver Usuga			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Parón			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador vial	Estefany Velez			
31	Controlador vial.	Janet Ortiz			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husvarna LP - 6500			
2	Compresor	KAESER MSO-108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita EyP			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LFK 838 Subaneta.			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 20/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008775	167651	1	CR 52B CL 8SUR-17	3,04	1,75	0,15	5,32	0,80	1,92
5008876	157630	2	CL 8SUR CR 52B-30	2,68	1,93	0,14	5,17	0,72	1,74
5008876	167652	3	CL 8SUR CR 52-76	3,73	1,64	0.15	6,12	0,92	2,2
5008876	167653	9A	CL 8SUR CR 52-55	0,94	3,86	0.15	3.63	0,54	1,31
5008876	167653	9B	CL 8SUR CR 52-55	1,45	1,9	0.15	2,76	0,41	0,99
5008876	167654	5	CL 8SUR CR 52-48	2,6	2,0	0.155	5,20	0,81	1,93
TOTALES							28,19	4,20	10,09

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
538690	SNZ073	10,09	10,09	147°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26361	SNZ073	Sencilla	1	Alumentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 20/03/2026

10. ESQUEMAS

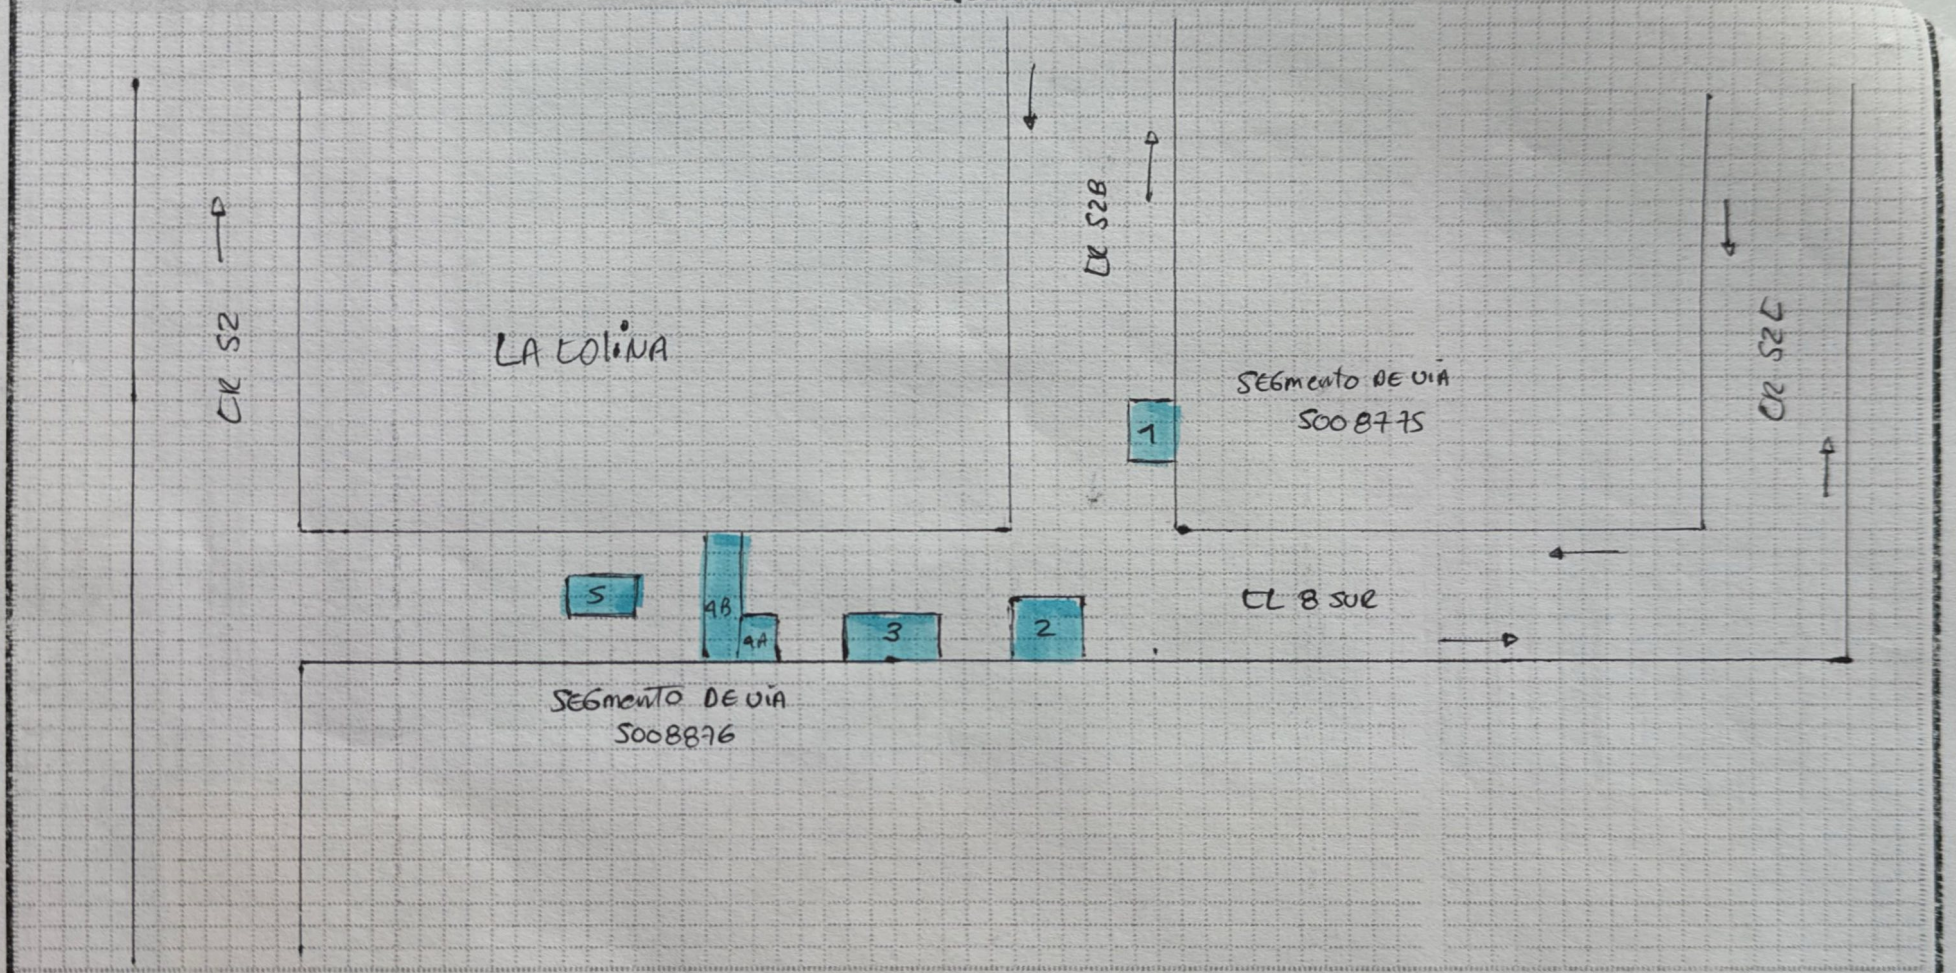

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	14
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,09 ton
BARRIO	La Colina	DIRECCIÓN	CR 52B CL 8 SUR.

Scanned with CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26361**

PROVEEDOR: JUM - 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro

20/03/2026

PLACA No: SNZ 073 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

20/03/2026

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Julian Alzate A.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

REMISION DE MATERIALES ----- 2026/03/20 08:35
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Versión 1
TIQUETE DE BASCULA: 538690
PLACA: SNZ073
CONDUCTOR: ALEXIS MEJIA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica RDF-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,09 Ton 10,09 ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS
OBRA: V0000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMID
2026 M2149

PESO TARA: 6,800.00
PESO BRUTO:16,890.00

ENTRADA: 20 mar 2026 - 08:52 a.
SALIDA: 20 mar 2026 - 08:52 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

20/03/2026

FIRMA DEL CONDUCTOR

Julian Alzate A
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
