FECHA (D/M/A): 24/03/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutinal
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,02 ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 15- Guayabal	
BARRIO: Guayabal	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 am	—
TERMINACIÓN: 5:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Nublado Parcialmente
TARDE	Nublado Horas Intermitentes.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Localización del frente de Trabajo y zona a intervenir
2. Señalización de áreas de intervención Segun Prot.
3. Marcación de BACHES con perfobrisas (Piel de cocodrilo, Grietas, huecos, etc)
4. Demolición de carpeta asfaltica con Compresor y martillo.
5. limpieza de BACHES y Retiro de Escombros.
6. Liga con emulsión asfaltica en Frio.
7. Instalación de mezcla asfaltica MDC-19 + RAP Fibra.
8. Compactación de mezcla asfaltica con Vibro-compactador Manual
9. Cargue de Escombros manual en Volqueta.
10. Retiro de Señalización con Prot.
11. Orden y Aseo en Frente de Trabajo

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate A.	Jenny Alexander Mabulo Gómez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Restrepo	NOMBRE: José Luis Guzmán A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 24/03/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juliana Alzate			
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona			
4	Rastrillero	Sebastian Toro			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Sanchez			
7	Ayudante	Johan Higuita			
8	Ayudante	Julian marin			
9	Ayudante	Cristian Giraldo			
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Roberto Carlos Vasquez			
17	Operador compresor	Ever Usuga			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Carlos Carmona			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Javier Pabón			
29	Conductor Volqueta(s)				
30	Controlador vial	Esfermy Velez			
31	Controlador vial	Janet Ortiz			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP - 6500			
2	Compresor	KAESER M50 - 108			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita EyP			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LHK 038 Sabaneta.			
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 24/03/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5009423	167707	1A	CL 14 SUR CR 51A-06	8,12	1,47	0,14	12.05	1.69	4,05
5009423	167707	1B	CL 14 SUR CR 51A-06	3,77	3,18	0,14	11.99	1.68	9,03
5009425	167708	2	CR 51A CL 14 SUR-4	3,02	3,5	0,116	10.57	1.23	2,93
TOTALES							34.61	4.59	11,02

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
538831	TDZ899	11,02	11,02	147°C	26362	TDZ899	SENCILLA	1	PAVIMENTAR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 24/05/2026

10. ESQUEMAS

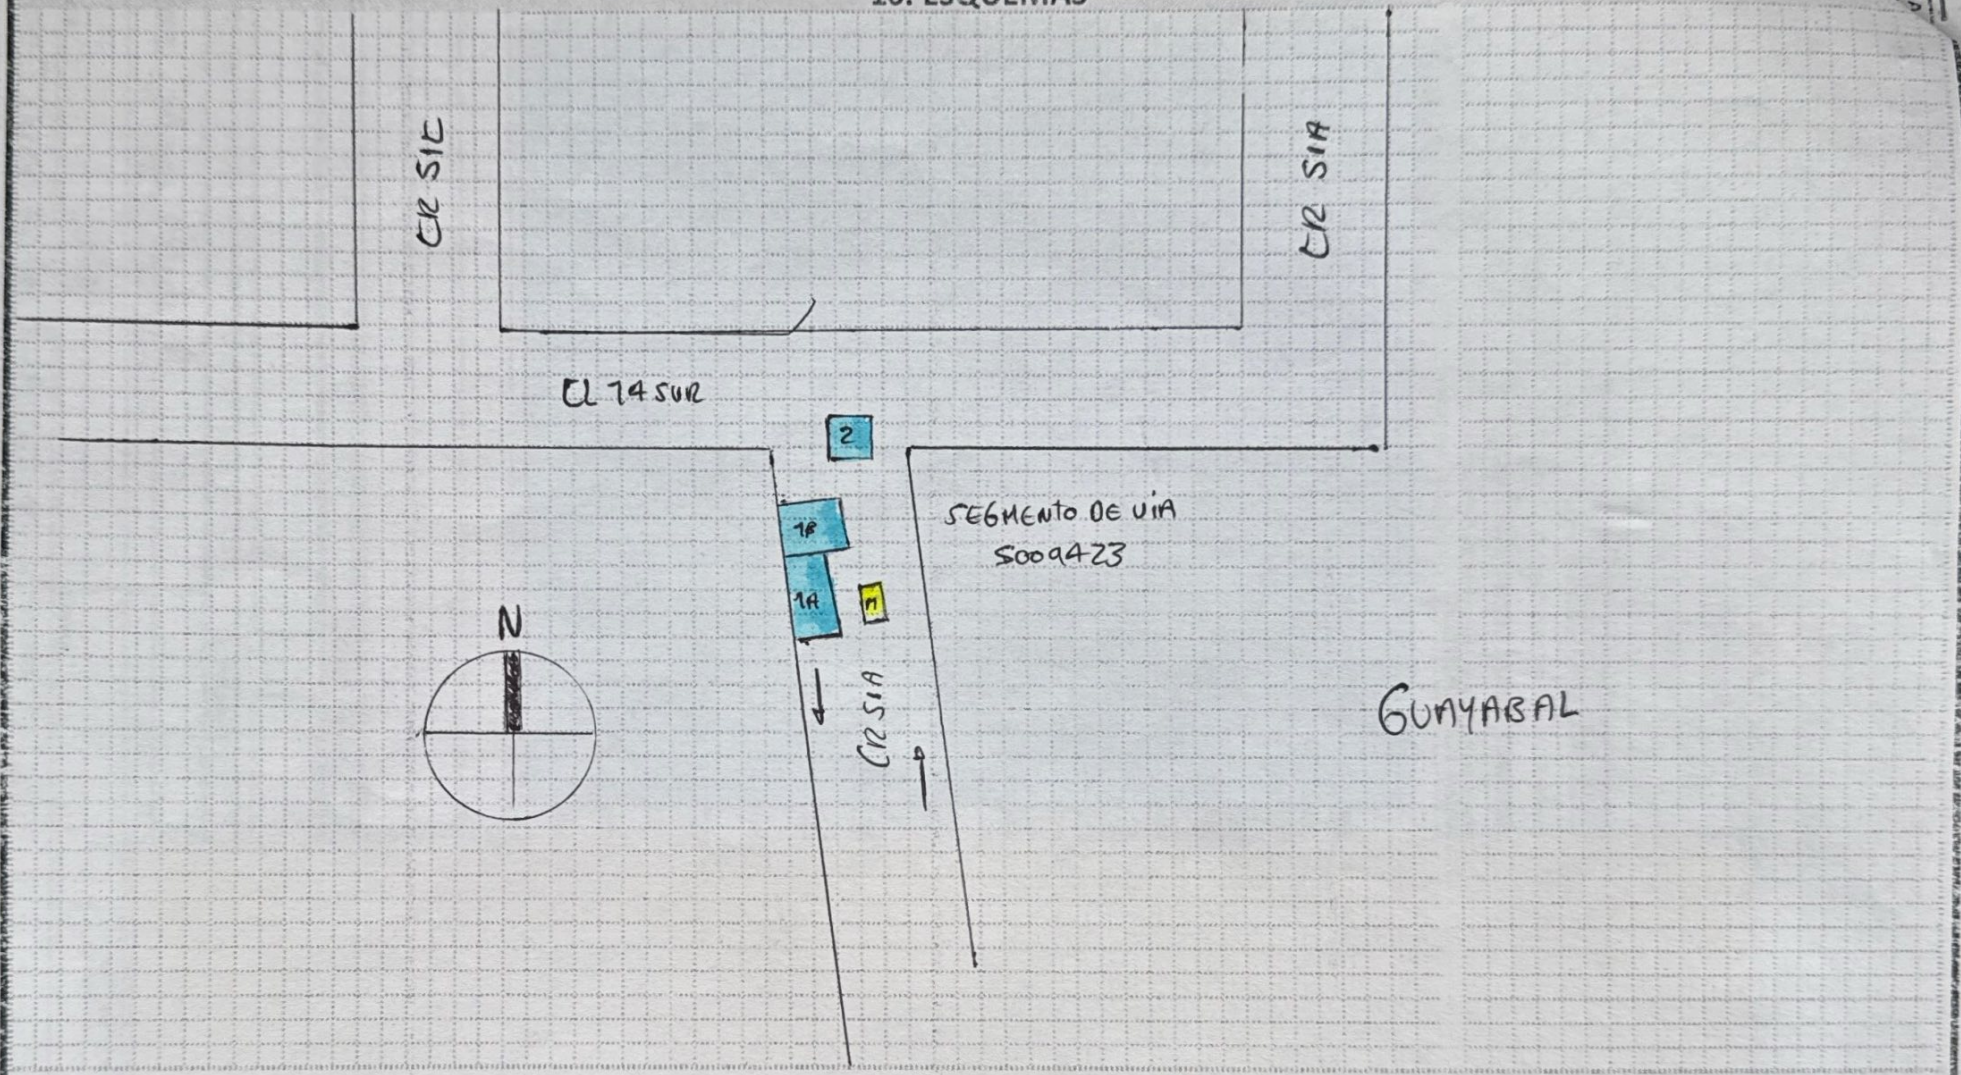

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	74
RANGO:	7	CANTIDAD:	11.02 ton
BARRIO	Guayabal	DIRECCIÓN	CL 14 SUR CR 51C

Scanned with CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26362**

PROVEEDOR: SUM - 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro

24/03/26

PLACA No: TDZ899 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: pavimentar

RECIBIDO POR: [illegible] 24/08/2026

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Juliana Alzate A
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

COMISION DE MATERIALES --20260324 09:47
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 538831 538631
PLACA: TDZ899
CONDUCTOR: JORGE RESTREPO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,02 Ton 11,02 ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.250,00
PESO BRUTO:18.270,00

ENTRADA: 24 mar 2026 -a09:47 a.
SALIDA: 24 mar 2026 - a09:47 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

24/03/2026

FIRMA DEL CONDUCTOR

Juliana Alzate A

FIRMA DEL CLIENTE

CHADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner
