EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88.283.109-8
INFORME GENERAL DE OBRA No. 07
PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA NO. **LP-DTCA-OBR-001-2023**
"REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"



CONTRATANTE: FONAM – SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.

INTERVENTORÍA: INGESARA LTDA.

SUPERVISOR: JEFE ÁREA PROTEGIDA VANBUREN WARD BOLÍVAR
PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

FONAM – SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, mediante aviso de convocatoria pública del día 5 de mayo de 2023, y publicación del pliego de condiciones para Licitación Pública **LP-DTCA-OBR-001-2023** que tiene por objeto: **"REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,"** El Municipio de Providencia y Santa Catalina, departamento de SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, da inicio a convocatoria en la página de contratación pública SECOP, la cual fue adjudicada mediante Resolución Auto No. 178 del 27 junio de 2023, al ingeniero EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS, que, en su calidad de adjudicatario, ejecutará el Contrato de Obra Pública **LP-DTCA-OBR-001-2023**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MC. BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**. La Orden de Iniciación del Contrato de Obra No. LP-DTCA-OBR-001-2023, se dio a partir del primero día del mes de agosto del 2023 y se estipuló un plazo inicial de seis (06) meses, mediante prorroga No. 01, se adiciona un (1) mes y quince (15) días, luego mediante prorroga No. 02, se adicionan cuarenta y seis (46) días a partir del 14 de febrero de 2024, quedando como nueva fecha de terminación el día 30 de marzo de 2024.

De igual forma, FONAM – SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, otorga la supervisión del contrato de obra No. **LP-DTCA-OBR-001- 2023**, a jefe área protegida VANBUREN WARD BOLÍVAR – PNN Old Providence McBean Lagoon.

El presente INFORME EJECUTIVO No.07, reporta las actividades ejecutadas en el periodo del 01 de febrero al 29 de febrero del año 2024.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon fue declarado en el año de 1995, es una de las Áreas Naturales Protegidas que actualmente conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNN. El Parque Nacional, se encuentra ubicado en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente en la porción nororiental de la isla de Providencia, entre Maracaibo Hill y Smith Bay. Es un Área Protegida de carácter Nacional, administrada por Parque Nacionales Naturales de Colombia y cuenta con una extensión aproximada de 1.615 Hectáreas, de las cuales 90 ha corresponden al área terrestre y 1.525 ha al área marina.

Esta área protegida forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower declarada por la UNESCO en el 2000 y se encuentra articulada al Área Marina Protegida Seaflower (Hoy Distrito de Manejo Integrado), declarada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2005.

Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC. Tiene como prioridad la recuperación del **PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, cuyo objetivo es la recuperación de la sede administrativa. Se toma la decisión de adecuarla, bajo parámetros técnicos que incluyan reforzamiento anti - huracanes y adecuaciones arquitectónicas para la reconstrucción y diseño de la edificación como Sede Administrativa, implicando mitigar riesgos futuros por eventos naturales similares.

La adecuación y reconstrucción de la sede es vista como una parte primordial para la ejecución de las funciones de la entidad y personas que laboran en esta.


La sede de Parques Naturales nacionales está proyectada en dos plantas, donde el primer piso se adecua una parte como refugio, con muros en mampostería en concreto con sus respectivos refuerzos y la segunda planta se construirá con una placa de entrepiso en metaldeck, sobre la cual se levantarán los muros en construcción tradicional en madera con un recubrimiento exterior en tríplex marino y vinyl siding PVC. El recubrimiento interior es fibrocemento, estructura en madera las demás zonas irán en cerámica.

La cubierta en laminas termoacústica con estructura en madera, aleros en UPVC o Ajover premium Trapezoidal con estructura en madera. Cielorrasos en PVC, La carpintería metálica de puertas, ventanas, barandas balcones, rampas y escaleras exteriores son en aluminio.


CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PRIMER PISO

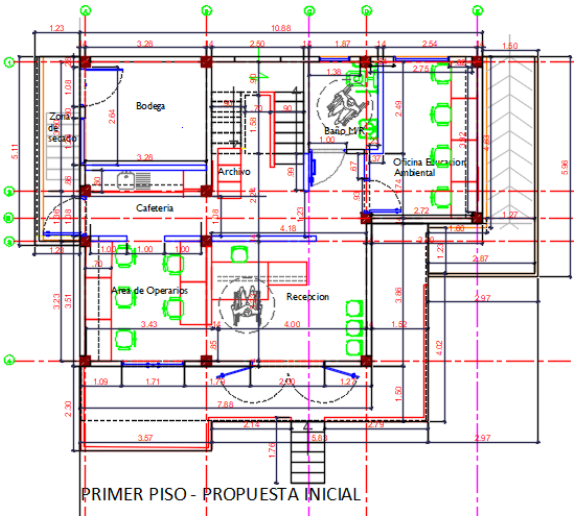

PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL SEGUNDO PISO

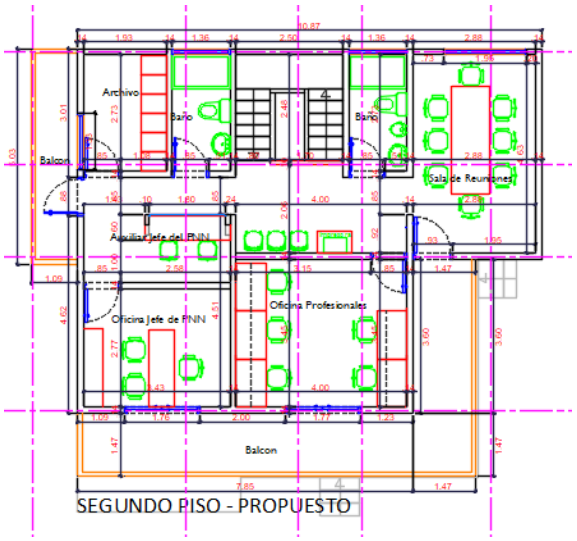

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

ALCANCE

Mejorar las condiciones para el desempeño labores y protección contra fenómenos atmosféricos (huracanes) del personal y bienes de PNN y comunidad en la zona ROCKY POINT mediante la adecuación de la sede.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Suministro e instalación de teja termoacústica tipo sándwich, incluye accesorios de instalación.
- Instalación de tablero de breakers bifásico de 36 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta, Red Normal, incluye instalación de tablero, barrajes, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE).
- Instalación de tablero de breakers bifásico de 8 circuitos, Red Regulada, incluye instalación de tablero, barrajes, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE).
- Suministro e instalación de breakers para tablero red normal de 1 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).
- Suministro e instalación de breakers para tablero red regulada de 1 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).
- Suministro e instalación de breakers para tablero red normal (AA) de 2 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).
- Suministro e instalación de punto completo para tomacorriente a 220V, red Aire Acondicionado, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 10 THHN / THWN, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE).
- Barandas balcones, rampa y escalera de exterior de aluminio, incluye todos los accesorios de instalación.
- Instalación de puertas y ventanas en aluminio.
- Resane y pintura interior.
- Resane y pintura exterior incluye elementos estructurales.
- Instalación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad a 2000 litros o similar, incluye conexiones y accesorio.
- Suministro e instalación de cubierta UPVC 2.5 mm o Ajover Premium Trapezoidal A360 para instalación en aleros, incluye accesorios de instalación.
- Suministro e instalación de punto singular (cumbrera, limatesa, limahoya, borde perimetral, encuentro frontal de faldón con paramento vertical, encuentro lateral de faldón

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

con paramento vertical, etc.) de teja termoacústica tipo sándwich, incluye accesorios de instalación y sellante.

- Localización y replanteo parqueadero.
- Excavación manual parqueadero.
- Descapote y limpieza parqueadero.
- Estuco para muros interiores y exteriores, incluye muros en fibrocemento.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

En la zona ROCKY POINT en la isla de Providencia, se encuentra ubicada la sede PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON a intervenir, ubicada de frente al mar. Por consiguiente, soportó el embate del huracán IOTA que dejó semi destruido el inmueble.

OBJETIVO GENERAL


- Ejecutar y construir todas las obras detalladas en la oferta económica, que conforman la adecuación de la sede de PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON, en el plazo contractual establecido y con la calidad exigida en las especificaciones técnicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reforzamiento de muros refugio primer piso.
- Construcción de muros de segundo piso en madera, con recubrimiento exterior en tríplex marino e interior con recubrimiento en fibrocemento.
- Cubierta en lamina termoacústica con estructura en madera.
- Realizar los informes requeridos para llevar a cabo el reporte de avance del contrato de obra.
- Presentar registros fotográficos de cada una de las actividades comprendidas dentro del contrato de obra.
- Cumplir con cada una de las obligaciones requeridas dentro del contrato de obra.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

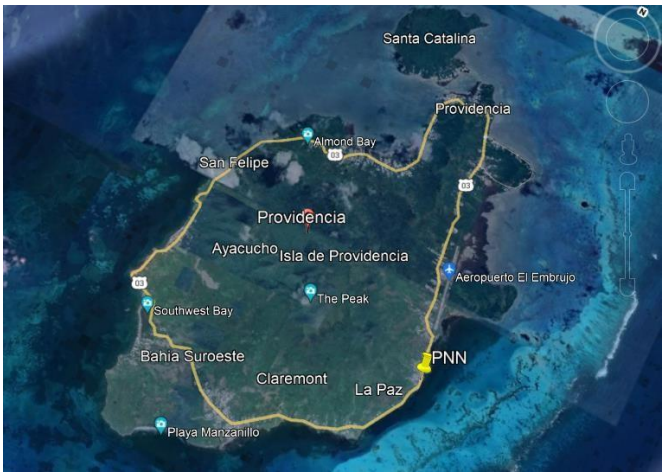

LOCALIZACIÓN GENERAL DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO

La isla de Providencia conocida también como Old Providence es un Parque Nacional Natural ubicada en el mar Caribe. Sus construcciones son tradicionales y turísticas. La sede de PNN en ROCKY POINT se encuentra ubicada a una latitud de 13°20’ 42.03’’Norte y una longitud de 81°21’20.29’’ Oeste del meridiano de Greenwich, en la isla en el km. 12 y 13 de la vía circunvalar de frente al litoral, Providencia cuenta con una extensión territorial de 17 km2.

El Aeropuerto El Embrujo es el principal puerto de ingreso a la isla. Algunos accidentes naturales de la isla son:

- **Bahías:** Catalina, Aguamansa, Manzanillo, Suroeste y Aguadulce.
- **Puntas:** San Juan, Rocosa, El Faro y Caimán.
- **Cayos:** Suroeste (Southwest Cay), Tres Hermanos (Three Brothers Cay), Casabaja (Bottom House Cay) y Cangrejo (Crab Cay). Temperatura 26° y una población 4926 habitantes en promedio.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-DTCA-OBR-001-2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA LP-DTCA-OBR-001- 2023
CDP No.	12423 - 12323 FONAM
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
CONTRATANTE	FONAM – SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
CONTRATISTA	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
INTERVENTORÍA	INGESARA LTDA. R/L: JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.551.007.547).
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.01	UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA No.02	46 DÍAS A PARTIR DEL 14 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	TREINTA (30) DE MARZO DE 2024

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

1.2. DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS

ENTIDAD ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	
ASEGURADO	FONAM - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N°.	56-44-101005817
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	BARRANCABERMEJA, 03 DE ENERO DE 2024
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO N°	56-40-101002632
CIUDAD Y FECHA DE LA PÓLIZA	BARRANCABERMEJA, 03 DE ENERO DE 2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2023	15/09/2024	$155,100,754.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2023	18/03/2027	$155,100,754.70
CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2023	15/09/2024	$155,100,754.70
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/08/2023	16/03/2024	$232,000,000.00

Las pólizas, se encuentran vigentes según el Contrato **LP-DTCA-OBR-001-2023,** Acta de inicio del 1 de agosto de 2023, Acta de Prorroga No.01 y Acta de Prorroga No. 02.

2. PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA

2.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se relaciona el personal que el Contratista utilizó para realizar la ejecución de actividades programadas y obra en general:

PERSONAL OBRA	CANTIDAD
Director de obra.	1
Residente administrativo y técnico de obra.	1
Profesional sst	1

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

PERSONAL OBRA	CANTIDAD
Ingeniero hidráulico	1
Ingeniero eléctrico.	1
Ingeniero estructural	1
Ingeniero ambiental	1
Maestro	2
Oficiales	2
Ayudantes de construcción	3
Personal de estructura de madera	5
Personal instalaciones eléctricas	3

2.2. EQUIPO DE OBRA

A continuación, se relaciona el equipo – maquinaria a utilizar por el Contratista para ejecutar las obras:

EQUIPO OBRA CIVIL	CANTIDAD
Turbo de plataforma 3 m3	1
Mixer	1
Rotomartillo	3
Pulidora	3
Sierra circular	2
Cepilladora	1
Taladros	5

2.3. EQUIPO OBRA CIVIL

A continuación, se relaciona el equipo de obra civil, utilizado para adelantar el control técnico,

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

administrativo y financiero de la obra en el presente proyecto:

EQUIPO OBRA CIVIL	CANTIDAD
Moto transporte de personal	1
Oficina	1
Computador	2
Impresora	1
Cámara digital	1
Cinta métrica	1

3. AVANCE DE OBRA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El avance de la obra en el periodo de corte del presente informe es del periodo (DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024), se tiene así:

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**
4.1	Suministro e instalación de teja termoacústica tipo sándwich Metecno Glamet Techmet A42-P1000-G4 o similar de espesor S igual a 40 mm calibre 26, incluye accesorios de instalación, color a convenir con el AP	m2	138,00	138,00
9.1	Suministro e instalación de tablero de breakers bifásico de 36 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta, Red Normal, incluye instalación de tablero, barrajes, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	un	1,00	0,04

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

9.2	Suministro e instalación de tablero de breakers bifásico de 8 circuitos, Red Regulada, incluye instalación de tablero, barrajes, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	un	1,00	0,06
9.15	Suministro e instalación de breakers para tablero red normal de 1 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).	un	14,00	6,00
9.16	Suministro e instalación de breakers para tablero red regulada de 1 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).	un	4,00	2,00
9.19	Suministro e instalación de breakers para tablero red normal (AA) de 2 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).	un	8,00	4,00
9.20	Suministro e instalación de punto completo para tomacorriente a 220V, red Aire Acondicionado, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 10 THHN / THWN, tubería EMT, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	un	8,00	1,00
15.1	Barandas balcones, rampa y escalera de exterior de aluminio, incluye todos los accesorios de instalación	m	58,42	54,87
17.1	Puertas y ventanas en aluminio	gl	1,00	0,40
18.1	Resane y pintura 3 manos	m2	333,30	241,65
18.2	Resane y pintura exterior incluye elementos estructurales	m2	88,70	60,96
22.1	Suministro e instalación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad a 2000 litros o similar, incluye conexiones y accesorio	un	1,00	0,28
25.1	Cubierta UPVC 2.5 mm o Ajover Premium	m2	26,17	26,17

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

	Trapezoidal A360 para instalación en aleros, incluye accesorios de instalación			
26.2	Suministro e instalación de punto singular (cumbrera, limatesa, limahoya, borde perimetral, encuentro frontal de faldón con paramento vertical, encuentro lateral de faldón con paramento vertical, etc.) de teja termoacústica tipo sándwich Metecno Glamet Techmet A42-P1000-G4 o similar en lámina galvanizada en caliente Gr 60 (60µm, 425 g/m²), espesor 1.2 mm, color a convenir con el AP, incluye accesorios de instalación n y sellante. Usar recubrimiento base Barrera Epóxica Gris Serie 23 Sika o similar con espesor 6 mils en película seca. Por último, usar Esmalte Uretano Serie 36 Sika o similar con espesor 3 mils en película seca.	m	28,04	18,04
28.1	Localización y replanteo parqueadero	m2	42,00	42,00
28.2	Excavación manual	m3	12,60	12,60
28.3	Descapote y limpieza	m2	42,00	42,00
32.3	Estuco para muros, incluye muros en fibrocemento	m2	432,80	189,05

3.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico para cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista durante este período. (Ver Anexo).

3.2. CLIMATOLOGÍA

Durante el período se presentaron lluvias y fuertes vientos debido al fenómeno del ciclón que se está formando en el mar caribe, en la zona de ejecución del proyecto, la cual impidieron la ejecución de algunas de las actividades programadas. (Ver Anexo).

4. INFORME ADMINISTRATIVO

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

4.1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS OBRA

DIRECCIÓN OFICINA CENTRAL:	Calle 11, No. 16-109, Edificio Mónaco, Oficina 107-SAN AGUSTÍN
DIRECCIÓN OFICINA EN PROVIDENCIA:	ROCKY POINT
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL:	ingever1@hotmail.com
TELÉFONOS:	315-383-7201 y 320-560-4176

4.2. ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES

En el desarrollo del Contrato de Obra Pública **LP-DTCA-OBR-001-2023**: **"ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."**, se realizaron visitas de supervisión los días 07 de febrero, donde se evidenció el avance, se aclararon dudas, se solicitó información sobre los detalles constructivos de las escaleras, se realiza verificación de medidas del tanque séptico, se propone la implementación de un filtro para el mismo; el día 16 de febrero, en la visita por parte de la supervisión, se verifica avance, se realiza por parte del contratista algunas obras complementarias necesarias, se solicita nuevamente información sobre el detalle constructivo de las escaleras, no se realizaron reuniones virtuales en el presente periodo.
.

4.3. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS

A la fecha no se han necesitado licencias y/o autorizaciones, así mismo comunicamos que la responsabilidad es directamente de Parques Nacionales Naturales.

5. INFORME FINANCIERO

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

El presente contrato de obra no contemplaba la entrega de un pago a manera de Anticipo al Contratista.

5.2. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de corte del período reportado en el presente informe, se han realizado pagos parciales al Contratista de Obra.

5.3. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

ACTA No.	% EJECUCIÓN	EGRESO No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
1	30,00 %			29/09/2023	$ 465.302.263,92	NO	$ 465.302.263,92
2	17,28 %			06-12-2023	$ 268.014.104,02	NO	$ 268.014.104,02
3	18,19%				$ 282.128.272,69	NO	$ 282.128.272,69
TOTALES							**$ 1.015.444.640,64**

6. PROBLEMÁTICAS

En el presente reporte, se realiza un breve resumen de las circunstancias presentadas en obra. Durante el periodo del mes de enero de la presente anualidad, se han presentado lluvias constantes en la isla de providencia y mar caribe, así mismo se ha generado alerta naranja en la isla debido a los fuertes vientos y alto oleaje presentados por dicho fenómeno, lo que ha generado en el periodo la suspensión de actividades programadas por intervalos de tiempo.
Como es de conocimiento, los materiales a utilizar en el proyecto se suministran desde ciudades como Barranquilla y Cartagena hasta isla de providencia, la cual dicho fenómeno ha dificultado el transporte y arribo de dichos materiales, ocasionando demoras en las entregas de los barcos y/o suspensión de salida de dichos barcos entre otras situaciones marítimas, generando atrasos considerables en la entrega de dicho material.
Igualmente la mano de obra no calificada proveniente de la isla de providencia y la isla de san Andrés, cuentan con un horario de trabajo establecido, lo cual ha contribuido en el bajo rendimiento de las actividades programadas, por lo anterior se inició actividades el día 15 de enero del presente año.

Desde el pasado mes de diciembre, se han presentado una nueva alerta del fenómeno del niño, lo que ha dificultado o ha generado inconvenientes en cuanto al suministro y transporte material a la zona.
Por los inconvenientes ya manifestados anteriormente, luego de solicitarle a la interventoría el estudio, decidió aprobar la adición de tiempo de 46 días más calendario a partir del día 14 de febrero al 30 de marzo de la presente anualidad, para de esta manera cumplir eficientemente con el objeto contractual, y que nuestra firma finalice a satisfacción con la obra pública que fue encomendada.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

7. CONCLUSIONES

De acuerdo a las condiciones del contrato, las actividades se ejecutaron con responsabilidad teniendo en cuenta que cada actividad se realiza con las condiciones técnicas requeridas.
A la fecha del presente informe, se ejecutaron en su totalidad las actividades descritas en el capítulo **ACTIVIDADES EJECUTADAS** con un avance de obra en el mes de febrero del **11,06%,** correspondiente a una inversión de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 171.543.843,63). El porcentaje acumulado a la fecha es de **76,53 %,** donde ha transcurrido un tiempo de 212 días, durante este periodo se genera el acta de parcial No.4 donde se cobra según los estipulado en anexo técnico, un avance acumulado del **70,00%,** lo que contemplaría una ejecución del 4,53% correspondiente en inversión de SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 70.260.641,85)
En la etapa de construcción el frente de trabajo, en el transcurso del periodo se realizó la ejecución de actividades como las contempladas en el ítem de actividades ejecutadas, además del suministro de los materiales e insumos necesarios para cumplir con los requerimientos.
Debido a las difíciles condiciones climáticas, donde se presentaron fuertes vientos y alto oleaje, los cuales dificultaron el avance de obra, tanto en la ejecución como en el transporte de materiales desde el puerto de Cartagena.
Se continuo con el bajo rendimiento en las actividades programadas, debido a los rendimientos presentados por los trabajadores de la zona.
A la fecha, y durante el periodo informado, no se presentaron accidentes en obra.

Cordialmente,



EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
Ing. Contratista.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO










CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com


CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com









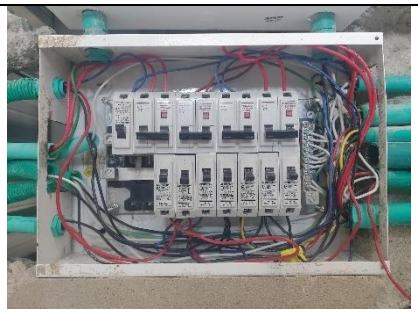


CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

ANEXOS

ANEXO 1. GARANTÍAS DEL CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101005817	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2024	01	08	2023	00:00	28	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO	CC: 88.283.109

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 11 NRO 16-109	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	3153837201

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
NACION - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES	NIT: 901.037.393-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 29 NTE NRO. 6 N - 43	CALI, VALLE	6676041

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NLP-DTCA-OBR-001-2023 REFERENTE A Realizar la adecuacin de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon, en la Isla de Providencia y Santa Catalina

ASEGURADO Y BENEFICIARIO FONAM - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2023	15/09/2024	$155,100,754.70	$155,100,754.70
CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2023	15/09/2024	$155,100,754.70	$155,100,754.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2023	18/03/2027	$155,100,754.70	$155,100,754.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$310,201,509.40	$310,201,509.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE EXPIDE ANEXO SEGUN MODIFICACION No 001 DONDE LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO 1 MES Y 13 DIAS, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 13/02/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****146,602.00	$ ******8,000.00	$ ******29,374.00	$ **********183,976.00	$ ******775,503,773.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	194875	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101005817

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF194875A 1

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101005817	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2024	01	08	2023	00:00	28	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO		**CC: 88.283.109**
DIRECCIÓN: CALLE 11 NRO 16-109	**CIUDAD:** OCA¥A, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3153837201

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES		**NIT: 901.037.393-8**
DIRECCIÓN: CL 29 NTE NRO. 6 N - 43	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	6676041

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101005817

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194875A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-40-101002632	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2024	01	08	2023	00:00	16	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO	CC: 88.283.109	CALLE 11 NRO 16-109	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	3153837201

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NACION - PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERITORIAL CARIBE	NIT: 901.037.393-8	CALLE 17 NO. 4 - 06	SANTA MARTA, MAGDALENA	4230752

BENEFICIARIO: 901037393 - NACION - PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERITORIAL CARIBE ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
N LP-DICA-OBR-001-2023 REFERENTE A Realizar la adecuaciOn de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon, en la Isla de Providencia y Santa Catalina

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2023	16/03/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

SE EXPIDE ANEXO SEGUN MODIFICACION No 001 DONDE LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO 1 MES Y 13 DIAS, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 13/02/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******71,506.00	$ *******3,000.00	$ ******14,156.00	$ **********88,663.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	194875	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

56-40-101002632
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF194875A 1

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-40-101002632	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2024	01	08	2023	00:00	16	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	RAMIREZ ARIAS, EVER LEONARDO		CC: 88.283.109
DIRECCIÓN: CALLE 11 NRO 16-109	**CIUDAD:** OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3153837201

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION - PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERITORIAL CARIBE		NIT: 901.037.393-8
DIRECCIÓN: CALLE 17 NO. 4 - 06	**CIUDAD:** SANTA MARTA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	4230752

BENEFICIARIO: 901037393 - NACION - PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERITORIAL CARIBE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-40-101002632

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194875A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

ANEXO 2.
CONTROL DIARIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 de febrero de 2024 **Y EL:** 29 de febrero de 2024

CONTRATISTA: EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **CONTRATO DE OBRA No.** LP-DTCA-OBR-001-2023

INTERVENTORÍA: INGESARA LTDA

														D	DOMINGO			F	FESTIVO					X	LABORAL				
Clase de tiempo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**Total**
Seco		6		8						15		16	20	22	22	22	23	17	12	20	18	18	19	16	19	19	17	18	18	365
Húmedo	20	16	22	16	24	22	21	20	22	9	24	8	4	1	1	2	1	5	6	4	4	4	3	5	3	2	3	4	4	280
Lluvias moderadas	4	2	2			1	1	4	1					1	1			2	4		2	2	2	3	2	3	4	2	2	45
Lluvias intensas						1	2		1																					4
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS Y VIENTOS FUERTES, LAS CUALES DIFICULTAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Firma:
Nombre: **EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS**
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORÍA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

ANEXO 3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL EN OBRA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 de febrero de 2024 **Y EL:** 29 de febrero de 2024

CONTRATISTA: EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **CONTRATO DE OBRA No.** LP-DTCA-OBR-001-2023

INTERVENTORÍA: INGESARA LTDA

														D	DOMINGO				F	FESTIVO					1	LABORAL			
Personal	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Director de Obra	X	1	1	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	1	1	X	X	X	X	D	X	X	X	X
Residente administrativo y técnico	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
Profesional sst	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
Ingeniero hidráulico	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
Ingeniero eléctrico	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
Ingeniero estructural	X	X	X	D	1	1	1	X	X	X	D	X	X	X	X	1	1	D	1	X	X	1	1	1	D	1	1	1	1
Ingeniero ambiental	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
Técnico Construcción	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
TOTAL	6	7	7	0	7	7	7	6	6	6	0	6	6	6	6	7	7	0	8	7	6	7	7	7	0	7	7	7	7

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS**
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORÍA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

ANEXO 4.
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA EN OBRA

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 de febrero de 2024 **Y EL:** 29 de febrero de 2024

CONTRATISTA: EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **CONTRATO DE OBRA No.** LP-DTCA-OBR-001-2023

INTERVENTORÍA: INGESARA LTDA

				D	DOMINGO									F	FESTIVO									LABORAL			
Personal	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Turbo de plataforma 3 m3	X	X	1	D	X	X	X	X	X	1	D	X	X	X	X	X	1	D	X	X	X	X	X	1	D	X	X	1	X
Mixer	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X
Rotomartillo	3	3	3	D	3	3	3	3	3	3	D	3	3	3	3	3	3	D	3	3	3	3	3	3	D	3	3	3	3
Pulidora	3	3	3	D	3	3	3	3	3	3	D	3	3	3	3	3	3	D	3	3	3	3	3	3	D	3	3	3	3
Sierra circular	2	2	2	D	2	2	2	2	2	2	D	2	2	2	2	2	2	D	2	2	2	2	2	2	D	2	2	2	2
Cepilladora	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
Taladros	5	5	5	D	5	5	5	5	5	5	D	5	5	5	5	5	5	D	5	5	5	5	5	5	D	5	5	5	5
Herramienta menor	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1	1	1	D	1	1	1	1
TOTAL	15	15	16	0	15	15	15	15	15	16	0	15	15	15	15	15	16	0	15	15	15	15	15	16	0	15	15	16	15

OBSERVACIONES:

Firma: _____
Nombre: **EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS**
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORÍA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

ANEXO 5.
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA LP-DTCA-OBR-001- 2023
CDP No.	12423 - 12323 FONAM
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
CONTRATANTE	FONAM – SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
CONTRATISTA	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
INTERVENTORÍA	INGESARA LTDA. R/L: JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.551.007.547).
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.01	UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA No.02	46 DÍAS A PARTIR DEL 14 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	TREINTA (30) DE MARZO DE 2024

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

2. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

Se presenta el informe mensual de avance de la Gestión Ambiental de Obra, adelantada de acuerdo con los programas desarrollados en el Plan de Manejo Ambiental – PMA en la ejecución del contrato de obra No. **LP-DTCA-OBR-001- 2023**, cuyo objeto es**: "ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**, el cual no requiere de licencia ambiental para su ejecución. El informe elaborado se basa en el PMA y en cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, en el cual se reporta la verificación y seguimiento a las medidas ambientales y siso de prevención, mitigación y control implementadas por el CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto en el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024.

Proteger el medio ambiente para que no se vea afectado por las construcción es una de las obligaciones del componente ambiental, es por esta razón que se desarrollan acciones pertinentes para mitigar los impactos ambientales causados por el desarrollo de la obra, como también la implementación de las estrategias plasmadas en el presente documento, de manera que se brinde una mayor calidad de vida a las comunidades y permitan controlar los efectos negativos que se puedan producir en el medio ambiente, y también dando cumplimiento con la legislación ambiental.

El presente componente está orientado a identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control de los factores de riesgo a los que se expone el personal que laboran con el contratista EVER LEONARDO RAMÍREZ, manteniendo el control permanente de los mismos en los diferentes oficios, contribuyendo al bienestar físico, mental y social del trabajador y el funcionamiento de los recursos e instalaciones.

3. CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SISO AL PERSONAL DE OBRA

3.1. INDUCCIÓN AL PERSONAL

Se realiza la orientación, supervisión y ubicación los trabajadores en el ingreso a la obra, y se informa acerca de que labores debe realizar mediante acciones de información, educación y se realizan mediante medidas de prevención y seguridad de acuerdo con los riesgos identificados.

3.2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Con el propósito de desarrollar habilidades y capacidades en todo el personal, se realizan capacitaciones y charlas de acuerdo con la necesidad de la población trabajadora y teniendo en cuenta la identificación de los peligros, estas capacitaciones se realizan con el fin de obtener un perfil más competitivo y seguro con la promoción y prevención de la salud a través del autocuidado y la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Igualmente se

logra mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental y la responsabilidad del personal al reportar a tiempo factores de riesgo presentes en los diferentes frentes de trabajo. A continuación, se relaciona las capacitaciones y charlas durante periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero del 2024.

Tabla 1. *Relación de charlas al personal en obra*

CONTROL DE CAPACITACIONES Y CHARLAS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 de febrero de 2024 **Y EL:** 29 de febrero de 2024

CONTRATISTA: EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **CONTRATO DE OBRA No.** LP-DTCA-OBR-001-2023

INTERVENTORÍA: INGESARA LTDA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TEMA	OBJETIVO	TIEMPO (minutos)	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	ENCARGADO
REUTILIZACIÓN DE MATERIAL	CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECOMENDACIONES PARA ENTENDER CUANDO LOS MATERIALES SON REUTILIZABLES	15	CONTROL DE ASISTENCIA	8/02/2024	Gustavo Cristo
CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ENTENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN EN EL AIRE.	20	CONTROL DE ASISTENCIA	20/02/2024	Gustavo Cristo

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS**
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORÍA

4. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Con el fin de prevenir y mitigar los impactos potenciales por el manejo inapropiado de los materiales de construcción se realizó entrega al personal de los elementos de protección auditivos, en cuanto a la maquinaria que genera ruido.

5. DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS

En la obra hasta el momento se han generado escombros esta clase de residuos serán dispuestos en predios privados, con el protocolo indicado y con la autorización del propietario de este.

6. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES.

6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de identificar, analizar y controlar las condiciones subestándares que puedan causar daño al personal, se realizaran inspecciones de seguridad informales, que permita identificar la condición real de las diferentes áreas de trabajo, detectando así posibles peligros por causas técnicas o humanas. Y mediante este resultado evaluar la forma como se viene trabajando y finalmente organizar capacitación y entrenamiento que nos permita una mejora continua.

6.2. INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA

La limpieza y el aseo en el trabajo son factores importantes para la salud, la seguridad, la productividad y la protección del medio ambiente; de esta manera nos ayuda a optimizar el tiempo y a reducir costos de operación.

Cuando un lugar de trabajo está sucio o desordenado con acumulación de material, o materiales fuera de lugar ocurren accidentes laborales, para esto se realizan actividades rutinarias que garanticen el orden y la organización.

El orden y la limpieza en él es fundamental, para esto se realizan inspecciones de orden y limpieza en los diferentes frentes de trabajo, que nos ayudan a identificar posibles riesgos a tiempo, evitando accidentes como caídas, choques entre otras, garantizando un buen estado, libre de obstáculos, eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, acondicionando los medios para aguardar y localizar el material fácilmente.

Promoviendo comportamientos seguros y como resultado se logra satisfactoriamente:

- ✓ Conservación del medio ambiente
- ✓ Productividad
- ✓ Reducción de costo
- ✓ Ambiente laboral y seguro
- ✓ Conservación de la salud

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

6.3. ATENCIÓN A PQRS Y DERECHOS DE PETICIÓN


Dentro del proceso que se ha iniciado y durante el avance de la obra, se pretende realizar encuestas verbales que permitan conocer la opinión de la comunidad con respecto al proceso constructivo, de igual forma se pretende recibir las PQRS de la comunidad de manera verbal directamente en la obra y tratar de priorizar en las necesidades o afectaciones que la comunidad manifieste y las PQRS que no puedan ser solucionadas al instante serán llevadas por escrito hasta la oficina que se encuentra en el casco urbano del municipio para que el contratista en compañía de su grupo de trabajo expongan la mejor solución para la comunidad sin afectar el avance de la obra.

7. JUSTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El tratamiento de aguas residuales es un proceso que convierte estos contaminantes en una sustancia que puede ser reintegrada al ciclo del agua con problemas ambientales mínimos o reutilizada para otros propósitos según cada necesidad. Existen plantas de tratamiento de aguas que se encargan específicamente del tratamiento de efluentes industriales, así como del tratamiento de efluentes urbanos. Estos tratamientos consisten en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que eliminan los componentes dañinos. El tratamiento de aguas residuales es importante para conservar el ciclo del agua y el medio ambiente, pues permite un mayor acceso al agua potable, evita problemas de salud por la exposición a los componentes de las aguas residuales, reduce costos de energía, además de reducir los niveles de contaminación.

7.1. ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El sistema de tratamiento de aguas residuales presente en la sede administrativa del Parque Nacional Natural en la isla de Providencia y Santa Catalina, está compuesto por un tanque en concreto existente de tres recamaras de filtración, al que se le realiza un mejoramiento a la capacidad de tratamiento y de filtración con la adición del sistema séptico y tanque anaeróbico con una capacidad de 2000 litros y su sistema de infiltración.

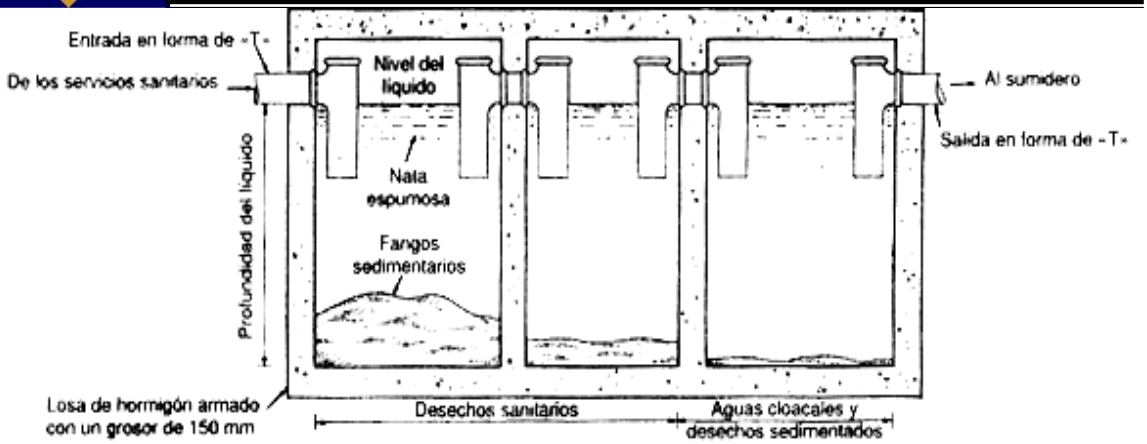

7.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

7.2.1. Excavación manual.

Luego de localizado el sitio donde se instalaría el sistema de tratamiento de aguas residuales, se procede a realizar la excavación manual, encontrando en el terreno material rocoso, gravas y arenas.



7.2.2. Ubicación del sistema séptico y tanque anaeróbico.

Se realiza la ubicación del tanque séptico con capacidad de 2000 litros dentro de la excavación para verificar las medidas, pendientes, puntos de acceso y zona de infiltración.



7.2.3. Piso en concreto y paredes en mampostería.

Luego de replantear las medidas necesarias, niveles y de demarcar la zona de infiltración, se realiza la adecuación de un piso en concreto y del izado de muros en mampostería, que servirá para la protección del tanque ante las fuerzas ejercidas por el terreno.





7.2.4. Zona de infiltración.

La zona de infiltración es aquella que permite el retorno de las aguas, luego del proceso de filtración dentro del sistema de tratamiento de aguas residuales, hacia el terreno natural. Se procede a realizar la excavación de esta zona, el llenado con material de grava, la ubicación de la tubería perforada, recubrimiento en grava y posterior llenado de la zanja de infiltración.







7.2.5. Sistema de tratamiento de aguas residuales.

Por último, se realiza la instalación del sistema séptico y tanque anaeróbico al tanque séptico existente, el cual aumentará su capacidad de tratamiento y de filtración de las aguas residuales generadas dentro de la sede administrativa y que serán infiltradas mediante la zanja de infiltración al terreno natural adyacente.

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA



Gustavo Castro

GUSTAVO ADOLFO CASTRO
M.P. 20260-4194

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

ANEXO 6. INFORME DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

La especialidad en seguridad y salud en el trabajo tiene como prioridad velar por el bienestar de los trabajadores y personas vinculadas de manera directa (personal directo, contratista y subcontratista, entre otros) esto con el fin de proteger al personal de los riesgos a los cuales están expuestos en la obra, algunos de estos riesgos están relacionados a lesiones, cortadas, golpes, caídas, laceraciones, pinchazos, incidentes, accidentes y enfermedades, esto debido a las diferentes actividades a realizar en la jornada laboral.

También los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representa un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo, por lo tanto es necesario adoptar medidas de protección, prevención y autocuidado de la integridad de la población, cumpliendo con las normas legales que promueven y mejoran las buenas prácticas en las diferentes áreas de trabajo generando consciencia en el personal y el uso responsable de los elementos de protección personal.

En el presente informe se relacionan las actividades que se han venido desarrollando como parte del SG-SST durante el periodo de tiempo del 1 al 29 de febrero del 2024.

1. OBJETIVOS

- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y los resultados de la aplicación del Plan de Salud ocupacional y ambiental.

- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

- Verificar el cumplimiento de la reglamentación actual vigente.

2. GENERALIDADES

Para la empresa viene ejecutado el contrato de obra cuyo objeto es **"LA ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON, EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**".
Para el desarrollo de la obra se ha elaborado un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades que van enfocadas a la prevención de accidentes laborales, estas actividades se van desarrollando a lo largo del transcurso de la obra y de acuerdo con el cronograma de actividades que se va a ejecutar.
El plan seguridad, salud en el trabajo nos permite que se reduzcan los accidentes laborales y nos ayudan a optimizar acciones en el trascurso de la ejecución de la obra, esté plan está orientado en salvaguardar la vida de los trabajadores, a evitar contaminaciones en el ambiente y evitar pérdidas al Consorcio.

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN OBRA

Las actividades programadas en obra van de acuerdo con la programación y amarrada al presupuesto general.

4. EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Durante el periodo del 1 al 29 de febrero se hizo uso de las siguientes herramientas de trabajo.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA UTILIZADA		
Turbo de plataforma 3 m3	1	SI
Mixer	1	SI
Rotomartillo	3	SI
Pulidora	3	SI
Sierra circular	2	SI
Cepilladora	1	SI
Taladros	5	SI
Herramienta menor	1	SI

5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estas actividades se realizaron de acuerdo con el plan tratando de cumplir con los estándares y normas de seguridad en el trabajo.

a. Se restringe el ingreso al personal que no cuente con los implementos de seguridad EPP.
b. Se realiza la limpieza diaria dentro de la obra para evitar la contaminación y la disposición de material en sitios inadecuados.
c. Capacitación del personal en Obra

5.1. Plan de inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Los cursos de inducción tienen una duración de 1 hora; en el mes se realizó un curso de inducción al personal de la empresa, a cada trabajador se le realizo su inducción sobre los lineamientos básicos para el desempeño en la obra.

- Uso adecuado de los equipos de protección
- Señalización de los trabajos en Obra
- Difusión de Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional

d. Actividades de Seguridad en el Trabajo

- Se realizaron capacitaciones al personal acerca protección de los ojos, los riesgos del ruido, prevención de accidentes laborales entre otros.
- Manejo de residuos sólidos, y disposición adecuada de los mismos.
- Adecuadas posturas al momento de realizar esfuerzo y levantar peso.

Lista de charlas de capacitaciones dadas a los trabajadores

CONTROL DE CAPACITACIONES Y CHARLAS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 1 de febrero de 2024 **Y EL:** 29 de febrero de 2024

CONTRATISTA: EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **CONTRATO DE OBRA No.** LP-DTCA-OBR-001-2023

INTERVENTORÍA: INGESARA LTDA

SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TEMA	TIEMPO (minutos)	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	ENCARGADO
RIESGOS DEL RUIDO	20	CONTROL DE ASISTENCIA	9/02/2024	
SEGURIDAD DURANTE LOS TRBAJOS ELÉCTRICOS	10	CONTROL DE ASISTENCIA	14/02/2024	
PROTECCIÓN DE LOS OJOS	15	CONTROL DE ASISTENCIA	9/02/2024	

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS**
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORÍA

e. Actividades de Salud en el Trabajo

- Afiliación de los trabajadores a Salud, Pensión y ARL.
- Inspecciones de seguridad en el control de la maquinaria, equipos y herramientas, equipos de protección personal de acuerdo con los estándares establecidos.
- Se realiza entrega de materiales de protección EPP cada 15 días o cuando el trabajador requiera la renovación de los implementos.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	
NUMERO DE ATENCIONES MEDICAS COMUNES REPORTADAS Y DIAS PERDIDOS	0
INCIDENTES	0
ACCIDENTES	0

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	FORMULA	RESULTADOS	INTERPRETACIÓN
Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo periodo	N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES	0/5*100 = 0	Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan 0 accidentes en el período.
Índice de Frecuencia de Ausentismo.	Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud.	N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA DEL PERIODO X K / HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL PERIODO	0*25333 / = 0	La empresa presentó 0 eventos que generaron ausencia en el personal por causas de salud en el periodo, por cada 100 trabajadores.
Índice de Severidad del Ausentismo	Es la relación entre los días de incapacidad por enfermedad común y el total de HHT	N° DÍAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD DURANTE EL PERIODO * K / HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL PERIODO	0*25333 / = 0	la empresa perdió 0 días por eventos que generaron ausencia en el personal por causas de salud en el periodo, por cada 100 trabajadores
VALORES DE CONSTANTE K: K=240.000 AÑO K=20.000 MES K=25.333 PERIODO DE 38 DÍAS				

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

ANEXO 7.
BITÁCORA

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

acople e instalación. Tiempo nublado y lluvioso. Lluvias leves.

L.


31-1-24 Miercoles.
Se hacen las intalaciónes del tanque septico y la conexion al pozo existente, teniendo en cuenta los niveles de entrada y salida del pozo existente. Se continua el arreglo de pañete en cajas 4x4 para alistar para estuco. Un oficial más un ayudante en el tanque Septico y dos personas en la electricidad. Tiempo Nublado y lluvioso.

C.

1-2-24 Jueves.
Retiro de piedra resultado de excavacion para tanque septico.
Se hacen las intalación de la tuberia de agua potable baño segundo piso.
se inicia el estuco en el primer piso.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

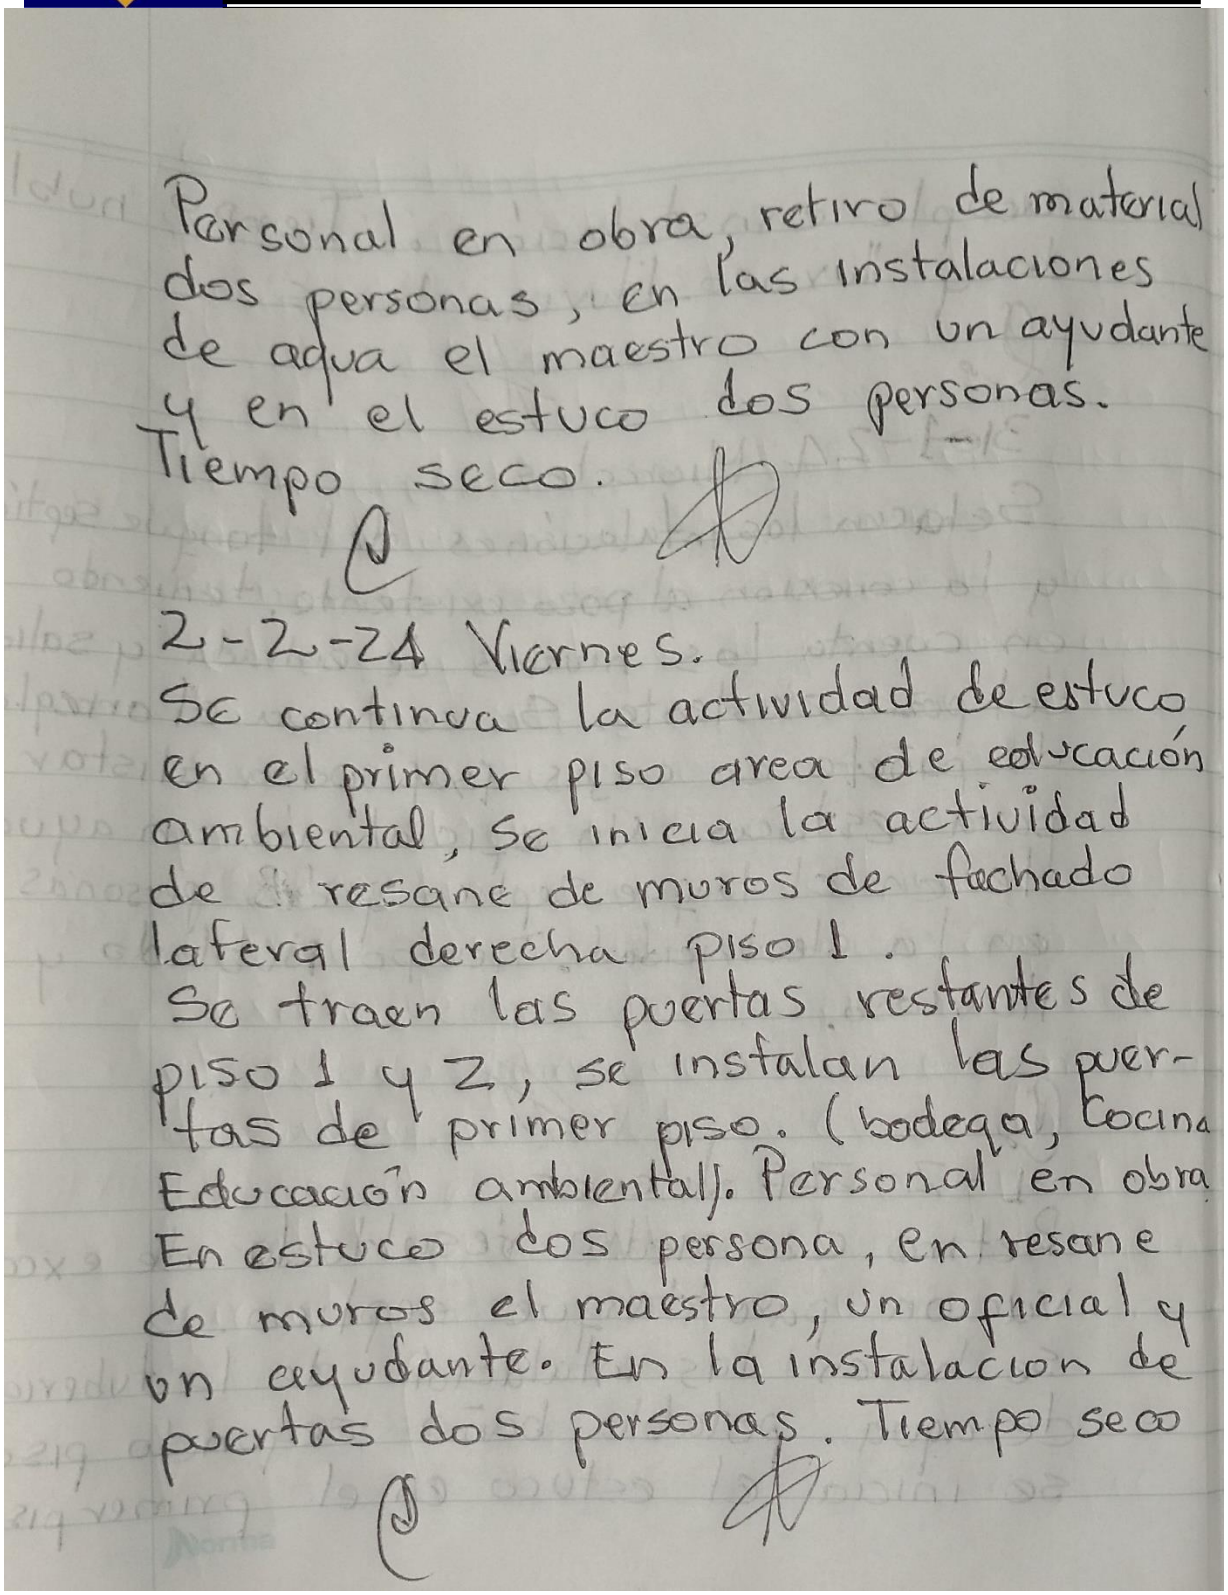


Personal en obra, retiro de material dos personas, en las instalaciones de agua el maestro con un ayudante y en el estuco dos personas. Tiempo seco.

2-2-24 Viernes.
Se continua la actividad de estuco en el primer piso area de educación ambiental, Se inicia la actividad de resane de muros de fachado lateral derecha piso 1.
Se traen las puertas restantes de piso 1 y 2, se instalan las puertas de primer piso. (bodega, cocina Educación ambiental). Personal en obra En estuco dos persona, en resane de muros el maestro, un oficial y un ayudante. En la instalacion de puertas dos personas. Tiempo seco

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

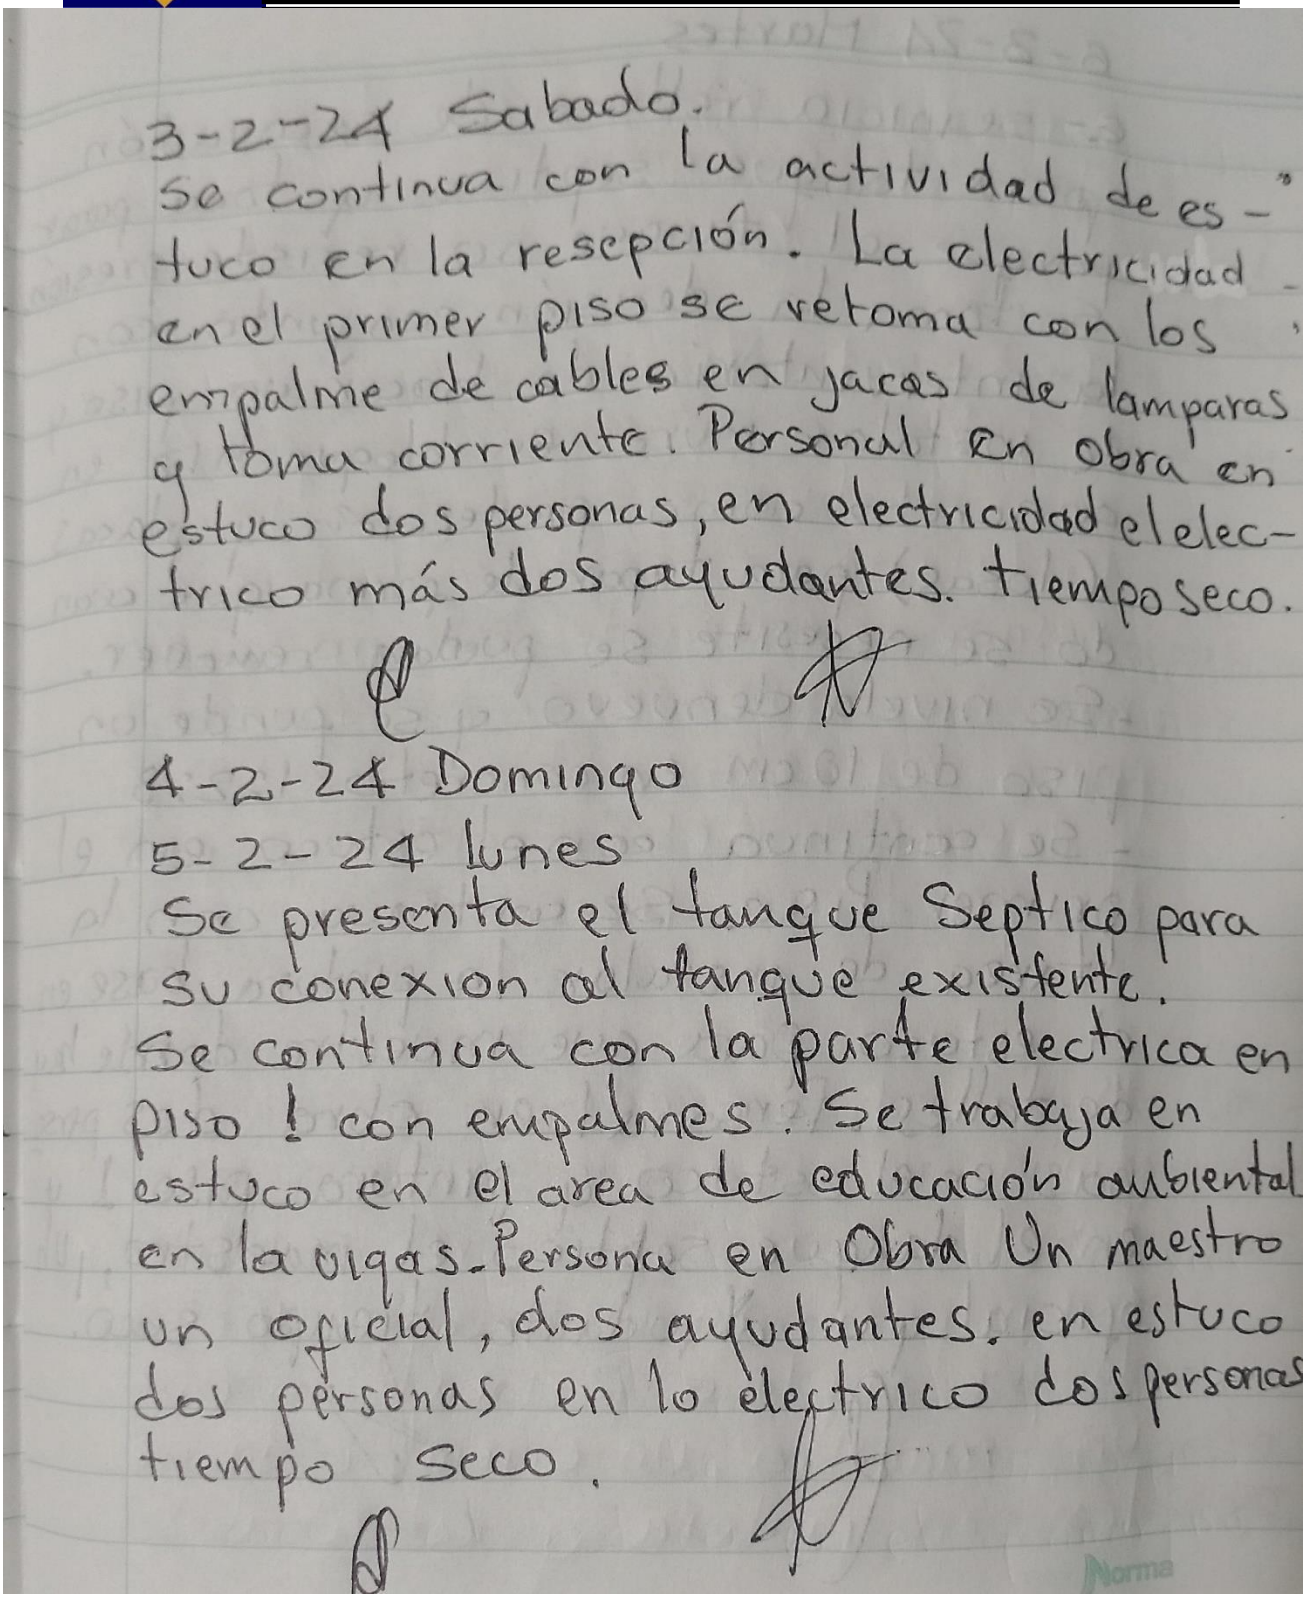


3-2-24 Sabado.
Se continua con la actividad de estuco en la resepción. La electricidad en el primer piso se retoma con los empalme de cables en jacas de lamparas y toma corriente. Personal En obra en estuco dos personas, en electricidad el electrico más dos ayudantes. tiempo seco.

4-2-24 Domingo

5-2-24 lunes
Se presenta el tanque Septico para su conexion al tanque existente.
Se continua con la parte electrica en piso 1 con empalmes. Se trabaja en estuco en el area de educación ambiental en la vigas. Persona en Obra Un maestro un oficial, dos ayudantes. en estuco dos personas en lo electrico dos personas tiempo Seco.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

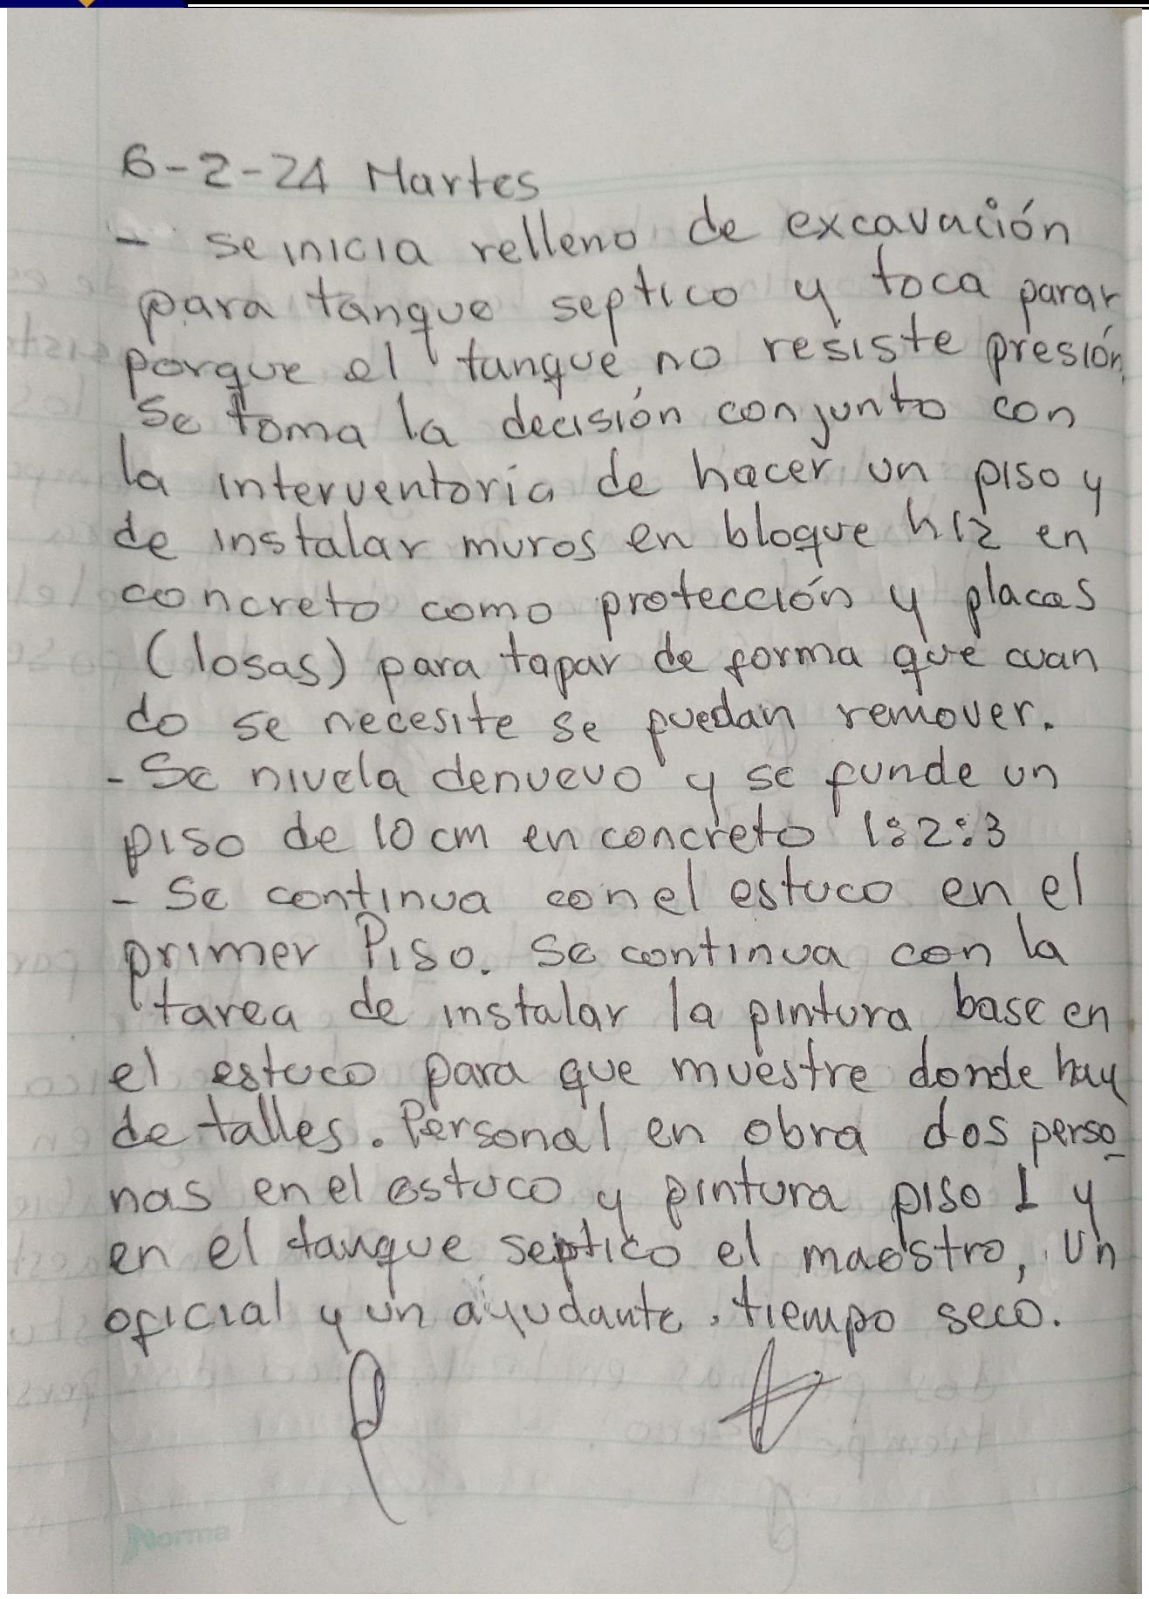


6-2-24 Martes

- se inicia relleno de excavación para tanque septico y toca parar porque el tanque no resiste presión, se toma la decisión conjunto con la interventoria de hacer un piso y de instalar muros en blogue h12 en concreto como protección y placas (losas) para tapar de forma que cuando se necesite se puedan remover.
- Se nivela denuevo y se funde un piso de 10 cm en concreto 1:2:3
- Se continua con el estuco en el primer Piso. Se continua con la tarea de instalar la pintura base en el estuco para que muestre donde hay detalles. Personal en obra dos personas en el estuco y pintura piso 1 y en el tanque septico el maestro, un oficial y un ayudante, tiempo seco.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

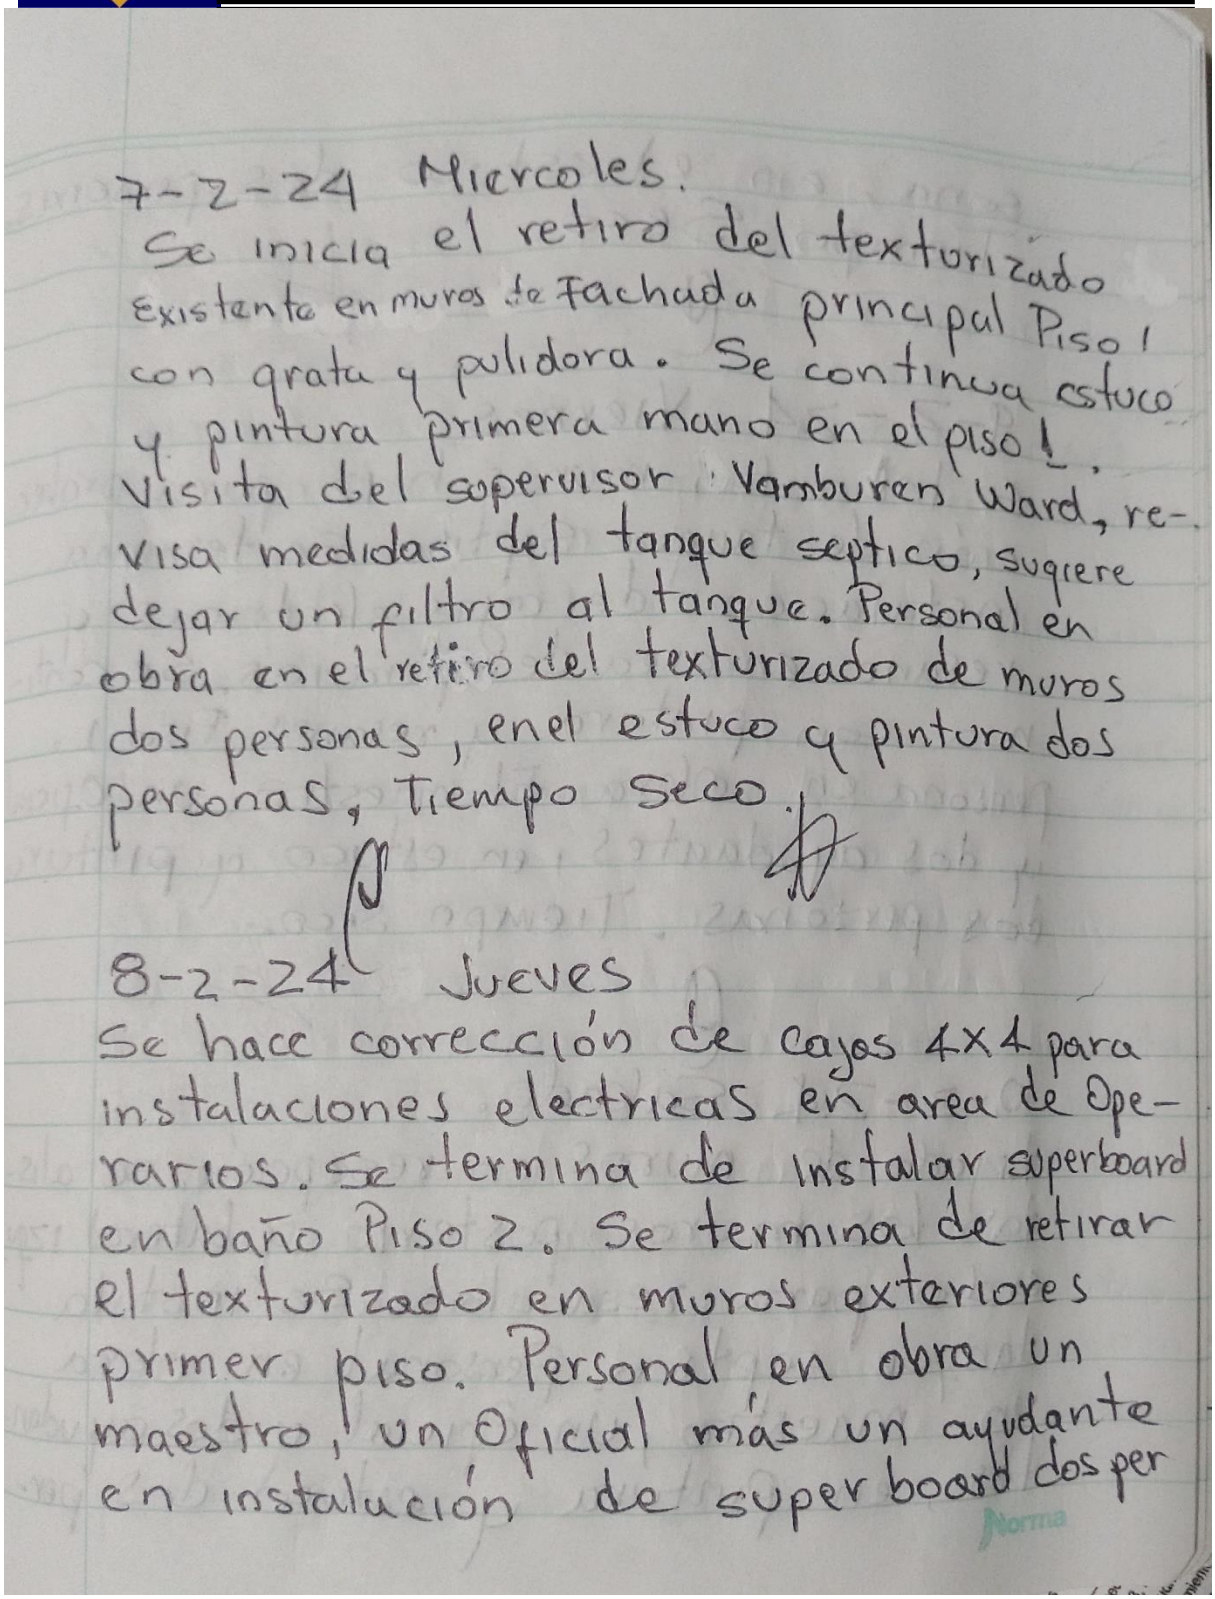

7-2-24 Miercoles.
Se inicia el retiro del texturizado existente en muros de fachada principal Piso 1 con grata y pulidora. Se continua estuco y pintura primera mano en el piso 1. Visita del supervisor Vamburen Ward, revisa medidas del tanque septico, sugiere dejar un filtro al tanque. Personal en obra en el retiro del texturizado de muros dos personas, enel estuco y pintura dos personas, Tiempo seco.

8-2-24 Jueves
Se hace corrección de cajas 4X4 para instalaciones electricas en area de Operarios. Se termina de instalar superboard en baño Piso 2. Se termina de retirar el texturizado en muros exteriores primer piso. Personal en obra un maestro, un Oficial más un ayudante en instalación de superboard dos per


CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

sona. en el estuco dos personas Tiempo Seco.

9-2-24 Viernes
Se lebantan muros h 12 para protección de tanque Septico. Se termina instalacion de cajas electricas y resane en area de operarios. Se continua con pintura y resanes Piso 1. Persona en obra. El maestro, un Oficial y dos ayudantes, en estuco y pintura dos personas. Tiempo Seco.

10-2-24 Sabado.
Lijado de muros en resepción, se alistan los muros posterio y lateral izquierdo para resanalos. Se instala tanque septico. Personal en obra un maestro, un Oficial y dos ayudantes, en pintura y estuco dos per-

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

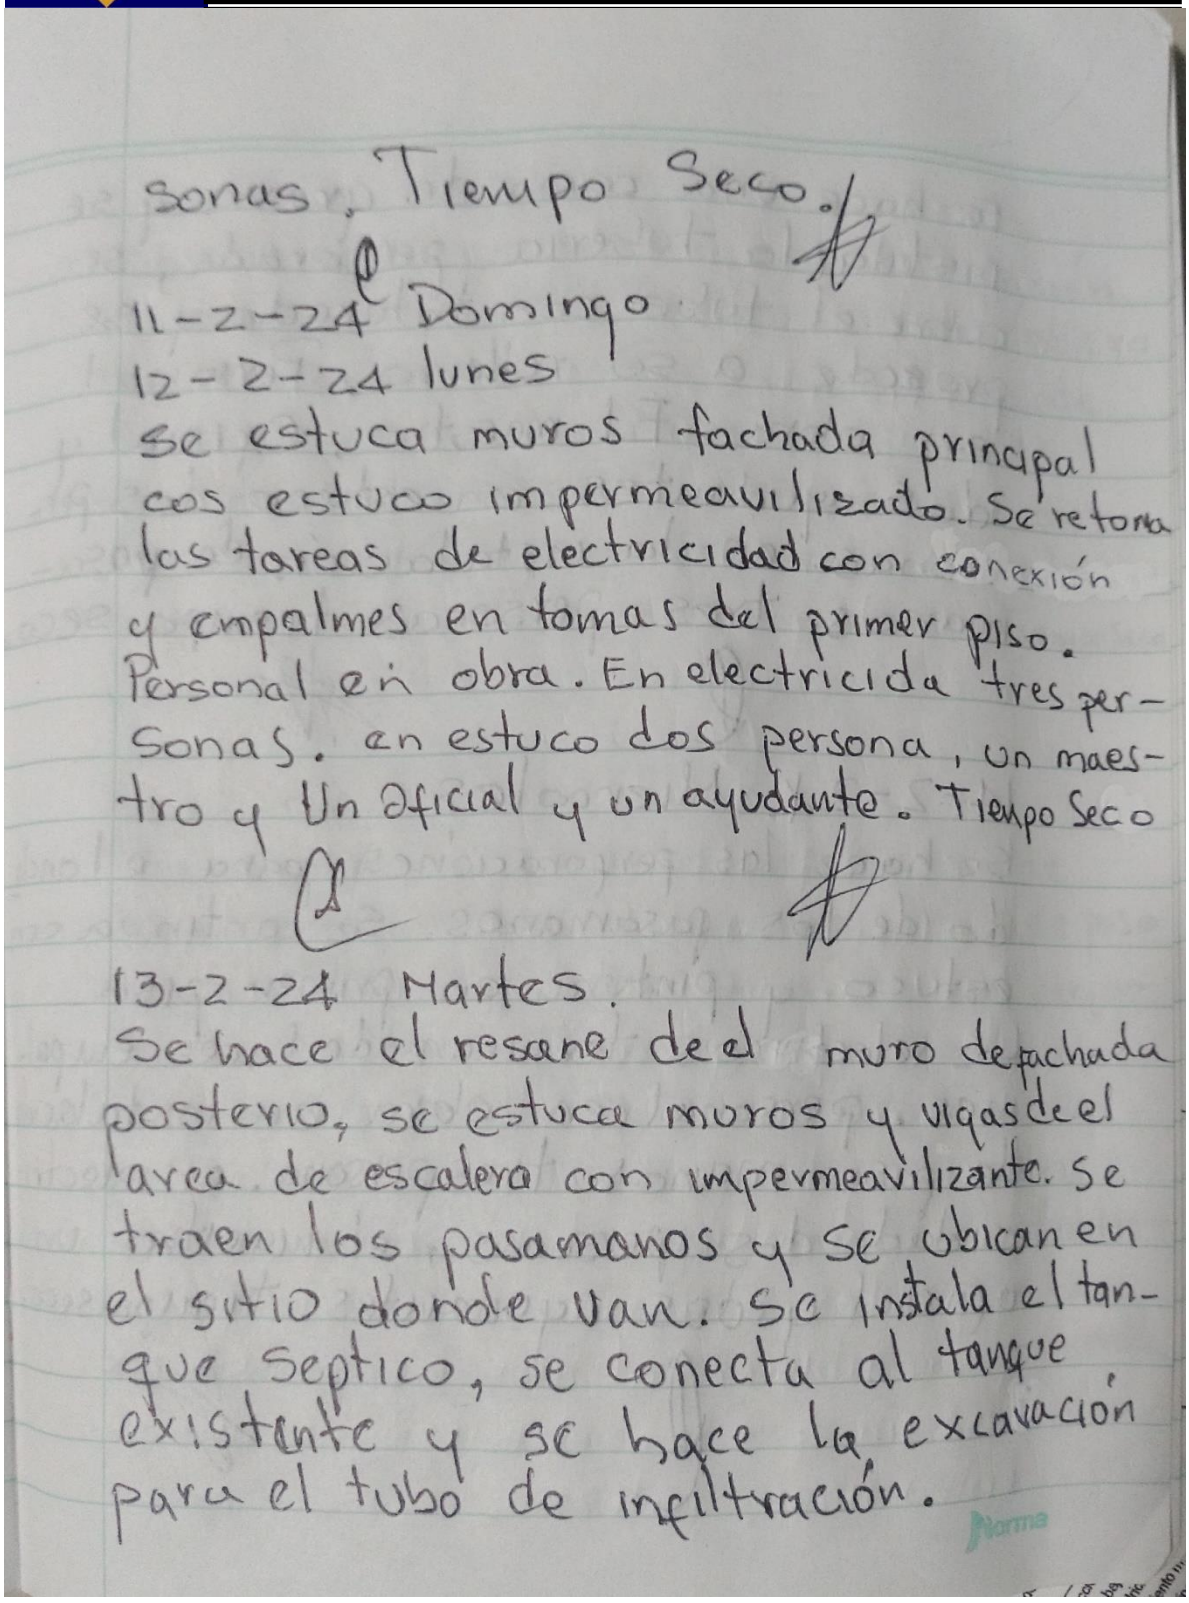


sonas. Tiempo Seco.

11-2-24 Domingo
12-2-24 lunes
se estuca muros fachada principal con estuco impermeavilizado. Se retoma las tareas de electricidad con conexión y empalmes en tomas del primer piso. Personal en obra. En electricida tres personas. en estuco dos persona, un maestro y Un Oficial y un ayudante. Tiempo Seco

13-2-24 Martes.
Se hace el resane de el muro de fachada posterio, se estuca muros y vigas de el area de escalera con impermeavilizante. Se traen los pasamanos y se ubican en el sitio donde van. Se instala el tanque Septico, se conecta al tanque existente y se hace la excavación para el tubo de infiltración.

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

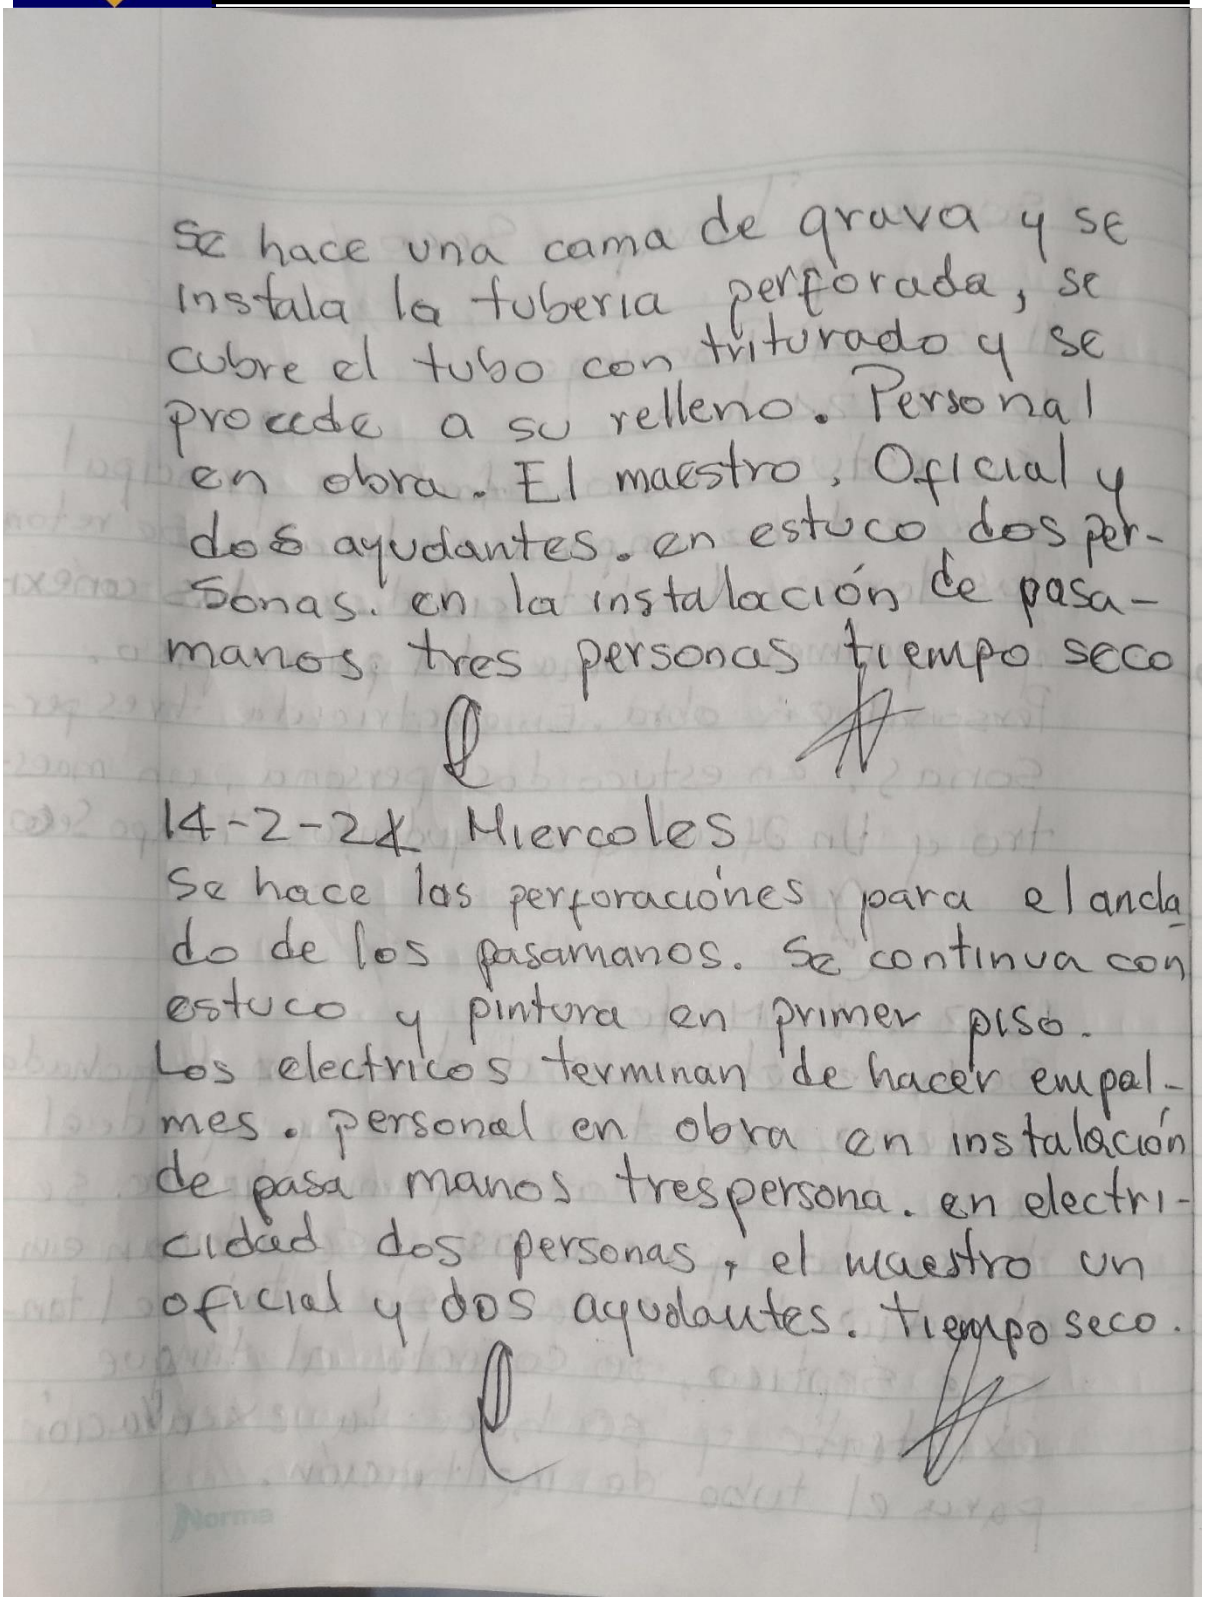


Se hace una cama de grava y se instala la tuberia perforada, se cubre el tubo con triturado y se procede a su relleno. Personal en obra. El maestro, Oficial y dos ayudantes. en estuco dos personas. en la instalación de pasamanos tres personas tiempo seco

14-2-24 Miercoles

Se hace las perforaciones para el anclado de los pasamanos. Se continua con estuco y pintura en primer piso. Los electricos terminan de hacer empalmes. personal en obra en instalación de pasa manos trespersona. en electricidad dos personas, el maestro un oficial y dos ayudantes. tiempo seco.

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

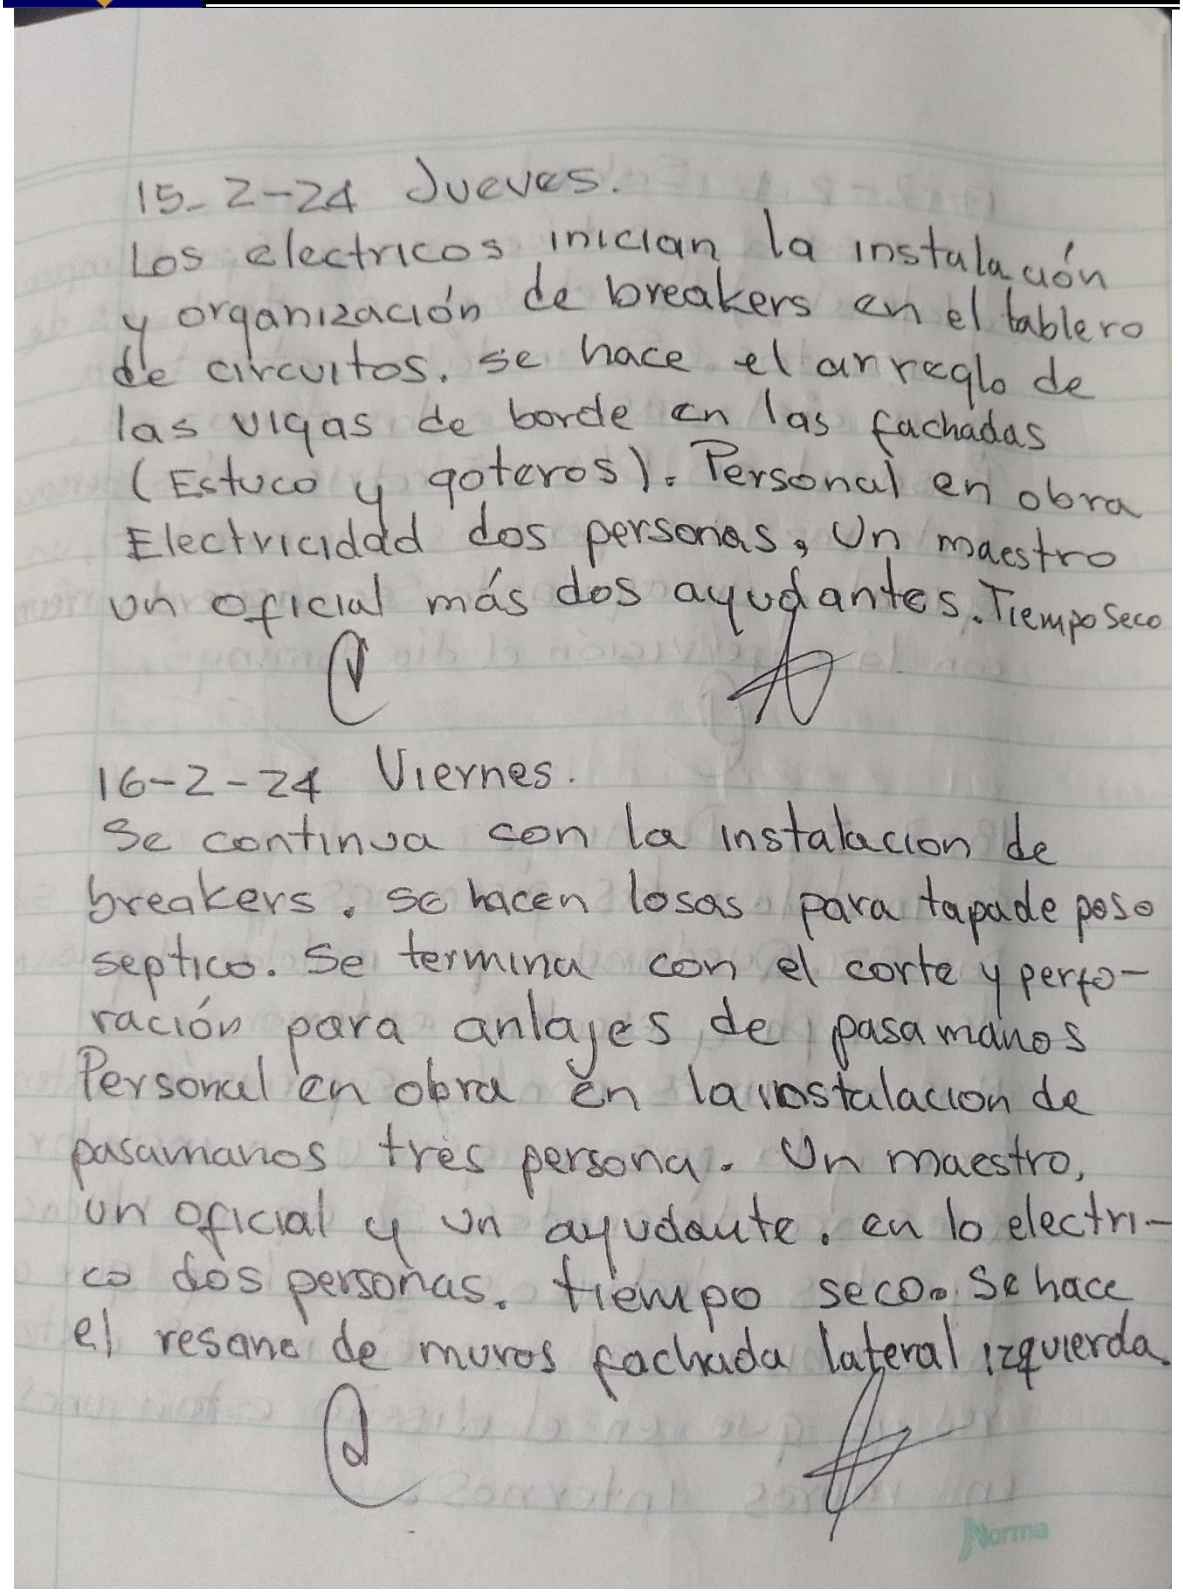

15-2-24 Jueves.
Los electricos inician la instalación y organización de breakers en el tablero de circuitos. se hace el arreglo de las vigas de borde en las fachadas (Estuco y goteros). Personal en obra Electricidad dos personas, Un maestro un oficial más dos ayudantes. Tiempo Seco

16-2-24 Viernes.
Se continua con la instalacion de breakers. se hacen losas para tapa de poso septico. Se termina con el corte y perforación para anlajes de pasamanos Personal en obra en la instalacion de pasamanos tres persona. Un maestro, un oficial y un ayudante. en lo electrico dos personas. tiempo seco. Se hace el resane de muros fachada lateral izquierda.


INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

17-2-24 Sabado.
Se resana y estuca vigas (parte inferior y laterales). Se trabaja en tableros de circuitos. Se instala estructura para cielo raso en las terrazas. Personal en Obra Electricos dos personas cielo raso dos personas un maestro, un oficial y un ayudante. Se acuerda reunión con la supervisión el día domingo.

18-2-24 Domingo
Se instalan los pasamanos y se usa Sika Duz 32. Quedando por instalar el pasamanos de rampa y escalera exterior.
Nos reunimos con la supervisión, interventoria y la persona que va a instalar los aires acondicionados. Se define ubicación y puntos electricos que hay que correr para ubicar el aire en muros exteriores ya que en el diseño estan unos en muros internos.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

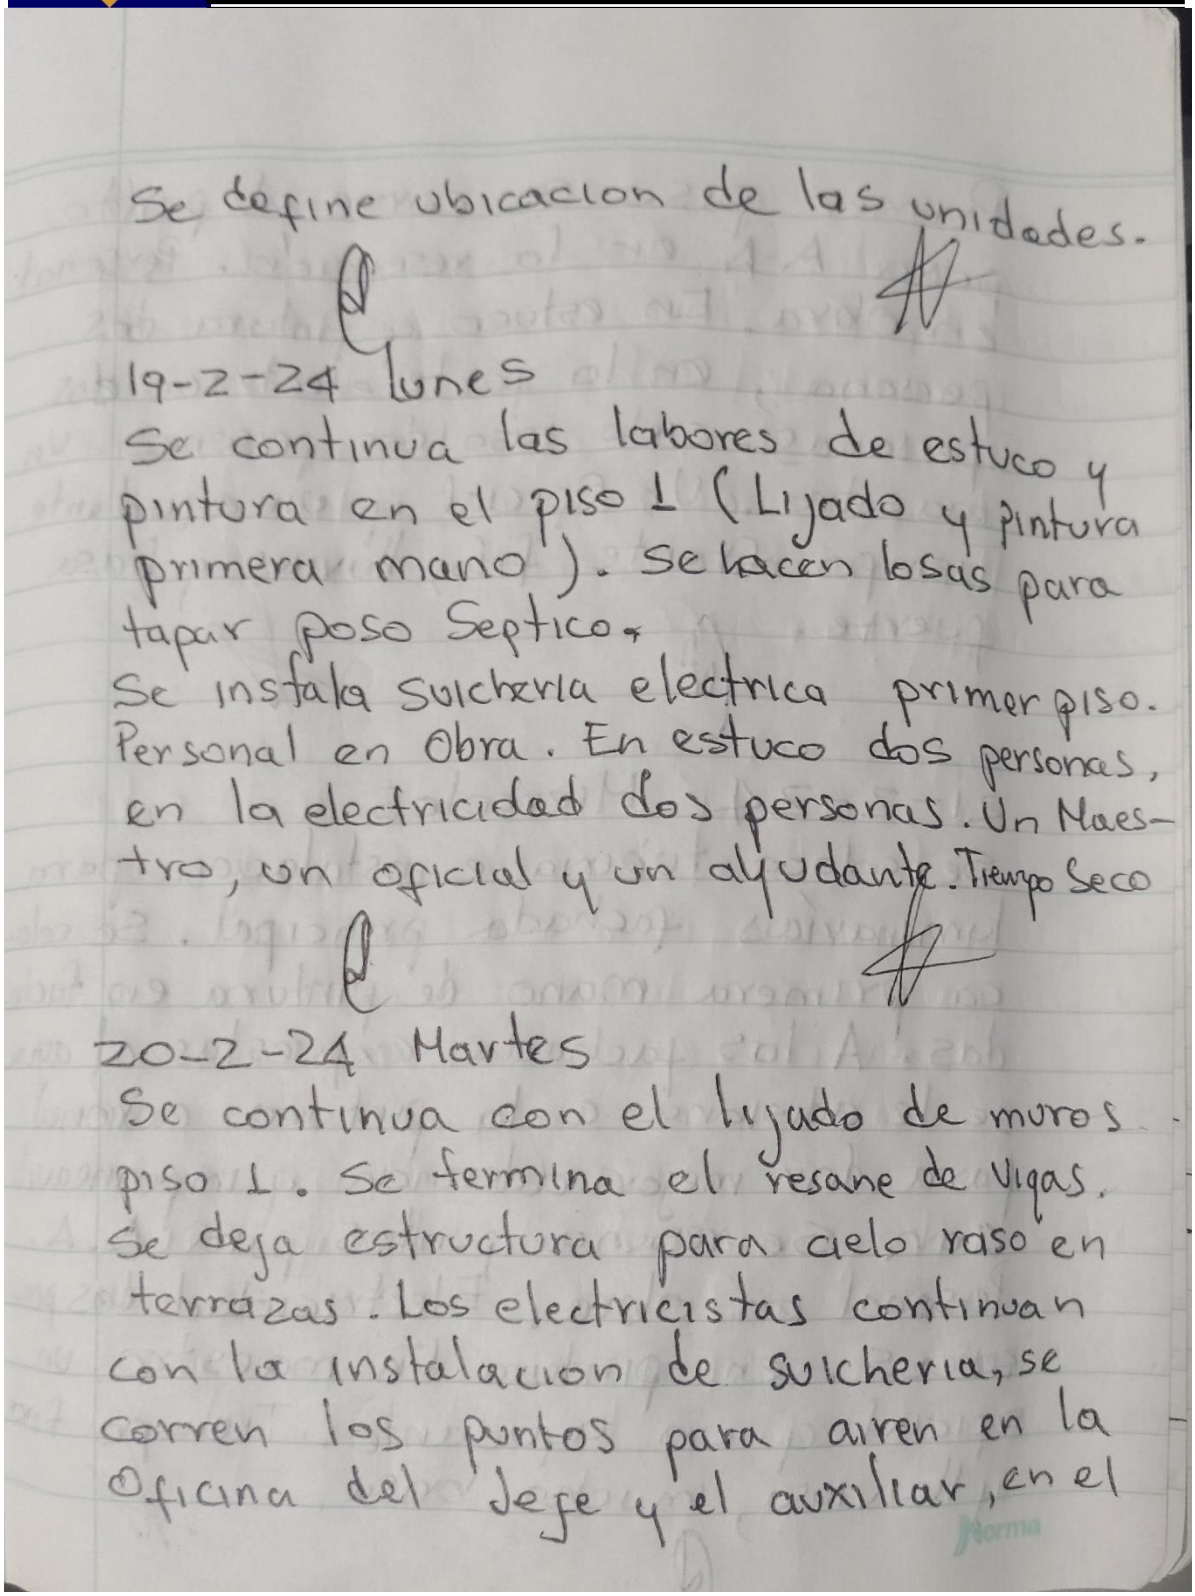

Se define ubicacion de las unidades.

19-2-24 lunes

Se continua las labores de estuco y pintura en el piso 1 (Lijado y pintura primera mano). Se hacen losas para tapar poso Septico.

Se instala Suicheria electrica primer piso.


Personal en Obra. En estuco dos personas, en la electricidad dos personas. Un Maestro, un oficial y un ayudante. Tiempo Seco

20-2-24 Martes

Se continua con el lijado de muros piso 1. Se termina el resane de Vigas. Se deja estructura para cielo raso en terrazas. Los electricistas continuan con la instalacion de suicheria, se corren los puntos para airen en la Oficina del Jefe y el auxiliar, en el

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

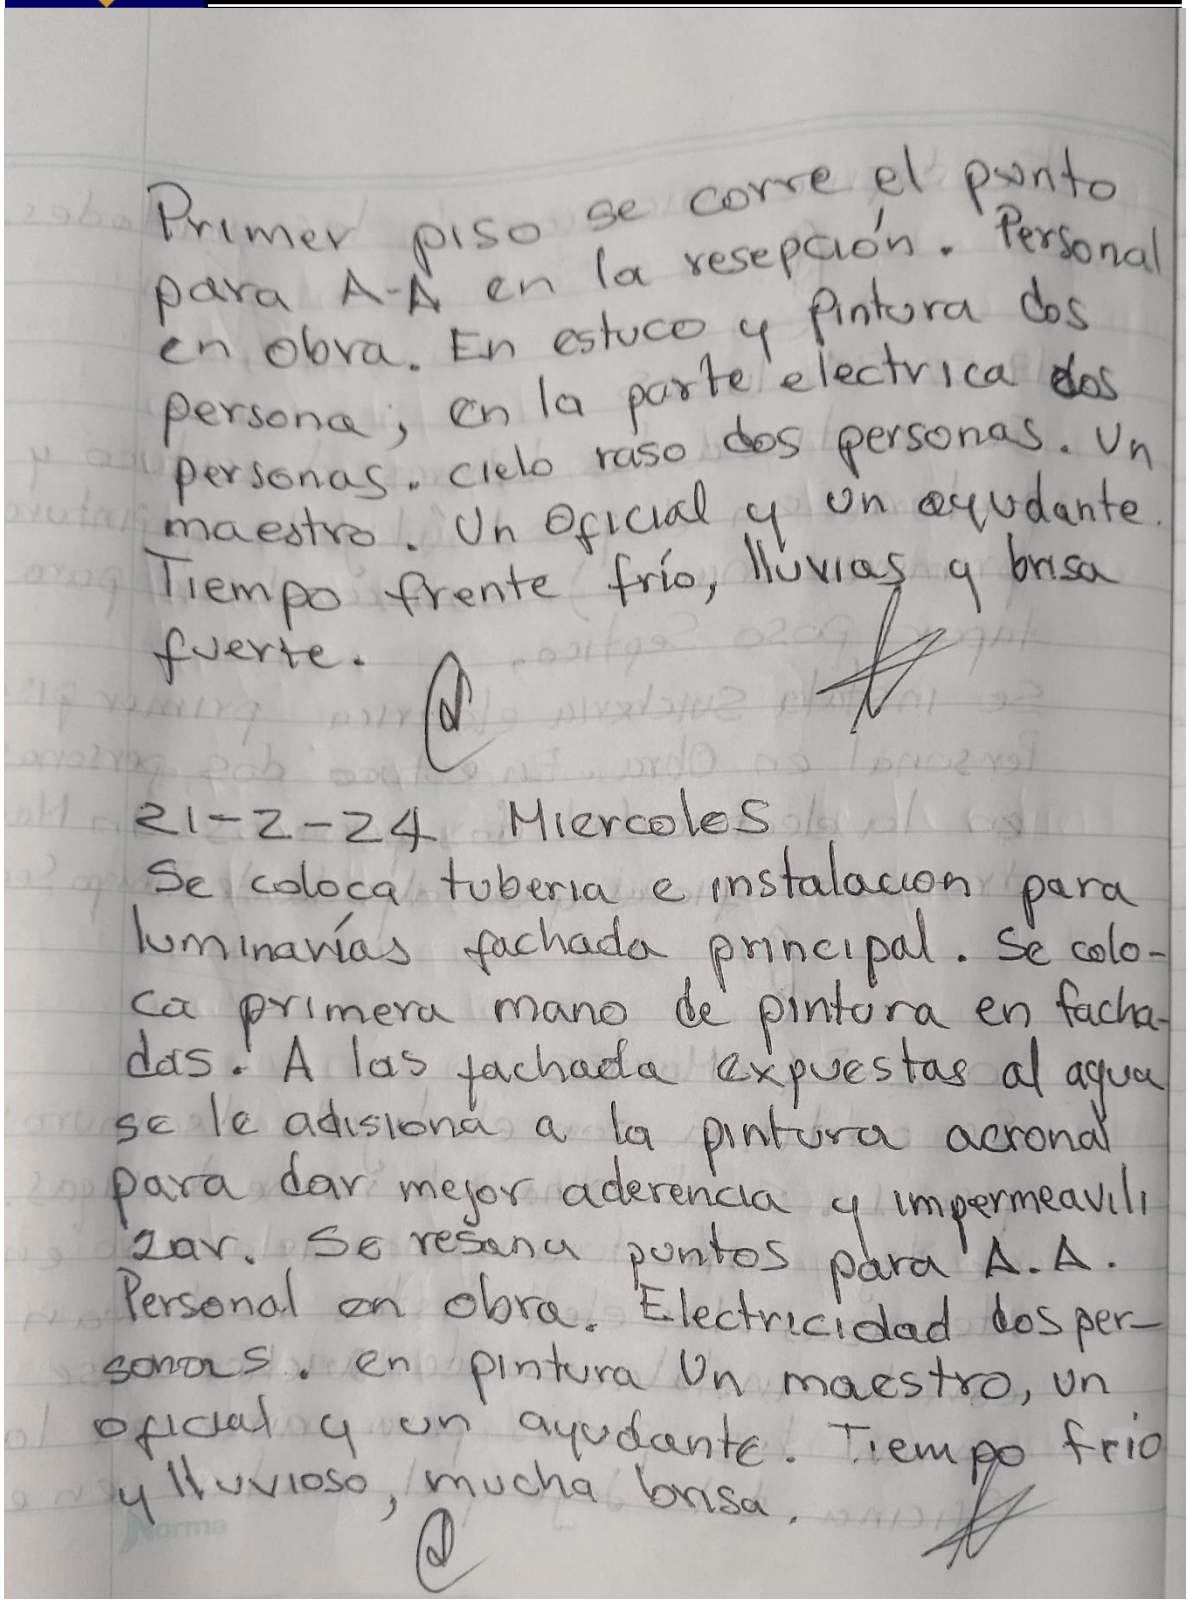


Primer piso se corre el punto para A-A en la resepción. Personal en obra. En estuco y pintura dos persona, en la parte electrica dos personas. cielo raso dos personas. Un maestro. Un oficial y un ayudante. Tiempo frente frío, lluvias y brisa fuerte.

21-2-24 Miercoles

Se coloca tuberia e instalacion para luminarías fachada principal. Se coloca primera mano de pintura en fachadas. A las fachada expuestas al agua se le adisiona a la pintura acronal para dar mejor aderencia y impermeavilizar. Se resana puntos para A.A. Personal en obra. Electricidad dos personas. en pintura Un maestro, un oficial y un ayudante. Tiempo frio y lluvioso, mucha brisa.

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

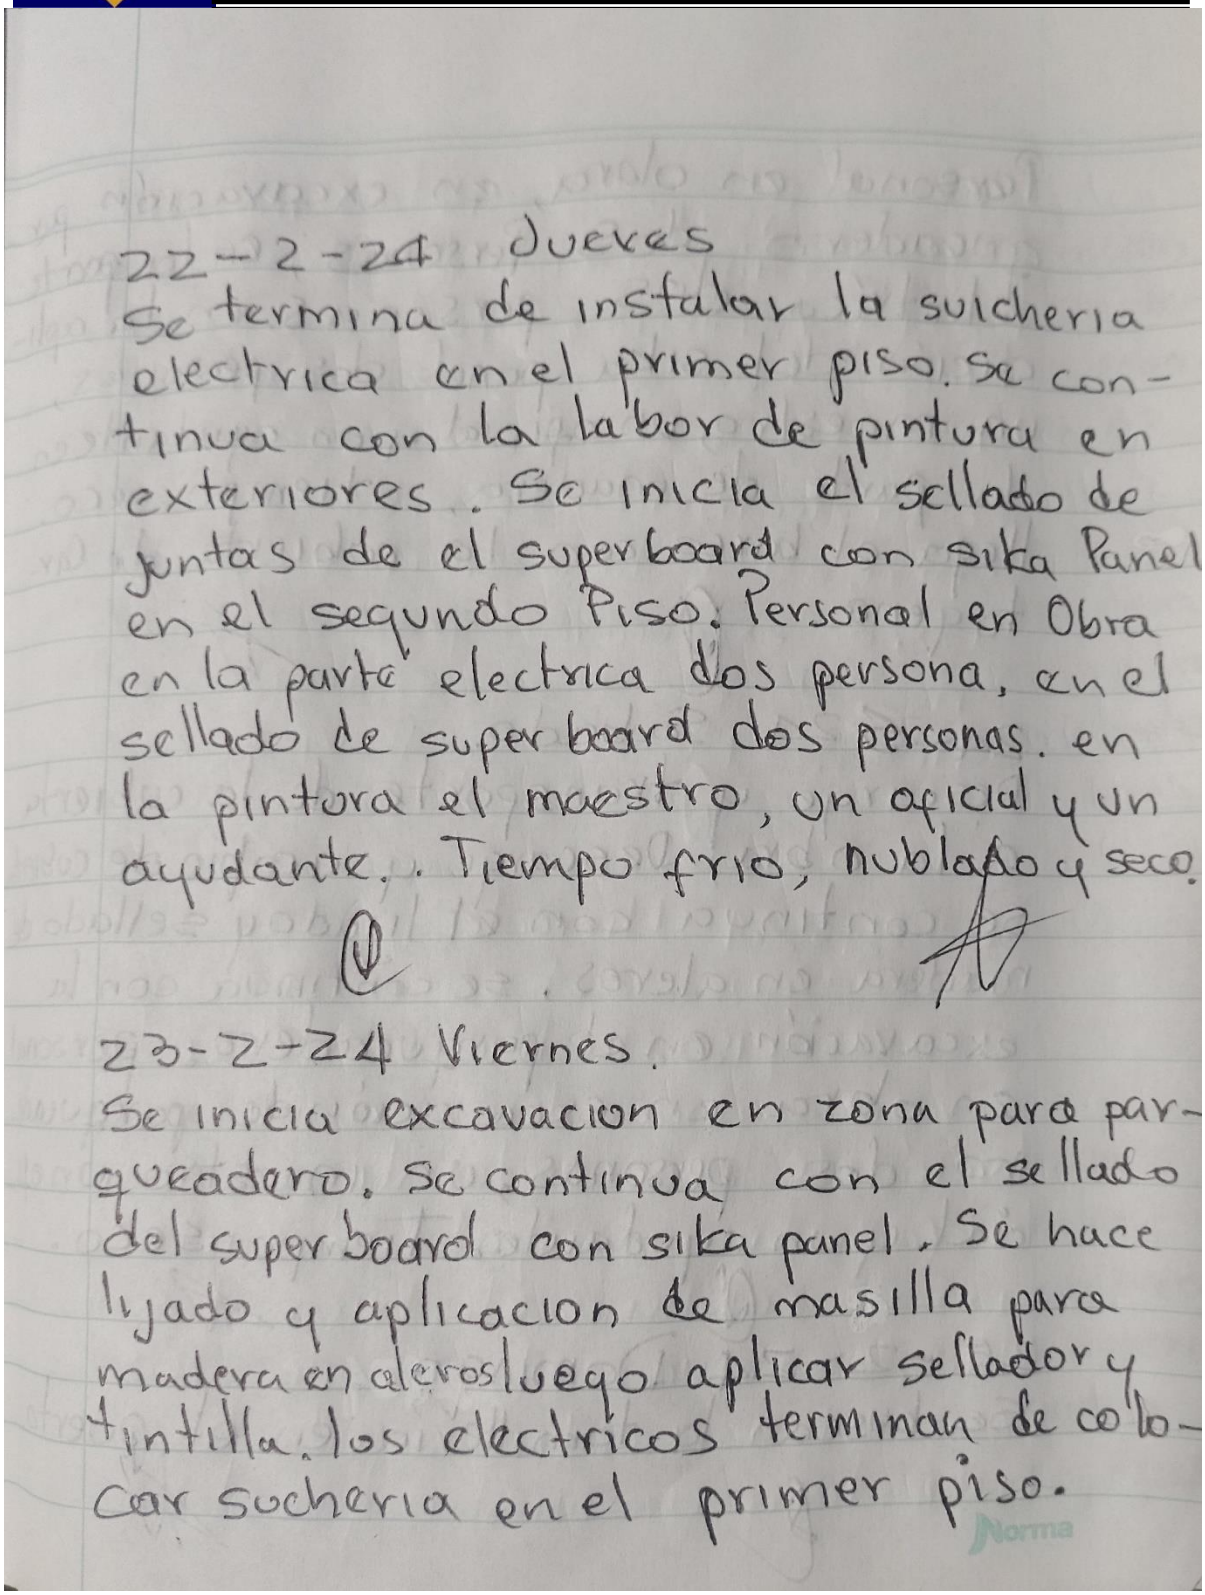


22-2-24 Jueves
Se termina de instalar la sulcheria electrica en el primer piso. Se continua con la labor de pintura en exteriores. Se inicia el sellado de juntas de el superboard con sika Panel en el segundo Piso. Personal en Obra en la parte electrica dos persona, en el sellado de superboard dos personas. en la pintura el maestro, un oficial y un ayudante. Tiempo frio, nublado y seco.

23-2-24 Viernes.
Se inicia excavacion en zona para parqueadero. Se continua con el sellado del superboard con sika panel. Se hace lijado y aplicacion de masilla para madera en aleros luego aplicar sellador y tintilla. los electricos terminan de colocar sucheria en el primer piso.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

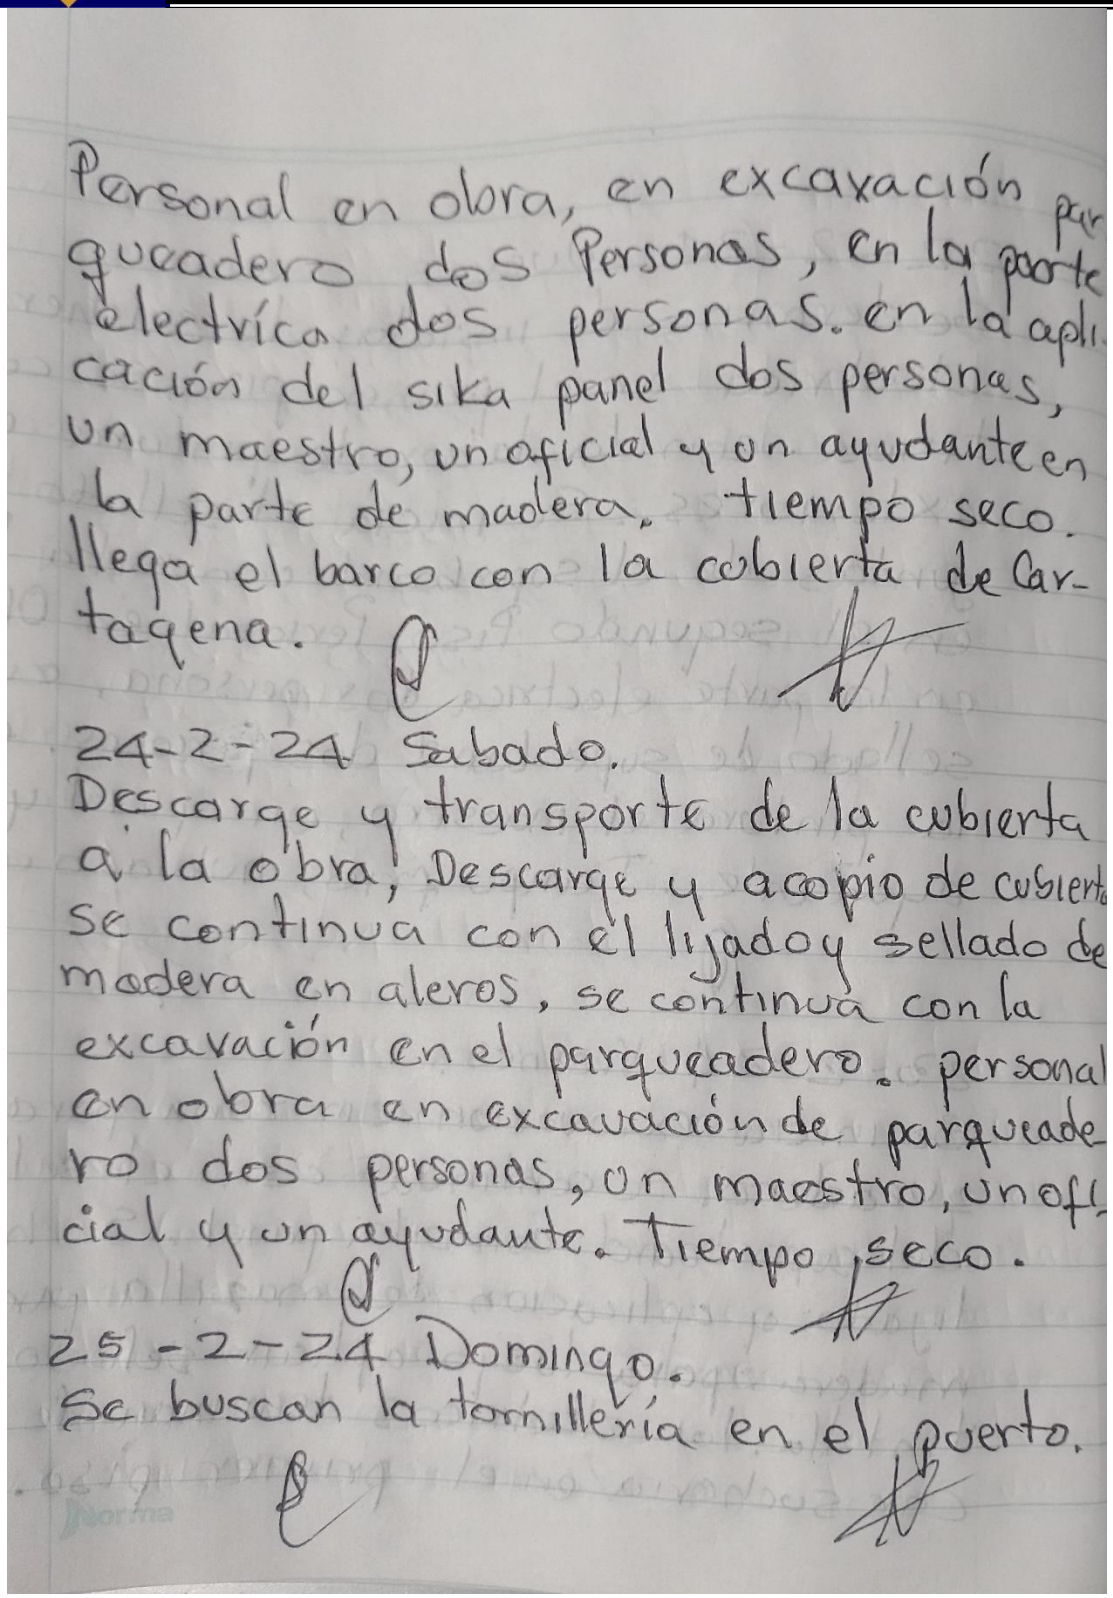


Personal en obra, en excavación parqueadero dos Personas, en la parte electrica dos personas. en la aplicación del sika panel dos personas, un maestro, un oficial y un ayudante en la parte de madera, tiempo seco. llega el barco con la cubierta de Cartagena.

24-2-24 Sabado.
Descarge y transporte de la cubierta a la obra, Descarge y acopio de cubierta se continua con el lijado y sellado de madera en aleros, se continua con la excavación en el parqueadero. personal en obra en excavación de parqueadero dos personas, un maestro, un oficial y un ayudante. Tiempo seco.

25-2-24 Domingo.
Se buscan la tornillería en el puerto.

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

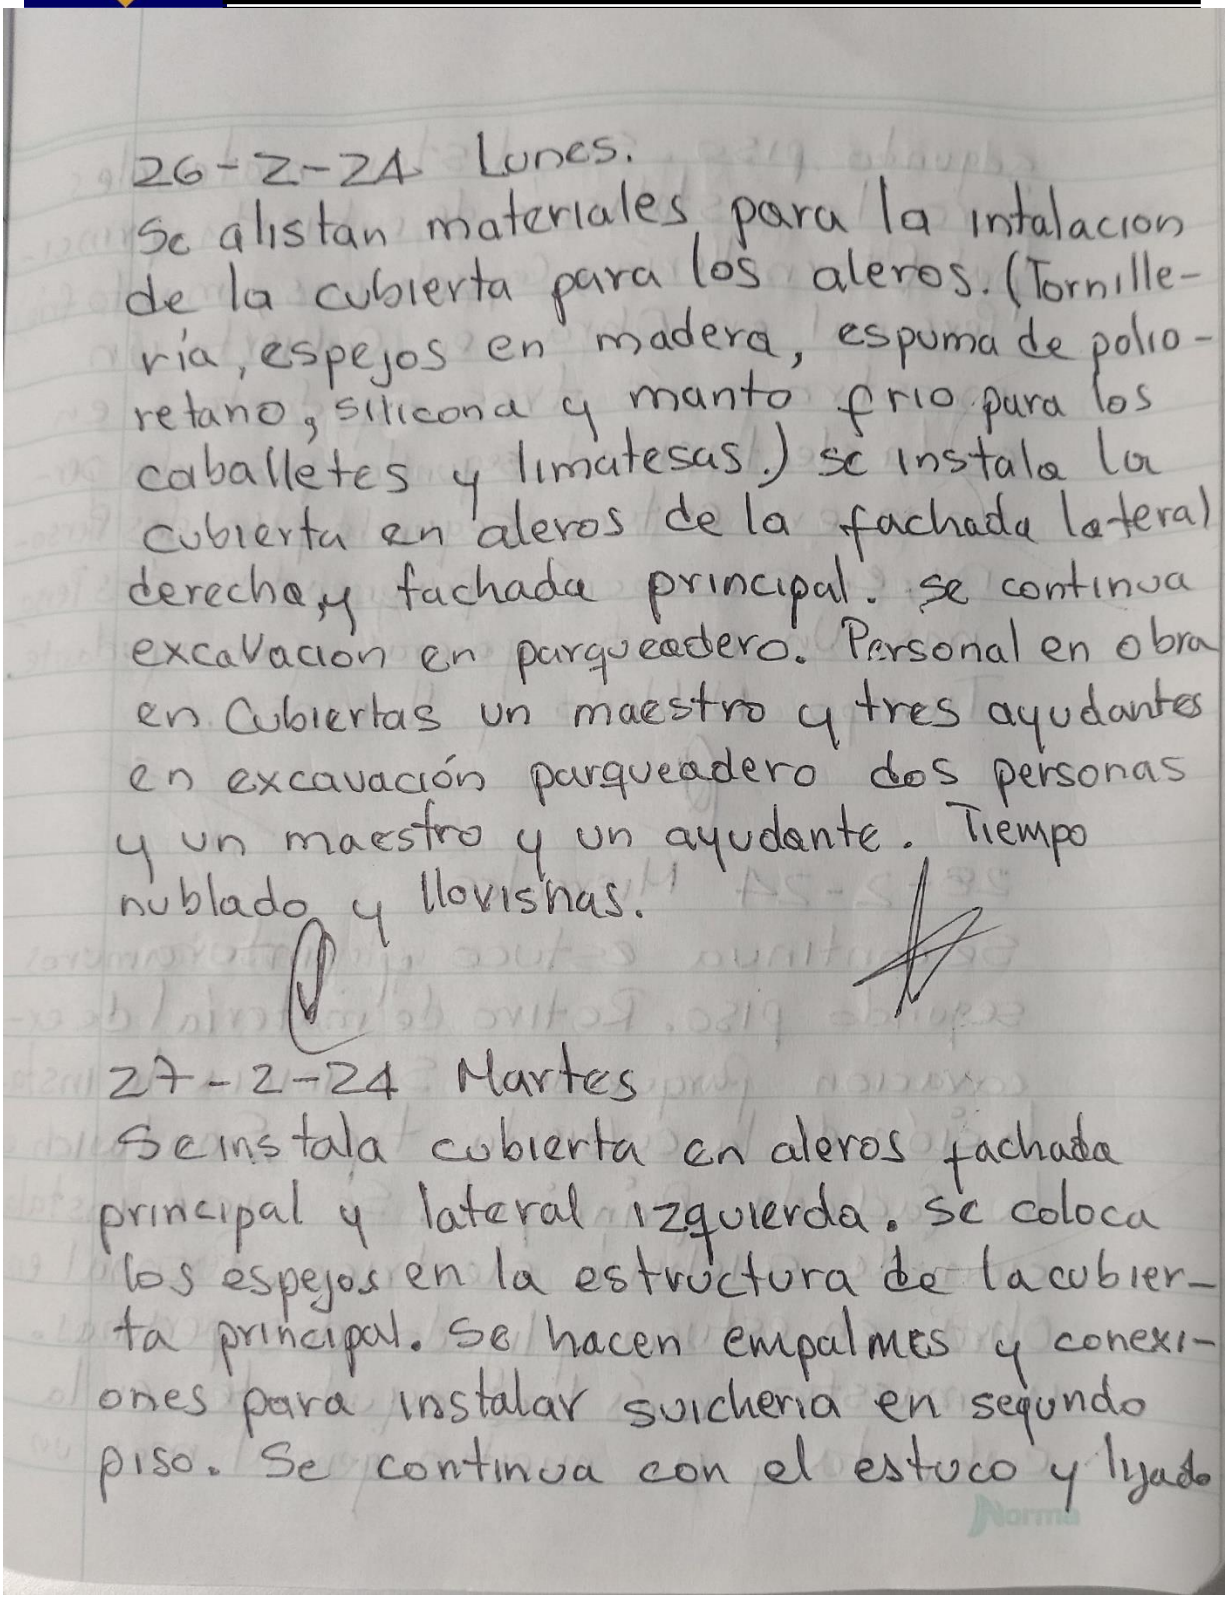


26-2-24 Lunes.
Se alistan materiales para la intalacion de la cubierta para los aleros. (Tornillería, espejos en madera, espuma de poliuretano, silicona y manto frio para los caballetes y limatesas.) se instala la cubierta en aleros de la fachada lateral derecha, y fachada principal. se continua excavacion en parqueadero. Personal en obra en Cubiertas un maestro y tres ayudantes en excavación parqueadero dos personas y un maestro y un ayudante. Tiempo nublado y lloviznas.

27-2-24 Martes
Se instala cubierta en aleros fachada principal y lateral izquierda. se coloca los espejos en la estructura de la cubierta principal. Se hacen empalmes y conexiones para instalar suicheria en segundo piso. Se continua con el estuco y lijado

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

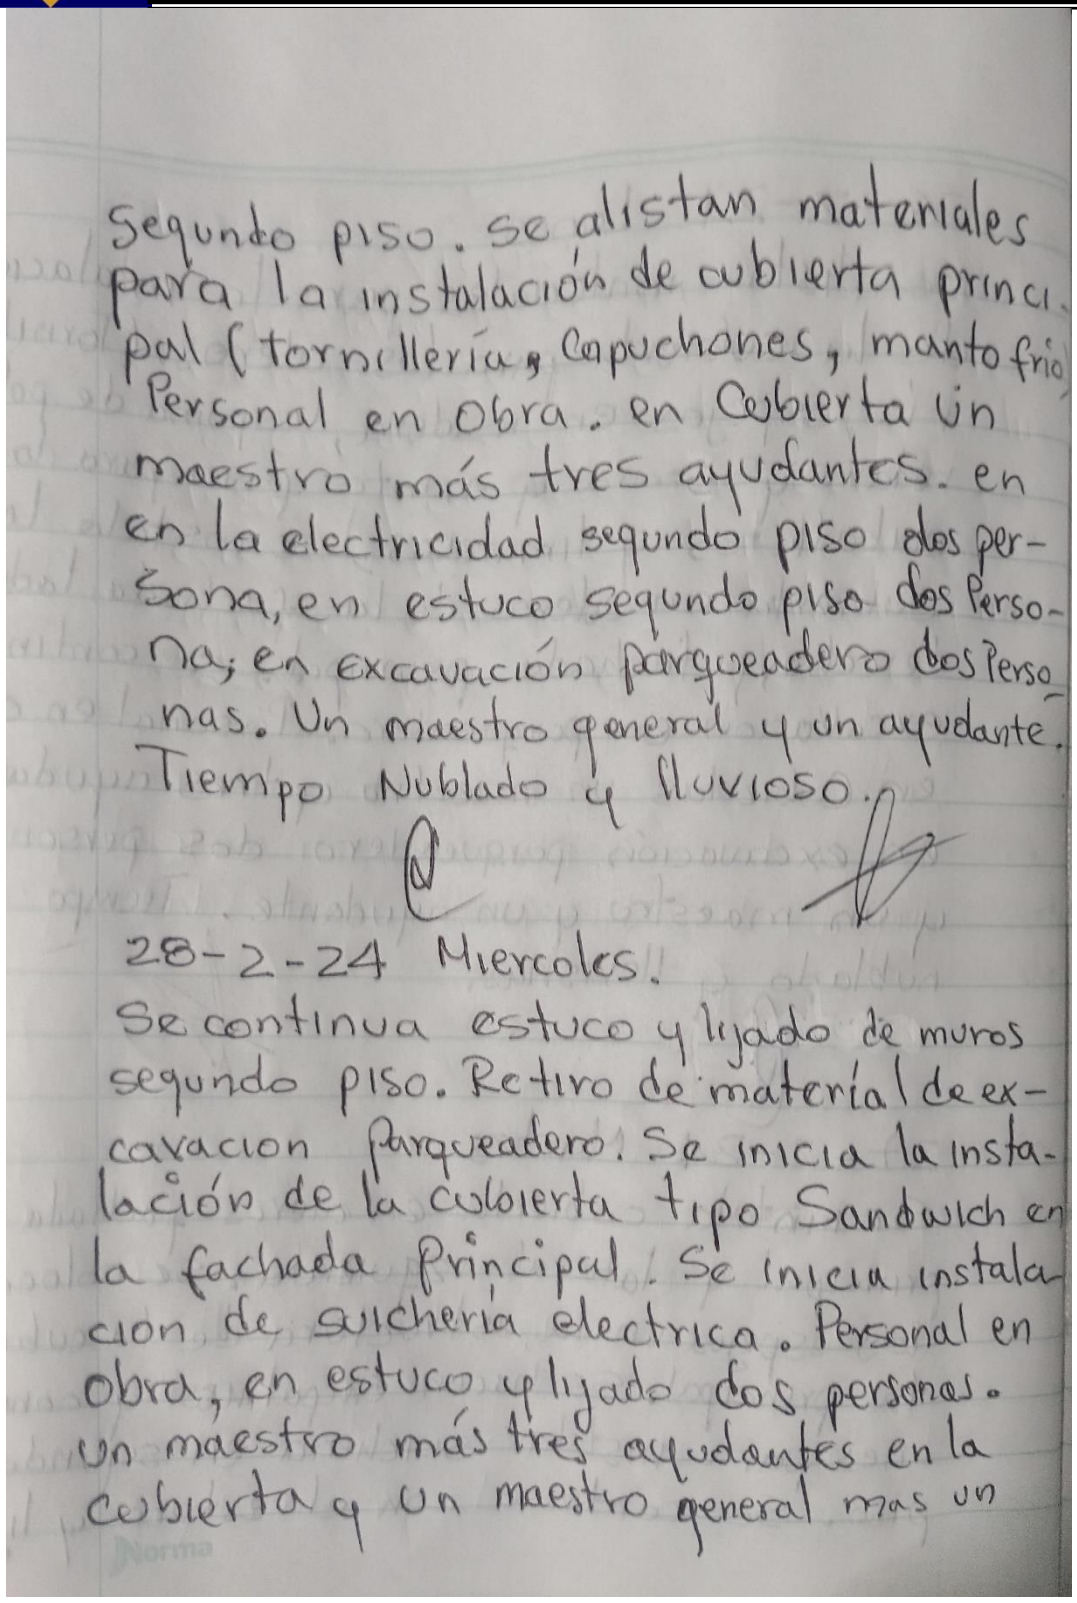


segundo piso. se alistan materiales para la instalación de cubierta princi. pal (tornillería, capuchones, manto frio) Personal en Obra. en Cubierta un maestro más tres ayudantes. en en la electricidad segundo piso dos persona, en estuco segundo piso dos Persona; en excavación parqueadero dos Personas. Un maestro general y un ayudante. Tiempo Nublado y lluvioso.

28-2-24 Miercoles.
Se continua estuco y lijado de muros segundo piso. Retiro de material de excavacion parqueadero. Se inicia la instalación de la cubierta tipo Sandwich en la fachada Principal. Se inicia instalacion de cuchería electrica. Personal en obra, en estuco y lijado dos personas. un maestro más tres ayudantes en la cubierta y un maestro general mas un

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

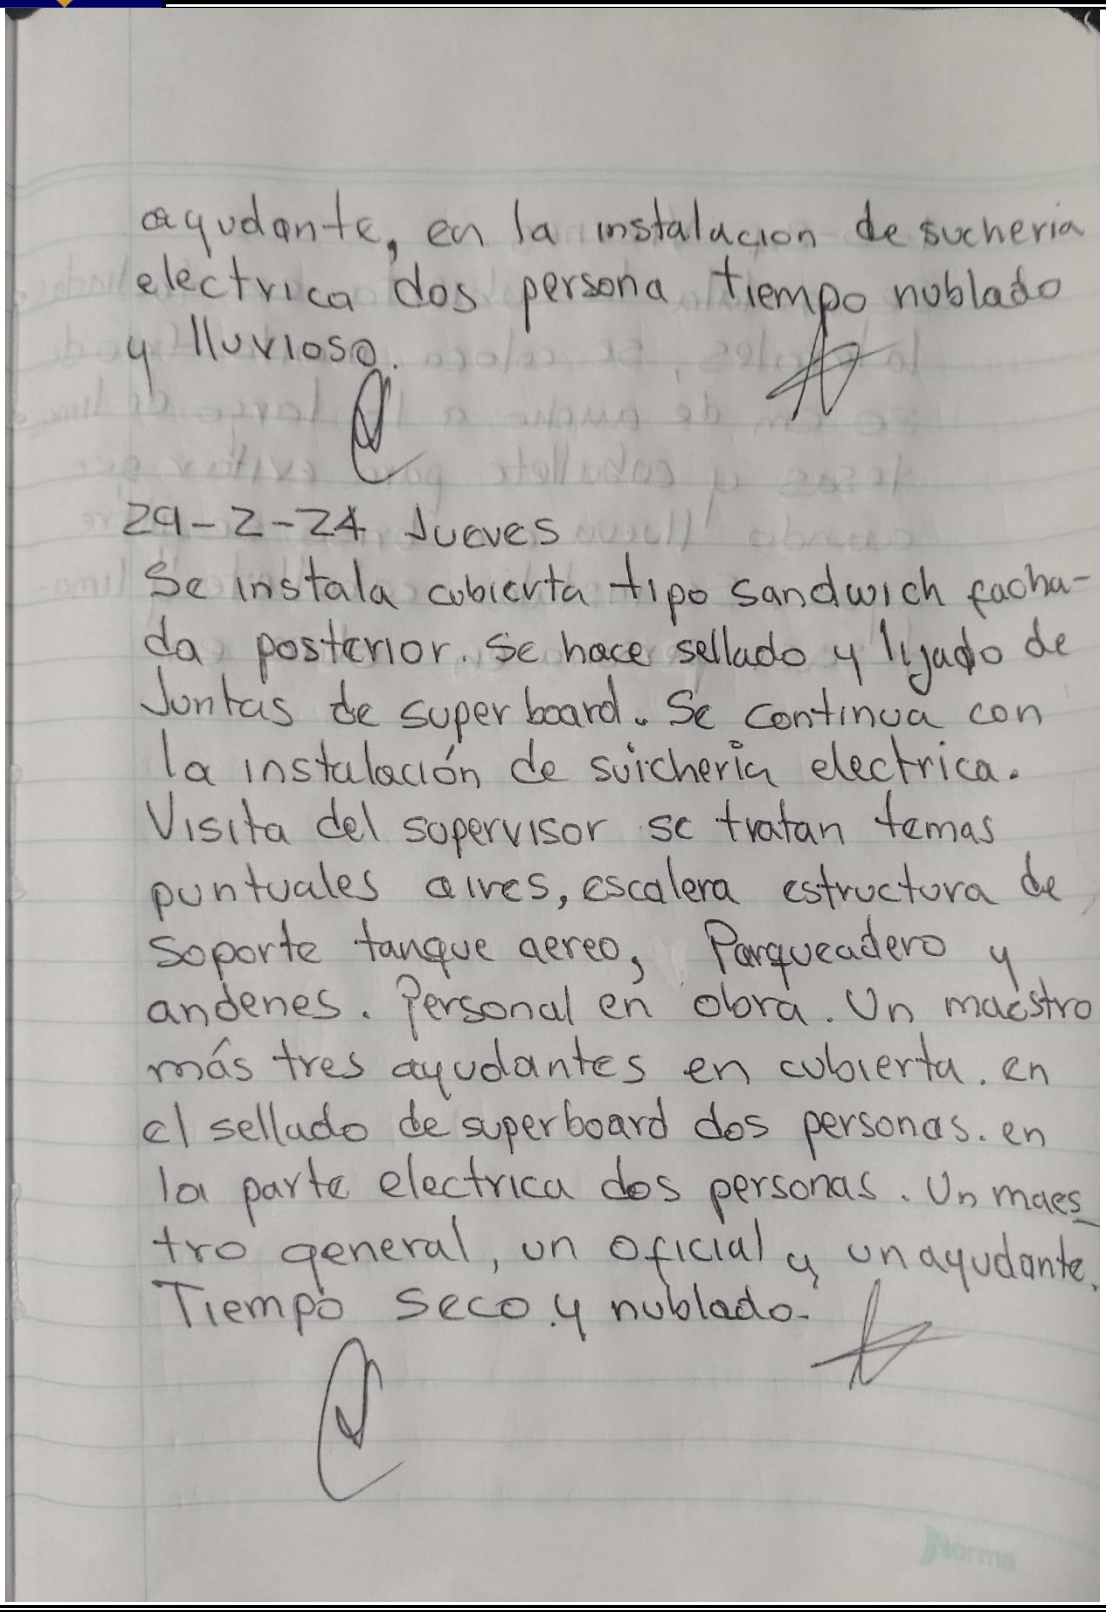

ayudante, en la instalacion de sucheria electrica dos persona tiempo nublado y lluvioso.

29-2-24 Jueves

Se instala cubierta tipo sandwich fachada posterior. Se hace sellado y ligado de juntas de superboard. Se continua con la instalación de suicheria electrica. Visita del supervisor se tratan temas puntuales aires, escalera estructura de soporte tanque aereo, Parqueadero y andenes. Personal en obra. Un maestro más tres ayudantes en cubierta. en el sellado de superboard dos personas. en la parte electrica dos personas. Un maestro general, un oficial y un ayudante. Tiempo seco y nublado.

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

ANEXO 8.
SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2024

CORREO ELECTRÓNICO: ingever2@gmail.com – ingever1@hotmail.com

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	CALLE 12 16A-158	3153837201	ingever1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75572619	$6.140.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	162.400	0		0		0	9	1.300	0	163.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	204.800	0		0		0	9	1.600	0	206.400	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	243.200	0		0		0	9	1.900	0	245.100	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	176.800	0		0		0	9	1.400	0	178.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	857.600	0	0	0	0	9	6.700	0	864.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	915.200	0	0	0	0	9	7.100	0	922.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	9	2.500	0	322.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.056.000	0	0	0	0	9	8.200	0	1.064.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.370.000				1.370.000	9	10.600	1.380.600			13.700	1.380.600	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	787.200	9	6.100	793.300	12

PAGADA

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		CALLE 12 16A-158	3153837201	ingever1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75572619	$6.140.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	787.200	793.400
Pensión	4	3.148.800	3.173.300
Riesgos Laborales	1	1.370.000	1.380.600
CCF	1	787.200	793.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.093.200	6.140.600

PAGADA

INGENIERO CIVIL
EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
NIT. 88283109-8 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11, NO. 16-109, EDIFICIO MÓNACO, OFICINA 107-SAN AGUSTÍN
CEL. 315 383 72 01 - OCAÑA - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		CALLE 12 16A-158	3153837201	ingever1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75572619	$6.140.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	RL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1091653684	REYES ANGIARITA YEYMI KARINA	1	0			S																230201	4.060.000	649.600	0	0	0	0	CCFC50	4.060.000	162.400	14-11	4.060.000	5	262.600	CCF36	4.060.000	162.400	0	0	0	0	0
2	CC	1091661161	GUERRERO CASTILLA REINALDA	1	0			S																25-14	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS041	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF36	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
3	CC	1091682298	BARBOSA CARDENAS EILEEN MARIAM	1	0			S																231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF36	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1091684356	GUERRERO LOPEZ DEIVES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1091806425	AVENDAÑO ROPERO SERGIO ANDRES	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1094577037	VERJEL TORRADO CAMILO ELIAS	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	6664316	RODRIGUEZ GERSON ALBERTO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	77186742	ATENCIA HERRERA WILLINTON	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	88284881	QUINTERO SANGUINO MIGUEL ROBERTO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	9716581	JAIMES CARDENAS IVAN	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1004943382	SANCHEZ VELASQUEZ YAMID ALONSO	1	0			S	X															230301	520.000	83.200	0	0	0	0	ESSC24	520.000	20.800	14-11	520.000	5	36.200	CCF36	520.000	20.800	0	0	0	0	0
12	CC	1091988184	AREVALO RODRIGUEZ FRANKLIN EDUARDO	1	0			S	X															25-14	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS037	520.000	20.800	14-11	520.000	5	36.200	CCF36	520.000	20.800	0	0	0	0	0

PAGADA
