NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ING. DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2044-01 DT- Tolima

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4394 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía terciaria Cajamarca – Toche, código INVÍAS 32200 entre los municipios de Cajamarca y Corregimiento de Toche municipio de Ibagué.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1546 de 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN	SA-MC-DEO-SVR-003-2025		
CONTRATISTA:	SOFIA CASTRILLÓN ARCE	NIT:	31.932.472
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	06 de Octubre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma (el que aplique): SECOP: 2025S-VBOG-074848	Estado en plataforma SECOP: En ejecución
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.255.345.000,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
FUENTE DE LOS RECURSOS	NACION		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.255.345.000,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	SI (CLÁUSULA DÉCIMA del contrato)		
ANTICIPO OTORGADO:	$227.247.737,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.oo		
SALDO POR AMORTIZAR:	$227.247.737,00		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	31 DE MARZO DE 2026 – 1 MES + 15 DIAS		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	18/12/2025		
AMLPIACION 1 A LA SUSPENSION 1	02/02/2026		
AMLPIACION 2 A LA SUSPENSION 1	27/02/2026		
REACTIVACION	24 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 DE MAYO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
666325	2025	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$1.255.345.000,00	$0.00	$1.255.345.000,00
TOTAL						

1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo no se tramitaron actas parciales.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

Alcance del contrato de acuerdo con el anexo técnico:

- Construcción de 4 alcantarillas de 36”
- Construcción del 610 ml de placa huella
- Construcción de 10 ml de muro en gaviones.
- Suministro e instalación de afirmado en 415 m3.
- Conformación de 400 metros de calzada existente.

1.5.AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4, con corte al 30 de abril de 2025, se reporta un avance acumulado para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.255.345.000,00	100.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$749.566.499,5	59,71%%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$212.789.106,8	16,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$212.789.106,8	16,95%

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$227.247.737,00*
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$227.247.737,00

*A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 59,71%:
Meta física ejecutada 16,95%:

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/04/2026	1	Aprobado

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2025	1	N/A	18/12/2025 al 01/02/2026	02/02/2026
02/02/2026		1	02/02/2026 al 26/02/2026	27/02/2026
27/02/2026		2	27/02/2026 al 23/03/2026	24/03/2026

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/03/2026	N/A	1	Prorroga 1 - Aprobada

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Póliza de cumplimiento No. 45-44-101168932 de fecha 07/10/2025 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-40-101102439 de fecha 07/10/2025.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 125.534.500,00	29	8	2025	21	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 251.069.000,00	29	8	2025	21	11	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 251.069.000,00	29	8	2025	21	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 2.856.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 373.747.500,00	31	12	2025	21	5	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101168932

Certificado de modificación o anexo No.: 15
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 01/04/2026

Garantía de RCE

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios labores y operaciones		$ 350.181.000,00	29	8	2025	21	5	2026
Contratista y subcontratistas		$ 350.181.000,00	29	8	2025	21	5	2026
Vehiculos propios y no propios		$ 350.181.000,00	29	8	2025	21	5	2026

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101102439 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 12
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 01/04/2026

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1586 DE 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	IP-DEO-SVR-006-2025		
CONTRATISTA:	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	NIT:	79.466.268
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA-TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: SECOP: 2025S-VBOG-074844	Estado en ejecución en plataforma SECOP: En ejecución
VALOR INICIAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($69.875.471,00,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	NO		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($69.875.471,00,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	31 DE MARZO DE 2026 – 1 MES + 15 DIAS		

PRÓRROGA 2:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	18/12/2025
AMLPIACION 1 A LA SUSPENSION 1	02/02/2026
AMLPIACION 2 A LA SUSPENSION 1	27/02/2026
REACTIVACION	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 DE MAYO DE 2026

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691525	2025	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$69.875.471,00	$0,00	$69.875.471,00

A la fecha no se han realizado los pagos de las actas tramitadas.

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo no se tramitaron actas de costos.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

A fecha de corte al 30 de abril de 2026, el contrato reporta un avance de 76,76%:

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $85,71%
Total inversión ejecutada: $90,75%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

06/04/2026	1

Reprogramación 1 al plan de cargas.

2.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2025	1	N/A	18/12/2025 al 01/02/2026	02/02/2026
02/02/2026		1	02/02/2026 al 26/02/2026	27/02/2026
27/02/2026		2	27/02/2026 al 23/03/2026	24/03/2026


2.8.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/03/2026	N/A	1	Prorroga 1 - Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Póliza de cumplimiento No. I-100047863 - SEGUROS MUNDIAL

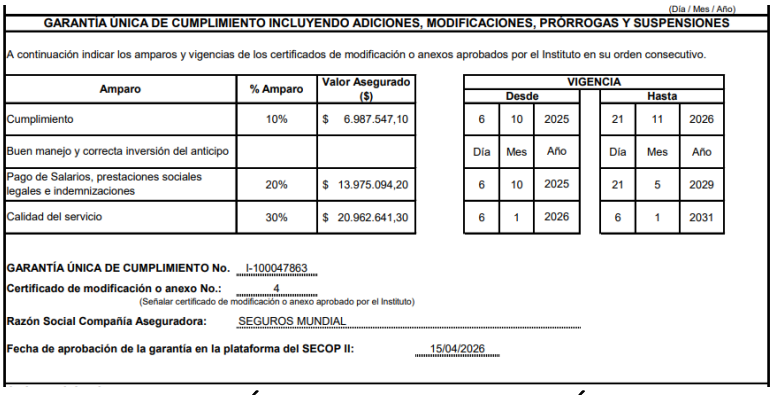

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.987.547,10	6	10	2025	21	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.975.094,20	6	10	2025	21	5	2029
Calidad del servicio	30%	$ 20.962.641,30	6	1	2026	6	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100047863

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/04/2026

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Al corte del 30 de abril se registra un atraso acumulado del 42,76%

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de obra por falta de PAC.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visita al sitio de las obras el día 24 de abril de 2026, en el marco de la resolución 118 del 21 de abril de 2026.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión y proyección de correspondencia.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se debe Implementar las medidas necesarias para minimizar los retrasos en la ejecución de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma y de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

_____

WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2044-01
C.C. 18.262.769 de Puerto Carreño (V)
