NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ING. DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2044-01 DT- Tolima

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4394 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía terciaria Cajamarca – Toche, código INVÍAS 32200 entre los municipios de Cajamarca y Corregimiento de Toche municipio de Ibagué.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1546 de 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN	SA-MC-DEO-SVR-003-2025		
CONTRATISTA:	SOFIA CASTRILLÓN ARCE	NIT:	31.932.472
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	06 de Octubre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma (el que aplique): SECOP: 2025S-VBOG-074848	Estado en plataforma SECOP: En ejecución
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.255.345.000,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
FUENTE DE LOS RECURSOS	NACION		
VALOR ADICIONES:	SI		
ADICIÓN 1:	14 DE MAYO DE 2026 - $630.000.000		
VALOR ACTUAL:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.885.345.000) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	SI (CLÁUSULA DÉCIMA del contrato)		
ANTICIPO OTORGADO:	$227.247.737,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.oo		
SALDO POR AMORTIZAR:	$227.247.737,00		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31 DE MARZO DE 2026 – 1 MES + 15 DIAS		
PRÓRROGA 2:	14 DE MAYO DE 2026 – 4 MESES + 25 DIAS		
SUSPENSIÓN 1:	18/12/2025		
AMLPIACION 1 A LA SUSPENSION 1	02/02/2026		
AMLPIACION 2 A LA SUSPENSION 1	27/02/2026		
REACTIVACION	24 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
666325	2025	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$1.255.345.000,00	$250.039.975,61	$1.005.305.024,39
613526	2026	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$630.000.000		$630.000.000
TOTAL				$1.885.345.000		$1.635.305.024,39

1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial No. 4 (Marzo de 2026)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta parcial No. 5 (Abril de 2026)	$101.036.220,40	$732.705,42	$21.808.311,80	$79.960.614,02

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

Alcance del contrato de acuerdo con el anexo técnico:

- Construcción de 4 alcantarillas de 36”
- Construcción del 610 ml de placa huella
- Construcción de 10 ml de muro en gaviones.
- Suministro e instalación de afirmado en 415 m3.
- Conformación de 400 metros de calzada existente.

1.5.AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5, con corte al 31 de mayo de 2025, se reporta un avance acumulado para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.255.345.000,00	100.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$801.504.000	45,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$317.570.323,11	25,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$317.570.323,11	25,30%

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$227.247.737,0
Amortizado	$21.808.311,80
Saldo	$205.439.426,00

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 45,50%:
Meta física ejecutada 25,30%:

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/05/2026	1

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/04/2026	1	Aprobado
22/05/2026	2	Aprobado

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2025	1	N/A	18/12/2025 al 01/02/2026	02/02/2026
02/02/2026		1	02/02/2026 al 26/02/2026	27/02/2026
27/02/2026		2	27/02/2026 al 23/03/2026	24/03/2026

Durante el periodo no se efectuaron suspensiones

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/03/2026	N/A	1	Prorroga 1 - Aprobada
14/05/2026	1	2	Prorroga 2 - Aprobada

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Póliza de cumplimiento No. 45-44-101168932 de fecha 07/10/2025 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-40-101102439.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 188.534.500,00	29	8	2025	15	5	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 251.069.000,00	29	8	2025	15	5	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 377.069.000,00	29	8	2025	15	10	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 2.856.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 562.747.500,00	31	12	2025	15	10	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101168932

Certificado de modificación o anexo No.: 17
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/05/2026

Garantía de RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios labores y operaciones		$ 350.181.000,00	29	8	2025	15	10	2026
Contratista y subcontratistas		$ 350.181.000,00	29	8	2025	15	10	2026
Vehiculos propios y no propios		$ 350.181.000,00	29	8	2025	15	10	2026

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101102439 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1586 DE 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	IP-DEO-SVR-006-2025		
CONTRATISTA:	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	NIT:	79.466.268
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA-TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: SECOP: 2025S-VBOG-074844	Estado en ejecución en plataforma SECOP: En ejecución
VALOR INICIAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($69.875.471,00,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	SI		
ADICIÓN 1:	$90.000.000		
VALOR ACTUAL:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($159.875.471,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31 DE MARZO DE 2026 – 1 MES + 15 DIAS		

PRÓRROGA 2:	14 DE MAYO DE 2026 - 4 MESES + 25 DIAS
SUSPENSIÓN 1:	18/12/2025
AMLPIACION 1 A LA SUSPENSION 1	02/02/2026
AMLPIACION 2 A LA SUSPENSION 1	27/02/2026
REACTIVACION	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2026

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691525	2025	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$69.875.471,00	$11.393.417,00	$58.482.054,00
619826	2026	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$90.000.000,00	$0,00	$90.000.000,00

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 3 (Diciembre 2025)	$7.361.600	$1.398.704	n/a	$8.760.304
Acta de costos 4 (Marzo 2026)	$0,00	$0,00	N/A	$0,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

A fecha de corte al 31 de mayo de 2026, el contrato reporta un avance de 78,72%:

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $78,66%

Total inversión ejecutada: $78,72%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
06/04/2026	1
22/05/2026	2

Reprogramación 2 al plan de cargas.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2025	1	N/A	18/12/2025 al 01/02/2026	02/02/2026
02/02/2026		1	02/02/2026 al 26/02/2026	27/02/2026
27/02/2026		2	27/02/2026 al 23/03/2026	24/03/2026

Durante el periodo no se tramitaron suspensiones al contrato.


2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/03/2026	N/A	1	Prorroga 1 - Aprobada
14/05/2026	1	2	Prorroga 2 - Aprobada

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Póliza de cumplimiento No. I-100047863 - SEGUROS MUNDIAL

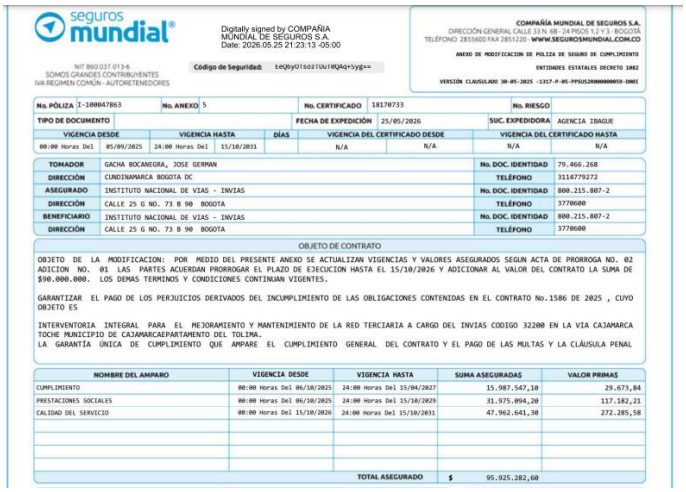

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.25 21:23:13 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: teQbyOIsozIUuTeQAq+5ygc=

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS20000000019-DANE

No. PÓLIZA	I-100047863	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18170733	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2025	24:00 Horas Del	15/10/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GACHA BOCANEGRA, JOSE GERMAN	No. DOC. IDENTIDAD	79.466.268
DIRECCIÓN	CUNDINAMARCA BOGOTA DC	TELÉFONO	3114779272
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS SEGUN ACTA DE PRORROGA NO. 02 ADICION NO. 01 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15/10/2026 Y ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $90.000.000. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1586 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGO 32200 EN LA VIA CAJAMARCA TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA/DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 15/04/2027	15.987.547,10	29.673,84
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 15/10/2029	31.975.094,20	117.182,21
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/10/2026	24:00 Horas Del 15/10/2031	47.962.641,30	272.285,58
		TOTAL ASEGURADO	$	95.925.282,60

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Prorroga 2 al contrato por 4 meses más 25 días

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Adición en valor de $90.000.000

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se realizaron comisiones al sitio de las obras.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión y proyección de correspondencia.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se debe Implementar las medidas necesarias para minimizar los retrasos en la ejecución de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma y de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,



WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2044-01
C.C. 18.262.769 de Puerto Carreño (V)
